20252900028389

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20252900028389

Pública ☐ **Pública Reservada** ☐ **Pública Clasificada** ☐

Bogotá D.C, 07-11-2025

1. DETERMINACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN

1.1. MODALIDAD DE SELECCIÓN.

El proceso de selección se adelantará mediante la modalidad de CONTRATACIÓN DIRECTA prevista en el Capítulo VI. Etapa de selección, numeral 31, literal ii) "Contratos y/o Convenios Interadministrativos" del Manual de Contratación de ENTerritorio M-PR-01 versión 1, por tratarse de un acuerdo de voluntades suscrito entre dos entidades públicas y en concordancia con lo previsto en el literal c) del numeral 4º. del artículo 2º. de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011.

1.2. JUSTIFICACIÓN

En el marco de lo dispuesto en el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019, a la fecha hay once (11) pactos territoriales en ejecución (Bicentenario, Golfo de Morrosquillo, Santander, Casanare, Cesar - La Guajira, Atlántico, Cundinamarca, Bolívar, por la Cultura Bello Antioquia, Río Bogotá y Magdalena).

De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.3.2 del documento CONPES 4023 del 11 de febrero de 2021, se destaca a los Pactos Territoriales dentro de los mecanismos de articulación institucional entre niveles de gobierno, por lo cual en las recomendaciones del referido documento, numeral 3, literal C se solicita al DNP "implementar una estrategia de dinamización de los proyectos de impacto regional para la reactivación; como impulso importante al proceso de reactivación económica", para lo cual el Fondo Regional para los Pactos Territoriales- FRPT, se convierte en el vehículo que da cumplimiento a la recomendación como estrategia de dinamización para superar la crisis financiera causada por el COVID-19.

Así las cosas, estos proyectos de inversión priorizados en los Planes Estratégicos de los Pactos Territoriales vigentes han sido concertados de manera articulada entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, dada su importancia en el desarrollo económico y social del país, por lo que es fundamental impulsar su financiación y ejecución, para apoyar el desarrollo de las regiones y contrarrestar los efectos del COVID-19, que han desencadenado una crisis económica sin precedentes, toda vez que la actual emergencia de salud ha ocasionado una contracción de la economía colombiana calculada para el 2020 en 6,8%, además de un

aumento en el índice de pobreza monetaria, que registra un nivel del 42,5% y en el índice de pobreza monetaria extrema, con el 15,1% de acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)1.

En ese mismo orden de acción, el pasado 19 de julio del 2021, se expidió el documento **CONPES 4037** mediante el cual se declaró la importancia estratégica del proyecto de inversión: *"Apoyo al desarrollo de proyectos a través del Fondo Regional para los Contratos Plan"*, de acuerdo con el aval fiscal otorgado por el Confis14, para impulsar el desarrollo territorial a través de la destinación de recursos para la ejecución de 142 proyectos de inversión priorizados en los Pactos Territoriales: Atlántico, Bolívar, Casanare, Cesar- La Guajira, Cundinamarca, Golfo de Morrosquillo, Río Bogotá y Santander.

A su vez, el pasado 29 de diciembre de 2023, se expidió el documentos **CONPES 4101,** a través del cual se realizó la ***"MODIFICACIÓN AL DOCUMENTO CONPES 4037 DECLARACIÓN DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DEL PROYECTO APOYO AL DESARROLLO DE PROYECTOS A TRAVÉS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS CONTRATOS PLAN, AHORA PACTOS TERRITORIALES".*** Dicho lo anterior *"(…) La Secretaría Técnica del CONPES, en uso de las facultades conferidas por el artículo 2.2.12.3.3 del Decreto 1082 de 2015, expide la presente adenda al Documento CONPES 4101 Modificación al Documento Conpes 4037 Declaración de Importancia Estratégica del Proyecto Apoyo al Desarrollo de Proyectos a través del Fondo Regional para los Contratos Plan, Ahora Pactos Territoriales aprobado en 2022, que tiene como objetivo garantizar los recursos financieros necesarios para fomentar la articulación institucional y el crecimiento económico en las regiones mediante la ejecución de 151 proyectos de inversión priorizados en los Pactos Territoriales de Atlántico, Bolívar, Casanare, Cesar La Guajira, Cundinamarca, Golfo de Morrosquillo, Magdalena, Río Bogotá y Santander (…)".*

De esta manera, con fundamento en el marco constitucional, legal y de política pública que regula los Pactos Territoriales / Contratos Plan, **el 14 de agosto de 2025**, se suscribió el **Pacto Boyacá, Raíz y Futuro: Transformación Económica Justicia Social en Armonía con la Naturaleza**, con el objeto de *"Implementar políticas y proyectos estratégicos en el departamento de Boyacá, que promuevan la transformación productiva para una tierra grande, competitiva y equitativa, alineadas con los principios del Gobierno Nacional. Todo ello para lograr una transición energética justa, que permita transitar de las actividades económicas extractivistas, a la agroindustria, el turismo y las energías alternativas, sumado a la generación de bienestar con el fortalecimiento del acceso a servicios esenciales como salud, agua potable y saneamiento básico, educación e infraestructura estratégica, para lograr el cierre de brechas y promover la vida en el territorio Boyacense".*

El Pacto Boyacá, Raíz y Futuro: Transformación Económica Justicia Social en Armonía con la Naturaleza, aplica a las entidades signatarias y a las que representan, y se suscribe en el marco de lo previsto

[1] https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/ pobreza-monetaria

en el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 *"Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad".*

Además, la Focalización Territorial del **El Pacto Boyacá, Raíz y Futuro: Transformación Económica Justicia Social en Armonía con la Naturaleza** se extiende a la totalidad del departamento de Boyacá, que cuenta con 23.189 Km2 de superficie y 123 municipios localizados en 13 provincias. Está ubicado en el centro oriente del país y lo atraviesa la Cordillera Oriental de la región Andina Colombiana, por consiguiente, tiene una topografía muy variada a la cual se suma también la variedad de climas.

El Pacto Boyacá, Raíz y Futuro: Transformación Económica Justicia Social en Armonía con la Naturaleza, tiene un plazo de ejecución de **cinco (5) años** contados a partir de su suscripción, por lo que su fecha de terminación está prevista para el **13 de agosto de 2030.**

Con base en lo anteriormente descrito, mediante el radicado **DNP 20254330761971 del 07 de noviembre de 2025 / ENTerritorio 202561010242952 del 07 noviembre de 2025,** la Gerencia Nacional para los Pactos Territoriales del Departamento Nacional de Planeación, solicitó al Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, la verificación sobre el cumplimiento de requisitos técnicos, jurídicos y financieros para la posible asignación de recursos al proyecto denominado ***"MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES LÍMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON – TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA".***

2. TIPOLOGÍA DEL CONTRATO

De conformidad con la naturaleza jurídica de las partes y el objeto contractual, el contrato a suscribir es un **CONTRATO ESPECÍFICO INTERADMINISTRATIVO**.

3. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

3.1 ANTECEDENTES

El artículo 8 de la Ley 1450 de 2011, modificado por el artículo 198 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014 "Prosperidad para Todos", incorporó al ordenamiento jurídico los Contratos Plan como un instrumento de planeación del desarrollo territorial para la articulación de recursos y la concurrencia de esfuerzos institucionales entre diferentes niveles de gobierno.

El marco jurídico de los Contratos Plan se complementa con la Ley 1454 de 2011 , los lineamientos de política pública definidos en el CONPES 3822 de 2014 , el cual propuso iniciar la fase de expansión de los Contratos Plan, desarrollando distintos elementos que integran el ciclo de los Contratos Plan y definiendo un conjunto de criterios de focalización, condiciones de elegibilidad, reglas de financiamiento y arreglos institucionales a ser

tenidos en cuenta en la operación del instrumento, lo anterior se materializó en el Título 13 "Contratos Plan" del Decreto 1082 de 2015 , adicionado por el Decreto 740 de 2016 y modificado por el Decreto 1675 de 2016 , el cual reglamenta los artículos 198 y 199 de la Ley 1753 de 2015 .

De acuerdo con este marco normativo, los Contratos Plan buscan la coordinación interinstitucional entre los diferentes niveles de gobierno en favor de un eje central de desarrollo. Dicho eje debe responder tanto a las necesidades territoriales como a los ejes estratégicos de desarrollo nacional y sectorial establecidos en los planes de desarrollo respectivos. En virtud de lo anterior, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) incluyó en su plan estratégico 2014-2018 "Todos por un Nuevo País", el propósito de avanzar en la coordinación de la implementación del instrumento Contratos Plan, como una de las principales herramientas para facilitar la articulación Nación-Territorio y promover políticas conjuntas para el desarrollo regional.

En virtud de lo anterior, desde 2012 a la fecha se suscribieron trece (13) Contratos Plan en dieciséis (16) departamentos del país, dentro de los cuales se suscribieron siete (7) pilotos, que constituyeron la primera generación de los Contratos Plan en los departamentos de: Antioquia, Córdoba y Chocó (Contrato Plan Atrato Gran Darién), Boyacá, Nariño, Tolima, Norte del Cauca, Arauca y Santander, de igual forma, siguiendo los lineamientos de política pública derivada del CONPES 3867 y del CONPES 3822, se inició el proceso de formulación de seis (6) Contratos Plan para la Paz y el Posconflicto, denominados "Contratos Paz" por el mencionado Decreto 1675 de 2016, para los departamentos de Bolívar, Sucre (Contrato Paz Bolívar - Sucre), Caquetá, Guainía, Valle del Cauca, Guaviare y Meta.

Con el fin de satisfacer los compromisos pactados dentro de cada uno de los Contratos Plan y facilitar la ejecución de la herramienta, con posterioridad a la adopción del CONPES 3822 de 2014, se expidió la Ley 1753 de 2015, cuyos artículos 198 y 199, relativos a los Contratos Plan, precisan, de una parte, el alcance jurídico de la herramienta, y de otra, crean el Fondo Regional para los Contratos Plan y los Contratos Específicos como mecanismos para potenciar la gestión y la ejecución de la herramienta de Contratos Plan.

El artículo 198 de la Ley 1753 de 2015, modificó el artículo 8 de la Ley 1450 de 2011 y definió los Contratos Plan como *"(…) un acuerdo marco de voluntades de carácter estratégico entre la Nación y las entidades territoriales plasmado en un documento que contiene los arreglos programáticos y de desempeño definidos entre éstas para la ejecución asociada de proyectos de desarrollo territorial que contemplen la concurrencia de esfuerzos de inversión nacional y territorial". De igual forma, este artículo señaló que: "En desarrollo de este acuerdo marco se suscribirán contratos específicos en los cuales se señalará el objeto, las metas, los plazos, el responsable de la ejecución y se comprometerán los recursos de fuente nacional y territorial que se destinen para su ejecución, así como las vigencias futuras que se requieran. Adicionalmente, se acordarán los mecanismos de seguimiento y control de los recursos y todos los demás aspectos necesarios para garantizar la rápida y eficiente ejecución de los proyectos, atendiendo las prioridades y particularidades de cada sector y cada región".*

Si bien los Contratos Plan permiten articular esfuerzos institucionales entre la Nación y el territorio, para impulsar determinados ejes de inversión, cada una de las partes que concurren en su suscripción y ejecución, conservan y ejercen sus competencias de acuerdo con el marco legal que les resulta aplicable. Es así como, tratándose de la ejecución de proyectos, la contratación, vigilancia, supervisión y control de los recursos asociados a los

proyectos priorizados en los Contratos Plan, corresponde a las entidades ejecutoras, bien sean estas del orden nacional (Ministerios, entidades descentralizadas, entre otras) o del orden territorial (Departamentos, municipios y corporaciones autónomas, entre otras).

Por su parte, el artículo 199 del PND 2014-2018, creó el Fondo Regional de los Contratos Plan como una cuenta de naturaleza especial, sin personería jurídica, adscrita al Departamento Nacional de Planeación que podría ser administrada por una entidad financiera del orden nacional, con participación estatal, constituyéndose en un mecanismo de gestión, que permitiera facilitar el cumplimiento de los acuerdos, metas y resultados acordados en los Contratos Plan y de lograr la articulación y convergencia de recursos disponibles.

Con la creación del Fondo Regional para los Contratos Plan se estableció un mecanismo de gestión de esta herramienta para ser utilizado por los aportantes en los Contratos Plan, bien se trate de las partes o de terceros para la administración y ejecución de los recursos priorizados en éstos, con el ánimo de velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Aunado a lo anterior, fue expedido el Decreto 740 de 2016, *"Por el cual se adiciona el Título 13 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin de reglamentar parcialmente la Ley 1454 de 2011 y los artículos 198 y 199 de la Ley 1753 de 2015 sobre los Contratos Plan y el Fondo Regional para los Contratos Plan*", el cual especifica las condiciones generales de operación y administración del Fondo, establece las funciones que deberá ejercer el administrador en virtud del mismo y estipula la forma en la cual deberán ser administrados los recursos que ingresen a éste.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.13.1.2.4 del Decreto 1082 de 2015, el administrador del Fondo Regional para los Contratos Plan deberá desarrollar como mínimo las siguientes actividades: *"(…) 1) Recibir, custodiar y administrar los recursos del Fondo Regional para los Contratos Plan y aquellos que le sean transferidos por las demás entidades aportantes en los Contratos Plan, en los términos previstos en este título, las normas que lo regulen de conformidad con la naturaleza de los recursos y según las condiciones acordadas en el contrato de administración; 2) Administrar los recursos como un sistema separado de cuentas y constituir subcuentas por cada Contrato Plan, proyecto y fuente de financiación; 3) Mantener en depósito los recursos distintos de los provenientes del Presupuesto General de la Nación que se le transfieran, hasta su giro, de conformidad con las normas del presente título; 4) Efectuar los pagos a que haya lugar en desarrollo de los Contratos Plan, previa verificación del cumplimiento de los requisitos previstos para su desembolso; 5) Administrar la bolsa de los recursos que determine el Gobierno Nacional a través del Departamento Nacional de Planeación para incentivar a las entidades territoriales para que concurran con sus recursos propios y obtengan los mejores resultados en el desarrollo y ejecución de los Contratos Plan, a que se refiere el parágrafo del artículo 199 de la Ley 1753 de 2015, de conformidad con las condiciones que para el efecto defina el Departamento Nacional de Planeación; 6) Rendir informe de la administración de los recursos de cada Contrato Plan al Departamento Nacional de Planeación; 7) Cumplir y hacer cumplir las decisiones y normas expedidas por el Gobierno Nacional y el Departamento Nacional de Planeación, en temas relacionados con la operación y funcionamiento del Fondo, y 8) Las demás que se acuerden en el contrato de mandato."*

Adicionalmente, el Decreto 1082 de 2015, estableció que la representación del Fondo estaría en cabeza del DNP y en virtud de ello lo facultó para que contratara la administración de este con una Entidad Financiera del

orden nacional con participación estatal vigilada por la Superintendencia Financiera, por medio de un Contrato de Mandato en los términos previstos en los artículos 2.2.13.1.2.3 y 2.2.13.1.2.4 de esta normativa.

Así las cosas, teniendo en cuenta que los Contratos Plan se enmarcan en los programas y proyectos que las entidades pueden emprender para el cumplimiento de las funciones misionales que les han sido asignadas legalmente, con fundamento en la autorización legal conferida a la entidad, el DNP confirió mandato a FONADE (ahora ENTerritorio S.A.) desde el 15 de julio de 2016 para que realizara la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan (ahora Fondo Regional para los Pactos Territoriales) en virtud de los Contratos de Mandato No. 216115 y 216138 de 2016.

Asimismo, y siguiendo las orientaciones establecidas en las bases del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad” para el cuatrienio 2018-2022, se contempló un rediseño a la estrategia de la herramienta de los Contratos Plan proponiendo su migración hacia los Pactos Territoriales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019 por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Es importante precisar que en razón a la expedición del Decreto 1042 de 2022, de fecha 21 de junio de 2022, “Por el cual se realiza la depuración del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”, señala con relación a lo establecido en el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019, que las referencias a los "Contratos Plan" y al "Fondo Regional para los Contratos Plan" se entenderán efectuadas a los "Pactos Territoriales" y al "Fondo Regional para los Pactos Territoriales", respectivamente.

A su vez, el artículo 279 de la Ley 2294 de 2023, modifica el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019, señalando que los departamentos, los municipios, los Esquemas Asociativos Territoriales y la Nación podrán suscribir Pactos Territoriales, definidos como un instrumento de articulación para la concertación de inversiones estratégicas de alto impacto que con-tribuyan a consolidar el desarrollo regional definido en el Plan Nacional de Desarrollo y la construcción de la Paz Total, promoviendo para ello, la adopción de metodologías con enfoque de género a través del trabajo articulado con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, y la concurrencia de recursos del orden nacional y territorial, público, privado y/o de cooperación internacional, bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación.

Es así como este elemento normativo establece que a partir de la expedición del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, se transforma el Fondo Regional para los Pactos Territoriales a un Patrimonio Autónomo constituido mediante la celebración de un contrato de fiducia mercantil por parte del Departamento Nacional de Planeación y una sociedad fiduciaria de carácter público seleccionada directamente por dicho Departamento Administrativo. El objeto de este patrimonio autónomo será recibir, administrar y ejecutar los recursos destinados a la implementación de los pactos territoriales, incluyendo los que ya se encuentren en el Fondo Regional para los Pactos Territoriales.

El artículo 250 ya mencionado, modificado por el artículo 279 de la Ley 2294 de 2023, fue reglamentado por el Decreto 105 de 2024, “Por el cual se modifica la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 13 de la Parte 2 del Libro II del Decreto número 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación, con el fin de reglamentar el artículo 279 de la Ley 2294 de 2023”. Esta norma establece los órganos de gobierno y administración del Patrimonio Autónomo Fondo Pactos de que trata el artículo 279 de la Ley 2294 de 2023, así como su funcionamiento y los aspectos necesarios para su financiamiento.

En tanto inicia la operación del Patrimonio Autónomo Fondo Pactos y se celebra el contrato de fiducia mercantil correspondiente, el Fondo Regional para los Pactos Territoriales continuará siendo el mecanismo para la administración y ejecución de los recursos que permitan la financiación de proyectos incluidos en los Pactos Territoriales. De acuerdo con lo anterior, cada Ley del Plan que se ha venido expidiendo ha hecho ciertas modificaciones a la figura original (por ejemplo, en cuanto a su enfoque, con la incorporación de los Contratos Plan para la Paz), de manera que hoy podría hablarse de tres (3) generaciones de esta figura, a saber: (i) los Contratos Plan (2012); (ii) los Contratos Plan para la Paz (2016); y (iii) los Pactos Territoriales (2019)

Los Pactos Territoriales incorporan entonces un enfoque principalmente de asociatividad territorial alrededor de intervenciones o proyectos de impacto regional y formación bruta de capital, de igual forma buscan promover la delegación de competencias y prestación de servicios públicos compartidos, entre entidades territoriales. En este sentido, se espera fortalecer el acceso a fuentes de recursos, acceso directo a los recursos de SGR o a la presentación y ejecución de proyectos como esquema asociativo, mejorando la calidad de la inversión pública y garantizando la coordinación y la articulación de la planeación e inversiones para el desarrollo regional, hecho que implica la adopción de técnicas de presupuestación por desempeño y resultados que mejoren la calidad del ciclo de la inversión pública tanto en el nivel nacional como en el territorial, en particular, la programación y la toma de decisiones de política con base en información proveniente del seguimiento y la evaluación.

En razón a que el Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 546-2016- FONADE (ahora ENTerritorio S.A.) 216138, finalizó el 31 de mayo de 2019, y subsistía la necesidad de adelantar la correspondiente contratación para garantizar el cumplimiento de los compromisos, metas y resultados acordados en cada Contrato Plan / Pacto Territorial, a través de la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan / Pactos Territoriales, el 24 de mayo de 2019 el DNP y ENTerritorio S.A. suscribieron el Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 558 / ENTerritorio 219057, que tenía por objeto lo siguiente: *"DNP confiere mandato a ENTerritorio para realizar la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan / Pactos Territoriales con los recursos que ingresen a este y los demás que le sean transferidos*", cuyo término de ejecución fue hasta el 14 de enero de 2021, conforme lo dispuso el Otrosí No. 3, suscrito el 14 de diciembre de 2020.

Igualmente, y en razón a que el Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 558 / ENTerritorio 219057 finalizó el 14 de enero de 2021 y subsistía la necesidad de adelantar la correspondiente contratación para garantizar el cumplimiento de los compromisos, metas y resultados acordados en cada Contrato Plan, el 15 de enero de 2021, el DNP y ENTerritorio suscribieron el Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 226-2021 ENTerritorio 221001 que tiene por objeto lo siguiente: *"DNP confiere mandato a ENTerritorio para realizar la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan / Pactos Territoriales con los recursos que ingresen a este y los demás que le sean transferidos", con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021".*

El 14 de septiembre de 2021, se suscribió acta de terminación anticipada por mutuo acuerdo del Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 226-2021 ENTerritorio 221001, con el fin de proceder al trámite de un nuevo contrato de mandato para las vigencias 2021-2025, que permita la administración de recursos y el seguimiento técnico, jurídico y administrativo de los 20 contratos específicos aún en ejecución, así como las demás iniciativas priorizadas en el marco de los Pactos Territoriales vigentes, que permitirán coadyuvar el cumplimiento del

objetivo principal del Proyecto de Inversión *APOYO AL DESARROLLO DE PROYECTOS A TRAVÉS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES/CONTRATOS PLAN NACION.*

En virtud de lo anterior, el 15 de septiembre de 2021, el DNP y ENTerritorio S.A. suscribieron el Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877-2021 ENTerritorio 221009 que tiene por objeto lo siguiente: *"DNP confiere mandato a ENTerritorio para realizar la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan / Pactos Territoriales con los recursos que ingresen a este y los demás que le sean transferidos"*, con un plazo de ejecución hasta el 15 de noviembre de 2025

Con ocasión del contrato de mandato celebrado con el DNP, ENTerritorio S.A. debe adelantar, entre otras, las siguientes actividades, acorde con la Cláusula Segunda del precitado Contrato de Mandato:

> *"(…)*
>
> *5) Como condición previa a la celebración de los contratos específicos, el mandatario deberá verificar y dejar constancia de la viabilidad técnica que la entidad competente emita con relación a los proyectos de inversión o programas priorizados en el marco del Contrato Plan/Pacto Territorial, así como deberá verificar y dejar constancia de la viabilidad jurídica y financiera del mismo con fundamento en la información que le sea remitida, de conformidad con los lineamientos que se establezcan en el reglamento operativo del Fondo Regional de Contratos Plan/Pactos Territoriales que hace parte integral del Contrato.*
>
> *6) Celebrar los contratos específicos en los términos descritos en el Decreto No. 1082 de 2015, adicionado por el Decreto No. 740 de 2016 o la norma que lo modifique o sustituya, así como los demás actos jurídicos que se requieren para el desarrollo del contrato de mandato con cargo a los recursos del Fondo y adelantar las gestiones previas necesarias para su suscripción de manera autónoma manteniendo indemne al DNP frente a cualquier reclamación.*
>
> *(…)*
>
> *11) Efectuar los giros, liquidaciones y deducciones a que haya lugar en desarrollo de los Contratos Específicos, previa certificación del cumplimiento de los requisitos jurídicos, técnicos y financieros previstos para su desembolso establecidos en los procedimientos de pago de ENTerritorio en su calidad de administrador del Fondo.*
>
> *(…)*
>
> *19. Realizar el seguimiento financiero y administrativo a la ejecución de los recursos que concurran a los proyectos y aquellos que le sean transferidos para el cumplimiento de los acuerdos, metas y compromisos adquiridos en los Contratos Plan/Pactos Territoriales con relación a los contratos específicos que hayan sido celebrados en virtud de los contratos de mandato anteriores o aquellos que se celebren y de acuerdo al mecanismo que se pacte en los contratos específicos y en el reglamento operativo del Fondo. Este seguimiento no implica supervisión ni la vigilancia y el control de la ejecución contractual de los recursos en los proyectos financiados a través del Contrato, en tanto esta es responsabilidad de las entidades ejecutoras; sin embargo, en los contratos específicos se deben incluir los mecanismos necesarios para mantener indemne al DNP y al FONDO para aquellos eventos en que el contrato no llegue a feliz término*
>
> *(…)"*

Ahora bien, ENTerritorio S.A. presentó la propuesta técnica y económica cuyo alcance consistió en ofertar un servicio de gestión de proyectos, que son priorizados en los Contratos Plan bajo el marco de la línea de negocio de Gestión de Proyectos. De acuerdo con lo establecido en el Manual de Líneas de Negocio M-CM-01, ENTerritorio S.A. en cumplimiento de su objeto social desarrolla tres líneas de negocios: Gerencia de Proyectos,

Gestión de Proyectos y Estructuración y Evaluación de Proyectos. Bajo estas líneas, opera en el mercado y ofrece servicios de valor a sus clientes, siendo ofertadas conforme el Procedimiento de Negociación de Líneas Misionales establecido en el sistema de gestión de calidad de la Entidad.

El Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877-2021 ENTerritorio 221009, se enmarcó en la línea de negocios de gestión de proyectos de ENTerritorio S.A., el cual, ha sido desarrollado por la entidad, en virtud de las competencias definidas en el artículo segundo del Decreto 288 de 2004, en el que se señala que esta entidad "tiene por objeto principal ser Agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la preparación, financiación y administración de estudios, y la preparación, financiación, administración y ejecución de proyectos de desarrollo en cualquiera de sus etapas".

La línea de negocios de ENTerritorio S.A. se encuentra enfocada a la gestión de proyectos, lo que permite contribuir para que las entidades hagan el mejor uso de los recursos disponibles para alcanzar la ejecución exitosa de sus proyectos y alcanzar los resultados esperados. Esta línea de negocio es congruente con los esquemas de gestión y dirección que se conocen; e incorpora elementos que proporcionan a los clientes eficiencia, economía, seguridad, desarrollo, impacto y soporte para los proyectos que ejecutan.

El alcance de la Gestión de Proyectos de ENTerritorio S.A. consiste, en que realizan tareas de acompañamiento para proyectos de desarrollo o parte de ellos, asumiendo obligaciones de intermediación con su cliente, compartiendo actividades y tareas específicas con el ejecutor, generando valor agregado de orden técnico, financiero, jurídico y de control al proyecto.

En este caso particular, tratándose de la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan, el alcance de los servicios estará circunscrito a las actividades previstas en el artículo 2.2.13.1.2.4. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 740 de 2016 y las que se acuerden en el Contrato de Mandato bajo el marco normativo que regula los Contratos Plan, los Pactos Territoriales y el Fondo Regional para los Pactos Territoriales / Contratos Plan.

En relación con la responsabilidad que asume ENTerritorio S.A. en la línea de negocio de gestión de proyectos, se aclara que esta entidad no asume la responsabilidad por el resultado del proyecto, en ese sentido su responsabilidad solamente se predica en la ejecución oportuna y efectiva de las acciones de acompañamiento, asesoría, administración y/o intermediación, para proveer los elementos que la ejecución del proyecto le demande a la entidad contratante.

En este sentido, en consideración a que la intervención de ENTerritorio S.A. normalmente está sujeta a la participación de su cliente y a su obligación de desarrollar o implementar el proyecto de que se trata; en ningún caso podrá comprometerse con la obtención del resultado; por lo que en caso de que se presente una omisión o una afectación propia o de un tercero, por efectos de la no implementación del proyecto, podrá solicitar las indemnizaciones a que haya lugar.

Visto el alcance de la responsabilidad que le asiste a ENTerritorio S.A. en el Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877-2021 ENTerritorio 221009, bajo la línea de negocios Gestión de Proyectos, con ocasión del seguimiento a la transferencia de recursos, en ningún caso ENTerritorio S.A.es el responsable de realizar la

vigilancia y el control de la ejecución contractual, en cuanto a los aspectos técnicos, jurídicos y financieros de los recursos en los proyectos financiados a través del Pacto Territorial / Contrato Plan, pues ésta corresponde expresamente a las entidades ejecutoras que se definan para cada proyecto en el contrato específico, en los términos descritos en los artículos 2.2.13.1.1.6. y 2.2.13.1.2.7 del Decreto No. 1082 de 2015, como se señaló anteriormente.

El objeto para contratar se encuentra incluido dentro del Plan Anual de Adquisiciones mediante el código **No. 1378.**

Con base en lo anteriormente descrito, mediante el radicado **DNP 20254330761971 del 07 de noviembre de 2025 / ENTerritorio 202561010242952 del 07 noviembre de 2025,** la Gerencia Nacional para los Pactos Territoriales del Departamento Nacional de Planeación, solicitó al Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, la verificación sobre el cumplimiento de requisitos técnicos, jurídicos y financieros para la posible asignación de recursos al proyecto denominado ***"MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES LÍMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON – TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA".***

Como anexo a estos oficios, se remitió documentación, mediante el Gobernador del Departamento de Boyacá, señor **CARLOS ANDRES AMAYA RODRIGUEZ,** presentó al DNP el proyecto anteriormente descrito, para contar con la financiación de este por la suma de **SETENTA MIL TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($70, 031, 648,339)**

Igualmente, en la información aportada por el secretario de despacho adscrito a la secretaría de contratación del Departamento de Boyacá, de mediante la cual se indicó que el proyecto fue priorizado en el **Acta Consejo Directivo No. º 2 del 07 de Noviembre de 2025 del Pacto Boyacá, Raíz y Futuro: Transformación Económica Justicia Social en Armonía con la Naturaleza**, e incluido en el Plan de Acción del mismo año.

En consecuencia, el valor total del Contrato Específico a celebrar asciende a la suma total de **SETENTA MIL TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($70, 031, 648,339)**

Igualmente, en la información aportada por el Gobernador de Boyacá - de mediante la cual se indicó que el proyecto fue priorizado en el Acta Consejo Directivo No. 2 del 07 de noviembre de 2025 del Pacto Funcional Magdalena, e incluido en el Plan de Acción del mismo año.

Por lo anterior, mediante oficio con radicado ENTerritorio S.A. No. 202533010018421 del 07 de noviembre de 2025**,** dirigido a la Gerente Nacional de los Pactos Territoriales del DNP, y suscrito por Gerente Máster Grupo de Proyectos Especiales y el Gerente del FRPT, se dio respuesta a la solicitud de verificación de la viabilidad técnica, jurídica y financiera para la posible asignación de recursos del proyecto, dejando a consideración del DNP se adelantasen las gestiones necesarias para continuar con los trámites respectivos.

Con fundamento en esta información, la Secretaria General del Departamento Nacional de Planeación, mediante oficio de radicado **DNP 20256000762361 del 07 de noviembre de 2025**, dio la instrucción a la Gerencia de ENTerritorio S.A., de iniciar las gestiones necesarias para financiar con recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, el proyecto de inversión priorizado e incluido en el Plan de Acción 2025 del Pacto Funcional Boyacá, denominado: ***"MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES LÍMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON – TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA"*** por un valor total de de **SETENTA MIL TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRES-CIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($70, 031, 648,339)** los cuales se financia-rán con recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales**,** recursos de las vigencias **2025 y 2026.**

Por todo lo anterior, se encuentra la procedencia de suscribir el Contrato Específico, para la financiación del proyecto denominado ***"MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES LÍMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON – TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA****".*

4. IDENTIFICACIÓN DEL CÓDIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

Código Segmento	Código Familia	Código Clase	Código Producto	Nombre producto
80000000	80100000	80101500	80101505	Desarrollo de políticas u objetivos empresariales

5. OBJETO Y ALCANCE

5.1 OBJETO

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTerritorio S.A., está interesada en contratar:

ENTerritorio S.A. y la Gobernación de Boyacá, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Funcional Boyacá, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto denominado ***MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES LÍMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON – TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA"***, el cual se encuentra priorizado en el Plan de Acción 2025 del Pacto Funcional Boyacá.

6. ALCANCE DEL OBJETO

Financiar la ejecución del proyecto denominado ***"MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES LÍMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON – TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA"*** de acuerdo con la descripción jurídica, técnica y financiera contenida en los documentos que han sido entregado por la Entidad Formuladora a través del DNP, así como la verificación realizada por el

equipo del FRPT, tal como se evidencia en el documento de justificación del proyectó, así como el formato ENTerritorio F-PR-37, y los demás insumos complementarios para la suscripción del Contrato Específico.

Esta meta deberá ser acreditada por la Entidad Ejecutora en los términos que se señalan en las respectivas cláusulas del Contrato Específico, en tanto es la responsable de realizar seguimiento al proyecto y recibirlo a satisfacción.

7. DESCRIPCIÓN DE LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL.

No aplica.

8. ANÁLISIS DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No aplica.

9. ANÁLISIS DE RIESGOS, MATRIZ DE RIESGOS Y ANÁLISIS DE GARANTÍAS

Se anexan soportes

9.1 ANÁLISIS DE RIESGOS Y MATRIZ DE RIESGO

Ver documento anexo F-PR-32 - Análisis de riesgo y matriz de riesgos.

9.2 ANÁLISIS DE GARANTÍAS.

Ver documento anexo F-PR-33- Esquema de garantias

10. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN

Se fija como plazo para la ejecución del proyecto **NUEVE (09) MESES** contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato Específico.

PARÁGRAFO. Considerando que el plazo de ejecución del proyecto denominado ***"MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES LÍMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON – TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA",*** excede la vigencia del Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877 / ENTerritorio S.A. 221009, (31 de julio de 20263), por medio del cual ENTerritorio S.A. actúa en calidad de administrador y operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, la continuidad de las gestiones de operación y administración del FRPT, respecto de los proyectos cuya ejecución superen el plazo del actual mandato, será asumida directamente por el Departamento Nacional de Planeacion o por la figura que esta entidad instruya para tal efecto.

10.1 CONDICIÓN RESOLUTORÍA

No aplica.

11. LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL

Al producirse una de las causas de terminación del contrato, se procederá a su liquidación de mutuo acuerdo en un plazo máximo de cuatro (4) meses, contados a partir de la ocurrencia del hecho o acto que genera la terminación. La liquidación por mutuo acuerdo se hará por acta firmada por las partes, en la cual deben constar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. De no realizarse la liquidación del contrato en el término anterior, se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 o la norma que sea aplicable para el efecto.

12. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero	Rubro	Concepto	Centro contable	Valor CDP	N° Vigencia Futura	Vigencia	Valor Vigencia Futura	Rubro
CDP2025-5057	921910011	EJECUCIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA VIGENCIA ACTUAL	221009 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	10.227.104.846,00	SOLVF2025-000022	2026	59.804.543.493,00	EJECUCIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA VIGENCIA ACTUAL

LUGAR DE EJECUCIÓN: Departamento de Boyacá

13. FORMA DE PAGO

FORMA DE TRANSFERENCIAS AL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de financiación ascienden a la suma de **SETENTA MIL TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($70.031.648.339,00),** cuyo desembolso será así:

1) Una primera transferencia por la suma de **CATORCE MIL SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTI-NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($14.006.329.671,00),** una vez se suscriba el contrato específico, se apruebe la póliza, se realice la apertura de la cuenta especial para el manejo exclusivo de los recursos, se realice incorporación de estos recursos en el presupuesto de la Entidad Ejecutora, se presente la cuenta de cobro con sus soportes correspondientes, se suscriba el acta de inicio de la contratación derivada y se cuente con la disponibilidad del PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2025 por valor de **DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE**

MILLONES CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($10.227.104.846,00) y de la vigencia fiscal 2026 por valor de **TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($3.779.224.825,00)** del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

2) Una segunda transferencia por valor de **DIEZ MIL QUINIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($10.504.747.250,00),** una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del **20%** que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2026, del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

3) Una tercera transferencia por valor de **DIEZ MIL QUINIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($10.504.747.250,00),** una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del **40%** que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2026 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

4) Una cuarta transferencia por valor de **DIEZ MIL QUINIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($10.504.747.250,00),** una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del **55%** que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2026 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

5) Una quinta transferencia por valor de **DIEZ MIL QUINIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($10.504.747.250,00),** una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del **70%** que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso

estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2026 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

6) Una sexta transferencia por valor de **SIETE MIL TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($7.003.164.834,00),** una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del **83%** que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2026 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

7) Una última transferencia por valor de **SIETE MIL TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($7.003.164.834,00),** con la entrega del informe final de ejecución del proyecto, el cual contendrá como i) las actas de terminación de los contratos derivados ii) estado del cumplimiento de la meta, resumen de actividades y desarrollo de la obra; iii) planos récord de obra aprobados por la interventoría en medio impreso y magnético; iv) póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran aprobadas por la entidad ejecutora; v) registro fotográfico y audiovisual definitivo evidenciando la condición inicial y final del proyecto; vi) balance financiero del contrato específico con los soportes correspondientes de acuerdo a los lineamientos que se impartan por parte de ENTerritorio al departamento y vii) análisis de resultados del proyecto teniendo en cuenta los indicadores de la MGA.; y se cuente con las actas de terminación de los contratos derivados y los demás requisitos administrativos conducentes para el mismo. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2026 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

14. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA / GOBERNACION DE BOYACA

2.1 Realizar las gestiones presupuestales y contractuales de los recursos transferidos, conforme a los lineamientos jurídicos, técnicos, administrativos, presupuestales y operativos vigentes conforme a las condiciones previstas en el proyecto presentado y de manera especial en concordancia con los Manuales, que para tales efectos disponga **EL DEPARTAMENTO DE BOYACA** para este tipo de proyectos.

2.2 Ejecutar el objeto del Contrato Específico, conforme con las disposiciones establecidas en el presente contrato, bajo las especificaciones técnicas y financieras del proyecto las cuales deberán ser verificadas y acreditadas por la interventoría que se contrate para el efecto y el supervisor que se designe por parte de la entidad ejecutora.

2.3 **La Entidad Ejecutora** deberá realizar la apertura de una cuenta bancaria generadora de rendimientos financieros para el manejo exclusivo de los recursos que serán trasferidos por ENTerritorio S.A. dando cumplimiento al objeto del Contrato Específico. Dicha cuenta debe ser exenta de GMF, retenciones, comisiones, IVA y demás gastos y gravámenes e igualmente deberá ser marcada como inembargable. Una vez efectuada la apertura, se deberá informar a ENTerritorio S.A., allegando la respectiva certificación bancaria. De igual manera la entidad ejecutora velará porque la tasa de rentabilidad de dicha cuenta sea la mayor del mercado al momento de su apertura.

2.4 Presentar a ENTerritorio S.A. la lista de requisitos de inicio de los contratos derivados, que debe incluir lo siguiente:

- Copia de los contratos derivados perfeccionados que se celebren para la ejecución del proyecto.
- Copia de las pólizas de los contratos derivados, aprobadas por la entidad contratante, en las cuales se debe incluir al DNP y a ENTerritorio S.A. como beneficiarios.
- Copia de las actas de inicio de los contratos derivados.
- Plan de trabajo con programación ajustada a la ejecución de cada actividad del proyecto.

2.5 Recibir los recursos que serán transferidos por ENTerritorio S.A. y destinarlos exclusivamente a la ejecución del proyecto identificado en el objeto.

2.6 Para el manejo de los recursos la Entidad Ejecutora, deberá tener en cuenta el flujo de caja pactado en el contrato específico para cubrir las obligaciones financieras de los contratos derivados. En este sentido, deberá pactar en los contratos derivados (obra e interventoría), una forma de pago concordante con el flujo de recursos del Contrato Específico. En caso de pactarse anticipos en los contratos derivados, estos no podrán ser superiores a los porcentajes o valores transferidos por ENTerritorio S.A conforme a los hitos de ejecución pactados en el contrato específico. En caso de pactarse anticipo en el contrato de obra, la entidad ejecutora deberá dar alcance a lo señalado en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 y establecer en los prepliegos y pliegos la forma de manejo de dicho anticipo y su amortización, en todo caso, el costo de la fiducia no podrá ser asumido con el valor aprobado del proyecto los rendimientos generados deberán ser devueltos a la cuenta de manejo exclusivo del proyecto y posterior reintegro a la Dirección del Tesoro Nacional (DTN). De igual manera, de pactarse anticipo en el contrato de interventoría, el valor del anticipo deberá ser manejado en una cuenta independiente que en caso de generar rendimientos financieros estos deberán ser trasladados a la cuenta del manejo exclusivo del proyecto y posterior reintegro a la Dirección del Tesoro Nacional (DTN).

2.7 La Entidad Ejecutora se obliga a garantizar que la suscripción y ejecución de los contratos derivados del presente Contrato Específico no generará en ningún caso costos adicionales asociados a la administración, manejo o gestión financiera de los recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales (FRPT), más allá de aquellos expresamente reconocidos y aprobados dentro del presente instrumento contractual. En consecuencia, se prohíbe la creación o constitución de esquemas fiduciarios, fondos, convenios, contratos o cualquier otra figura administrativa o financiera que implique una doble administración de los recursos públicos asignados al proyecto, o que conlleve la disminución efectiva del monto destinado a la ejecución

del objeto contractual. El incumplimiento de esta obligación constituirá causal de incumplimiento contractual grave, habilitando a ENTerritorio S.A., en su calidad de mandatario del Departamento Nacional de Planeación (DNP), para adelantar las acciones administrativas, contractuales y legales a que haya lugar, con el fin de proteger los recursos públicos y garantizar su destinación específica conforme a la normatividad vigente.

2.8 Realizar el seguimiento, supervisión y control a la ejecución de los recursos que le sean transferidos en cumplimento del contrato especifico suscrito, conforme al artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y al parágrafo del artículo 2.2.13.1.1.5 del Decreto 740 de 2016 y demás normas aplicables.

2.9 Realizar la devolución mensual de los rendimientos financieros generados en la cuenta de manejo exclusivo del proyecto a la cuenta de la Dirección General de Crédito Público conforme lo establece el artículo 2.8.1.9.8. Rendimientos Financieros del Decreto No 1068 de 2015 y el Decreto 1853 de 2015 artículo 2.3.5.6 de acuerdo con la normatividad vigente. Para dar cumplimiento a esta obligación, la entidad ejecutora deberá validar los rendimientos financieros frente al extracto bancario del mes correspondiente y realizar el respectivo traslado. La Entidad deberá remitir a ENTerritorio S.A. el extracto bancario y soporte de traslado de los rendimientos financieros a la cuenta del Tesoro Nacional.

2.10 La Entidad Ejecutora, con ocasión de los recursos aportados por el Departamento Nacional de Planeación, administrados y trasladados por la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, y frente a un eventual incumplimiento de obligaciones contractuales respecto de la contratación derivada (Obra, Interventoría, Suministro, y/o los contratos celebrados para tal fin), deberá restituir los aportes que no hayan sido ejecutados a ENTerritorio S.A.. En el mismo sentido el Ejecutor, y frente al pago de indemnizaciones con ocasión de la ejecución de la contratación derivada, deberá reintegrar en favor de ENTerritorio S.A. los valores pagados al contratista, respecto de los cuales se predique el incumplimiento.

2.11 Mantener actualizada, organizada y en condiciones de disponibilidad, la información y documentación que se genere o administre con ocasión del cumplimiento de las obligaciones que se derivan del contrato específico.

2.12 Los remanentes de los recursos obtenidos de la ejecución del objeto contractual que resulten de la diferencia entre los recursos girados y los efectivamente ejecutados, que no se destinen para el pago de los bienes y servicios contratados serán devueltos a la cuenta bancaria que indique ENTerritorio S.A..

2.13 La Entidad Ejecutora, deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto Tributario Territorial, Nacional, y demás normatividad relacionada con el tratamiento tributario aplicables en la ejecución del proyecto. Si dicha entidad no hubiera presupuestado todos los conceptos de impuestos, tasas, estampillas y el gravamen a los movimientos financieros aplicables para la ejecución del proyecto, deberá asumir el valor correspondiente, sin afectar el valor de las actividades del proyecto.

2.14 Presentar un informe mensual dentro de los **quince (15) días siguientes al vencimiento del mes respectivo**, suscrito por el supervisor del contrato específico, en donde informe el avance físico y financiero del proyecto a partir del inicio del contrato específico hasta su finalización en medio magnético y físico, que contenga como mínimo:

COMPONENTE TÉCNICO:

- Avance de la meta establecida en el contrato específico.
- Actividades desarrolladas en el periodo del informe: identificar las actividades que tuvieron ejecución durante el periodo reportado, resumiendo para cada una, las gestiones realizadas, con la indicación de los documentos, archivos y/o gestión resultada de las actividades desarrolladas.
- Relación de las cantidades correspondientes a las actividades ejecutadas.
- Registros fotográficos en medio físico y magnético.
- Actualización del programa de ejecución del proyecto (si aplica)
- Copia de las actas parciales de los contratos derivados con sus anexos.
- Enunciar las conclusiones, recomendaciones y observaciones presentadas a partir de la revisión hecha por parte de los supervisores.
- Informe mensual de interventoría con sus anexos.

COMPONENTE FINANCIERO:

- Informe de avance de ejecución financiera en donde se establezcan las actividades desarrolladas (obra e interventoría), acorde a lo definido en el cronograma del proyecto. Dicho avance deberá ir acompañado de los soportes.
- Extracto Bancario de la cuenta donde se manejan los recursos del contrato especifico.
- Comprobantes de pago de los giros realizados a través de la cuenta bancaria en la que se manejan los recursos del contrato especifico, correspondiente al desembolso de los recursos de los contratos celebrados por la entidad para dar cumplimiento al objeto del contrato especifico con sus soportes (acta parcial, copia de la factura, comprobante de egreso) y el reporte de los rendimientos financieros generados en la cuenta durante el periodo reportado (extracto bancario y soporte de traslado a la cuenta del tesoro nacional) y los demás documentos que sean solicitados como soportes.
- Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias para cada uno de los pagos realizados en virtud de los contratos derivados celebrados por la Entidad territorial, en cumplimiento del objeto del contrato específico. Para tal efecto, el ejecutor deberá revisar y certificar las deducciones de los impuestos y/o tasas conforme la normatividad que le resulte aplicable en esta materia.

COMPONENTE JURÍDICO:

- Informe de los contratos derivados, indicando su objeto, valor, plazo de ejecución, fechas de legalización, inicio, así como las novedades contractuales que se suscriban en desarrollo de su ejecución, aportando el documento que así lo acredite. Igualmente, deberá indicarse el enlace para consulta de los procesos de contratación en el Sistema Electrónico de Contratación pública SECOP, o la plataforma electrónica que sea aplicable, bajo sus procesos de contratación.
- Informe de las pólizas de los contratos derivados, junto con la aprobación correspondiente de la Entidad Territorial. Esta información deberá actualizarse, de acuerdo con las novedades que se suscriban en la contratación derivada.

2.15 Entregar a ENTerritorio S.A. la información que requiera para el seguimiento del avance de la ejecución de los recursos, proveer los medios necesarios para posibilitarlo, así como concertar y tener disponibilidad para atender las reuniones que se consideren pertinentes y las visitas de campo aleatorias que se realicen para verificar el avance del proyecto reportado por la entidad ejecutora y demás actividades que ENTerritorio S.A. considere pertinente realizar con ocasión de los mecanismos de control que disponga para hacer seguimiento a las transferencias.

2.16 Presentar a ENTerritorio S.A. informe final de ejecución suscrito por el supervisor designado por el ejecutor, por parte del municipio y de la gobernación, el cual contendrá como mínimo: i) las actas de terminación de los contratos derivados que se celebren para el cumplimiento del objeto contractual; ii) estado del cumplimiento de la meta, resumen de actividades y desarrollo del proyecto; iii) planos récord de obra aprobados por la interventoría en medio impreso y magnético; iv) pólizas de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran aprobadas por la entidad ejecutora; v) registro fotográfico y audiovisual definitivo evidenciado la condición inicial y final del proyecto; vi) balance financiero del contrato específico con los soportes correspondientes de acuerdo a los lineamientos que se impartan por parte de ENTerritorio S.A. a las Entidades Ejecutoras y vii) análisis de resultados del proyecto teniendo en cuenta los indicadores de la MGA;

2.17 Con posterioridad a la última transferencia de recursos del Contrato Específico, la entidad ejecutora deberá remitir dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes, los documentos que se requieran para realizar la liquidación del contrato.

2.18 Diligenciar los formatos y aportar los documentos que sean requeridos por ENTerritorio S.A., para la transferencia de los recursos y demás trámites administrativos necesarios durante el desarrollo del proyecto.

2.19 Mantener actualizado el formato de vinculación de clientes.

2.20 En el evento en que durante la ejecución del contrato surjan circunstancias que impliquen el reconocimiento y/o pago de sumas de dinero superiores a las entregadas al ejecutor derivadas de omisiones o situaciones que alteren el cronograma de ejecución, imputables a la Entidad Ejecutora y/o al contratista e interventor, **EL DEPARTAMENTO DE BOYACA** cumplimiento de las metas programadas del proyecto.

2.21 Garantizar, en cualquier caso y si fuese necesario, la obtención y aporte de recursos locales y/o regionales y/o nacionales para asegurar la terminación del objeto del presente contrato específico.

2.22 Aportar los recursos faltantes, para el cumplimiento de las metas programadas del proyecto, en el evento en que durante la ejecución del contrato surjan circunstancias que impliquen el reconocimiento y/o pago de sumas de dinero superiores a las entregadas al ejecutor derivadas de omisiones o situaciones que alteren el cronograma de ejecución, imputables a la entidad ejecutora y/o al contratista e interventor.

2.23 Designar un supervisor para el contrato específico y aportar el documento o acto administrativo donde se realiza esta designación.

2.24 Las demás que sean requeridas para dar cumplimiento al adecuado desarrollo del presente Contrato Específico.

OBLIGACIONES POR PARTE DE ENTerritorio S.A.

1.1 Transferir en favor de la Entidad Ejecutora recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales hasta la suma de **SETENTA MIL TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($70.031.648.339,00),** de acuerdo con la forma de desembolso que se pacte en este contrato, siempre que se hayan desembolsado los recursos para dar cumplimiento a lo pactado en el presente contrato por parte del DNP, y se encuentren disponibles en el Fondo Regional para los Pactos Territoriales.

1.1 Hacer seguimiento administrativo y financiero a la transferencia de los recursos realizada a la Entidad Ejecutora y efectuar la supervisión tal y como se señala en las Cláusulas respectivas del Contrato Específico y el Reglamento Operativo del Contrato Interadministrativo de Mandato.

15. SUPERVISIÓN

La supervisión administrativa del Contrato Específico estará a cargo del Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, quien contará con el equipo de profesionales que sean designados para apoyar la supervisión del contrato. En tanto el Contrato Específico es un contrato de financiación y de transferencia de recursos, la supervisión administrativa del mismo se circunscribe a recibir y autorizar las solicitudes de transferencias de la **ENTIDAD EJECUTORA**, con base en los informes presentados por el supervisor del Contrato Específico designado por la **ENTIDAD EJECUTORA** y los demás mecanismos de seguimiento que se establezcan en el contrato a celebrarse.

Así mismo, a través del Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, sus coordinadores y su equipo de trabajo se implementarán los mecanismos que permitan realizar seguimiento administrativo y financiero a las transferencias, los cuales están dispuestos en el Reglamento Operativo del Contrato Interadministrativo de Mandato **DNP 877-2021 ENTerritorio 221009**, los cuales son: i) Reuniones de seguimiento; ii) Comités Operativos y de Seguimiento; iii) Verificación del cumplimiento de requisitos definidos en el contrato para desembolso de los recursos; iv) Requerimientos por incumplimiento de compromisos; v) Visitas realizadas por los profesionales técnicos del Fondo; vi) Informes mensuales de seguimiento entregados por la supervisión de la **ENTIDAD EJECUTORA**. En todo caso se precisa que la supervisión, interventoría, la vigilancia y el control de la ejecución contractual de los recursos transferidos, en particular con relación a aquellos contratos que se suscriban para el cumplimiento de las metas de este Contrato Específico, serán responsabilidad de la **ENTIDAD EJECUTORA**, de conformidad con el inciso final del parágrafo del artículo 2.2.13.1.1.5 y el inciso final del artículo 2.2.13.1.1.6 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 740 de 2016.

Para tal efecto, se adjuntan los documentos que a continuación se relacionan:

1. Formato de solicitud de contratación de Convenios o Contratos Interadministrativos Derivados.
2. CDP (Físico y ERP).
3. Copia legible del documento de nombramiento del Representante Legal de la Entidad.
4. Copia del acta de posesión del Representante legal de la Entidad.
5. Documento que permita verificar las facultades del Representante Legal de la Entidad.
6. Copia de la cédula de ciudadanía del Representante legal de la Entidad.
7. Registro Único Tributario actualizado (RUT) de la Entidad.
8. Certificación de pago de obligaciones con los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales de la Entidad (para Contratos Interadministrativos).
9. F-RI-01 Solicitud de vinculación. (Documento en original, actualizado, firmado y validado por el responsable del Grupo solicitante con los numerales 12 y 13.).
10. Consulta de listas vinculantes (Documento actualizado del representante legal y de la Entidad).
11. Anexos Técnicos (Cuando aplique).

Atentamente,

JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA
Gerente de Unidad Grupo de Proyectos Especiales

WILLIAM ARMANDO MONROY TINJACA
Contratista - Gestor Contrato
Interadministrativo de Mandato n.° 221009

OSCAR JAVIER PEREZ RUIZ
Subgerente de Desarrollo de Proyectos

Elaboró: Mario Paternina Castillo – Profesional Jurídico – Contratista – Fondo Regional para los Pactos Territoriales ***MP***

Revisó: Marcela Ramirez – Contratista -Coordinadora Jurídica FRPT MRA.
Nhur Pertuz – Contratis- Coordinadora Financiera FRPT
Juan Manuel Medina Herrera – Grupo Desarrollo de Proyectos Especiales
Oliver Ñustes Cabezas - Profesional Técnico - Sugerencia de Desarrollo de Proyectos
Talent And Consulting Group S A.S- Profesional Jurídica Sugerencia de Desarrollo de Proyectos

ENTERRITORIO S.A. Y EL DEPARTAMENTO DEL BOYACÁ, ACUERDAN SUSCRIBIR UN CONTRATO ESPECÍFICO, DERIVADO DEL PACTO TERRITORIAL BOYACÁ, QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON EL FIN DE DESTINAR RECURSOS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES Y LOS DEMÁS QUE SE REQUIERAN PARA LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON -TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", EL CUAL SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2025 DEL PACTO TERRITORIAL BOYACÁ.

1. GARANTÍAS

Teniendo en cuenta la normativa con la cual se rige ENTerritorio S.A. y los riesgos identificados en el Estudio de Riesgos, el requerimiento de garantías es el siguiente:

1.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Teniendo en cuenta la tipología y naturaleza del contrato, el objeto, el alcance, el valor del contrato, las actividades a realizar, y las garantías a requerir se encuentra que los riesgos de perfeccionamiento del contrato son mínimos, y por tanto no se requiere garantía de seriedad de la oferta.

1.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

La Entidad Ejecutora deberá constituir a favor de ENTerritorio S.A. en calidad de asegurado y beneficiario, en los términos establecidos en la normatividad vigente, una garantía que podrá consistir en una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, correspondiente a la póliza de cumplimiento ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN o garantía bancaria expedida por un banco local que incluya los siguientes amparos:

La garantía deberá cubrir, como mínimo, los riesgos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales, y su valor no podrá superar en ningún caso el valor de la cláusula penal pecuniaria que se pacte en el presente contrato, y la cual debe incluir los siguientes amparos:

AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA	RESPONSABLE
Cumplimiento	20% del total de los recursos aportados desde ENTerritorio S.A..	Vigente por el plazo de ejecución del contrato y ocho (8) meses más.	Entidad Ejecutora

Nota 1: En esta garantía deberá figurar como beneficiario el DNP.

Nota 2: En caso de que la garantía sea una póliza de seguro, el contratista deberá anexar el respectivo recibo de pago de prima. Así mismo la póliza deberá presentar el siguiente texto de modificación de las condiciones generales de la misma:

"Queda convenido, acordado y entendido que, para efectos de la acreditación de la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la reclamación, Enterritorio S.A. dará aplicación a lo normado en el artículo 1077 del Código de Comercio, sin aplicar procedimiento alguno que pueda encontrarse estipulado en las condiciones generales de la póliza."

El anterior texto debe estar incluido EXPRESAMENTE en la carátula de la póliza.

Nota 3: Para la constitución de la Garantía de Cumplimiento - Póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, correspondiente a la póliza de cumplimiento **ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN** o Garantía Bancaria expedida por un banco local - la misma deberá entregarse a ENTerritorio, para su aprobación, a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a la suscripción del presente Contrato Específico.

Así mismo, la entidad ejecutora del proyecto al momento de celebrar los contratos derivados **debe incorporar como obligación del contratista la constitución de garantías en donde se incluya como beneficiarios al DNP y a ENTerritorio S.A**.

A su vez, La Entidad Ejecutora, con ocasión de los recursos aportados por el Departamento Nacional de Planeación, administrados y trasladados por la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A., y frente a un eventual incumplimiento de obligaciones contractuales respecto de la contratación derivada (Obra, Interventoría, Suministro, y/o los contratos celebrados para tal fin), deberá restituir los aportes que no hayan sido ejecutados a ENTerritorio. En el mismo sentido el Ejecutor, y frente al pago de indemnizaciones con ocasión de la ejecución de la contratación derivada, deberá reintegrar en favor de ENTerritorio los valores pagados al contratista, respecto de los cuales se predique el incumplimiento.

1.3 CLÁUSULA PENAL DE APREMIO Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA

De acuerdo con la estimación de los posibles perjuicios que pueda causar el contratista en caso de un posible incumplimiento se recomienda establecer en la cláusula penal de apremio y cláusula penal pecuniaria del contrato los siguientes valores:

- Cláusula penal de apremio: 1% del valor total de los recursos aportados desde ENTerritorio S.A.. por cada semana de atraso, sin exceder el 10% del valor total de los recursos aportados desde ENTerritorio S.A.

- Cláusula penal pecuniaria: 20% del valor total de los recursos aportados desde ENTerritorio S.A.

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisado y aprobado por	Fernando Ulloa Tachack	Profesional de Riesgos Grupo de Planeación Contractual		07/11/2025
Elaborado por	Marcela Ramirez Arias	Coordinadora Jurídica FRPT		07/11/2025

ENTERRITORIO S.A. Y EL DEPARTAMENTO DEL BOYACÁ, ACUERDAN SUSCRIBIR UN CONTRATO ESPECÍFICO, DERIVADO DEL PACTO TERRITORIAL BOYACÁ, QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON EL FIN DE DESTINAR RECURSOS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES Y LOS DEMÁS QUE SE REQUIERAN PARA LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON -TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", EL CUAL SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2025 DEL PACTO TERRITORIAL BOYACÁ.

De conformidad con lo establecido en el numeral 23.8. Análisis de Riesgos y Matriz de Riesgos del Manual de Contratación **M-PR-01 V02** de ENTerritorio S.A. a continuación se presenta el respectivo análisis y matriz de riesgos con base en lo contenido en el documento de planeación del cual el presente documento es anexo, con el siguiente contenido:

1. Marco de referencia con el que se realiza el análisis de riegos.
2. Descripción del contexto en el que se ejecutará el contrato.
3. Parámetros de valoración de probabilidades y consecuencias.
4. Análisis por Factor de Riesgo y matrices de Riesgo.

1. MARCO DE REFERENCIA CON EL QUE SE REALIZA EL ANÁLISIS DE RIEGOS.

El marco de referencia para la tipificación, estimación y valoración de riesgos se construye bajo el método semicuantitativo, según las directrices contenidas en la norma NTC ISO 31000 2018, así mismo se tienen en cuenta los conceptos y elementos de la G*uía para la elaboración de análisis de riesgos para la contratación derivada y de funcionamiento G-PR-04* en su versión vigente aplicables al presente análisis, como se presenta a continuación.

1.1 Contexto.

El análisis del contexto se enfoca a la descriptiva general del contexto natural, demográfico y social, macroeconómico que se tiene en cuenta para la identificación y valoración de riesgos y que por su parte debe ser tenido en cuenta por los interesados para la preparación de sus ofertas y por el contratista para la ejecución del contrato.

1.2 Escalas de Probabilidad y Consecuencia

Las siguientes son las escalas de probabilidad y consecuencia que se utilizarán para efectos del presente análisis:

Escala de Probabilidades		Escala de Consecuencias	
Nivel	**Descriptor**	**Nivel**	**Descriptor**
1	Raro	1	Mínimo
2	Poco Probable	2	Menor
3	Posible	3	Moderado
4	Probable	4	Mayor
5	Casi cierta	5	Catastrófico

Se enfatiza que la valoración de riesgos no es una ciencia exacta, sino probabilística, y que cada interesado en participar en el proceso debe hacer una verificación de sus propios niveles de tolerancia y apetito de riesgos para hacer su propia valoración, la cual puede no corresponder en un todo con la que se plantea aquí. En todo caso esta propuesta de distribución y valoración de riesgos queda sujeta a las discusiones que se surtirán en el desarrollo del proceso de selección, de acuerdo con el espacio que el cronograma del proceso señale para este propósito.

1.3 Nivel de Riesgo

Con base en la calificación asignada a la probabilidad de ocurrencia y al impacto, se determina el nivel de riesgo para cada uno de los riesgos identificados con base en la siguiente matriz de calor:

Probabilidad de Ocurrencia	Mínimo	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Casi Cierta	Considerable	Considerable	Considerable	Considerable	Significativo
Probable	Moderado	Moderado	Considerable	Considerable	Significativo
Posible	Moderado	Moderado	Moderado	Considerable	Significativo
Poco Probable	Bajo	Moderado	Moderado	Considerable	Significativo
Raro	Bajo	Bajo	Moderado	Considerable	Significativo

Impacto

Para los riesgos de niveles considerable y significativo los tratamientos de riesgo que se determinen deberán modificar la condición de probabilidad o consecuencia o ambas condiciones de acuerdo con la naturaleza del riesgo, en tal medida que el nivel de riesgo luego de aplicado el tratamiento tenga un nivel de riesgo moderado o menor. Es responsabilidad de la parte a la que se asigna el riesgo validar los controles que debe establecer, la frecuencia con que debe monitorear el riesgo y la efectividad del tratamiento de riesgo adoptado.

1.4 Tipificación de Riesgos

Los riesgos para analizar pueden generar cambios en los presupuestos y modelos que permiten estimar el posible valor del contrato y el precio con el cual se suscriba el mismo. En especial se tienen en cuenta los eventos que pueden dar lugar a variaciones en la ecuación económica, sin que tales variaciones lleguen a afectar de manera grave las condiciones de ejecución del contrato. Así mismo se tienen en cuenta los riesgos derivados de la operación y ejecución de las tareas propias del objeto contractual, los cuales permiten contar con una guía de la azarosidad del proyecto y que tales riesgos sean contemplados en el desarrollo del futuro contrato. Si durante la ejecución del contrato se produjeran cambios en la normatividad vigente relacionada con los trabajos derivados del objeto contractual, sin que su efecto llegase a afectar de manera grave las condiciones de ejecución del contrato, se deberán adaptar y ajustar los protocolos de las actividades relacionadas con el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Con el fin de facilitar la identificación de los riesgos se tendrán en cuenta los factores de riesgos que se describen a continuación. Estos factores describen distintas situaciones que pueden dar origen a cambios en los ingresos, variación de los gastos, costos e inversiones, necesarias para la ejecución del contrato o sobrevinientes en desarrollo del mismo, teniendo la potencialidad, algunos de ellos, de llevar a cambios en la ecuación contractual. Unos con cargo a la Entidad y otros con cargo al Contratista de acuerdo con la asignación propuesta y aceptada en el desarrollo del proceso de selección.

1.4.1 Factor de Riesgos Acciones Legales

En este factor se tienen en cuenta los efectos sobre costos del presupuesto derivados de impuestos, cargas parafiscales, y todo tipo de tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo que pueden ser considerados en virtud de la normatividad vigente o en desarrollo, al momento de presentar la oferta. Igualmente, actos de autoridad, comiso, embargo, demandas que afecten a las partes involucradas en el proyecto. También se incluyen todas las licencias y permisos, derechos de autor y de propiedad intelectual, materiales, equipos y técnicas que se deban emplear en la ejecución del contrato. Así mismo las normas vigentes que hoy son conocidas o que entrarán en vigencia durante el plazo de ejecución, incluidas las disposiciones legales y normas relacionadas con el estado de excepción y la emergencia sanitaria por el COVID-19. Todos estos eventos en el marco de su previsibilidad determinados en el desarrollo del presente análisis. Aquellos eventos que excedan dicho marco de previsibilidad estarán sujetos a las revisiones de las condiciones contractuales a las que haya lugar.

1.4.2 Factor de Riesgos Tecnológicos y de Infraestructura Pública

En este factor se contemplan las afectaciones por fallas en telecomunicaciones o disponibilidad de cobertura limitada o no disponibilidad de servicios de telecomunicaciones. Disponibilidad limitada o no disponibilidad de servicios públicos. Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos que contribuyan o afecten el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Operación y manejo de equipos y herramientas. Operatividad y estado de las vías de acceso y disponibilidad limitada o no disponibilidad de medios de transporte adecuados para transitar y acceder a los sitios indicados para ejecutar las actividades propias del proyecto. En particular se deben anticipar los equipos y medios necesarios para el desarrollo cabal de las actividades requeridas en el marco del contrato. Todos estos eventos en el marco de su previsibilidad determinados en el desarrollo del presente análisis. Aquellos eventos que excedan dicho

marco de previsibilidad estarán sujetos a las revisiones de las condiciones contractuales a las que haya lugar.

1.4.3 Factor de Riesgo Actos de Terceros Relacionados y Subcontratos

En este factor se tienen en cuenta las afectaciones por errores, insuficiencia o eventos con origen en, o derivados de subcontratos adelantados por el contratista; alteración de planos o estudios ejecutados o revisados por el contratista o por su cuenta. Falla humana de otra persona que actúe por cuenta, contratada o a cargo del contratista, Actos o eventos en proveedores, filiales, subordinadas, y otros contratistas o subcontratistas relacionados o vinculados con el oferente seleccionado.

1.4.4 Factor de Riesgos Socio-Políticos

Actos de terrorismo, actos de Delincuencia común, Actividad proselitista o huelgas, protestas y acciones frente a las cuales se debe mantener una actitud de diligencia y cuidado adecuados, se consideran también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que se afectan, benefician, o influyen en la operación del proyecto. Todos estos eventos en el marco de su previsibilidad determinados en el desarrollo del presente análisis. Aquellos eventos que excedan dicho marco de previsibilidad estarán sujetos a las revisiones de las condiciones contractuales a las que haya lugar.

1.4.5 Factor de Riesgos Macroeconómicos

Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de Inflación, variaciones en el comercio, medidas y trámites de Importaciones y exportaciones, Oferta o demanda de materias o servicios necesarios para el proyecto o requeridos para la ejecución del contrato, disponibilidad y costo de mano de obra, Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, Escasez de mano de obra. Será responsabilidad de cada una de las partes, hacer sus estimaciones y elaborar sus modelos de predicción. Todos estos eventos en el marco de su previsibilidad determinados en el desarrollo del presente análisis. Aquellos eventos que excedan dicho marco de previsibilidad estarán sujetos a las revisiones de las condiciones contractuales a las que haya lugar.

1.4.6 Factor de Riesgos Actos de la Naturaleza

En esta categoría se consideran fenómenos Geológicos, freáticos, Hidrológicos, Climáticos, incendios forestales, Biológicos / patológicos, acción de roedores, insectos y demás animales, todos los anteriores dentro de los parámetros previsibles que determinen su acontecer con base en las condiciones que se dan en la zona identificada en el contexto del presente análisis, que afecte o tenga influencia en este proyecto. Todos estos eventos en el marco de su previsibilidad determinados en el desarrollo del presente análisis. Aquellos eventos que excedan dicho marco de previsibilidad estarán sujetos a las revisiones de las condiciones contractuales a las que haya lugar.

1.4.7 Factor de Riesgos Relaciones Laborales

Todos los eventos y consecuencias derivados de los accidentes laborales, enfermedad profesional, muerte, ausentismos, del personal requerido en el contrato o que sea vinculado a él, así como la falta de personas clave, actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimiento.

1.4.8 Factores Riesgos Hechos de las Cosas

Incendios, roturas, filtraciones, derrames, explosiones, falla mecánica, todos de carácter súbito y accidental, pero cuyo desarrollo debe ser considerado en ejecución de este proyecto, en la medida que afecten sus bienes e intereses relacionados directamente con el proyecto. Las que se presenten por falta de diligencia y extremo cuidado, fallas de los sistemas de vigilancia y control que se deban implementar y mantener adecuadamente.

1.4.9 Factor de Riesgos Vicios

Cambios en los costos, inversiones y gastos derivados de vicio propio, vicios ocultos o vicios redhibitorios presentes en desarrollo del contrato o los trabajos necesarios para su ejecutoria.

1.4.10 Factor de Riesgos Actos Culposos o Dolosos de Terceros

Las pérdidas materiales en los bienes utilizados en la ejecución del contrato que sean ocasionadas por actuaciones u omisiones que cometan terceros ajenos al contrato sean de carácter culposo o doloso.

1.4.11 Otros Factores de Riesgos

En este grupo se tienen en cuenta todos aquellos eventos que se puedan identificar y que no encuadren en los 10 factores de riesgos anteriormente descritos.

Teniendo en cuenta el anterior marco de referencia, a continuación, se presenta el análisis y las matrices de riesgos:

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO EN EL QUE SE EJECUTARÁ EL CONTRATO.

2.1 OBJETO

ENTERRITORIO S.A. Y EL DEPARTAMENTO DEL BOYACÁ, ACUERDAN SUSCRIBIR UN CONTRATO ESPECÍFICO, DERIVADO DEL PACTO TERRITORIAL BOYACÁ, QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON EL FIN DE DESTINAR RECURSOS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES Y LOS DEMÁS QUE SE REQUIERAN PARA LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON -TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", EL CUAL SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2025 DEL PACTO TERRITORIAL BOYACÁ.

.

2.2 PLAZO DE EJECUCIÓN

Se fija como plazo para la ejecución del proyecto **NUEVE (9) MESES** contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato Específico.

2.3 CONTEXTO NATURAL

Contexto natural:

El Departamento de Boyacá se encuentra en el centro-oriente de Colombia, atravesado por la Cordillera Oriental de los Andes. Su superficie es de aproximadamente 23.189 km². El relieve es muy variado: incluye montañas, sierras, páramos — Boyacá cuenta con más de 300 000 ha de páramos, cerca del 20 % del total nacional. Los pisos altitudinales van desde zonas bajas templadas cálidas hasta zonas de alta montaña con clima frío.

Los ecosistemas incluyen bosques andinos, páramos y recursos hídricos importantes, lo que lo convierte en una región estratégica para la captación y regulación de agua.

Riesgos naturales vinculados al territorio: por el relieve montañoso se presentan riesgos de deslizamientos, erosión y saturación del suelo ante lluvias intensas. En zonas bajas o de valle, pueden presentarse inundaciones o impactos por cambios en los patrones de precipitación.

Oportunidades naturales: paisajes de montaña y páramo que ofrecen potencial para el ecoturismo, conservación de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Terrenos aptos para agricultura variada gracias a pisos térmicos múltiples y recursos hídricos sólidos que pueden sostener infraestructura de abastecimiento y riego.

Contexto socio-político / de orden público:

Boyacá tiene una fuerte identidad cultural ligada al proceso de independencia de Colombia (Batalla del Puente de Boyacá) y a su papel en la región andina. En términos de gobernabilidad, el departamento dispone de instituciones sólidas y niveles relativamente altos de educación y participación ciudadana.

En cuanto al orden público, no es considerado foco de conflicto armado activo; sin embargo, enfrenta desafíos de gobernabilidad en áreas rurales dispersas y en la prestación de servicios.

Riesgos: debilidad institucional en zonas rurales remotas, economías informales y limitada presencia estatal en áreas de difícil acceso.

Oportunidades: buena base institucional para implementar proyectos de desarrollo, identidad cultural fuerte que fortalece la cohesión social y el turismo patrimonial.

Contexto demográfico:

Boyacá cuenta con una población estimada de 1.300.000 habitantes, de los cuales cerca del 52 % vive en cabeceras municipales y el resto en zonas rurales. La dispersión poblacional y la migración de jóvenes hacia centros urbanos son desafíos importantes, especialmente en la retención de fuerza laboral rural.
Riesgos: dispersión que encarece la prestación de servicios, envejecimiento rural y migración de jóvenes.
Oportunidades: potencial de desarrollo de proyectos rurales de empleo, emprendimiento y fortalecimiento comunitario.

Contexto económico:

La economía de Boyacá se basa en la agricultura (papa, cebolla, maíz, trigo, cebada), la minería (esmeraldas, carbón, materiales de construcción) y el turismo (Villa de Leyva, termales, patrimonio histórico).

También existen actividades industriales en alimentos, cerámica y textiles, aunque con niveles de competitividad moderados.

Riesgos económicos: dependencia de sectores primarios, fluctuaciones del mercado agrícola y mineral, infraestructura limitada.

Oportunidades económicas: diversificación agroindustrial, turismo sostenible, explotación responsable de recursos mineros y ubicación estratégica cercana a Bogotá.

Principales riesgos y oportunidades:

Riesgos: difícil acceso a zonas rurales, vulnerabilidad ante deslizamientos e inundaciones, brechas urbano-rurales y dependencia de sectores primarios.
Oportunidades: proyectos rurales sostenibles que integren agricultura, ecoturismo y conservación; desarrollo de cadenas productivas con valor agregado; fortalecimiento de la conectividad e infraestructura; consolidación de una marca territorial basada en su cultura y biodiversidad.

3. PARÁMETROS DE VALORACIÓN DE PROBABILIDADES Y CONSECUENCIAS

El precio del contrato y utilidad para el CONTRATISTA que resulte adjudicado en el presente proceso se concreta en sus propios cálculos y estimaciones, y en la dimensión que él haga del alcance de su oferta, especialmente lo relacionado a la aplicación de los recursos humanos, técnicos y económicos para optimizar y ofrecer un precio por sus servicios y productos a entregar.

Tales estimaciones y cálculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fenómenos, actividades y buenas prácticas, que sus conocimientos sobre la actividad y su estado actual indiquen que,

en forma responsable y cuidadosa, deben ser observados. Estas pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aquí estudiados, dado que al hacer sus ofrecimientos el contratista puede exacerbar, aumentar o disminuir las estimaciones de riesgo. De esta forma, queda claro que los valores que se registran en las reglas de participación y los riesgos señalados no constituyen una garantía que esté extendiendo la entidad contratante, para el cálculo de los ingresos y utilidad esperada del futuro contratista.

Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, en cuanto a las cargas de este contrato tendrán un tratamiento de conformidad a las estipulaciones de las normas civiles y comerciales que rigen la materia.

Parámetros de Valoración para la Escala de Probabilidad

Nivel	Descriptor	Descripción
1	Raro	Puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales durante la ejecución del contrato.
2	Poco Probable	Es difícil que ocurra durante la ejecución del contrato.
3	Posible	Podría ocurrir en algún momento durante la ejecución del contrato.
4	Probable	Probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias durante la ejecución del contrato.
5	Casi cierta	Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias durante la ejecución del contrato.

Parámetros de Valoración Escala de Consecuencias

CONSECUENCIA			
Nivel	Descriptor	Desde >	Hasta <=
1	Mínimo	$ -	$ 204.173.901,86
2	Menor	$ 204.173.901,86	$ 1.429.217.313,04
3	Moderado	$ 1.429.217.313,04	$ 10.004.521.191,29
4	Mayor	$ 10.004.521.191,29	$ 70.031.648.339,00
5	Catastrófico	$ 70.031.648.339,00	

Las variaciones que se derivan de los riesgos analizados afectan los componentes del presupuesto en distinta magnitud, por tanto, para efectos del presente análisis se tomarán como referencia los siguientes ítems del presupuesto.

Se precisa que los rangos desde y hasta de la escala de consecuencias determinan la cuantía hasta la cual se asigna el riesgo y que en caso de materializarse alguno de los riesgos asignados y de producirse

una consecuencia superior a la indicada en las tablas que se muestran en el numeral 4 del presente documento, habrá lugar a aplicar lo previsto en las normas civiles y comerciales que rigen el contrato en materia de imprevisión.

ÍTEMS DEL PRESUPUESTO
Cambio en Costos de Contratación Derivada

4. ANÁLISIS POR FACTOR DE RIESGO

4.1 Factor de Riesgo Acciones Legales

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Actos de autoridad, comiso, embargo, demandas. Reflejándose en: Efectos en costos del Recurso Humano.

Items de Presupuesto	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación
Cambio en Costos de Contratación Derivada	Poco Probable	Menor	Moderado	Entidad Territorial

Tratamiento Sugerido:

La Entidad Territorial deberá: Monitorear estado de acciones legales, contemplar en rubro de contingencias posibles costos de asesoría legal y defensa. Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

4.2 Factor de Riesgos Tecnológicos y de Infraestructura Pública

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Operatividad y estado de las vías de acceso y disponibilidad limitada o no disponibilidad de medios de transporte adecuados para transitar y acceder a los sitios indicados para ejecutar las actividades propias del proyecto. Reflejándose en: Efectos en costos de Materiales e Insumos

Items de Presupuesto	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación
Cambio en Costos de Contratación Derivada	Poco Probable	Menor	Moderado	Entidad Territorial

Tratamiento Sugerido:

La Entidad Territorial deberá: Verificar tiempos de recorridos, establecer rutas alternas, contemplar holguras en el cronograma para las actividades de la ruta crítica. Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

4.3 Factor de Riesgo Actos de Terceros Relacionados y Subcontratos

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Proveedores. Reflejándose en: Efectos en costos por la complejidad de Direccionamiento y Gestión.

Items de Presupuesto	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación
Cambio en Costos de Contratación Derivada	Poco Probable	Menor	Moderado	Entidad Territorial

Tratamiento Sugerido:

La Entidad Territorial deberá: Establecer términos y condiciones de idoneidad de proveedores. Establecer acuerdos de precios y cantidades de suministro. Establecer clausulas penales y requerir garantías a proveedores. Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

4.4 Factor de Riesgos Socio-Políticos

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Protestas. Reflejándose en: Efectos en costos por el Contexto Sociopolítico.

Items de Presupuesto	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación
Cambio en Costos de Contratación Derivada	Posible	Menor	Moderado	Entidad Territorial

Tratamiento Sugerido:

La Entidad Territorial deberá: Establecer los monitoreos necesarios de las condiciones de orden público presentes en la zona, programar holguras para las actividades de campo requeridas en el contrato, solicitar el acompañamiento de la fuerza pública en los casos que resulte necesario. Establecer los monitoreos necesarios de las condiciones de orden público presentes en la zona, programar holguras para las actividades de campo requeridas en el contrato, solicitar el acompañamiento de la fuerza pública en los casos que resulte necesario.

4.5 Factor de Riesgos Macroeconómicos

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: oferta o demanda de bienes y servicios. Reflejándose en: Efectos en costos por el Contexto Macroeconómico

Items de Presupuesto	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación

Cambio en Costos de Contratación Derivada	Posible	Menor	Moderado	Entidad Territorial

Tratamiento Sugerido:

La Entidad Territorial deberá: Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva. Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

4.6 Factor de Riesgos Actos de la Naturaleza

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Fenómenos Climáticos. Reflejándose en: Efectos en costos de Servicios Conexos.

Items de Presupuesto	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación
Cambio en Costos de Contratación Derivada	Poco Probable	Menor	Moderado	Entidad Territorial

Tratamiento Sugerido:

La Entidad Territorial deberá: Incluir en el plan de trabajo como ítem crítico de control el seguimiento del estado de las condiciones climáticas. Verificar actividades de la ruta crítica con mayor exposición, incrementar holguras en las de mayor incidencia. Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

4.7 Factor de Riesgos Relaciones Laborales

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Accidentes laborales. Reflejándose en: Efectos en costos por la complejidad de Direccionamiento y Gestión.

Items de Presupuesto	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación
Cambio en Costos de Contratación Derivada	Posible	Menor	Moderado	Entidad Territorial

Tratamiento Sugerido:

La Entidad Territorial deberá: Establecer plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Validar afiliaciones al SGSS. Contar con póliza de responsabilidad civil extracontractual con amparo patronal. Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

4.8 Factor de Riesgos Hechos de las Cosas

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Roturas. Reflejándose en: Efectos en costos de Servicios Conexos.

Items de Presupuesto	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación
Cambio en Costos de Contratación Derivada	Poco Probable	Menor	Moderado	Entidad Territorial

Tratamiento Sugerido:

La Entidad Territorial deberá: Establecer planes de mantenimiento y regímenes de operación de conformidad con lo establecido en los manuales de operación del fabricante. Contratar póliza TRDM. Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

4.9 Factor de Riesgos Vicios

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Vicios ocultos. Reflejándose en: Efectos en Costos por Complejidad de la actividad.

Items de Presupuesto	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación
Cambio en Costos de Contratación Derivada	Posible	Menor	Moderado	Entidad Territorial

Tratamiento Sugerido:

La Entidad Territorial deberá: Verificar procesos y procedimiento, establecer monitoreo y control de actividades críticas, considerar en el rubro de contingencias costos de no calidad. Establecer métodos y procedimientos, verificar capacidades y habilidades del personal, establecer cadena de supervisión y niveles de decisión.

4.10 Factor de Riesgos Actos Culposos o Dolosos de Terceros

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Pérdidas materiales en los bienes actuaciones u omisiones que cometan terceros ajenos al contrato sean de carácter culposo o doloso. Reflejándose en: Efectos en costos de Materiales e Insumos.

Items de Presupuesto	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación
Cambio en Costos de Contratación Derivada	Poco Probable	Menor	Moderado	Entidad Territorial

Tratamiento Sugerido:

La Entidad Territorial deberá: Establecer sistema de vigilancia en las locaciones del contrato. Establecer barreras de acceso y controles de ingreso. Establecer zonas de acceso restringido. Establecer identificación de personal y visitantes. Establecer cadena de custodia y responsabilidad de los bienes. Contar con póliza TRDM. Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

4.11 Otros Factores de Riesgos

A continuación, se enuncian otros eventos que pueden presentarse en la ejecución del contrato y que pueden afectar la ejecución del mismo:

Riesgo	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación	Tratamiento
Accidentes laborales menor	Poco Probable	Menor	Moderado	Entidad Territorial	Afiliación SGSS y Amparo Responsabilidad civil Patronal
Accidentes laborales mayor	Poco Probable	Menor	Moderado	Entidad Territorial	Afiliación SGSS y Amparo Responsabilidad civil Patronal
Necesidad de reforzar dedicación de recursos para evitar retrasos en el cronograma de actividades por causas imputables al contratista	Posible	Moderado	Moderado	Entidad Territorial	Contar con plan de contingencia
Accidentes - daños y lesiones o muerte de terceros -	Raro	Mayor	Considerable	Entidad Territorial	Estimar posibles perjuicios y daños a terceros contratar seguros suficientes
Necesidad de repetición de actividades de transferencia de conocimiento por insuficiencia en la apropiación del conocimiento del personal entrenado	Posible	Moderado	Moderado	Entidad Territorial	Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto

Terminación anticipada del contrato por inviabilidad de las fases o etapas subsiguientes.	Posible	Moderado	Moderado	Entidad Territorial	Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto
Necesidades de reprocesos por fallas, errores o insuficiencias en las actividades de control de ejecución del contrato principal	Posible	Moderado	Moderado	Entidad Territorial	Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisado y aprobado por	Fernando Ulloa Tachack	Profesional de Riesgos Grupo de Planeación Contractual		07/11/2025
Elaborado por	Marcela Ramirez Arias	Coordinadora Jurídica FRPT		07/11/2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Proyecto Macro	Fondo Regional para los Pactos Territoriales
Objeto del contrato	ENTERRITORIO S.A. Y EL DEPARTAMENTO DEL BOYACÁ, ACUERDAN SUSCRIBIR UN CONTRATO ESPECÍFICO, DERIVADO DEL PACTO TERRITORIAL BOYACÁ, QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON EL FIN DE DESTINAR RECURSOS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES Y LOS DEMÁS QUE SE REQUIERAN PARA LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON -TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", EL CUAL SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2025 DEL PACTO TERRITORIAL BOYACÁ.

Presupuesto	$ 70.031.648.339	Plazo del contrato	9 Meses
Tipo de Contrato	1 Contrato de Obra.	Sistemas de Pago	2 Precio global fijo.
Etapas/Fases	Fase	# de Fases	3
		Valor del SMMLV	$ 1.423.500,00

Nombre Fase 1	Precontractual	Duración Fase 1	3	Meses	Valor Fase 1	$	3.199.000.000,00
Nombre Fase 2	Ejecución	Duración Fase 2	5	Meses	Valor Fase 2	$	65.233.148.339,00
Nombre Fase 3	Cierre	Duración Fase 3	1	Meses	Valor Fase 3	$	1.599.500.000,00
				Meses			
				Meses			
				Meses			

Forma de Pago Fase 1	3 Pago por hitos.
Forma de Pago Fase 2	3 Pago por hitos.
Forma de Pago Fase 3	3 Pago por hitos.

Númeo de Ítems del Presupuesto	1

Fase 1

Items de Presupuesto	Valor Total Item

Fase 2

Items de Presupuesto	Valor Total Item

Fase 3

Items de Presupuesto	Valor Total Item

Items de Presupuesto	Valor Total Item

Items de Presupuesto	Valor Total Item

Items de Presupuesto	Valor Total Item

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A- ENTERRITORIO S.A

Vigencia:2025

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **CDP2025-005057** **Fecha Exp: 07/11/2025**

Valor total certificado de Disponibilidad Presupuestal: $ 10.227.104.846,00

OBJETO/CONCEPTO: 011716 07/11/2025 PAA-1378 ENTerritorio S.A. y el Departamento del Boyacá, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Territorial Boyacá, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON -TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, el cual se encuentra priorizado en el Plan de Acción 2025 del Pacto Territorial Boyacá.

Detalle

Concepto	Rubro	CentroDeCosto	CentroContable	Fuente	LineasDeNegocio	Valor CDP
EJECUCIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA VIGENCIA ACTUAL	921910011	000000 - CONVENIOS	221009 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	155 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	03 - CONVENIOS DE GESTION	$10.227.104.846,00

Diana Carolina Cuervo Ramos

RESPONSABLE DEL GRUPO DE PRESUPUESTO

Solicitado: Oscar Javier Perez Ruiz / 11/07/2025

Revisó: HERNANDEZ ZAMBRANO PAOLA ANDREA / 11/08/2025

Elaboró: Diana Carolina Cuervo Ramos / 11/08/2025

CERTIFICACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS

Nº SOLVF2025-000022

LA GERENTE DE UNIDAD DEL GRUPO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – ENTERRITORIO S.A.

CERTIFICA:

Que, mediante autorización de cupo para vigencias futuras ordinarias en el Presupuesto de Gastos de Inversión 2-2025-063702 del 16 de octubre de 2025, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público APROBÓ en el presupuesto de gastos para la (s) vigencia (s) 2026, cupo de vigencias futuras, por la suma de: ($63.638.012.116,00) de los cuales se afectará la suma de ($59.804.543.493,00)

Que, con base en lo anterior y de acuerdo con la solicitud realizada a través aplicativo Dynamics 365 bajo consecutivo SOLCDP2025-005513 asociada a la solicitud de vigencia futura SOLVF2025-000022 radicada el 08/11/2025, se solicita al responsable del Control de Presupuesto la certificación de las vigencias futuras aprobadas, con el fin de que "ENTerritorio S.A. y el Departamento de Boyacá, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Territorial Boyacá, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la cofinanciación del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON TURMEQUE Y TURMEQUÉ – NUEVO COLON – TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", el cual se encuentra priorizado en el Plan de Acción 2025 del Pacto Territorial Boyacá..", se certifica la disponibilidad de los recursos, así:

VIGENCIA	UNIDAD	RUBRO	VALOR
2026	221009	EJECUCIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA VIGENCIA ACTUAL	$59.804.543.493,00

La presente certificación se expide a los ocho (08) días del mes de noviembre del año 2025.

Firmado digitalmente por SANDRA CECILIA CADENA CASTAÑEDA

SANDRA CECILIA CADENA CASTAÑEDA
Gerente de Unidad Grupo de Presupuesto

Elaboró: Laura Marcela Rodríguez Ríos - Contratista Grupo de Presupuesto
Reviso: Paola Andrea Hernández Zambrano - Contratista Grupo de Presupuesto
Diana Carolina Cuervo Ramos - Profesional Junior 1 Grupo de Presupuesto

Departamento
Nacional de Planeación

Bogotá D.C., viernes, 07 de noviembre de 2025

Al responder cite este Nro.

SG 20256000762361

Doctora
ESMERALDA MOLINA GÓMEZ
Presidente (E)
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTERRITORIO S.A.
Calle 26 n.° 13-19
Email: correspondencia.lira@enterritorio.gov.co
Bogotá D.C.

Asunto: Instrucción de gasto número 164 de 2025 – Asignación de recursos del Fondo Regional para los Contratos Plan/Pactos Territoriales al proyecto *"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON TURMEQUE Y TURMEQUÉ NUEVO COLON TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"* conforme al Proyecto de Inversión *"Apoyo para la financiación de proyectos estratégicos que promuevan el desarrollo territorial y nacional."*

Apreciada Dra. Esmeralda:

En atención a la ejecución del Contrato Interadministrativo de Mandato No. DNP-877-2021 / ENTerritorio n.° 221009 suscrito el 14 de septiembre de 2021, en virtud del cual el Departamento Nacional de Planeación (DNP) confirió el mandato con representación a la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio S.A. para la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan/Pactos Territoriales (FRPT), y teniendo en cuenta lo establecido en el proyecto de inversión *"Apoyo para la financiación de proyectos estratégicos que promuevan el desarrollo territorial y nacional."*, solicito se proceda en nombre y representación del Departamento Nacional de Planeación, en atención a los artículos 1505 y 2177 del Código Civil y los artículos 832 y 1262 del Código de Comercio, a adelantar los trámites para asignar recursos por valor de *SETENTA MIL TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON TRES CENTAVOS. ($70.031.648.339.03) MCTE,* para la financiación del proyecto *"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON TURMEQUE Y TURMEQUÉ NUEVO COLON TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"*

DNP Firmado digitalmente

Lo anterior, con base en la recomendación del Supervisor del citado contrato de mandato (Asesor Código 1020 grado 16 de la Subdirección General de Inversiones, Seguimiento y Evaluación)[1], quien informó que el esquema de inversiones de los recursos conforme al proyecto de Inversión *"Apoyo para la financiación de proyectos estratégicos que promuevan el desarrollo territorial y nacional."*, previsto para la financiación y ejecución del proyecto que será ejecutado por el departamento de Boyacá es el siguiente:

Tabla No. 1 – Esquema de Inversión

Entidad que Financia	Entidad a través de la cual se ejecuta el financiamiento	Valor Financiado	Valor 2025	Valor 2026
Departamento Nacional de Planeación	Fondo Regional para los Pactos Territoriales	$ 70.031.648.339.00	$ 10.227.104.846	$ 59.804.543.493
VALOR TOTAL		**$ 70.031.648.339.03**	**$ 10.227.104.846,03**	**$ 59.804.543.493**

Fuente: Grupo Gerencia Nacional de Pactos Territoriales elaborado a partir de la información del Proyecto de Inversión "Apoyo para la financiación de proyectos estratégicos que promuevan el desarrollo territorial y nacional." (anexo 2) y carta de presentación de solicitud de recursos (Anexo 3).

El esquema de inversión del proyecto se financiará con recursos de la vigencia fiscal 2025 y las vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2026 autorizadas por la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Adicionalmente, de acuerdo con el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico realizado por parte de la supervisión del citado contrato de mandato, a través del memorando con radicado No. 20254330761921 del 7 de noviembre de 2025 informó que:

- Este proyecto fue priorizado en la línea estratégica 8 Transporte. Componente: Infraestructura red vial regional, identificado dentro del Plan Estratégico de Inversiones del *Pacto Boyacá, raíz y futuro: Transformación económica y justicia social en armonía con la naturaleza* que tiene vigencia desde el 14 de agosto de 2025 y tiene como objeto *"Implementar políticas y proyectos estratégicos en el departamento de Boyacá, que promuevan la transformación productiva para una tierra grande, competitiva y equitativa, alineadas con los principios del Gobierno Nacional. Todo ello para lograr una transición energética justa, que permita transitar de las actividades económicas extractivistas, a la agroindustria, el turismo y las energías alternativas, sumado a la generación de bienestar con el fortalecimiento del*

[1] Memorando radicado n.° DNP 20244330164343 mediante el cual se nombra el Asesor Código 1020 grado 16 de la Subdirección General de Inversiones, Seguimiento y Evaluación y memorando radicado DNP n.° 20246400137353 mediante el cual el asesor fue designado para la Supervisión del Contrato Interadministrativo de Mandato n.° DNP-877-2021.

DNP
Firmado digitalmente

acceso a servicios esenciales como salud, agua potable y saneamiento básico, educación e infraestructura estratégica, para lograr el cierre de brechas y promover la vida en el territorio Boyacense.", con una duración de 5 años. Se priorizó mediante Plan Estratégico de Inversiones (PEI)[2], el cual fue aprobado por el Consejo Directivo, en sesión nro. 2 celebrada el 07 de noviembre del 2025. (ver anexo 1)

- Los recursos destinados para financiar el proyecto *"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON TURMEQUE Y TURMEQUÉ NUEVO COLON TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"* corresponden a los asignados al proyecto de inversión denominado *"Apoyo para la financiación de proyectos estratégicos que promuevan el desarrollo territorial y nacional"* (ver anexo 2).

- Mediante radicados DNP nro. 20256631025212 y 20256631025162 del 07 de noviembre de 2025, el departamento de Boyacá presentó ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP) el proyecto *"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES* LIMITE *VILLAPINZON TURMEQUE Y TURMEQUÉ NUEVO COLON TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"* para que le sean asignados los recursos dispuestos por el FRPT por valor de *SETENTA MIL TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON TRES CENTAVOS. ($70.031.648.339,03) MCTE* que se encuentra priorizado en el Plan Estratégico de Inversiones (ver anexo 3).

- El proyecto cuenta con concepto de viabilidad sectorial del Instituto nacional de vías INVIAS, mediante oficios 2024E-VUVR-098687 del 28 de octubre del 2024 y No. 2024S VBOG 079521 de fecha 7 de noviembre 2025 (ver anexo 4).

  Es importante aclarar que, ENTerritorio debe velar porque la ejecución del proyecto se realice conforme a las especificaciones y diseños aprobados por la entidad cabeza del sector de acuerdo con el concepto sectorial favorable emitido; en caso que se presenten cambios en el proyecto viabilizado por la entidad cabeza del sector deberá existir una justificación técnica, financiera y/o jurídica para cualquier modificación, la cual deberá presentarse ante las instancias de seguimiento que establece el Fondo Regional para los Pactos Territoriales en su reglamento operativo, para efectos de establecer la necesidad de tramitar alguna modificación ante la entidad viabilizadora.

2 El Plan Estratégico de Inversiones (PEI) es un instrumento de planeación del Pacto Territorial en el que se consolidan las inversiones relacionadas con la priorización de iniciativas y sus fuentes indicativas de financiación. Dicho PEI corresponde al *esquema operativo de inversión* que se menciona en el reglamento operativo del Fondo Regional de Pactos Territoriales, con lo cual se valida que un proyecto de inversión se encuentra priorizado en un pacto territorial.

DNP
Firmado digitalmente

De acuerdo con lo establecido en el reglamento operativo del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, en el capítulo 3 literal c, la entidad territorial es la responsable de presentar los proyectos de inversión priorizados en los Contratos Plan/Pactos Territoriales con todos los soportes definidos para tal fin, para acceder a su financiación y, con fundamento en estos soportes, ENTerritorio emite concepto de verificación técnica, financiera y jurídica de los documentos aportados, los cuales serán el soporte para que el DNP genere la respectiva orden de gasto.

- Con fundamento en la información del proyecto junto con los documentos aportados por la entidad ejecutora, ENTerritorio emitió concepto de verificación favorable de requisitos técnicos, jurídicos y financieros por parte del administrador del Fondo Regional para los Contratos Plan/Pactos Territoriales – ENTerritorio, el cual fue remitido al DNP mediante radicado N°202534010018421 del 7 de noviembre de 2025 (ver anexo 5).

- El proyecto se encuentra registrado bajo la Metodología General Ajustada (MGA) y está identificado con ID 995029, según consta en la ficha de verificación (ver anexo 6).

- A la fecha se encuentra vigente el Contrato Interadministrativo de Mandato n.° DNP-877-2021 / ENTerritorio n.° 221009, a través del cual ENTerritorio, en calidad de mandatario, asumió la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan/Pactos Territoriales, siendo el competente para administrar los recursos que se aprueben a través de la instrucción de gasto para la financiación total del proyecto; cuya vigencia actualmente está hasta el 31 de julio de 2026.

  Dentro de las obligaciones del mandatario contenidas en la cláusula segunda del mencionado contrato, se encuentra la de *"Celebrar los contratos específicos en los términos descritos en el Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto No. 740 de 2016 o la norma que lo modifique o sustituya, así como los demás actos jurídicos que se requieren para el desarrollo del contrato de mandato con cargo a los recursos del Fondo y adelantar las gestiones previas necesarias para su suscripción de manera autónoma manteniendo indemne al DNP frente a cualquier reclamación"* (núm. 6) y *"Cumplir con el reglamento operativo del Fondo Regional de los Contratos Plan/Pactos Territoriales de qué (sic) trata el Decreto No. 1082 de 2015, adicionado por el Decreto No. 740 de 2016 o la norma que lo modifique o sustituya"* (núm. 16). Las anteriores obligaciones no están supeditadas a una situación o condición distinta a la vigencia del plazo de ejecución del contrato de mandato; por lo cual, ENTerritorio deberá adelantar las gestiones necesarias para la suscripción del contrato específico del proyecto del asunto,

DNP
Firmado digitalmente

así su plazo de ejecución supere el plazo del contrato de mandato (situación que se abordará cuando se considere pertinente).

- En la cláusula cuarta del citado contrato de mandato – CONDICIONES ESPECIALES DE OPERACIÓN – se pactó que:

  "(…) *En este sentido, cuando así proceda, el administrador de los recursos asignados a los Contratos Plan/Pactos Territoriales – ENTerritorio -, para su giro, recibirá la instrucción de pago, en donde se indicará el valor de éste, la subcuenta de los recursos que serán afectados con el pago y la indicación del cumplimiento de las condiciones que se pacten en los contratos específicos para hacer efectivo el mismo. La instrucción de pago deberá estar soportada en la certificación del interventor o supervisor designado por la entidad ejecutora, en donde se acredite el cumplimiento de la condición de pago*".

- En la cláusula vigésima octava del prenombrado contrato de mandato – SUPERVISIÓN – se indicó que:

  "*1. Por parte del DNP: La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente Contrato de mandato estará a cargo del Asesor Código 1020 grado 16 de la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del DNP que ejerza las funciones de Gerente Nacional de Pactos Territoriales para el efecto, el Coordinador del Grupo de Contratación del DNP comunicará mediante memorando, de acuerdo con la solicitud de la dependencia…*".

Expuesto lo anterior, se emite la presente instrucción de gasto, de acuerdo con lo establecido en la Resolución n.° 2051 de 2021, expedida por el Director General del DNP, "*Por la cual se delega la suscripción de las instrucciones de gasto, sin consideración de la cuantía, para la ejecución de los proyectos administrados a través del Fondo Regional de los Contratos Plan/Pactos Territoriales*".

En caso de cualquier inquietud o requerimiento sobre el proyecto antes mencionado, agradecemos comunicarse con la supervisión del Contrato Interadministrativo de Mandato n.° DNP-877-2021 / ENTerritorio n.° 221009, para que de manera articulada se realice el trámite correspondiente

Cordialmente,

JOSÉ LENIN GALINDO URQUIJO
Secretaria General (E)

Anexos. Vía electrónica incluye:

DNP
Firmado digitalmente

Anexo 1. Plan Estratégico de Inversiones aprobado (11 folios).
Anexo 2. Proyecto de inversión (21 folios).
Anexo 3. Carta de Presentación solicitud de recursos del Departamento de Boyacá (9 folios).
Anexo 4. Conceptos sector - Viabilidad (4 folios).
Anexo 5. Concepto de verificación técnica, jurídica y financiera FRPT (13 folios).
Anexo 6. Ficha MGA (20 folios).
Anexo 7. Memorando de recomendación supervisor del C.I. DNP-877-2021 Radicado No. 20254330248213 del 7 de noviembre de 2025 (8 folios).

Copia:
Juan Carlos Montaña, Gerente de Unidad de Proyectos Especiales, email: jmontana1@enterritorio.gov.co
William Armando Monroy Tinjacá, Gerente Convenio FRPT ENTerritorio, email: wmonroy@enterritorio.gov.co

Elaboró: Sonia Alejandra Velasco Rodríguez – Contratista GIT Pactos Territoriales – SGISE.
Revisó: Adriana Fanny Ariza Medina – Contratista GIT Pactos Territoriales – SGISE.
Numael Eduardo Parra Martinez – Contratista GIT Pactos Territoriales – SGISE Numael Parra
Maria Fernanda Rueda – Contratista GIT Pactos Territoriales – SGISE.
Milexza Cristina Roa Cueto – Contratista GIT Pactos Territoriales – SGISE.
Sandra Yaneth Tibamosca Villamarín – Asesora GIT Pactos territoriales – SGISE.
Diana Marsella Lozano Ortiz – Contratista – Secretaria General

DNP
Firmado digitalmente

Departamento
Nacional de Planeación

Bogotá D.C., viernes, 07 de noviembre de 2025

Al responder cite este Nro.

SG 20256000762361

Doctora
ESMERALDA MOLINA GÓMEZ
Presidente (E)
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTERRITORIO S.A.
Calle 26 n.° 13-19
Email: correspondencia.lira@enterritorio.gov.co
Bogotá D.C.

Asunto: Instrucción de gasto número 164 de 2025 – Asignación de recursos del Fondo Regional para los Contratos Plan/Pactos Territoriales al proyecto *"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON TURMEQUE Y TURMEQUÉ NUEVO COLON TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"* conforme al Proyecto de Inversión *"Apoyo para la financiación de proyectos estratégicos que promuevan el desarrollo territorial y nacional."*

Apreciada Dra. Esmeralda:

En atención a la ejecución del Contrato Interadministrativo de Mandato No. DNP-877-2021 / ENTerritorio n.° 221009 suscrito el 14 de septiembre de 2021, en virtud del cual el Departamento Nacional de Planeación (DNP) confirió el mandato con representación a la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio S.A. para la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan/Pactos Territoriales (FRPT), y teniendo en cuenta lo establecido en el proyecto de inversión *"Apoyo para la financiación de proyectos estratégicos que promuevan el desarrollo territorial y nacional."*, solicito se proceda en nombre y representación del Departamento Nacional de Planeación, en atención a los artículos 1505 y 2177 del Código Civil y los artículos 832 y 1262 del Código de Comercio, a adelantar los trámites para asignar recursos por valor de *SETENTA MIL TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON TRES CENTAVOS. ($70.031.648.339.03) MCTE,* para la financiación del proyecto *"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON TURMEQUE Y TURMEQUÉ NUEVO COLON TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"*

DNP Firmado digitalmente

Lo anterior, con base en la recomendación del Supervisor del citado contrato de mandato (Asesor Código 1020 grado 16 de la Subdirección General de Inversiones, Seguimiento y Evaluación)[1], quien informó que el esquema de inversiones de los recursos conforme al proyecto de Inversión *"Apoyo para la financiación de proyectos estratégicos que promuevan el desarrollo territorial y nacional."*, previsto para la financiación y ejecución del proyecto que será ejecutado por el departamento de Boyacá es el siguiente:

Tabla No. 1 – Esquema de Inversión

Entidad que Financia	Entidad a través de la cual se ejecuta el financiamiento	Valor Financiado	Valor 2025	Valor 2026
Departamento Nacional de Planeación	Fondo Regional para los Pactos Territoriales	$ 70.031.648.339.00	$ 10.227.104.846	$ 59.804.543.493
VALOR TOTAL		**$ 70.031.648.339.03**	**$ 10.227.104.846,03**	**$ 59.804.543.493**

Fuente: Grupo Gerencia Nacional de Pactos Territoriales elaborado a partir de la información del Proyecto de Inversión "Apoyo para la financiación de proyectos estratégicos que promuevan el desarrollo territorial y nacional." (anexo 2) y carta de presentación de solicitud de recursos (Anexo 3).

El esquema de inversión del proyecto se financiará con recursos de la vigencia fiscal 2025 y las vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2026 autorizadas por la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Adicionalmente, de acuerdo con el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico realizado por parte de la supervisión del citado contrato de mandato, a través del memorando con radicado No. 20254330761921 del 7 de noviembre de 2025 informó que:

- Este proyecto fue priorizado en la línea estratégica 8 Transporte. Componente: Infraestructura red vial regional, identificado dentro del Plan Estratégico de Inversiones del *Pacto Boyacá, raíz y futuro: Transformación económica y justicia social en armonía con la naturaleza* que tiene vigencia desde el 14 de agosto de 2025 y tiene como objeto *"Implementar políticas y proyectos estratégicos en el departamento de Boyacá, que promuevan la transformación productiva para una tierra grande, competitiva y equitativa, alineadas con los principios del Gobierno Nacional. Todo ello para lograr una transición energética justa, que permita transitar de las actividades económicas extractivistas, a la agroindustria, el turismo y las energías alternativas, sumado a la generación de bienestar con el fortalecimiento del*

[1] Memorando radicado n.° DNP 20244330164343 mediante el cual se nombra el Asesor Código 1020 grado 16 de la Subdirección General de Inversiones, Seguimiento y Evaluación y memorando radicado DNP n.° 20246400137353 mediante el cual el asesor fue designado para la Supervisión del Contrato Interadministrativo de Mandato n.° DNP-877-2021.

DNP
Firmado digitalmente

acceso a servicios esenciales como salud, agua potable y saneamiento básico, educación e infraestructura estratégica, para lograr el cierre de brechas y promover la vida en el territorio Boyacense.", con una duración de 5 años. Se priorizó mediante Plan Estratégico de Inversiones (PEI)[2], el cual fue aprobado por el Consejo Directivo, en sesión nro. 2 celebrada el 07 de noviembre del 2025. (ver anexo 1)

- Los recursos destinados para financiar el proyecto *"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON TURMEQUE Y TURMEQUÉ NUEVO COLON TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"* corresponden a los asignados al proyecto de inversión denominado *"Apoyo para la financiación de proyectos estratégicos que promuevan el desarrollo territorial y nacional"* (ver anexo 2).

- Mediante radicados DNP nro. 20256631025212 y 20256631025162 del 07 de noviembre de 2025, el departamento de Boyacá presentó ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP) el proyecto *"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES* LIMITE *VILLAPINZON TURMEQUE Y TURMEQUÉ NUEVO COLON TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"* para que le sean asignados los recursos dispuestos por el FRPT por valor de *SETENTA MIL TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON TRES CENTAVOS. ($70.031.648.339,03) MCTE* que se encuentra priorizado en el Plan Estratégico de Inversiones (ver anexo 3).

- El proyecto cuenta con concepto de viabilidad sectorial del Instituto nacional de vías INVIAS, mediante oficios 2024E-VUVR-098687 del 28 de octubre del 2024 y No. 2024S VBOG 079521 de fecha 7 de noviembre 2025 (ver anexo 4).

  Es importante aclarar que, ENTerritorio debe velar porque la ejecución del proyecto se realice conforme a las especificaciones y diseños aprobados por la entidad cabeza del sector de acuerdo con el concepto sectorial favorable emitido; en caso que se presenten cambios en el proyecto viabilizado por la entidad cabeza del sector deberá existir una justificación técnica, financiera y/o jurídica para cualquier modificación, la cual deberá presentarse ante las instancias de seguimiento que establece el Fondo Regional para los Pactos Territoriales en su reglamento operativo, para efectos de establecer la necesidad de tramitar alguna modificación ante la entidad viabilizadora.

2 El Plan Estratégico de Inversiones (PEI) es un instrumento de planeación del Pacto Territorial en el que se consolidan las inversiones relacionadas con la priorización de iniciativas y sus fuentes indicativas de financiación. Dicho PEI corresponde al *esquema operativo de inversión* que se menciona en el reglamento operativo del Fondo Regional de Pactos Territoriales, con lo cual se valida que un proyecto de inversión se encuentra priorizado en un pacto territorial.

DNP
Firmado digitalmente

De acuerdo con lo establecido en el reglamento operativo del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, en el capítulo 3 literal c, la entidad territorial es la responsable de presentar los proyectos de inversión priorizados en los Contratos Plan/Pactos Territoriales con todos los soportes definidos para tal fin, para acceder a su financiación y, con fundamento en estos soportes, ENTerritorio emite concepto de verificación técnica, financiera y jurídica de los documentos aportados, los cuales serán el soporte para que el DNP genere la respectiva orden de gasto.

- Con fundamento en la información del proyecto junto con los documentos aportados por la entidad ejecutora, ENTerritorio emitió concepto de verificación favorable de requisitos técnicos, jurídicos y financieros por parte del administrador del Fondo Regional para los Contratos Plan/Pactos Territoriales – ENTerritorio, el cual fue remitido al DNP mediante radicado N°202534010018421 del 7 de noviembre de 2025 (ver anexo 5).

- El proyecto se encuentra registrado bajo la Metodología General Ajustada (MGA) y está identificado con ID 995029, según consta en la ficha de verificación (ver anexo 6).

- A la fecha se encuentra vigente el Contrato Interadministrativo de Mandato n.° DNP-877-2021 / ENTerritorio n.° 221009, a través del cual ENTerritorio, en calidad de mandatario, asumió la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan/Pactos Territoriales, siendo el competente para administrar los recursos que se aprueben a través de la instrucción de gasto para la financiación total del proyecto; cuya vigencia actualmente está hasta el 31 de julio de 2026.

  Dentro de las obligaciones del mandatario contenidas en la cláusula segunda del mencionado contrato, se encuentra la de *"Celebrar los contratos específicos en los términos descritos en el Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto No. 740 de 2016 o la norma que lo modifique o sustituya, así como los demás actos jurídicos que se requieren para el desarrollo del contrato de mandato con cargo a los recursos del Fondo y adelantar las gestiones previas necesarias para su suscripción de manera autónoma manteniendo indemne al DNP frente a cualquier reclamación"* (núm. 6) y *"Cumplir con el reglamento operativo del Fondo Regional de los Contratos Plan/Pactos Territoriales de qué (sic) trata el Decreto No. 1082 de 2015, adicionado por el Decreto No. 740 de 2016 o la norma que lo modifique o sustituya"* (núm. 16). Las anteriores obligaciones no están supeditadas a una situación o condición distinta a la vigencia del plazo de ejecución del contrato de mandato; por lo cual, ENTerritorio deberá adelantar las gestiones necesarias para la suscripción del contrato específico del proyecto del asunto,

DNP
Firmado digitalmente

así su plazo de ejecución supere el plazo del contrato de mandato (situación que se abordará cuando se considere pertinente).

- En la cláusula cuarta del citado contrato de mandato – CONDICIONES ESPECIALES DE OPERACIÓN – se pactó que:

  "(…) *En este sentido, cuando así proceda, el administrador de los recursos asignados a los Contratos Plan/Pactos Territoriales – ENTerritorio -, para su giro, recibirá la instrucción de pago, en donde se indicará el valor de éste, la subcuenta de los recursos que serán afectados con el pago y la indicación del cumplimiento de las condiciones que se pacten en los contratos específicos para hacer efectivo el mismo. La instrucción de pago deberá estar soportada en la certificación del interventor o supervisor designado por la entidad ejecutora, en donde se acredite el cumplimiento de la condición de pago*".

- En la cláusula vigésima octava del prenombrado contrato de mandato – SUPERVISIÓN – se indicó que:

  "*1. Por parte del DNP: La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente Contrato de mandato estará a cargo del Asesor Código 1020 grado 16 de la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del DNP que ejerza las funciones de Gerente Nacional de Pactos Territoriales para el efecto, el Coordinador del Grupo de Contratación del DNP comunicará mediante memorando, de acuerdo con la solicitud de la dependencia…*".

Expuesto lo anterior, se emite la presente instrucción de gasto, de acuerdo con lo establecido en la Resolución n.° 2051 de 2021, expedida por el Director General del DNP, "*Por la cual se delega la suscripción de las instrucciones de gasto, sin consideración de la cuantía, para la ejecución de los proyectos administrados a través del Fondo Regional de los Contratos Plan/Pactos Territoriales*".

En caso de cualquier inquietud o requerimiento sobre el proyecto antes mencionado, agradecemos comunicarse con la supervisión del Contrato Interadministrativo de Mandato n.° DNP-877-2021 / ENTerritorio n.° 221009, para que de manera articulada se realice el trámite correspondiente

Cordialmente,

JOSÉ LENIN GALINDO URQUIJO
Secretaria General (E)

Anexos. Vía electrónica incluye:

DNP
Firmado digitalmente

Anexo 1. Plan Estratégico de Inversiones aprobado (11 folios).
Anexo 2. Proyecto de inversión (21 folios).
Anexo 3. Carta de Presentación solicitud de recursos del Departamento de Boyacá (9 folios).
Anexo 4. Conceptos sector - Viabilidad (4 folios).
Anexo 5. Concepto de verificación técnica, jurídica y financiera FRPT (13 folios).
Anexo 6. Ficha MGA (20 folios).
Anexo 7. Memorando de recomendación supervisor del C.I. DNP-877-2021 Radicado No. 20254330248213 del 7 de noviembre de 2025 (8 folios).

Copia:
Juan Carlos Montaña, Gerente de Unidad de Proyectos Especiales, email: jmontana1@enterritorio.gov.co
William Armando Monroy Tinjacá, Gerente Convenio FRPT ENTerritorio, email: wmonroy@enterritorio.gov.co

Elaboró: Sonia Alejandra Velasco Rodríguez – Contratista GIT Pactos Territoriales – SGISE.
Revisó: Adriana Fanny Ariza Medina – Contratista GIT Pactos Territoriales – SGISE.
Numael Eduardo Parra Martinez – Contratista GIT Pactos Territoriales – SGISE Numael Parra
Maria Fernanda Rueda – Contratista GIT Pactos Territoriales – SGISE.
Milexza Cristina Roa Cueto – Contratista GIT Pactos Territoriales – SGISE.
Sandra Yaneth Tibamosca Villamarín – Asesora GIT Pactos territoriales – SGISE.
Diana Marsella Lozano Ortiz – Contratista – Secretaria General

DNP
Firmado digitalmente

Departamento de Boyacá
Gobernación

DECRETO NÚMERO 1109 **DE**
(17 OCT. 2025)

"*Por el cual se provee un empleo de libre nombramiento y remoción*"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y

CONSIDERANDO:

Que conforme a las facultades dispuestas por el artículo 305 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con el artículo 2.2.5.1.2 del Decreto 1083 de 2015, le corresponde al Gobernador nombrar y remover libremente a los funcionarios de sus dependencias de acuerdo a la necesidad del servicio, en cumplimiento de los requisitos legales, y por ende realizar las respectivas designaciones de los cargos de libre nombramiento y remoción que integran el gabinete departamental.

Que, según la Planta de Personal fijada para la Gobernación de Boyacá, mediante Decreto 047 de 2019, el empleo de Secretario de Despacho, código 020 grado 10, asignado a la Secretaría de Contratación, se encuentra vacante.

Que el Director General de Talento Humano, revisó la hoja de vida del nominado JORGE MARIO IBÁÑEZ ARANGO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7.181.256, al cargo de Secretario de Despacho, código 020 grado 10, asignado a la Secretaría de Contratación, verificando que cumple con los requisitos y el perfil requerido para ejercer las funciones del cargo conforme al Decreto No.307 de 2019 de la Gobernación de Boyacá.

Que en consecuencia, es procedente realizar el nombramiento ordinario en el cargo de Secretario de Despacho, código 020 grado 10, asignado a la Secretaría de Contratación.

Por lo expuesto previamente,

D E C R E T A:

Artículo 1. Nombrar a JORGE MARIO IBÁÑEZ ARANGO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7.181.256, para desempeñar el cargo de Secretario de Despacho, código 020 grado 10, asignado a la Secretaría de Contratación.

Departamento de Boyacá
Gobernación

DECRETO NÚMERO 1109 **DE**
(17 OCT. 2025)

"*Por el cual se provee un empleo de libre nombramiento y remoción*"

Artículo 2. El presente Decreto generará novedad fiscal, a partir de la fecha del acta de posesión.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Tunja, a 17 OCT. 2025

CARLOS ANDRÉS AMAYA RODRÍGUEZ
Gobernador de Boyacá

WILMAR ANCISAR TRIANA GONZALEZ
Secretario General

Aprobó: Camilo Andrés Guarnizo Romero
Director General de Talento Humano

Reviso: César Augusto Medina Rodríguez
Profesional Universitario

Elaboró: Miryam Correa López
Técnico administrativo (E)

Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: E-DO-TH-F-009
ACTA DE POSESIÓN DE CARGO		FECHA: 08/Ago/2019

NO. _____

En Tunja, a ***VEINTE (20) DE OCTUBRE*** *del* ***DOS MIL VEINTICINCO (2025)****, se presentó ante el* ***GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ*** *el doctor* ***JORGE MARIO IBÁÑEZ ARANGO****, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.181.256, con el objeto de tomar posesión* ***DEL CARGO DE SECRETARIO DE DESPACHO, CÓDIGO 020 GRADO 10, ASIGNADO A LA SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN****, Para el que fue* ***NOMBRADO POR DECRETO No. 1109 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2025*** *de la* ***GOBERNACIÓN DE BOYACÁ.***

El suscrito ***GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ*** *le recibió el juramento en la forma legal y bajo su gravedad juró cumplir y servir leal y fielmente los deberes de su cargo.*

EL POSESIONADO PRESENTÓ LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS

a) Decreto de nombramiento
b) Formato de Hoja de vida y soportes en físico
c) Cédula de ciudadanía
d) Libreta de Servicio Militar
e) Formularios de vinculación al Sistema de Seguridad Social
f) Antecedentes de la Procuraduría, Contraloría y de Policia.

NOTA: *ESTA POSESIÓN SURTE EFECTOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS A PARTIR DE LA FECHA.*

En constancia, se firma la presente diligencia como aparece.

EL POSESIONADO _____

CARLOS ANDRÉS AMAYA RODRÍGUEZ
Gobernador de Boyacá

CAMILO ANDRÉS GUARNIZO ROMERO
Director General de Talento Humano

República de Colombia

Departamento de Boyacá
Gobernación

DECRETO NÚMERO 093 **DE**
(01 FEB 2019)

Por medio de la cual delegan unas funciones

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

En uso de sus atribuciones constitucuonales, legales y reglamentarias, en especial las contenidas en los artículos 211 y 305 de la Constitución Política, artículos 9 y 10 de la Ley 489 de 1998 y artículo 12 de la Ley 80 de 1993 y

CONSIDERANDO

Que el articulo 211 de la Constitucion Politica , prevee que los representantes legales de las entidades públicas pueden delegar en sus subalternos y otras autoridades la decisión de los asuntos a ellos conferidos.

Que en desarrollo del precepto constitucional, la Ley 489 de 1998, en su artículo 9º, ratifica la potestad de trasferir el ejercicio de las funciones otorgadas a las autoridades administrativas, a sus colaboradores y empleados públicos de los niveles directivos y asesor, vinculados al correpondiente organismo.

Que en desarrollo del precepto constitucional, la Ley 80 de 1993 en su artículo 12º, establece que en materia contractual la delegación podra ser total o parcial, en los servidores que desempeñen los cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes.

Que con el propósito de dinamizar y realizar mejoras en la función administrativa contractual, se hace necesario delegar en el (la) Secretario de Despacho, código 020, grado 10 asignado a la Secretaría de Contratación, la competencia en dicha materia.

DECRETA

ARTICULO PRIMERO.- DELEGAR en el (la) Secretario (a) de Despacho, código 020, grado 10 asignado a la Secretaría de Contratación, la competencia para realizar y dirigir los procesos licitatorios, de selección abreviada, concursos de méritos, mínima cuantía, así como la de celebrar los contratos que de ellos de desprendan; igualmente aquellos derivados de la aplicación de las causales de contratación directa, modalidades establecidas en el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007. También se delegan los procesos contractuales y la celebración de contratos y convenios que se fundamentan en disposiciones constitucionales y legales diferentes al Estatuto General de la Contratación. Para el efecto será el delegatario de los procedimientos precontractuales, contractuales y pos-contractuales establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, Ley 1882 de 2018, decretos 1082 de 2015 y 392 de 2018, aquellos derivados del artículo 355 de la carta politica, decreto 092 de 2017, Ley 489 de 1998, Ley 1286 de 2009, Decretos 393 y 591 de 1991, Ley 1575 de 2012 y demás normas vigentes en materia contractual, o quellas que las sustituyan modifiquen o complementen.

República de Colombia

Departamento de Boyacá
Gobernación 15-093

DECRETO NÚMERO **DE**
(01 FEB 2019)

PARAGRAFO. Lo anterior sin perjuicio de la prohibición para delegar establecida en el artículo 2º del Decreto 092 de 2017.

ARTICULO SEGUNDO.- El (la) Funcionario (a) delegado (a) presentará informes al Gobernador cuando así lo requiera.

ARTÍCULO TERCERO.- El (la) Funcionario (a) delegado (a) queda facultado para continuar con los trámites contractuales que se hallen en curso.

ARTÍCULO CUARTO.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de expedicion y deroga las disposiciones que le sean contrarias en especial el Decreto 476 del 31 de octubre de 2017

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Tunja, al primer (01) día del mes de Febrero de dos mil diecinueve (2019)

CARLOS ANDRES AMAYA RODRIGUEZ
Gobernador de Boyacá

GABRIEL ALEJANDRO ALVAREZ SIERRA
Secrerario General

Revisó: German A. Aranguren Amaya/ Director Administrativo UAEADJ

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202534010018503

Pública ☐ **Pública Reservada** ☐ **Pública Clasificada** ☐

MEMORANDO

Bogotá D.C, 08-11-2025 01:27:46

PARA: **OSCAR JAVIER PEREZ RUIZ**
Subgerente de Desarrollo de Proyectos

DE: **JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA**
Gerente de Unidad Grupo de Proyectos Especiales

WILLIAM ARMANDO MONROY TINJACA
Gestor del Fondo Regional para los Pactos Territoriales (FRPT) - Contratista
Contrato Interadministrativo de Mandato **DNP 877 / ENTerritorio 221009**

ASUNTO: **Justificación** - Celebración del Contrato Específico para el proyecto: ***"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON -TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".***

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Apreciado Doctor Oscar:

La secretaria general del Departamento Nacional de Planeación, mediante oficio radicado **DNP 20256000762361 del 07 de noviembre de 2025**, dio instrucción a la Gerencia de ENTerritorio S.A., para iniciar las gestiones necesarias, a efectos de cofinanciar con recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales el proyecto de inversión priorizado e incluido en el Plan de Acción 2025 **del Pacto Boyacá, Raíz Y Futuro: Transformación Económica Y Justicia Social En Armonía Con La Naturaleza,** denominado: ***"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON -TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".***

En virtud de lo anterior, nos permitimos remitir justificación para la celebración del Contrato Específico del proyecto en mención, de la siguiente manera:

I. ANTECEDENTES

El artículo 8 de la Ley 1450 de 2011, modificado por el artículo 198 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014 "Prosperidad para Todos", incorporó al ordenamiento jurídico los Contratos Plan como un instrumento de planeación del desarrollo territorial para la articulación de recursos y la concurrencia de esfuerzos institucionales entre diferentes niveles de gobierno.

El marco jurídico de los Contratos Plan se complementa con la Ley 1454 de 2011 , los lineamientos de política pública definidos en el CONPES 3822 de 2014 , el cual propuso iniciar la fase de expansión de los Contratos Plan, desarrollando distintos elementos que integran el ciclo de los Contratos Plan y definiendo un conjunto de criterios de focalización, condiciones de elegibilidad, reglas de financiamiento y arreglos institucionales a ser tenidos en cuenta en la operación del instrumento, lo anterior se materializó en el Título 13 "Contratos Plan" del Decreto 1082 de 2015 , adicionado por el Decreto 740 de 2016 y modificado por el Decreto 1675 de 2016 , el cual reglamenta los artículos 198 y 199 de la Ley 1753 de 2015 .

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

De acuerdo con este marco normativo, los Contratos Plan buscan la coordinación interinstitucional entre los diferentes niveles de gobierno en favor de un eje central de desarrollo. Dicho eje debe responder tanto a las necesidades territoriales como a los ejes estratégicos de desarrollo nacional y sectorial establecidos en los planes de desarrollo respectivos. En virtud de lo anterior, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) incluyó en su plan estratégico 2014-2018 "Todos por un Nuevo País", el propósito de avanzar en la coordinación de la implementación del instrumento Contratos Plan, como una de las principales herramientas para facilitar la articulación Nación-Territorio y promover políticas conjuntas para el desarrollo regional.

En virtud de lo anterior, desde 2012 a la fecha se suscribieron trece (13) Contratos Plan en dieciséis (16) departamentos del país, dentro de los cuales se suscribieron siete (7) pilotos, que constituyeron la primera generación de los Contratos Plan en los departamentos de: Antioquia, Córdoba y Chocó (Contrato Plan Atrato Gran Darién), Boyacá, Nariño, Tolima, Norte del Cauca, Arauca y Santander, de igual forma, siguiendo los lineamientos de política pública derivada del CONPES 3867 y del CONPES 3822, se inició el proceso de formulación de seis (6) Contratos Plan para la Paz y el Posconflicto, denominados "Contratos Paz" por el mencionado Decreto 1675 de 2016, para los departamentos de Bolívar, Sucre (Contrato Paz Bolívar - Sucre), Caquetá, Guainía, Valle del Cauca, Guaviare y Meta.

Con el fin de satisfacer los compromisos pactados dentro de cada uno de los Contratos Plan y facilitar la ejecución de la herramienta, con posterioridad a la adopción del CONPES 3822 de 2014, se expidió la Ley 1753 de 2015, cuyos artículos 198 y 199, relativos a los Contratos Plan, precisan, de una parte, el alcance jurídico de la herramienta, y de otra, crean el Fondo Regional para los Contratos Plan y los Contratos Específicos como mecanismos para potenciar la gestión y la ejecución de la herramienta de Contratos Plan.

El artículo 198 de la Ley 1753 de 2015, modificó el artículo 8 de la Ley 1450 de 2011 y definió los Contratos Plan como *"(…) un acuerdo marco de voluntades de carácter estratégico entre la Nación y las entidades territoriales plasmado en un documento que contiene los arreglos programáticos y de desempeño definidos entre éstas para la ejecución asociada de proyectos de desarrollo territorial que contemplen la concurrencia de esfuerzos de inversión nacional y territorial". De igual forma, este artículo señaló que: "En desarrollo de este acuerdo marco se suscribirán contratos específicos en los cuales se señalará el objeto, las metas, los plazos, el responsable de la ejecución y se comprometerán los recursos de fuente nacional y territorial que se destinen para su ejecución, así como las vigencias futuras que se requieran. Adicionalmente, se acordarán los mecanismos de seguimiento y control de los recursos y todos los demás aspectos necesarios para garantizar la rápida y eficiente ejecución de los proyectos, atendiendo las prioridades y particularidades de cada sector y cada región".*

Si bien los Contratos Plan permiten articular esfuerzos institucionales entre la Nación y el territorio, para impulsar determinados ejes de inversión, cada una de las partes que concurren en su suscripción y ejecución, conservan y ejercen sus competencias de acuerdo con el marco legal que les resulta aplicable. Es así como, tratándose de la ejecución de proyectos, la contratación, vigilancia, supervisión y control de los recursos asociados a los proyectos priorizados en los Contratos Plan, corresponde a las entidades ejecutoras, bien sean estas del orden nacional (Ministerios, entidades descentralizadas, entre otras) o del orden territorial (Departamentos, municipios y corporaciones autónomas, entre otras).

Por su parte, el artículo 199 del PND 2014-2018, creó el Fondo Regional de los Contratos Plan como una cuenta de naturaleza especial, sin personería jurídica, adscrita al Departamento Nacional de Planeación que podría ser administrada por una entidad financiera del orden nacional, con participación estatal, constituyéndose en un mecanismo de gestión, que permitiera facilitar el cumplimiento de los acuerdos, metas y resultados acordados en los Contratos Plan y de lograr la articulación y convergencia de recursos disponibles.

icontec ISO 9001 TR-CO22-962903
icontec ISO 37001 TR-CMD-SG-0001'2
icontec ISO / IEC 27001 TR-CO22-962904
icontec ISO 45001 TR-CO22-962902
icontec ISO 14001 TR-CO22-962901

Con la creación del Fondo Regional para los Contratos Plan se estableció un mecanismo de gestión de esta herramienta para ser utilizado por los aportantes en los Contratos Plan, bien se trate de las partes o de terceros para la administración y ejecución de los recursos priorizados en éstos, con el ánimo de velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Aunado a lo anterior, fue expedido el Decreto 740 de 2016, *"Por el cual se adiciona el Título 13 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin de reglamentar parcialmente la Ley 1454 de 2011 y los artículos 198 y 199 de la Ley 1753 de 2015 sobre los Contratos Plan y el Fondo Regional para los Contratos Plan*", el cual especifica las condiciones generales de operación y administración del Fondo, establece las funciones que deberá ejercer el administrador en virtud del mismo y estipula la forma en la cual deberán ser administrados los recursos que ingresen a éste.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.13.1.2.4 del Decreto 1082 de 2015, el administrador del Fondo Regional para los Contratos Plan deberá desarrollar como mínimo las siguientes actividades: *"(…) 1) Recibir, custodiar y administrar los recursos del Fondo Regional para los Contratos Plan y aquellos que le sean transferidos por las demás entidades aportantes en los Contratos Plan, en los términos previstos en este título, las normas que lo regulen de conformidad con la naturaleza de los recursos y según las condiciones acordadas en el contrato de administración; 2) Administrar los recursos como un sistema separado de cuentas y constituir subcuentas por cada Contrato Plan, proyecto y fuente de financiación; 3) Mantener en depósito los recursos distintos de los provenientes del Presupuesto General de la Nación que se le transfieran, hasta su giro, de conformidad con las normas del presente título; 4) Efectuar los pagos a que haya lugar en desarrollo de los Contratos Plan, previa verificación del cumplimiento de los requisitos previstos para su desembolso; 5) Administrar la bolsa de los recursos que determine el Gobierno Nacional a través del Departamento Nacional de Planeación para incentivar a las entidades territoriales para que concurran con sus recursos propios y obtengan los mejores resultados en el desarrollo y ejecución de los Contratos Plan, a que se refiere el parágrafo del artículo 199 de la Ley 1753 de 2015, de conformidad con las condiciones que para el efecto defina el Departamento Nacional de Planeación; 6) Rendir informe de la administración de los recursos de cada Contrato Plan al Departamento Nacional de Planeación; 7) Cumplir y hacer cumplir las decisiones y normas expedidas por el Gobierno Nacional y el Departamento Nacional de Planeación, en temas relacionados con la operación y funcionamiento del Fondo, y 8) Las demás que se acuerden en el contrato de mandato."*

Adicionalmente, el Decreto 1082 de 2015, estableció que la representación del Fondo estaría en cabeza del DNP y en virtud de ello lo facultó para que contratara la administración de este con una Entidad Financiera del orden nacional con participación estatal vigilada por la Superintendencia Financiera, por medio de un Contrato de Mandato en los términos previstos en los artículos 2.2.13.1.2.3 y 2.2.13.1.2.4 de esta normativa.

Así las cosas, teniendo en cuenta que los Contratos Plan se enmarcan en los programas y proyectos que las entidades pueden emprender para el cumplimiento de las funciones misionales que les han sido asignadas legalmente, con fundamento en la autorización legal conferida a la entidad, el DNP confirió mandato a FONADE (ahora ENTerritorio S.A.) desde el 15 de julio de 2016 para que realizara la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan (ahora Fondo Regional para los Pactos Territoriales) en virtud de los Contratos de Mandato No. 216115 y 216138 de 2016.

Asimismo, y siguiendo las orientaciones establecidas en las bases del Plan Nacional de Desarrollo "Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad" para el cuatrienio 2018-2022, se contempló un rediseño a la estrategia de la herramienta de los Contratos Plan proponiendo su migración hacia los Pactos Territoriales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019 por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Es importante precisar que en razón a la expedición del Decreto 1042 de 2022, de fecha 21 de junio de 2022, "Por el cual se realiza la depuración del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional", señala con relación a lo establecido en el artículo 250 de la

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

icontec ISO 9001 TR-CO22-962903
icontec ISO 37001 TR-CMD-SG-000'2
icontec ISO / IEC 27001 TR-CO22-962904
icontec ISO 45001 TR-CO22-962902
icontec ISO 14001 TR-CO22-962901

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Ley 1955 de 2019, que las referencias a los "Contratos Plan" y al "Fondo Regional para los Contratos Plan" se entenderán efectuadas a los "Pactos Territoriales" y al "Fondo Regional para los Pactos Territoriales", respectivamente.

A su vez, el artículo 279 de la Ley 2294 de 2023, modifica el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019, señalando que los departamentos, los municipios, los Esquemas Asociativos Territoriales y la Nación podrán suscribir Pactos Territoriales, definidos como un instrumento de articulación para la concertación de inversiones estratégicas de alto impacto que con-tribuyan a consolidar el desarrollo regional definido en el Plan Nacional de Desarrollo y la construcción de la Paz Total, promoviendo para ello, la adopción de metodologías con enfoque de género a través del trabajo articulado con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, y la concurrencia de recursos del orden nacional y territorial, público, privado y/o de cooperación internacional, bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación.

Es así como este elemento normativo establece que a partir de la expedición del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, se transforma el Fondo Regional para los Pactos Territoriales a un Patrimonio Autónomo constituido mediante la celebración de un contrato de fiducia mercantil por parte del Departamento Nacional de Planeación y una sociedad fiduciaria de carácter público seleccionada directamente por dicho Departamento Administrativo. El objeto de este patrimonio autónomo será recibir, administrar y ejecutar los recursos destinados a la implementación de los pactos territoriales, incluyendo los que ya se encuentren en el Fondo Regional para los Pactos Territoriales.

El artículo 250 ya mencionado, modificado por el artículo 279 de la Ley 2294 de 2023, fue reglamentado por el Decreto 105 de 2024, “Por el cual se modifica la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 13 de la Parte 2 del Libro II del Decreto número 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación, con el fin de reglamentar el artículo 279 de la Ley 2294 de 2023”. Esta norma establece los órganos de gobierno y administración del Patrimonio Autónomo Fondo Pactos de que trata el artículo 279 de la Ley 2294 de 2023, así como su funcionamiento y los aspectos necesarios para su financiamiento.

En tanto inicia la operación del Patrimonio Autónomo Fondo Pactos y se celebra el contrato de fiducia mercantil correspondiente, el Fondo Regional para los Pactos Territoriales continuará siendo el mecanismo para la administración y ejecución de los recursos que permitan la financiación de proyectos incluidos en los Pactos Territoriales. De acuerdo con lo anterior, cada Ley del Plan que se ha venido expidiendo ha hecho ciertas modificaciones a la figura original (por ejemplo, en cuanto a su enfoque, con la incorporación de los Contratos Plan para la Paz), de manera que hoy podría hablarse de tres (3) generaciones de esta figura, a saber: (i) los Contratos Plan (2012); (ii) los Contratos Plan para la Paz (2016); y (iii) los Pactos Territoriales (2019)

Los Pactos Territoriales incorporan entonces un enfoque principalmente de asociatividad territorial alrededor de intervenciones o proyectos de impacto regional y formación bruta de capital, de igual forma buscan promover la delegación de competencias y prestación de servicios públicos compartidos, entre entidades territoriales. En este sentido, se espera fortalecer el acceso a fuentes de recursos, acceso directo a los recursos de SGR o a la presentación y ejecución de proyectos como esquema asociativo, mejorando la calidad de la inversión pública y garantizando la coordinación y la articulación de la planeación e inversiones para el desarrollo regional, hecho que implica la adopción de técnicas de presupuestación por desempeño y resultados que mejoren la calidad del ciclo de la inversión pública tanto en el nivel nacional como en el territorial, en particular, la programación y la toma de decisiones de política con base en información proveniente del seguimiento y la evaluación.

En razón a que el Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 546-2016- FONADE (ahora ENTerritorio S.A.) 216138, finalizó el 31 de mayo de 2019, y subsistía la necesidad de adelantar la correspondiente contratación para garantizar el cumplimiento de los compromisos, metas y resultados acordados en cada Contrato Plan / Pacto Territorial, a través de la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan / Pactos Territoriales, el 24 de mayo de 2019 el DNP y ENTerritorio S.A. suscribieron el Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 558 / ENTerritorio 219057, que tenía por objeto lo siguiente: *“DNP*

icontec ISO 9001 TR-CO22-962903 · icontec ISO 37001 TR-CMD-SG-0001'2 · icontec ISO / IEC 27001 TR-CO22-962904 · icontec ISO 45001 TR-CO22-962902 · icontec ISO 14001 TR-CO22-962901

confiere mandato a ENTerritorio para realizar la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan / Pactos Territoriales con los recursos que ingresen a este y los demás que le sean transferidos", cuyo término de ejecución fue hasta el 14 de enero de 2021, conforme lo dispuso el Otrosí No. 3, suscrito el 14 de diciembre de 2020.

Igualmente, y en razón a que el Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 558 / ENTerritorio 219057 finalizó el 14 de enero de 2021 y subsistía la necesidad de adelantar la correspondiente contratación para garantizar el cumplimiento de los compromisos, metas y resultados acordados en cada Contrato Plan, el 15 de enero de 2021, el DNP y ENTerritorio suscribieron el Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 226-2021 ENTerritorio 221001 que tiene por objeto lo siguiente: *"DNP confiere mandato a ENTerritorio para realizar la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan / Pactos Territoriales con los recursos que ingresen a este y los demás que le sean transferidos", con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021".*

El 14 de septiembre de 2021, se suscribió acta de terminación anticipada por mutuo acuerdo del Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 226-2021 ENTerritorio 221001, con el fin de proceder al trámite de un nuevo contrato de mandato para las vigencias 2021-2025, que permita la administración de recursos y el seguimiento técnico, jurídico y administrativo de los 20 contratos específicos aún en ejecución, así como las demás iniciativas priorizadas en el marco de los Pactos Territoriales vigentes, que permitirán coadyuvar el cumplimiento del objetivo principal del Proyecto de Inversión *APOYO AL DESARROLLO DE PROYECTOS A TRAVÉS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES/CONTRATOS PLAN NACION.*

En virtud de lo anterior, el 15 de septiembre de 2021, el DNP y ENTerritorio S.A. suscribieron el Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877-2021 ENTerritorio 221009 que tiene por objeto lo siguiente: *"DNP confiere mandato a ENTerritorio para realizar la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan / Pactos Territoriales con los recursos que ingresen a este y los demás que le sean transferidos"*, con un plazo inicial de ejecución hasta el 15 de noviembre de 2025, el cual fue adicionado y prorrogado hasta el 31 de julio de 2026.

Con ocasión del contrato de mandato celebrado con el DNP, ENTerritorio S.A. debe adelantar, entre otras, las siguientes actividades, acorde con la Cláusula Segunda del precitado Contrato de Mandato:

> *"(…)*
>
> *5) Como condición previa a la celebración de los contratos específicos, el mandatario deberá verificar y dejar constancia de la viabilidad técnica que la entidad competente emita con relación a los proyectos de inversión o programas priorizados en el marco del Contrato Plan/Pacto Territorial, así como deberá verificar y dejar constancia de la viabilidad jurídica y financiera del mismo con fundamento en la información que le sea remitida, de conformidad con los lineamientos que se establezcan en el reglamento operativo del Fondo Regional de Contratos Plan/Pactos Territoriales que hace parte integral del Contrato.*
>
> *6) Celebrar los contratos específicos en los términos descritos en el Decreto No. 1082 de 2015, adicionado por el Decreto No. 740 de 2016 o la norma que lo modifique o sustituya, así como los demás actos jurídicos que se requieren para el desarrollo del contrato de mandato con cargo a los recursos del Fondo y adelantar las gestiones previas necesarias para su suscripción de manera autónoma manteniendo indemne al DNP frente a cualquier reclamación.*
>
> *(…)*
>
> *11) Efectuar los giros, liquidaciones y deducciones a que haya lugar en desarrollo de los Contratos Específicos, previa certificación del cumplimiento de los requisitos jurídicos, técnicos y financieros previstos para su desembolso establecidos en los procedimientos de pago de ENTerritorio en su calidad de administrador del Fondo.*
>
> *(…)*
>
> *19. Realizar el seguimiento financiero y administrativo a la ejecución de los recursos que concurran a los proyectos y aquellos que le sean transferidos para el cumplimiento de los acuerdos, metas y compromisos adquiridos en los Contratos Plan/Pactos Territoriales con relación a*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

los contratos específicos que hayan sido celebrados en virtud de los contratos de mandato anteriores o aquellos que se celebren y de acuerdo al mecanismo que se pacte en los contratos específicos y en el reglamento operativo del Fondo. Este seguimiento no implica supervisión ni la vigilancia y el control de la ejecución contractual de los recursos en los proyectos financiados a través del Contrato, en tanto esta es responsabilidad de las entidades ejecutoras; sin embargo, en los contratos específicos se deben incluir los mecanismos necesarios para mantener indemne al DNP y al FONDO para aquellos eventos en que el contrato no llegue a feliz término

(…)"

Ahora bien, ENTerritorio S.A. presentó la propuesta técnica y económica cuyo alcance consistió en ofertar un servicio de gestión de proyectos, que son priorizados en los Contratos Plan bajo el marco de la línea de negocio de Gestión de Proyectos. De acuerdo con lo establecido en el Manual de Líneas de Negocio M-CM-01, ENTerritorio S.A. en cumplimiento de su objeto social desarrolla tres líneas de negocios: Gerencia de Proyectos, Gestión de Proyectos y Estructuración y Evaluación de Proyectos. Bajo estas líneas, opera en el mercado y ofrece servicios de valor a sus clientes, siendo ofertadas conforme el Procedimiento de Negociación de Líneas Misionales establecido en el sistema de gestión de calidad de la Entidad.

El Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877-2021 ENTerritorio 221009, se enmarcó en la línea de negocios de gestión de proyectos de ENTerritorio S.A., el cual, ha sido desarrollado por la entidad, en virtud de las competencias definidas en el artículo segundo del Decreto 288 de 2004, en el que se señala que esta entidad "tiene por objeto principal ser Agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la preparación, financiación y administración de estudios, y la preparación, financiación, administración y ejecución de proyectos de desarrollo en cualquiera de sus etapas".

La línea de negocios de ENTerritorio S.A. se encuentra enfocada a la gestión de proyectos, lo que permite contribuir para que las entidades hagan el mejor uso de los recursos disponibles para alcanzar la ejecución exitosa de sus proyectos y alcanzar los resultados esperados. Esta línea de negocio es congruente con los esquemas de gestión y dirección que se conocen; e incorpora elementos que proporcionan a los clientes eficiencia, economía, seguridad, desarrollo, impacto y soporte para los proyectos que ejecutan.

El alcance de la Gestión de Proyectos de ENTerritorio S.A. consiste, en que realizan tareas de acompañamiento para proyectos de desarrollo o parte de ellos, asumiendo obligaciones de intermediación con su cliente, compartiendo actividades y tareas específicas con el ejecutor, generando valor agregado de orden técnico, financiero, jurídico y de control al proyecto.

En este caso particular, tratándose de la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan, el alcance de los servicios estará circunscrito a las actividades previstas en el artículo 2.2.13.1.2.4. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 740 de 2016 y las que se acuerden en el Contrato de Mandato bajo el marco normativo que regula los Contratos Plan, los Pactos Territoriales y el Fondo Regional para los Pactos Territoriales / Contratos Plan.

En relación con la responsabilidad que asume ENTerritorio S.A. en la línea de negocio de gestión de proyectos, se aclara que esta entidad no asume la responsabilidad por el resultado del proyecto, en ese sentido su responsabilidad solamente se predica en la ejecución oportuna y efectiva de las acciones de acompañamiento, asesoría, administración y/o intermediación, para proveer los elementos que la ejecución del proyecto le demande a la entidad contratante.

En este sentido, en consideración a que la intervención de ENTerritorio S.A. normalmente está sujeta a la participación de su cliente y a su obligación de desarrollar o implementar el proyecto de que se trata; en ningún caso podrá comprometerse con la obtención del resultado; por lo que en caso de que se presente una omisión o una afectación propia o de un tercero, por efectos de la no implementación del proyecto, podrá solicitar las indemnizaciones a que haya lugar.

Visto el alcance de la responsabilidad que le asiste a ENTerritorio S.A. en el Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877-2021 ENTerritorio 221009, bajo la línea de negocios Gestión de Proyectos, con ocasión del seguimiento a la transferencia de

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

icontec ISO 9001 TR-CO22-962903
icontec ISO 37001 TR-CMD-SG-000'2
icontec ISO / IEC 27001 TR-CO22-962904
icontec ISO 45001 TR-CO22-962902
icontec ISO 14001 TR-CO22-962901

recursos, en ningún caso ENTerritorio S.A.es el responsable de realizar la vigilancia y el control de la ejecución contractual, en cuanto a los aspectos técnicos, jurídicos y financieros de los recursos en los proyectos financiados a través del Pacto Territorial / Contrato Plan, pues ésta corresponde expresamente a las entidades ejecutoras que se definan para cada proyecto en el contrato específico, en los términos descritos en los artículos 2.2.13.1.1.6. y 2.2.13.1.2.7 del Decreto No. 1082 de 2015, como se señaló anteriormente.

II. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

En el marco de lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley 2294 de 2023, a la fecha hay trece (13) pactos territoriales en ejecución (Bicentenario, Golfo de Morrosquillo, Cesar- La Guajira, Santander, Río Bogotá, Por el Arte, la Cultura y la Vida, Magdalena, Casanare, Catatumbo, Boyacá, Nariño, Cauca y Chocó.).

De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.3.2 del documento CONPES 4023 del 11 de febrero de 2021, se destaca a los Pactos Territoriales dentro de los mecanismos de articulación institucional entre niveles de gobierno, por lo cual en las recomendaciones del referido documento, numeral 3, literal C se solicita al DNP "implementar una estrategia de dinamización de los proyectos de impacto regional para la reactivación; como impulso importante al proceso de reactivación económica", para lo cual el Fondo Regional para los Pactos Territoriales- FRPT, se convierte en el vehículo que da cumplimiento a la recomendación como estrategia de dinamización para superar la crisis financiera causada por el COVID-19.

Así las cosas, estos proyectos de inversión priorizados en los Planes Estratégicos de los Pactos Territoriales vigentes han sido concertados de manera articulada entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, dada su importancia en el desarrollo económico y social del país, por lo que es fundamental impulsar su financiación y ejecución, para apoyar el desarrollo de las regiones y contrarrestar los efectos del COVID-19, que desencadenaron una crisis económica sin precedentes, toda vez que dicha emergencia de salud ocasionó una contracción de la economía colombiana calculada para el 2020 en 6,8%, además de un aumento en el índice de pobreza monetaria, que registra un nivel del 42,5% y en el índice de pobreza monetaria extrema, con el 15,1% de acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)1.

En ese mismo orden de acción, el pasado 19 de julio del 2021, se expidió el documento **CONPES 4037** mediante el cual se declaró la importancia estratégica del proyecto de inversión: *"Apoyo al desarrollo de proyectos a través del Fondo Regional para los Contratos Plan"*, de acuerdo con el aval fiscal otorgado por el Confis14, para impulsar el desarrollo territorial a través de la destinación de recursos para la ejecución de 142 proyectos de inversión priorizados en los Pactos Territoriales: Atlántico, Bolívar, Casanare, Cesar- La Guajira, Cundinamarca, Golfo de Morrosquillo, Río Bogotá y Santander.

A su vez, el pasado 29 de diciembre de 2023, se expidió el documentos **CONPES 4101,** a través del cual se realizó la ***"MODIFICACIÓN AL DOCUMENTO CONPES 4037 DECLARACIÓN DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DEL PROYECTO APOYO AL DESARROLLO DE PROYECTOS A TRAVÉS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS CONTRATOS PLAN, AHORA PACTOS TERRITORIALES".*** Dicho lo anterior *"(…) La Secretaría Técnica del CONPES, en uso de las facultades conferidas por el artículo 2.2.12.3.3 del Decreto 1082 de 2015, expide la presente adenda al Documento CONPES 4101 Modificación al Documento Conpes 4037 Declaración de Importancia Estratégica del Proyecto Apoyo al Desarrollo de Proyectos a través del Fondo Regional para los Contratos Plan, Ahora Pactos Territoriales aprobado en 2022, que tiene como objetivo garantizar los recursos financieros necesarios para fomentar la articulación institucional y el crecimiento económico en las regiones mediante la ejecución de 151 proyectos de inversión priorizados en los Pactos Territoriales de Atlántico, Bolívar, Casanare, Cesar La Guajira, Cundinamarca, Golfo de Morrosquillo, Magdalena, Río Bogotá y Santander (…)".*

[1] https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/ pobreza-monetaria

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

De esta manera, con fundamento en el marco constitucional, legal y de política pública que regula los Pactos Territoriales / Contratos Plan, **el 14 de agosto de 2025**, se suscribió el **Pacto Boyacá, Raíz y Futuro: Transformación Económica Justicia Social en Armonía con la Naturaleza**, con el objeto de *"Implementar políticas y proyectos estratégicos en el departamento de Boyacá, que promuevan la transformación productiva para una tierra grande, competitiva y equitativa, alineadas con los principios del Gobierno Nacional. Todo ello para lograr una transición energética justa, que permita transitar de las actividades económicas extractivistas, a la agroindustria, el turismo y las energías alternativas, sumado a la generación de bienestar con el fortalecimiento del acceso a servicios esenciales como salud, agua potable y saneamiento básico, educación e infraestructura estratégica, para lograr el cierre de brechas y promover la vida en el territorio Boyacense".*

El Pacto Boyacá, Raíz y Futuro: Transformación Económica Justicia Social en Armonía con la Naturaleza, aplica a las entidades signatarias y a las que representan, y se suscribe en el marco de lo previsto en el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 *"Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad".*

Además, la Focalización Territorial del **El Pacto Boyacá, Raíz y Futuro: Transformación Económica Justicia Social en Armonía con la Naturaleza** se extiende a la totalidad del departamento de Boyacá, que cuenta con 23.189 Km2 de superficie y 123 municipios localizados en 13 provincias. Está ubicado en el centro oriente del país y lo atraviesa la Cordillera Oriental de la región Andina Colombiana, por consiguiente, tiene una topografía muy variada a la cual se suma también la variedad de climas.

El Pacto Boyacá, Raíz y Futuro: Transformación Económica Justicia Social en Armonía con la Naturaleza, tiene un plazo de ejecución de **cinco (5) años** contados a partir de su suscripción, por lo que su fecha de terminación está prevista para el **13 de agosto de 2030.**

Con base en lo anteriormente descrito, mediante el radicado **DNP 20254330761971 del 07 de noviembre de 2025 / ENTerritorio 202561010242952 del 07 noviembre de 2025,** la Gerencia Nacional para los Pactos Territoriales del Departamento Nacional de Planeación, solicitó al Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, la verificación sobre el cumplimiento de requisitos técnicos, jurídicos y financieros para la posible asignación de recursos al proyecto denominado ***"MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES LÍMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON – TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA".***

Como anexo a estos oficios, se remitió documentación, mediante el Gobernador del Departamento de Boyacá, señor **CARLOS ANDRES AMAYA RODRIGUEZ,** presentó al DNP el proyecto anteriormente descrito, para contar con la financiación de este por la suma de **SETENTA MIL TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON TRES CENTAVOS ($70, 031, 648,339.03)**

Igualmente, en la información aportada por el secretario de despacho adscrito a la secretaría de contratación del Departamento de Boyacá, de mediante la cual se indicó que el proyecto fue priorizado en el **Acta Consejo Directivo No. º 2 del 07 de Noviembre de 2025 del Pacto Boyacá, Raíz y Futuro: Transformación Económica Justicia Social en Armonía con la Naturaleza**, e incluido en el Plan de Acción del mismo año.

Por lo anterior, mediante oficio con radicado **ENTerritorio S.A. No. 202534010018421 del 07 de noviembre de 2025,** dirigido a la Gerente Nacional de los Pactos Territoriales del DNP, y suscrito por Gerente de unidad Grupo de Proyectos Especiales y el Gestor del FRPT, se dio respuesta a la solicitud de verificación de la viabilidad técnica, jurídica y financiera para la posible asignación de recursos del proyecto, dejando a consideración del DNP se adelantasen las gestiones necesarias para continuar con los trámites respectivos.

icontec ISO 9001 TR-CO22-962903 · icontec ISO 37001 TR-CMD-SG-000'2 · icontec ISO / IEC 27001 TR-CO22-962904 · icontec ISO 45001 TR-CO22-962902 · icontec ISO 14001 TR-CO22-962901

Con fundamento en esta información, la Secretaria General del Departamento Nacional de Planeación, mediante oficio de radicado **DNP 20256000762361 del 07 de noviembre de 2025**, dio la instrucción a la Gerencia de ENTerritorio S.A., de iniciar las gestiones necesarias para cofinanciar con recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, el proyecto de inversión priorizado e incluido en el Plan de Acción 2025 del **Pacto Boyacá, Raíz y Futuro: Transformación Económica Justicia Social en Armonía con la Naturaleza**, denominado: ***"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON -TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ",*** por un valor total de **SETENTA MIL TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON TRES CENTAVOS ($70, 031, 648,339.03)** de las vigencias 2025 y 2026

Por todo lo anterior, se encuentra la procedencia de suscribir el Contrato Específico, para la cofinanciación del proyecto denominado ***"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON -TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ",***

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

III. VERIFICACIÓN DE LA VIABILIDAD TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO

En atención a lo previsto en el artículo 2.2.13.1.1.6. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 740 del 4 de mayo de 2016, que establece como condición para la celebración de los contratos específicos derivados de los Contratos Plan / Pactos Territoriales la viabilidad técnica, jurídica y financiera, ENTerritorio S.A. en virtud de la obligación No. 5 de la Cláusula Segunda, referida a las obligaciones del Mandatario del **Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877 / ENTerritorio 221009 de 2021**, procede a verificar los mencionados aspectos:

3.1 COMPONENTE TÉCNICO

El Coordinador Técnico del Fondo Regional de Pactos Territoriales conceptúa sobre la verificación de la viabilidad técnica del proyecto que hoy es objeto de atención bajo los siguientes criterios y argumentos:

Identificador: 995029

I. ESTADO ACTUAL

En la actualidad es difícil la intercomunicación terrestre de la red vial secundaria de la provincia de Márquez en el departamento de Boyacá; específicamente en Los corredores denominados Ventaquemada - Turmequé – Tibana y Vía Sector Límites Cundinamarca (Hacia Villapinzón) – Turmequé, debido a que, estas vías se encuentran en mal estado, y en temporada de lluvias se vuelven intransitables generando restricciones en el tránsito vehicular; A pesar del mantenimiento rutinario que se realiza a estas vías, las condiciones de deterioro de la superficie de rodadura son muy grandes, evidenciando estos problemas en la pérdida de capa de rodadura, hundimientos y fallas que se presentan en estos corredores en mención; lo que hacen que las labores de mantenimiento sean insuficientes y que con esto persistan los problemas de circulación vehicular por cada una de estas vías.

La persistencia del problema causa que se aumenten los tiempos de desplazamiento, llevando a que se retrasen actividades como el acceso oportuno a servicios médicos por parte de la población, que aumente la inasistencia de estudiantes a escuelas y colegios.
Igualmente se incrementan los costos de transporte y mantenimiento de vehículos, lo que repercute en dificultades para la comercialización de los productos agrícolas y pecuarios, generando por tanto que se dé una menor oferta y demanda de los productos producidos por cada uno de estos municipios.

II. ALCANCE DEL PROYECTO:

El objetivo principal del proyecto es el “MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON -TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.

3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


Población Beneficiaria: 59.102 en los municipios de Ventaquemada, Turmequé, Nuevo Colon, Tibana y límites con el municipio de Villapinzón

Fuente de información: DANE CENSO 2018 PROYECCIONES 2024


.

LOCALIZACIÓN

Se muestra la localización de los siete (7) tramos a intervenir, evidenciando la longitud de cada tramo y las abscisas de inicio y fin. Cada tramo cuenta con la topografía implantada tomada en campo con sus respectivas coordenadas planas y que son del alcance del proyecto.

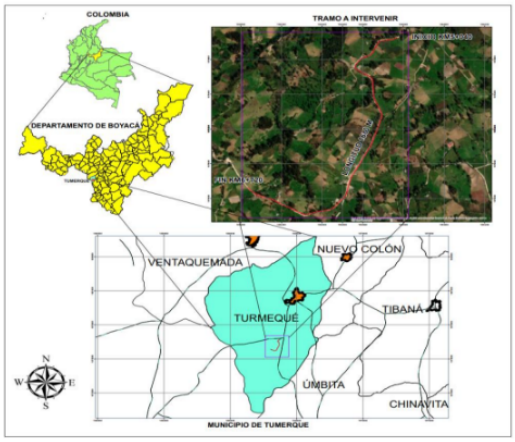


Localización Tramo 1

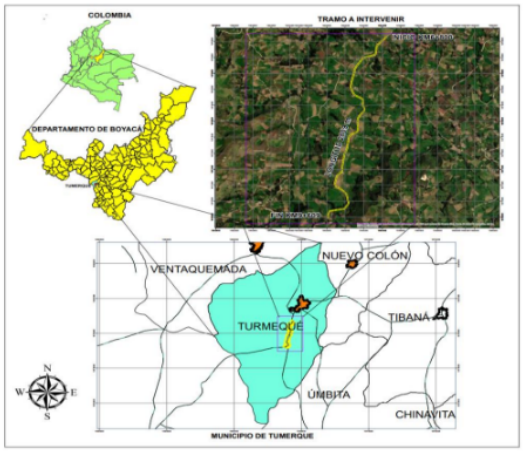


Localización Tramo 2


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

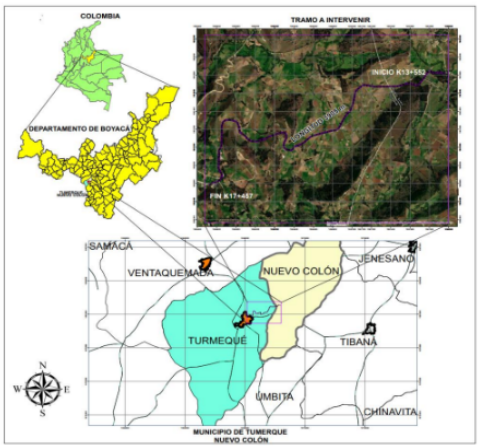


Localización Tramo 3

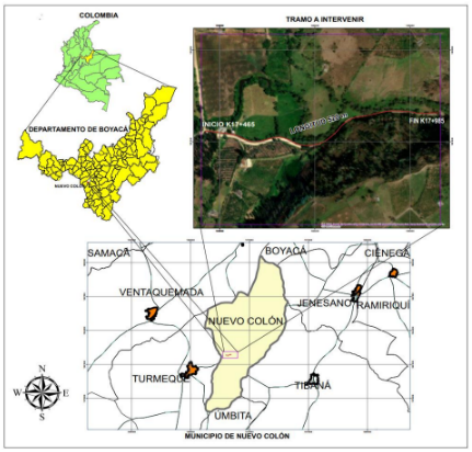


Localización 4

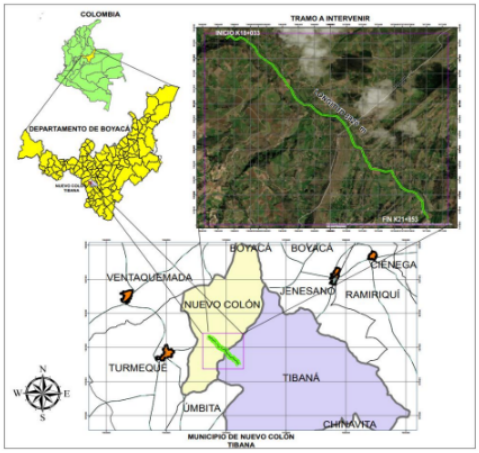

Localización Tramo 5

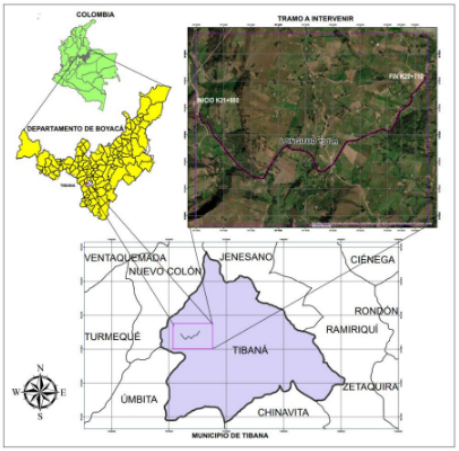

Localización Tramo 6

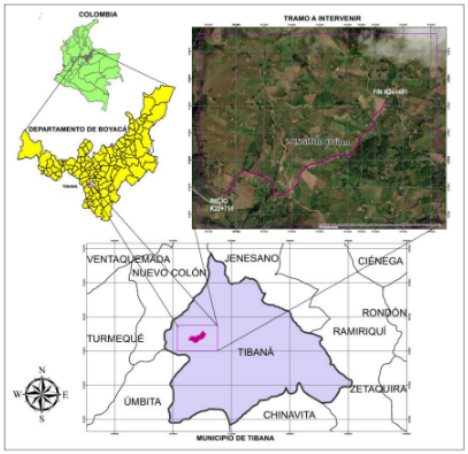


Localización Tramo 7

El proyecto comprende la construcción de una estructura de pavimento flexibles en siete (7) tramos para un total de 15,194 km de vía.


TRAMO	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	LONGITUD (m)
TRAMO N° 1	K5+040	K6+720	1680
TRAMO N° 2	K6+800	K9+609	2809
TRAMO N° 3	K13+552	K17+457	3905
TRAMO N° 4	K17+465	K17+985	520
TRAMO N° 5	K18+033	K21+853	3820
TRAMO N° 6	K21+980	K22+710	730
TRAMO N° 7	K22+751	K24+481	1730
		TOTAL INTERVENCIÓN (m)	**15194**

Actividades principales que están asociadas al mejoramiento de la vía secundaria se listan a continuación:

- Realizar obras preliminares: estas consisten en localización y replanteo topográfico, cuneteo y perfilado de la subrasante de acuerdo a los diseños establecidos.
- Implementar el mejoramiento de la via secundaria para la estructura de pavimento en tipo flexible con una calzada bidireccional de 6.0 metros con dos carriles de 3.0 metros cada uno y cunetas en cada costado, carpeta asfáltica de 9 cm y 8 cm respectivamente y según cada uno de los tramos propuestos, base granular de 20cm y 25 cm, respectivamente y subbase de 35 cm; tal como se puede observar en la siguiente imagen:



Tramo 1 y 2



Tramos 3, 4, 5, 6 y 7

- Construir obras de drenaje (alcantarillas de 36" en los sitios dispuestos en el estudio hidrológico).
- Señalización Vial: Se realizará instalación de señales verticales y horizontales a fin de ofrecer seguridad a los actores viales.
- PMT: Los costos de PMT y sus actividades desprenden al estudio técnico para la gestión de la movilidad mientras se desarrollen las obras en el tramo vial.
- PAGA: El plan de adaptación a la guía ambiental se encarga de realizar un acompañamiento continuo a las actividades de la obra, y todas sus afectaciones sobre flora fauna y recurso hídrico, la intención de este es salvaguardar las especies nativas de la intervención que se genera y mitigar las afectaciones

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TRAMO 1 Y TRAMO 2 “TURMEQUÉ-VILLAPINZÓN" (K5+040 hasta K9+609

TRAMO	ABSCISA INICIO_	ABSCISA FIN	LONGITUD (M)
TRAMO 01	K5+040	K6+720	1680
TRAMO 02	K6+800	K9+609	2809

Actividades principales que están asociadas al mejoramiento de 4.489 (ML); de la vía secundaria que se listan a continuación:

- Realizar obras preliminares: estas consisten en localización y replanteo topográfico,
- cuneteo y perfilado de la subrasante de acuerdo a los diseños establecidos.
- Implementar el mejoramiento de la vía secundaria para la estructura de pavimento en
- tipo flexible con un ancho de 6 m, carpeta asfáltica de 9 cm, una base granular de 20 cm y
- subbase de 35 cm.
- Construir obras de drenaje (27 alcantarillas de 36" en los sitios dispuestos en el estudio
- hidrológico, Construcción de 6 Box culvert).
- Señalización Vial: Se realizará instalación de señales verticales y horizontales a fin de
- ofrecer seguridad a los actores viales.
- Caracterización vial del tramo para el registro de información en el Sistema información Nacional de Carreteras SINC.

TRAMO 3 "TURMEQUÉ-NUEVO COLÓN. PTE RÍO TURMEQUÉ"
(K13+552 hasta K17+457)

TRAMO	ABSCISA INICIO_	ABSCISA FIN	LONGITUD (M)
TRAMO 3	K13+552	K17+457	3905

Actividades principales que están asociadas al mejoramiento de 3.905 (ML); de la vía secundaria que se listan a continuación:

- Realizar obras preliminares: estas consisten en localización y replanteo topográfico,
- cuneteo y perfilado de la subrasante de acuerdo a los diseños establecidos.
- Implementar el mejoramiento de la vía secundaria para la estructura de pavimento en
- tipo flexible con un ancho de 6 m, carpeta asfáltica de 8 cm, una base granular de 25 cm y
- subbase de 35 cm.
- Construir obras de drenaje (28 alcantarillas de 36" en los sitios dispuestos en el estudio
- hidrológico, Construcción de 5 Box culvert).
- Señalización Vial: Se realizará instalación de señales verticales y horizontales a fin de
- ofrecer seguridad a los actores viales.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

- Caracterización vial del tramo para el registro de información en el Sistema información Nacional de Carreteras SINC

TRAMO 4 (K17+465 - K17+985), TRAMO 5 (K18+033 - K21+853) TRAMO 6 (K21+980 HASTA K22+710), TRAMO 7 (K22+751 HASTA K24+481).

TRAMO	ABSCISA INICIO_	ABSCISA FIN	LONGITUD (M)
TRAMO 4	K17+465	K17+985	520
TRAMO 5	K18+033	K21+853	3820
TRAMO 6	K21+980	K22+710	730
TRAMO 7	K22+751	K24+481	1730

Actividades principales que están asociadas al mejoramiento de 6.800 (ML); de la vía secundaria que se listan a continuación:

- Realizar obras preliminares: estas consisten en localización y replanteo topográfico,
- cuneteo y perfilado de la subrasante de acuerdo a los diseños establecidos.
- Implementar el mejoramiento de la vía secundaria para la estructura de pavimento en
- tipo flexible con un ancho de 6 (m), carpeta asfáltica de 8 (cm), una base granular de 25
- (cm) y subbase de 35 (cm).
- Construir obras de drenaje (71 alcantarillas de 36" en los sitios dispuestos en el estudio
- hidrológico, Construcción de 7 Box culvert).
- Señalización Vial: Se realizará instalación de señales verticales y horizontales a fin de
- ofrecer seguridad a los actores viales.
- Caracterización vial del tramo para el registro de información en el Sistema información Nacional de Carreteras SINC.

ENTIDAD EJECUTORA Y FUENTE DE FINANCIACIÓN

Entidades Designadas como ejecutoras del proyecto	Gobernación de Boyacá
Entidad Designada para la contratación Obra e interventoría	Gobernación de Boyacá

Fuente Financiación	Valor Aporte	Valor obra	Valor Interventoría
Fondo Regional para los Pactos Territoriales	$ 70.031.648.339,03	$ 65,450,138,634.58	$ 4,581,509,704.42

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 70.031.648.339,03**

III. PRESUPUESTOS

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	COSTO DITECTO VR UNITARIO	VALOR UNITARIO (INCLUYE FACTOR DE INCREMENTO Y AIU)	VR TOTAL (COSTO DIRECTO)	VR TOTAL (INCLUYE INCREMENTO POR DISTANCIA Y AIU)
1		REALIZAR MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONFORMACION	TIPO:		OBRA PÚBLICA	
1,1	3.02.03	EXCAVACIÓN DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA.(INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	$ 20.252,01	$ 26.327,61	$ 1.441.237.329,45	$ 1.873.608.528,28
1,2	3.04.03	CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION)	$ 1.908.123,00	$ 2.480.559,90	$ 29.003.469,60	$ 37.704.510,48
1,3	4.01.07	RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	$ 31.742,33	$ 41.265,03	$ 780.665.467,82	$ 1.014.865.108,17
				COSTO DIRECTO GRUPO	$ 2.250.906.266,87	
				A	$ 495.199.378,71	
				I	$ 67.527.188,01	
				U	$ 112.545.313,34	
				VALOR TOTAL A.I.U	$ 675.271.880,06	
				COSTO DIRECTO + AIU	$ 2.926.178.146,93	2.926.178.146,93

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR UNITARIO (INCLUYE FACTOR DE INCREMENTO Y AIU)	VR TOTAL (COSTO DIRECTO)	VR TOTAL (INLCUYE INCREMENTO POR DISTANCIA Y AIU)
2		CONSTRUIR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	TIPO:		OBRA PÚBLICA	
2,1	3.13.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA(TIRA ANCHA)=33.8 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	$ 10.091,37	$ 13.905,91	$ 712.747.735,24	$ 926.572.055,81
2,2	3.04.05	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**)	$ 106.587,96	$ 138.564,35	$ 605.453.720,95	$ 787.089.837,24
2,3	3.04.07	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	$ 140.355,91	$ 182.462,68	$ 3.273.245.791,35	$ 4.255.219.528,76
2,4	3.04.06	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	$ 145.808,19	$ 189.550,65	$ 2.285.337.788,70	$ 2.970.939.125,32
2,5	3.06.09	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CRR-1 O SIMILAR	$ 4.913,16	$ 6.770,33	$ 347.013.702,09	$ 451.117.812,72
2,6	3.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE MDC-19. INCLUYE BARRIDO, SOPLADO, SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM) NORMA INVIAS (**).	$ 1.127.227,78	$ 1.465.396,11	$ 6.230.616.286,64	$ 8.099.801.172,61
2,7	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	$ 2.765,10	$ 3.594,63	$ 6.081.297.813,08	$ 7.905.687.157,01
2,8	3.12.04	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (MEDIDA EN BANCO).	$ 3.452,40	$ 4.488,12	$ 783.440.254,55	$ 1.018.472.330,91
				COSTO DIRECTO GRUPO	$ 20.319.153.092,60	
				A	$ 4.470.213.680,37	
				I	$ 609.574.592,78	
				U	$ 1.015.957.654,63	
				VALOR TOTAL A.I.U	$ 6.095.745.927,78	
				COSTO DIRECTO + AIU	$ 26.414.899.020,38	26.414.899.020,38

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR UNITARIO (INCLUYE FACTOR DE INCREMENTO Y AIU)	VR TOTAL (COSTO DIRECTO)	VR TOTAL (INLCUYE INCREMENTO POR DISTANCIA Y AIU)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

3	CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN		TIPO:		OBRA PÚBLICA	
3,1	3.02.07	EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	$ 26.955,15	$ 35.041,70	$ 864.206.099,08	$ 1.123.467.928,81
3,2	3.03.02	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS. (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI GEOTEXTIL). (**)	$ 285.074,72	$ 370.597,14	$ 2.580.647.455,04	$ 3.354.841.691,55
	3.13.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	$ 9.754,14	$ 13.441,20	$ 763.764.831,05	$ 992.894.280,36
3,3	2.02.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO	$ 33.484,59	$ 46.141,77	$ 394.166.382,62	$ 512.416.297,40
3,4	2.01.10	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CICLOPEO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	$ 333.667,15	$ 433.767,30	$ 263.917.368,96	$ 343.092.579,65
3,5	3.03.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	$ 558.149,46	$ 769.129,96	$ 312.462.002,77	$ 406.200.603,59
3,6	5.03.02	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	$ 1.030.440,93	$ 1.419.947,60	$ 376.657.485,32	$ 489.654.730,92
3,7	5.03.01	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	$ 1.267.906,07	$ 1.747.174,56	$ 645.567.561,76	$ 839.237.830,29
3,8	5.03.05	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	$ 1.123.169,86	$ 1.547.728,07	$ 462.473.052,04	$ 601.214.967,66
3,9	5.03.04	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	$ 1.360.635,00	$ 1.874.955,03	$ 381.928.339,61	$ 496.506.841,49
3,10	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	$ 7.675,05	$ 10.576,22	$ 5.129.831.696,90	$ 6.668.781.205,97
3,11	3.03.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36". (INCLUYE EMBOQUILLADA Y ATRAQUE EN CONCRETO).	$ 724.942,31	$ 998.970,50	$ 543.117.209,41	$ 706.052.372,24
3,12	3.13.13	CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	$ 9.018,51	$ 11.724,06	$ 200.305.706,54	$ 260.397.418,50
3,13	3.03.05	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	$ 778.254,11	$ 1.072.434,16	$ 583.057.706,26	$ 757.975.018,14
3,14	A.P.U 3.14	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE CORONACIÓN (Incluye excavación manual, sacos de suelo cemento al 5%, geotextil NT-2500 y geomembrana HPDE 30 mils)	$ 1.185.843,62	$ 1.634.092,51	$ 7.974.610.300,37	$ 10.366.993.390,48
3,15	3.03.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	$ 846.630,59	$ 1.166.656,95	$ 1.982.545.031,69	$ 2.577.308.541,19
3,16	3.03.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H > 3.0 M.	$ 1.147.008,63	$ 1.580.577,89	$ 2.789.014.798,72	$ 3.625.719.238,34
				COSTO DIRECTO GRUPO	$ 26.248.273.028,14	
				A	$ 5.774.620.066,19	
				I	$ 787.448.190,84	
				U	$ 1.312.413.651,41	
				VALOR TOTAL A.I.U	$ 7.874.481.908,44	
				COSTO DIRECTO + AIU	$ 34.122.754.936,58	$ 34.122.754.936,58

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR UNITARIO (INCLUYE FACTOR DE INCREMENTO Y AIU)	VR TOTAL (COSTO DIRECTO)	VR TOTAL (INLCUYE INCREMENTO POR DISTANCIA Y AIU)
4	EJECUTAR SEÑALIZACION VIAL		TIPO:		OBRA PÚBLICA	
4,1	3.09.16	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS	$ 4.674,15	$ 6.440,98	$ 220.088.390,82	$ 286.114.908,06
4,2	3.09.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES	$ 15.574,35	$ 21.461,45	$ 91.673.427,48	$ 119.175.455,72
4,3	3.09.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 60 x 60 CM.	$ 391.513,02	$ 539.504,94	$ 50.215.459,95	$ 65.280.097,92
4,4	3.09.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS VIALES TRAMO RECTO, CAL. 12. 2 POSTES DE 1.50M. Y TERMINALES INCLUYENDO TORNILLERIA, CAPTA-FAROS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22 EN CINTA REFLECTIVA GRADO INGENIERIA SEGUN NORMA INVIAS	$ 289.588,67	$ 399.053,19	$ 282.692.347,49	$ 367.500.051,74
4,5	3.09.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL VIAL INFORMATIVA, TAMAÑO 2.0 M. x 0.50 M. (INCLUYE SOPORTE EN H SEGÚN NORMA INVIAS).	$ 1.003.679,69	$ 1.383.070,61	$ 10.639.004,71	$ 13.830.706,13
4,6	3.09.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL DE TAMAÑO 0.40M X 0.50 M. SEGUN NORMA INVIAS. (INCLUYE POSTE METÁLICO).	$ 368.159,23	$ 507.323,42	$ 209.173.348,12	$ 271.925.352,56
4,7	3.09.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE REFERENCIA METÁLICO	$ 565.979,69	$ 779.920,01	$ 5.999.384,71	$ 7.799.200,13

icontec ISO 9001 TR-CO22-962903
icontec ISO 37001 TR-CMD-SG-0001'2
icontec ISO / IEC 27001 TR-CO22-962904
icontec ISO 45001 TR-CO22-962902
icontec ISO 14001 TR-CO22-962901

4,8	3.09.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRÁFICO SEGUN NORMA INVIAS. (INCLUYE MICROESFERAS)	$ 66.332,65	$ 91.406,39	$ 66.208.462,01	$ 86.071.000,62
				COSTO DIRECTO GRUPO	$ 936.689.825,29	
				A	$ 206.071.761,56	
				I	$ 28.100.694,76	
				U	$ 46.834.491,26	
				VALOR TOTAL A.I.U	$ 281.006.947,59	
				COSTO DIRECTO + AIU	$ 1.217.696.772,88	**$ 1.217.696.772,88**

INFORMACIÓN CONSOLIDADA FORMULACIÓN INICIAL					
COSTO DIRECTO					**$ 49.755.022.212,90**
Bienes		$ -			
Servicios		$ -			
Obra Pública		$ 49.755.022.212,900			
COSTO INDIRECTO					**$ 15.695.116.421,71**
Administración	22,00%	$ 10.946.104.886,837			
Imprevistos	3,00%	$ 1.492.650.666,387	AIU	$ 14.926.506.663,87	
Utilidad	5,00%	$ 2.487.751.110,645			
AJUSTES Y/O REDISEÑOS		Otro Tipo de Gastos Adicionales			**$ 470.581.301,91**
PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (DISPOSITIVOS, SEÑALIZACION Y EQUIPOS)		Otro Tipo de Gastos Adicionales			$ 183.130.381,08
PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL		Otro Tipo de Gastos Adicionales			$ 66.587.085,58
CARCATERIZACIÓN DEL TRAMO VIAL		Otro Tipo de Gastos Adicionales			$ 48.310.989,27
SUBTOTAL					**$ 65.450.138.634,61**
		INTERVENTORIA			**$ 4.581.509.704,42**
TOTAL, PRESUPUESTO					**$ 70.031.648.339,03**

PLAZO DE EJECUCIÓN

El contrato especifico se estima ejecutar en un plazo de trece (13) meses distribuidos de la siguiente forma:

Etapa precontractual: Tres (3) meses para acciones administrativas
Etapa ejecución física: Nueve (9) meses
Etapa terminación: Uno (1) meses

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ENTIDAD QUE VIABILIZO EL PROYECTO

El proyecto radicado al DNP es fiel copia del proyecto de inversión radicado en el MINISTERIO DEL DEPORTE (MINDEPORTE) donde fue viabilizado.

VERIFICACIÓN TÉCNICA:

Con ocasión de la lista de validación de requisitos proyectos de inversión que hace parte del reglamento operativo del Fondo Regional para Pactos Territoriales, se realizó la verificación de la información del **Componente Técnico** frente la solicitud presentada por El DNP. Por lo anterior, **en el anexo 5**, se evidencia la verificación de los requerimientos establecidos en dicha lista, tanto los Generales como los Específicos de Deporte.

CONCLUSIÓN DE LA VERIFICACIÓN TÉCNICA

El Área técnica del FRPT verificó los requerimientos técnicos establecidos en la lista de "Requisitos Generales" y los "Requisitos Específicos de TRASPORTE" por ser un proyecto que no se ha financiado por el FRPT donde incluyen el **pronunciamiento técnico de proyectos de inversión FAVORABLE, expedido por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS,** del proyecto de inversión "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON -TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" que presenta los siguiente:

Alcance:

Financiar el "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON -TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

El anterior alcance se logrará con las siguientes actividades:

- Realizar obras preliminares: en localización y replanteo topográfico, cuneteo y perfilado de la subrasante de acuerdo a los diseños establecidos.
- Implementar el mejoramiento de la vía secundaria para la estructura de pavimento en tipo flexible con una calzada bidireccional de 6.0 metros con dos carriles de 3.0 metros cada uno y cunetas en cada costado, carpeta asfáltica de 9 cm y 8 cm respectivamente y según cada uno de los tramos propuestos, base granular de 20cm y 25 cm, respectivamente y subbase de 35 cm
- Construir obras de drenaje (alcantarillas 36" en los sitios dispuestos en el estudio hidrológico).
- Señalización Vial: Se realizará instalación de señales verticales y horizontales a fin de ofrecer seguridad a los actores viales.
- PMT: Los costos de PMT y sus actividades desprenden al estudio técnico para la gestión de la movilidad mientras se desarrollen las obras en el tramo vial.
- PAGA: El plan de adaptación a la guía ambiental se encarga de realizar un acompañamiento continuo a las actividades de la obra, y todas sus afectaciones sobre flora fauna y recurso hídrico, la intención de este es salvaguardar las especies nativas de la intervención que se genera y mitigar las afectaciones
- Caracterización vial del tramo para el registro de información en el Sistema información Nacional de Carreteras SINC.

Considerando que el área técnica del FRPT verificó los documentos presentados por la Gobernación de Boyacá, que son soporte del concepto técnico favorable sectorial FAVORABLE emitido por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS, la lista de verificación de requisitos establecida en el FRPT y copia digital de los documentos revisados los cuales constan en el radicado **DNP 20256000762361 del 07 de noviembre de 2025**, se recomienda adelantar los trámites necesarios para cofinanciar el proyecto con recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, mediante suscripción de Contrato Especifico con la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, por valor de **$70.031.648.339,03** en cuya minuta se plasmarán la meta y obligaciones de este documento de verificación, siempre y cuando el proyecto cuente con concepto favorable de verificación de los requisitos jurídicos y financieros.

Así mismo se aclara que El FRPT no viabiliza proyectos, por ello la responsabilidad del contenido, calidad y veracidad de los estudios y diseños es responsabilidad de la Entidad que los está presentando.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La anterior verificación de viabilidad técnica se emite con base en la documentación presentada por LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ al DNP, quien remitió a ENTerritorio para su verificación, la cual se presume veraz, y por lo tanto será al misma GOBERNACIÓN DE BOYACA, quien deberá responder ante los organismos de control de Estado por cualquier inexactitud o falsedad en la información que pueda ocasionar detrimento patrimonial de los recursos del Estado o un perjuicio a la comunidad y siempre y cuando el proyecto cuente con concepto favorable de verificación de los requisitos jurídicos y financieros.

3.2 COMPONENTE FINANCIERO

La Coordinadora Financiera del Fondo Regional de Pactos Territoriales, conceptúa sobre la verificación de la viabilidad financiera del proyecto que hoy es objeto de atención bajo los siguientes criterios y argumentos:

Con ocasión de la lista de validación de requisitos de proyectos de inversión que hace parte del reglamento operativo del Fondo Regional para Pactos Territoriales, se realizó la verificación de la información del **Componente Financiero** frente la solicitud presentada por El DNP, remitida por ENTerritorio según radicado n.º **202534010023671** de fecha **07 de noviembre de 2025**.

En el radicado DNP n.º **20254331412461** de fecha 07 de noviembre de 2025 y radicado ENTerritorio n.º **202561010315032** de fecha 07 de noviembre de 2025, se anexa carta de presentación en la cual se indica que el proyecto denominado: ***"Mejoramiento de las vías Departamentales límite Villapinzón – Turmequé y Turmequé – Nuevo Colon – Tibaná en el Departamento de Boyacá",*** que será cofinanciado con recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales – DNP.

En el radicado DNP n.º **20254331412461** de fecha 07 de noviembre de 2025 y radicado ENTerritorio n.º **202561010315032** de fecha 07 de noviembre de 2025, se presenta el presupuesto general del proyecto discriminando las actividades a ejecutar, Costo Directo, AIU (discriminado), Detallando los costos correspondientes a los impuestos aplicables al tipo de contrato por la entidad ejecutora: El presupuesto del proyecto se puede observar en los anexos correspondientes al numeral 11 de la lista de verificación.

Con la información financiera suministrada, se realizó la verificación aritmética y operaciones correspondientes de los diferentes Ítems dentro del presupuesto, se revisaron las bases y tarifas de los impuestos y contribuciones teniendo en cuenta el Estatuto Tributario Territorial, Nacional y normatividad aplicable a los contratos de obra pública (Art. 2 del Decreto 2418 del 2013, Art.

100 de la ley 21 de 1992 y Art.6, Ley 1106 de 2006), los cuales están excluidos de IVA ya que es un contrato que será celebrado y ejecutado por el Departamento de Boyacá, entidad del orden territorial.

Los impuestos y contribuciones aplicables al proyecto son: Retención en la fuente con tarifa del 2% de acuerdo al art. 1.2.4.9.1 del Decreto 1625 de 2016, y para interventoría de acuerdo al Artículo 1.2.4.10.1 del Decreto 1625 de 2016 (***se debe tener en cuenta la tarifa del 2% que aplica para los contratos de interventoría que incluyen factor multiplicador);*** contribución especial de obra pública con tarifa del 5% (solo aplica para obra), Estampillas y contribuciones con tarifa total 10.5, ICA (7x mil), dichas tarifas son aplicables para obra e interventoría, se allega certificación del 7 de noviembre de 2025 , suscritas por el Director de Contabilidad de la Secretaria de Hacienda de la Departamento de Boyacá, donde se indican los descuentos aplicados, para contratos de obra pública y de interventoría, teniendo en cuenta la Ordenanza 030 de 2017 por el cual se expide el Estatuto de rentas del Departamento de Boyacá. Se evidencio diferencia entre el certificado y las estampillas de la ordenanza.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En concordancia con las normas expuestas, las tarifas relacionadas en la certificación y su aplicabilidad para los contratos de obra pública e interventoría celebrados con la Departamento de Boyacá, el valor de las retenciones por concepto de impuestos y contribuciones para ejecutar el proyecto es el siguiente:

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBRA

CONCEPTO	TARIFA	BASE	VALOR
Retencion ICA	**0,7%**	$ 64.681.528.877	**$ 452.770.702**
Contribución Especial por Contrato de Obra Pública	5,0%	$ 64.681.528.877	$ 3.234.076.444
Estampilla Adulto Mayor	4,0%	$ 64.681.528.877	$ 2.587.261.155
Estampilla Procultura	2,0%	$ 64.681.528.877	$ 1.293.630.578
Estampilla Para la Justicia Familiar	2,0%	$ 64.681.528.877	$ 1.293.630.578
Tasa Pro deporte	2,5%	$ 64.681.528.877	$ 1.617.038.222
Sobretasa Bomberil	0,7%	$ 64.681.528.877	$ 452.770.702
TOTAL ESTAMPILLAS Y CONTRIBUCIONES DE OBRA	**16,2%**		**$ 10.478.407.678**

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES INTERVENTORÍA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONCEPTO	TARIFA	BASE	VALOR
Impuesto al Valor Agregado	**19,0%**	$ 3.850.008.155	**$ 731.501.549**
Retencion ICA	**0,7%**	$ 3.850.008.155	$ 26.950.057
Estampilla Adulto Mayor	4,0%	$ 3.850.008.155	$ 154.000.326
Estampilla Procultura	2,0%	$ 3.850.008.155	$ 77.000.163
Estampilla Para la Justicia Familiar	2,0%	$ 3.850.008.155	$ 77.000.163
Tasa Pro deporte	2,5%	$ 3.850.008.155	$ 96.250.204
Sobretasa Bomberil	0,7%	$ 3.850.008.155	$ 26.950.057
TOTAL ESTAMPILLAS Y CONTRIBUCIONES DE INTERVENTORÍA	**11,2%**		**$ 431.200.913**
TOTAL ESTAMPILLAS Y CONTRIBUCIONES DEL PROYECTO			**$ 10.909.608.591**

Una vez validada la información allegada del presupuesto total por $ 70.031.648.339,03, en el cual se discrimina conceptos para obra y para interventoría.

Se presenta presupuesto de obra por valor total de $ 65.450.138.634,61, costos de licenciamiento por valor total de $ 768.609.758, al igual, se incluye AIU por valor de $14.926.506.663,87, en donde se incluyen los impuestos y contribuciones atribuibles del 15.5% por valor $ 8.099.510.959, de acuerdo con las tarifas certificadas por el Departamento de Boyacá como Entidad ejecutora designada.

Se evidencio que lo relacionado en el presupuesto está acorde a la certificación firmada por la gobernación pero que no concuerda con la ordenanza.

El presupuesto de interventoría de obra por valor total de $4.581.509.704,42 incluye IVA del 19% por $731.501.549,45, se detalla factor multiplicador del 2.3.

Es importante tener en cuenta que los impuestos y contribuciones aplicables se determinan sobre el valor total antes de IVA, las retenciones aplicadas a los contratos de interventoría que contienen factor multiplicador deben ser con las tarifas relacionadas en el Artículo 1.2.4.10.1 del Decreto 1625 de 2016 "**Retención en la fuente en contratos de consultoría de obras públicas con factor multiplicador**", el **Artículo 1.3.1.13.6. "Las tasas y contribuciones están excluidas del impuesto sobre las ventas"** y/o tarifas vigentes para este tipo de contratos, así mismo, se recomienda hacer el respectivo seguimiento a la aplicación de las tarifas vigentes durante la ejecución del proyecto y giro de dichos recursos a las Entidades determinadas como sujeto Activo.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


Se aclara que ENTERRITORIO no asumirá costos adicionales por impuestos u otros valores que afecten la ejecución de las actividades relacionadas en el presupuesto y que la responsabilidad de la aplicación correcta de las tarifas y de asumir costos adicionales a lo presupuestado es de la entidad ejecutora.

En el radicado DNP n.º **20254331412461** de fecha 07 de noviembre de 2025 y radicado ENTerritorio n.º **202561010315032** de fecha 07 de noviembre de 2025, se presenta cronograma con el flujo de fondos, este mismo contempla una etapa precontractual de 3 meses, un periodo de ejecución de obra de 9 meses y 1 mes para la etapa de liquidación, así mismo se detalla el costo total de la obra, suministro y el costo la interventoría, en el documento se refleja la misma información relacionada en la carta de presentación. El documento se encuentra firmado por el Secretario de Infraestructura Publica – Leonardo Álvarez, con TP 25202-254770 cnd . El soporte del cronograma se puede observar en el anexo del numeral 17 de la lista de verificación del proyecto.

Frente a la información señalada en el cronograma de ejecución y flujo de fondos, se evidencia que el proyecto presenta un flujo de recursos, en donde el proyecto es cofinanciado por el Fondo Regional para los Pactos Territoriales – DNP en donde se distribuyen desde el mes 4 hasta el mes 12 (ejecución del proyecto), los meses del 1 al 3 corresponden al periodo de contratación y el mes 13 al periodo de liquidación del proyecto, en los cuales se realizará el seguimiento por medio de los informes mensuales.

Conforme a la carta de presentación se discriminan 3 meses para la etapa precontractual, para la ejecución de la obra 9 meses y para la etapa de liquidación 1 meses

De manera particular, desde el mes 4 se observa el flujo de recursos, siendo los meses seis (6), siete (7) y ocho (8) donde el porcentaje de los recursos requeridos es mayor, como se evidencia en el siguiente gráfico:

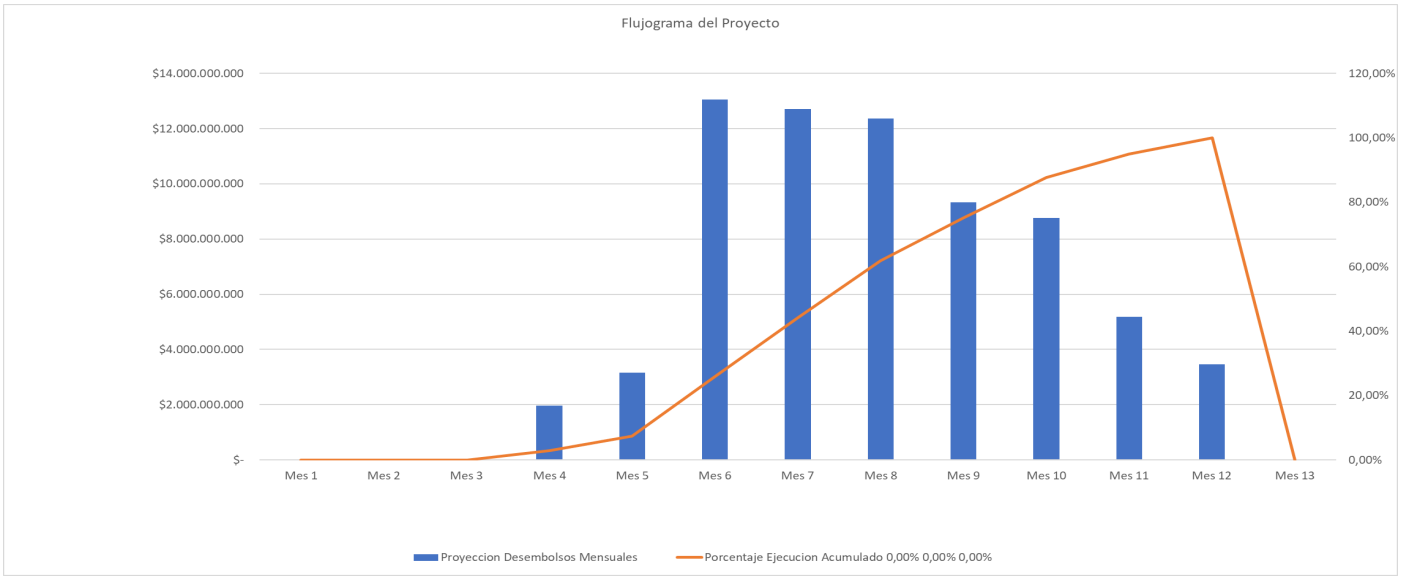

Por lo anterior, se evidencia que la ejecución del proyecto es 9 meses, de los cuales en los meses 1 al 3 corresponden al proceso de contratación, del mes 4 al 12 para la ejecución física del proyecto y el mes 13 corresponde al cierre del proyecto.

A continuación, se relaciona el esquema de inversión previsto para la financiación y ejecución del proyecto, que será ejecutado por el Departamento de Boyacá:

Entidad que Financia	Entidad a través de la cual se ejecuta el financiamiento	Valor Financiado	Valor 2025	Valor 2026
Departamento Nacional de Planeación	Fondo Regional para los Pactos Territoriales	$ 70.031.648.339.00	$ 10.227.104.846	$ 59.804.543.493
VALOR TOTAL		**$ 70.031.648.339.00**	**$ 10.227.104.846**	**$ 59.804.543.493**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Por lo anterior el DNP indica en la instrucción de gasto que el monto asignado por el FRPT con recursos DNP es de **SETENTA MIL TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($70.031.648.339,00** según radicado DNP n.º **DNP 20256000762361 del 07 de noviembre de 2025**, en el cual la secretaria general del Departamento de Planeación presenta la información del proyecto mencionado y la instrucción de gasto No. **165** de 2025 del proyecto.

En virtud de lo anterior, se emite verificación financiera favorable para la suscripción del respectivo contrato específico, con base en la documentación presentada por el Departamento de Boyacá al DNP, quien remitió a ENTerritorio S.A., para su verificación la cual se presume veraz, y por lo tanto será dicha Entidad quien deberá responder ante los organismos de control del Estado por cualquier inexactitud o falsedad en la información que pueda ocasionar detrimento patrimonial de los recursos del Estado o un perjuicio a la comunidad.

3.3 COMPONENTE JURÍDICO

La presente verificación se realiza en el marco de lo establecido en el Decreto 740 de 2016, que dispuso adicionar el Título 13 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, en especial, a lo que se refiere el Artículo 2.2.13.1.1.6:

> *"Contratos específicos para la ejecución de los Contratos Plan. En desarrollo de los Contratos Plan, las personas jurídicas de naturaleza pública o privada que concurran en la financiación de los proyectos identificados y priorizados en este instrumento suscribirán contratos específicos, cuando estos proyectos sean viabilizados técnica, jurídica y financieramente por las entidades respectivas. En estos contratos se definirá el objeto específico, las metas, los plazos, el mecanismo de gestión y ejecución contractual y sus responsables, entre otros aspectos. Con la suscripción los contratos específicos, se comprometerán los recursos de fuente nacional, territorial y los provenientes de otras fuentes de financiación que se destinen para su ejecución, así como las vigencias futuras que se requieran conforme con las normas presupuestales vigentes.*
>
> *En los contratos específicos también se acordarán los mecanismos de seguimiento a la ejecución de los recursos, el mecanismo de gestión y ejecución contractual del Contrato Plan, la entidad ejecutora y los demás aspectos que se consideren necesarios para garantizar la adecuada y eficiente* ejecución *de los proyectos.*
>
> *Quien se designe como ejecutor en el contrato específico será el responsable de realizar la vigilancia y el control de la ejecución contractual de los recursos en los proyectos financiados a través del Contrato Plan.*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Parágrafo 1. Habrá lugar a los contratos específicos solamente cuando se comprometan recursos de fuente nacional, territorial y los provenientes de otras fuentes para la financiación conjunta de los proyectos identificados y priorizados en Contrato el Plan respectivo.

Los contratos específicos definen el mecanismo de gestión y ejecución contractual del proyecto de inversión.

Parágrafo 2. En caso que los proyectos priorizados en el Contrato Plan sean cofinanciados con recursos del Sistema General de Regalías, en el contrato específico se deberá considerar que la disposición y ejecución de estos recursos, así como la designación del ejecutor, se realizará conforme a la normatividad especial que le resulta aplicable a esta fuente de financiación."

En este orden de ideas, los requisitos a verificar por parte del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, corresponde a los relacionados en la *"Lista de validación de requisitos proyectos de inversión"* del Reglamento Operativo del Fondo Regional para los Pactos Territoriales. Esta lista de validación fue acordada entre el DNP y ENTerritorio S.A., en el marco del Contrato de Interadministrativo de Mandato **DNP 877 / ENTerritorio 221009.**

Al respecto, es necesario precisar que dicha verificación corresponde a la confirmación de la incorporación de los documentos en el proyecto, **sin que por ello se asuma alguna responsabilidad por su contenido.** Lo anterior, en virtud que la responsabilidad se encuentra a cargo de la Entidad estructuradora y de quien presenta el proyecto, la validación del contenido técnico del mismo es responsabilidad de la Entidad competente que emitió el concepto de viabilidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 199 de la Ley 1753 de 2015[2] y el artículo 2.2.13.1.1.6 del Decreto 740 de 2016.

VERIFICACIÓN VIABILIDAD JURÍDICA

La Coordinación Jurídica del Fondo Regional de Pactos Territoriales, conceptúa sobre la verificación del proyecto que hoy es objeto de atención bajo los siguientes criterios y argumentos:

Se realizó la verificación de la información del componente jurídico, remitida por el Departamento Nacional de Planeación en el oficio**.** En el anexo 5 de este documento, se presenta la verificación del cumplimiento de los requerimientos jurídicos, técnicos y financieros establecidos en la "*Lista de validación de requisitos proyectos de inversión*".

VERIFICACIÓN JURÍDICA

Una vez realizada la verificación jurídica con base en la *"Lista de Validación de Requisitos Proyectos de Inversión",* creada por el equipo del Fondo Regional de Pactos Territoriales y aprobada por el Departamento Nacional de Planeación, se evidencia que el Departamento de Boyacá, bajo su calidad de Entidad Ejecutora, cumple con los requisitos jurídicos necesarios para la financiación del proyecto *denominado* ***"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON -TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"*** de acuerdo con los criterios fijados como requisitos para la firma del Contrato Específico, que se encuentran soportados en los documentos del proyecto. Así mismo, se deja constancia que no existe ningún impedimento, inhabilidad, incompatibilidad, prohibición o conflicto de interés, por parte del secretario de despacho adscrito a la secretaría de contratación del Departamento de Boyacá, según certificación aportada para la celebración del Contrato Específico.

[2] *"(…) En desarrollo del principio de especialización los proyectos que se ejecuten en el marco de los contratos Plan deberán contar con el concepto técnico previo del Ministerio o del departamento Administrativo del ramo o sector. (…)"*

De igual forma, se realizó la verificación de los antecedentes penales, fiscales, disciplinarios y Registro Nacional de Medidas Correctivas – RNMC, del secretario de despacho adscrito a la secretaría de contratación del Departamento de Boyacá, señor **JORGE MARIO IBAÑEZ ARANGO,** quien se encuentra facultado para la celebración del Contrato Específico, según los artículos 314 y 315 de la Constitución Política.

En atención a lo dispuesto en el Artículo 198 de la Ley 1753 de 2015, se prevé que los Contratos Específicos, derivados de los Contratos Plan – Pactos Territoriales, son el vehículo para destinar los recursos a las iniciativas priorizadas en esta herramienta y teniendo en cuenta que el artículo 2.2.13.1.1.6 del Decreto No. 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 740 de 2016, establece como condición para su celebración, la viabilidad técnica, financiera y jurídica del proyecto, y la expedición del concepto técnico por parte de la cabeza del sector.

Ahora bien, en la **Instrucción de Gasto 165 de 2025,** radicada mediante consecutivo **DNP 20256000762361 del 07 de noviembre de 2025**, la Secretaria General del Departamento Nacional de Planeación, remite a la Gerencia de ENTerritorio S.A. la asignación de recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales (FRPT), con relación al proyecto denominado ***"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON -TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ",*** por valor de **SETENTA MIL TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($70.031.648.339,00** Este valor será financiado de la siguiente manera:

Por parte del DNP, a través de los recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, la suma de **SETENTA MIL TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($70.031.648.339,00), de las vigencias 2025 y 2026**

Finalmente se hace por parte de la Coordinación Jurídica las siguientes precisiones: **i)** A pesar de ser el Contrato Específico una herramienta especial para la articulación de esfuerzos y financiación de proyectos importantes para la región, el Departamento de Boyacá, deberá ceñirse a su régimen legal y contractual vigente, so pena de incurrir en faltas disciplinarias, administrativas o penales; **ii)** En caso de requerir el Departamento de Boyacá, la autorización de vigencias futuras, se deberá realizar el trámite correspondiente para recibir la respectiva autorización por parte del ente competente.

En ese sentido, y obrando como soportes del Contrato Específico, se encuentra realizada la verificación de la viabilidad jurídica para proceder con la suscripción del Contrato Específico.

IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO ESPECÍFICO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley 1753 de 2015 y el artículo 2.2.13.1.1.6 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 740 de 2016, por medio del cual se crean los Contratos Específicos y se señalan los requisitos que deben regularse en estos, a continuación, se señalan las condiciones que deberán constar en el contrato así:

1. ENTIDAD CONTRATANTE: ENTerritorio S.A. en su calidad de administrador y operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales FRPT.

2. ENTIDAD CONTRATISTA: Departamento de Boyacá.

3. OBJETO: ENTerritorio S.A. y el Departamento de Boyacá, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Territorial Boyacá, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la cofinanciación del proyecto denominado ***"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS***

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON -TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", el cual se encuentra priorizado en el Plan de Acción 2025 del Pacto Territorial Boyacá.

4. META DEL PROYECTO: La meta del proyecto es la siguiente:

META: Cofinanciar la ejecución del proyecto denominado ***"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON -TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ",*** de acuerdo con la descripción jurídica, técnica y financiera contenida en los documentos que han sido entregado por la Entidad Formuladora a través del DNP, así como la verificación realizada por el equipo del FRPT, tal como se evidencia en el documento de justificación del proyectó, así como el formato ENTerritorio F-PR-37, y los demás insumos complementarios para la suscripción del Contrato Específico.

Esta meta deberá ser acreditada por la Entidad Ejecutora en los términos que se señalan en las respectivas cláusulas del Contrato Específico, en tanto es la responsable de realizar seguimiento al proyecto y recibirlo a satisfacción.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

5. ENTIDAD EJECUTORA. Se ha designado como Entidad Ejecutora del Contrato Especifico que se celebre al Departamento de Boyacá.conforme se refiere en la instrucción de Gasto **165 de 2025**, radicada mediante consecutivos **DNP 20256000762361 del 07 de noviembre de 2025,** la Entidad Ejecutora del proyecto de inversión se encargará de ejecutar contractual y presupuestalmente los recursos que le son transferidos por ENTerritorio S.A., con ocasión de la financiación del proyecto de inversión, **y será la responsable de realizar la vigilancia y el control de la ejecución contractual**, en cuanto a los aspectos técnicos, jurídicos y financieros de los recursos asignados al proyecto, en los términos descritos en los artículos 2.2.13.1.1.6. y 2.2.13.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015.

6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Las partes tendrán las siguientes obligaciones:

1. OBLIGACIONES DE ENTerritorio S.A.:

1.1 Transferir en favor de la Entidad Ejecutora recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales hasta la suma de **SETENTA MIL TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($70.031.648.339,00),** de acuerdo con la forma de desembolso que se pacte en este contrato, siempre que se hayan desembolsado los recursos para dar cumplimiento a lo pactado en el presente contrato por parte del DNP, y se encuentren disponibles en el Fondo Regional para los Pactos Territoriales.

1.2 Hacer seguimiento administrativo y financiero a la transferencia de los recursos realizada a la Entidad Ejecutora y efectuar la supervisión tal y como se señala en las Cláusulas respectivas del Contrato Específico y el Reglamento Operativo del Contrato Interadministrativo de Mandato.

2. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA – DEPARTAMENTO DE BOYACA.

2.1 Realizar las gestiones presupuestales y contractuales de los recursos transferidos, conforme a los lineamientos jurídicos, técnicos, administrativos, presupuestales y operativos vigentes conforme a las condiciones previstas en el proyecto presentado y de manera especial en concordancia con los Manuales, que para tales efectos disponga **DEPARTAMENTO DE BOYACÁ** para este tipo de proyectos.

icontec ISO 9001 TR-CO22-962903
icontec ISO 37001 TR-CMD-SG-0001'2
icontec ISO / IEC 27001 TR-CO22-962904
icontec ISO 45001 TR-CO22-962902
icontec ISO 14001 TR-CO22-962901

2.2 Ejecutar el objeto del Contrato Específico, conforme con las disposiciones establecidas en el presente contrato, bajo las especificaciones técnicas y financieras del proyecto las cuales deberán ser verificadas y acreditadas por la interventoría que se contrate para el efecto y el supervisor que se designe por parte de la entidad ejecutora.

2.3 **La Entidad Ejecutora** deberá realizar la apertura de una cuenta bancaria generadora de rendimientos financieros para el manejo exclusivo de los recursos que serán trasferidos por ENTerritorio S.A. dando cumplimiento al objeto del Contrato Específico. Dicha cuenta debe ser exenta de GMF, retenciones, comisiones, IVA y demás gastos y gravámenes e igualmente deberá ser marcada como inembargable. Una vez efectuada la apertura, se deberá informar a ENTerritorio S.A., allegando la respectiva certificación bancaria. De igual manera la entidad ejecutora velará porque la tasa de rentabilidad de dicha cuenta sea la mayor del mercado al momento de su apertura.

2.4 Presentar a ENTerritorio S.A. la lista de requisitos de inicio de los contratos derivados, que debe incluir lo siguiente:

- Copia de los contratos derivados perfeccionados que se celebren para la ejecución del proyecto.
- Copia de las pólizas de los contratos derivados, aprobadas por la entidad contratante, en las cuales se debe incluir al DNP y a ENTerritorio S.A. como beneficiarios.
- Copia de las actas de inicio de los contratos derivados.
- Plan de trabajo con programación ajustada a la ejecución de cada actividad del proyecto.

2.5 Recibir los recursos que serán transferidos por ENTerritorio S.A. y destinarlos exclusivamente a la ejecución del proyecto identificado en el objeto.

2.6 Para el manejo de los recursos la Entidad Ejecutora, deberá tener en cuenta el flujo de caja pactado en el contrato específico para cubrir las obligaciones financieras de los contratos derivados. En este sentido, deberá pactar en los contratos derivados (obra e interventoría), una forma de pago concordante con el flujo de recursos del Contrato Específico. En caso de pactarse anticipos en los contratos derivados, estos no podrán ser superiores a los porcentajes o valores transferidos por ENTerritorio S.A conforme a los hitos de ejecución pactados en el contrato específico. En caso de pactarse anticipo en el contrato de obra, la entidad ejecutora deberá dar alcance a lo señalado en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 y establecer en los prepliegos y pliegos la forma de manejo de dicho anticipo y su amortización, en todo caso, el costo de la fiducia no podrá ser asumido con el valor aprobado del proyecto los rendimientos generados deberán ser devueltos a la cuenta de manejo exclusivo del proyecto y posterior reintegro a la Dirección del Tesoro Nacional (DTN). De igual manera, de pactarse anticipo en el contrato de interventoría, el valor del anticipo deberá ser manejado en una cuenta independiente que en caso de generar rendimientos financieros estos deberán ser trasladados a la cuenta del manejo exclusivo del proyecto y posterior reintegro a la Dirección del Tesoro Nacional (DTN).

2.7 Realizar el seguimiento, supervisión y control a la ejecución de los recursos que le sean transferidos en cumplimento del contrato especifico suscrito, conforme al artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y al parágrafo del artículo 2.2.13.1.1.5 del Decreto 740 de 2016 y demás normas aplicables.

2.8 Realizar la devolución mensual de los rendimientos financieros generados en la cuenta de manejo exclusivo del proyecto a la cuenta de la Dirección General de Crédito Público conforme lo establece el artículo 2.8.1.9.8. Rendimientos Financieros del Decreto No 1068 de 2015 y el Decreto 1853 de 2015 artículo 2.3.5.6 de acuerdo con la normatividad vigente. Para dar cumplimiento a esta obligación, la entidad ejecutora deberá validar los rendimientos financieros frente al extracto bancario del mes correspondiente y realizar el respectivo traslado. La Entidad deberá remitir a ENTerritorio S.A. el extracto bancario y soporte de traslado de los rendimientos financieros a la cuenta del Tesoro Nacional.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

icontec ISO 9001 TR-CO22-962903
icontec ISO 37001 TR-CMD-SG-0001'2
icontec ISO / IEC 27001 TR-CO22-962904
icontec ISO 45001 TR-CO22-962902
icontec ISO 14001 TR-CO22-962901

2.9 La Entidad Ejecutora, con ocasión de los recursos aportados por el Departamento Nacional de Planeación, administrados y trasladados por la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, y frente a un eventual incumplimiento de obligaciones contractuales respecto de la contratación derivada (Obra, Interventoría, Suministro, y/o los contratos celebrados para tal fin), deberá restituir los aportes que no hayan sido ejecutados a ENTerritorio S.A.. En el mismo sentido el Ejecutor, y frente al pago de indemnizaciones con ocasión de la ejecución de la contratación derivada, deberá reintegrar en favor de ENTerritorio S.A. los valores pagados al contratista, respecto de los cuales se predique el incumplimiento.

2.10 Mantener actualizada, organizada y en condiciones de disponibilidad, la información y documentación que se genere o administre con ocasión del cumplimiento de las obligaciones que se derivan del contrato específico.

2.11 Los remanentes de los recursos obtenidos de la ejecución del objeto contractual que resulten de la diferencia entre los recursos girados y los efectivamente ejecutados, que no se destinen para el pago de los bienes y servicios contratados serán devueltos a la cuenta bancaria que indique ENTerritorio S.A..

2.12 La Entidad Ejecutora, deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto Tributario Territorial, Nacional, y demás normatividad relacionada con el tratamiento tributario aplicables en la ejecución del proyecto. Si dicha entidad no hubiera presupuestado todos los conceptos de impuestos, tasas, estampillas y el gravamen a los movimientos financieros aplicables para la ejecución del proyecto, deberá asumir el valor correspondiente, sin afectar el valor de las actividades del proyecto.

2.13 Presentar un informe mensual dentro de los **quince (15) días siguientes al vencimiento del mes respectivo**, suscrito por el supervisor del contrato específico, en donde informe el avance físico y financiero del proyecto a partir del inicio del contrato específico hasta su finalización en medio magnético y físico, que contenga como mínimo:

COMPONENTE TÉCNICO:

- Avance de la meta establecida en el contrato específico.
- Actividades desarrolladas en el periodo del informe: identificar las actividades que tuvieron ejecución durante el periodo reportado, resumiendo para cada una, las gestiones realizadas, con la indicación de los documentos, archivos y/o gestión resultada de las actividades desarrolladas.
- Relación de las cantidades correspondientes a las actividades ejecutadas.
- Registros fotográficos en medio físico y magnético.
- Actualización del programa de ejecución del proyecto (si aplica)
- Copia de las actas parciales de los contratos derivados con sus anexos.
- Enunciar las conclusiones, recomendaciones y observaciones presentadas a partir de la revisión hecha por parte de los supervisores.
- Informe mensual de interventoría con sus anexos.

COMPONENTE FINANCIERO:

- Informe de avance de ejecución financiera en donde se establezcan las actividades desarrolladas (obra e interventoría), acorde a lo definido en el cronograma del proyecto. Dicho avance deberá ir acompañado de los soportes.
- Extracto Bancario de la cuenta donde se manejan los recursos del contrato especifico.
- Comprobantes de pago de los giros realizados a través de la cuenta bancaria en la que se manejan los recursos del contrato especifico, correspondiente al desembolso de los recursos de los contratos celebrados por la entidad para dar cumplimiento al objeto del contrato especifico con sus soportes (acta parcial, copia de la factura, comprobante de

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

egreso) y el reporte de los rendimientos financieros generados en la cuenta durante el periodo reportado (extracto bancario y soporte de traslado a la cuenta del tesoro nacional) y los demás documentos que sean solicitados como soportes.

- Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias para cada uno de los pagos realizados en virtud de los contratos derivados celebrados por la Entidad territorial, en cumplimiento del objeto del contrato específico. Para tal efecto, el ejecutor deberá revisar y certificar las deducciones de los impuestos y/o tasas conforme la normatividad que le resulte aplicable en esta materia.

COMPONENTE JURÍDICO:

- Informe de los contratos derivados, indicando su objeto, valor, plazo de ejecución, fechas de legalización, inicio, así como las novedades contractuales que se suscriban en desarrollo de su ejecución, aportando el documento que así lo acredite. Igualmente, deberá indicarse el enlace para consulta de los procesos de contratación en el Sistema Electrónico de Contratación pública SECOP, o la plataforma electrónica que sea aplicable, bajo sus procesos de contratación.
- Informe de las pólizas de los contratos derivados, junto con la aprobación correspondiente de la Entidad Territorial. Esta información deberá actualizarse, de acuerdo con las novedades que se suscriban en la contratación derivada.

2.14 Entregar a ENTerritorio S.A. la información que requiera para el seguimiento del avance de la ejecución de los recursos, proveer los medios necesarios para posibilitarlo, así como concertar y tener disponibilidad para atender las reuniones que se consideren pertinentes y las visitas de campo aleatorias que se realicen para verificar el avance del proyecto reportado por la entidad ejecutora y demás actividades que ENTerritorio S.A. considere pertinente realizar con ocasión de los mecanismos de control que disponga para hacer seguimiento a las transferencias.

2.15 Presentar a ENTerritorio S.A. informe final de ejecución suscrito por el supervisor designado por el ejecutor, por parte del municipio y de la gobernación, el cual contendrá como mínimo: i) las actas de terminación de los contratos derivados que se celebren para el cumplimiento del objeto contractual; ii) estado del cumplimiento de la meta, resumen de actividades y desarrollo del proyecto; iii) planos récord de obra aprobados por la interventoría en medio impreso y magnético; iv) pólizas de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran aprobadas por la entidad ejecutora; v) registro fotográfico y audiovisual definitivo evidenciado la condición inicial y final del proyecto; vi) balance financiero del contrato específico con los soportes correspondientes de acuerdo a los lineamientos que se impartan por parte de ENTerritorio S.A. a las Entidades Ejecutoras y vii) análisis de resultados del proyecto teniendo en cuenta los indicadores de la MGA;

2.16 Remitir, con posterioridad a la última transferencia de recursos del Contrato Específico, los documentos que se requieran para realizar la liquidación del contrato.

2.17 Diligenciar los formatos y aportar los documentos que sean requeridos por ENTerritorio S.A., para la transferencia de los recursos y demás trámites administrativos necesarios durante el desarrollo del proyecto.

2.18 Mantener actualizado el formato de vinculación de clientes.

2.19 En el evento en que durante la ejecución del contrato surjan circunstancias que impliquen el reconocimiento y/o pago de sumas de dinero superiores a las entregadas al ejecutor derivadas de omisiones o situaciones que alteren el cronograma de ejecución, imputables a la Entidad Ejecutora y/o al contratista e interventor, **DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,** se compromete a aportar los recursos faltantes, para el cumplimiento de las metas programadas del proyecto.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

2.20 Gestionar, en cualquier caso y si fuese necesario, la obtención y aporte de recursos locales y/o regionales y/o nacionales para asegurar la terminación del objeto del presente contrato específico.

2.21 Aportar los recursos faltantes, para el cumplimiento de las metas programadas del proyecto, en el evento en que durante la ejecución del contrato surjan circunstancias que impliquen el reconocimiento y/o pago de sumas de dinero superiores a las entregadas al ejecutor derivadas de omisiones o situaciones que alteren el cronograma de ejecución, imputables a la entidad ejecutora y/o al contratista e interventor.

2.22 Designar un supervisor para el contrato específico y aportar el documento o acto administrativo donde se realiza esta designación.

2.23 Las demás que sean requeridas para dar cumplimiento al adecuado desarrollo del presente Contrato Específico.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

7. PLAZO DE EJECUCIÓN: Se fija como plazo para la ejecución del proyecto NUEVE (09) MESES contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato Específico.

PARÁGRAFO. Considerando que el plazo de ejecución del proyecto denominado ***"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON -TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ",*** excede la vigencia del Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877 / ENTerritorio S.A. 221009, (31 de julio de 2026), por medio del cual ENTerritorio S.A. actúa en calidad de administrador y operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, la continuidad de las gestiones de operación y administración del FRPT, respecto de los proyectos cuya ejecución superen el plazo del actual mandato será asumida por le entidad financiera del orden nacional con participación estatal, que sea contratada para tal efecto, o por el representante legal del Fondo.

8. VALOR DEL CONTRATO: EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ESPECIFICO ASCIENDE A LA SUMA DE SETENTA MIL TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($70.031.648.339,00), discriminados así:

El Departamento Nacional de Planeación, aportará el valor de **SETENTA MIL TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($70.031.648.339,00),** de los recursos que se encuentran en el Fondo Regional para los Pactos Territoriales los cuales serán transferidos a través de ENTerritorio en su calidad de administrador y operador del Fondo con fundamento en la instrucción de gasto remitida por DNP mediante radicado DNP n.º 20234290407641 del 07 de noviembre de 2025 – ENTerritorio n.º 20234300209172 del 07 de noviembre de 2025, por valor de **SETENTA MIL TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($70.031.648.339,00).**

FORMA DE TRANSFERENCIAS AL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de financiación ascienden a la suma de **SETENTA MIL TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($70.031.648.339,00),** cuyo desembolso será así:

1) Una primera transferencia por la suma de **CATORCE MIL SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($14.006.329.671,00),** una vez se suscriba el contrato específico, se apruebe la póliza, se realice la apertura de la cuenta especial para el manejo exclusivo de los recursos, se realice incorporación de estos recursos en el presupuesto de la Entidad Ejecutora, se presente la cuenta de cobro con sus soportes correspondientes, se suscriba el acta de inicio de la contratación derivada y se cuente con la disponibilidad

icontec ISO 9001 TR-CO22-962903 · icontec ISO 37001 TR-CMD-SG-0001'2 · icontec ISO / IEC 27001 TR-CO22-962904 · icontec ISO 45001 TR-CO22-962902 · icontec ISO 14001 TR-CO22-962901

del PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2025 por valor de **DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($10.227.104.846,00)** y de la vigencia fiscal 2026 por valor de **TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($3.779.224.825,00)** del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

2) Una segunda transferencia por valor de **DIEZ MIL QUINIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($10.504.747.250,00),** una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del **20%** que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2026**,** del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

3) Una tercera transferencia por valor de **DIEZ MIL QUINIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($10.504.747.250,00),** una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del **40%** que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2026 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

4) Una cuarta transferencia por valor de **DIEZ MIL QUINIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($10.504.747.250,00),** una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del **55%** que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2026 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

5) Una quinta transferencia por valor de **DIEZ MIL QUINIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($10.504.747.250,00),** una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del **70%** que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2026 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

6) Una sexta transferencia por valor de **SIETE MIL TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($7.003.164.834,00),** una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del **83%** que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2026 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

7) Una última transferencia por valor de **SIETE MIL TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($7.003.164.834,00),** con la entrega del informe final de ejecución del proyecto, el cual contendrá como i) las actas de terminación de los contratos derivados ii) estado del cumplimiento de la meta, resumen de actividades y desarrollo de la obra; iii) planos récord de obra aprobados por la interventoría en medio impreso y magnético; iv) póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran aprobadas por la entidad ejecutora; v) registro fotográfico y audiovisual definitivo evidenciando la condición inicial y final del proyecto; vi) balance financiero del contrato específico con los soportes correspondientes de acuerdo a los lineamientos que se impartan por parte de ENTerritorio al departamento y vii) análisis de resultados del proyecto teniendo en cuenta los indicadores de la MGA.; y se cuente con las actas de terminación de los contratos derivados y los demás requisitos administrativos conducentes para el mismo. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2026 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

9. MECANISMO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS: Como un mecanismo de seguimiento a la ejecución de los recursos, no se pacta el desembolso del 100% de los recursos de financiación, sino que el giro de estos se establece en razón al análisis del flujo de recursos del proyecto y se pacta contra hitos de ejecución del Contrato Específico y disponibilidad de PAC, como está previsto en la forma de transferencia de los recursos. Así mismo, se precisa que el seguimiento se realiza con los documentos que se deberán presentar por parte del Ejecutor a ENTerritorio S.A., para que en su calidad de administrador y operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, realice las verificaciones correspondientes, sin perjuicio de los demás documentos o informes que le sean solicitados a la Entidad Ejecutora, quien, de ser el caso, deberá rendir informe de la ejecución de los recursos transferidos, según requerimientos de ENTerritorio S.A..

Así mismo, se realizará el seguimiento administrativo y financiero a las transferencias y para el efecto podrán realizarse las visitas aleatorias que considere necesario realizar ENTerritorio S.A., los Comités Operativos y de Seguimiento, las reuniones de seguimiento y la solicitud de información adicional que se requiera para el seguimiento del avance de la ejecución de los recursos.

La acreditación de las metas es responsabilidad de la Entidad Ejecutora, en tanto es quien recibe los bienes y/o servicios que contrata con ocasión del proyecto.

Para realizar el seguimiento a la ejecución de los recursos, se constituirá un Comité Operativo y de Seguimiento que estará conformado por: **i)** Gerente Nacional de Pactos Territoriales o quien éste designe, **ii)** Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales o quien éste designe; **iii)** Gobernador del Departamento de Boyacá o quien este designe.

A estas sesiones podrán participar como invitados los profesionales de las Entidades que lo conforman, cuya asistencia se considere relevante para la discusión de los temas a tratar en la correspondiente sesión. Todos los invitados asistirán con voz, pero sin voto.

Este Comité definirá su agenda de reuniones y podrá ser convocado extraordinariamente cuando la ejecución del contrato lo requiera.

El Comité Operativo y de Seguimiento ejercerá las siguientes funciones:

1. Elaborar y aprobar su propio reglamento.
2. Realizar un seguimiento periódico de la ejecución del contrato, identificando los aspectos que generen dificultades, para plantear las sugerencias del caso, con sustento en el ejercicio realizado por la supervisión del contrato.
3. Realizar recomendaciones que se consideren necesarias para garantizar la ejecución del objeto contractual y las obligaciones de las partes en el contrato y verificar la implementación de mecanismos que permitan realizar seguimiento a los recursos.
4. Solicitar las reuniones y gestiones que considere necesarias para que el objeto del presente contrato se cumpla a cabalidad.
5. Las demás que sean necesarias para adelantar el seguimiento administrativo y financiero al contrato.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

10. SUPERVISIÓN Y CONTROL: La supervisión administrativa del Contrato Específico estará a cargo del Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, quien contará con el apoyo de los profesionales que sean designados para apoyar la supervisión del Contrato. En tanto el presente Contrato Específico es un contrato de financiación y de transferencia de recursos, la supervisión administrativa del mismo se circunscribe a recibir y autorizar las solicitudes de transferencias de la Entidad Ejecutora, con base en los informes presentados por el supervisor del Contrato Específico, designado por la Entidad Ejecutora, y los demás mecanismos de seguimiento que se establezcan en el contrato a celebrarse.

Así mismo, a través del Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, sus coordinadores y su equipo de trabajo se implementarán los mecanismos que permitan realizar seguimiento administrativo y financiero a las transferencias, los cuales están dispuestos en el Reglamento Operativo del **Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877 / ENTerritorio 221009**, los cuales son: i) Reuniones de seguimiento; ii) Comités Operativos y de Seguimiento; iii) Verificación del cumplimiento de requisitos definidos en el contrato para desembolso de los recursos; iv) Requerimientos por incumplimiento de compromisos; v) Visitas realizadas por los profesionales técnicos del Fondo; vi) Informes mensuales de seguimiento entregados por la supervisión de la Entidad Ejecutora. En todo caso se precisa que la supervisión, interventoría, la vigilancia y el control de la ejecución contractual de los recursos transferidos, en particular con relación a aquellos contratos que se suscriban para el cumplimiento de las metas de este contrato específico, serán responsabilidad de la entidad ejecutora, de conformidad con el inciso final del parágrafo del artículo 2.2.13.1.1.5 y el inciso final del artículo 2.2.13.1.1.6 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 740 de 2016.

11. LUGAR DE EJECUCIÓN: Departamento de Boyacá

12. DOMICILIO CONTRACTUAL: El domicilio contractual para todos los efectos es la ciudad de Bogotá D.C.

13. RÉGIMEN JURÍDICO: El presente Contrato Especifico se rige por las disposiciones consagradas en los artículos 198 y 199 de la Ley 1753 de 2015, el artículo 2.2.13.1.1.6 del Decreto 740 de 2016, el artículo 279 de la Ley 2294 de 2023 y demás normas que sean concordantes.

14. GARANTÍA: La Entidad Ejecutora deberá constituir a favor de ENTerritorio S.A. en calidad de asegurado y beneficiario, en los términos establecidos en la normatividad vigente, una garantía que podrá consistir en una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, correspondiente a la póliza de cumplimiento ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN o garantía bancaria expedida por un banco local que incluya los siguientes amparos:

La garantía deberá cubrir, como mínimo, los riesgos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales, y su valor no podrá superar en ningún caso el valor de la cláusula penal pecuniaria que se pacte en el presente contrato, y la cual debe incluir los siguientes amparos:

AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA	RESPONSABLE
Cumplimiento	20% del total de los recursos aportados desde ENTerritorio S.A..	Vigente por el plazo de ejecución del contrato y ocho (8) meses más.	Entidad Ejecutora

Nota 1: En esta garantía deberá figurar como beneficiario el DNP.

Nota 2: En caso de que la garantía sea una póliza de seguro, el contratista deberá anexar el respectivo recibo de pago de prima. Así mismo la póliza deberá presentar el siguiente texto de modificación de las condiciones generales de la misma:

"QUEDA CONVENIDO, ACORDADO Y ENTENDIDO QUE, PARA EFECTOS DE LA ACREDITACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA CUANTÍA DE LA RECLAMACIÓN, ENTERRITORIO S.A. DARÁ APLICACIÓN A LO NORMADO EN EL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SIN APLICAR PROCEDIMIENTO ALGUNO QUE PUEDA ENCONTRARSE ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA."

El anterior texto debe estar incluido EXPRESAMENTE en la carátula de la póliza.

Nota 3: Para la constitución de la Garantía de Cumplimiento - Póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, correspondiente a la póliza de cumplimiento **ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN** o Garantía Bancaria expedida por un banco local - la misma deberá entregarse a ENTerritorio, para su aprobación, a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a la suscripción del presente Contrato Específico.

Así mismo, la entidad ejecutora del proyecto al momento de celebrar los contratos derivados **debe incorporar como obligación del contratista la constitución de garantías en donde se incluya como beneficiarios al DNP y a ENTerritorio S.A.**

A su vez, La Entidad Ejecutora, con ocasión de los recursos aportados por el Departamento Nacional de Planeación, administrados y trasladados por la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A., y frente a un eventual incumplimiento de obligaciones contractuales respecto de la contratación derivada (Obra, Interventoría, Suministro, y/o los contratos celebrados para tal fin), deberá restituir los aportes que no hayan sido ejecutados a ENTerritorio. En el mismo sentido el Ejecutor, y frente al pago de indemnizaciones con ocasión de la ejecución de la contratación derivada, deberá reintegrar en favor de ENTerritorio los valores pagados al contratista, respecto de los cuales se predique el incumplimiento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

icontec ISO 9001 TR-CO22-962903 · icontec ISO 37001 TR-CMD-SG-0001'2 · icontec ISO / IEC 27001 TR-CO22-962904 · icontec ISO 45001 TR-CO22-962902 · icontec ISO 14001 TR-CO22-962901

15. RESPONSABILIDAD: LA ENTIDAD EJECUTORA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el contrato, y del recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios que se contraten para la ejecución del proyecto, por lo tanto, será igualmente responsable por los daños que ocasionen sus empleados, los empleados de sus contratistas, a ENTerritorio S.A. en su calidad de administrador y operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y al DNP por la ejecución del objeto del contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

También habrá responsabilidad civil, penal, fiscal y disciplinaria por parte de la Entidad Ejecutora, por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño o perjuicio a ENTerritorio S.A. y al DNP.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

16. TERMINACIÓN ANTICIPADA: De común acuerdo entre las partes, se podrá dar por terminado el contrato antes de su vencimiento, mediante acta. Así mismo, con la suscripción del presente contrato **LA ENTIDAD EJECUTORA,** autoriza expresamente a **ENTerritorio S.A.** para terminar anticipadamente el mismo mediante oficio escrito que se comunicará a la entidad ejecutora, en los siguientes eventos: **a)** Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga; **b)** Cuando la entidad ejecutora, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de entregar a **ENTerritorio S.A.** los documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución del contrato, dentro del plazo establecido para ello; **c)** Cuando **LA ENTIDAD EJECUTORA**, con posterioridad a la expedición del registro presupuestal, no diere inicio a la ejecución del contrato, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; **d)** Cuando del incumplimiento de las obligaciones de la entidad ejecutora se deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecución del contrato, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; **e)** Si suspendidas todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, la entidad ejecutora no reanudase la ejecución de las mismas dentro del plazo acordado entre las partes una vez terminadas las causas que obligaron a la suspensión, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; **f)** Cuando la entidad ejecutora abandone o suspenda los trabajos total o parcialmente, sin acuerdo o autorización previa y escrita de **ENTerritorio S.A.**, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; **g)** Cuando la entidad ejecutora ceda el contrato sin previa autorización expresa y escrita de **ENTerritorio S.A.** sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; **h)** Cuando la entidad ejecutora incurra en las conductas prohibidas en el artículo 25 de la Ley 40 de 1993 (pago de sumas de dinero a extorsionistas u ocultar o colaborar, por parte de algún directivo o delegado de la entidad ejecutora en el pago por la liberación de una persona secuestrada que sea funcionaria o empleada de la misma entidad o de alguna de sus filiales); **i)** Por mutuo acuerdo; **j)** Por orden legal judicial; **k)** Por las demás causas dispuestas en la ley.

PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que el contrato se dará por terminado anticipadamente a partir de la fecha que señale la comunicación que se remita a **LA ENTIDAD EJECUTORA** por parte de **ENTerritorio S.A.**; sin perjuicio de lo anterior, las partes suscribirán un acta de liquidación en la cual se dejará constancia de los hechos o circunstancias que motivaron la misma. Igualmente, **LA ENTIDAD EJECUTORA** tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de conformidad con el clausulado de este contrato, a que se le transfiera los recursos en atención a los avances en la ejecución del proyecto y que sean recibidos a satisfacción por **ENTerritorio S.A.** hasta la fecha de la terminación anticipada. Posteriormente **LA ENTIDAD EJECUTORA** no podrá solicitar valores diferentes a los que resulten de lo allí consignado, razón por la cual renuncia a realizar cualquier reclamación o demanda por conceptos o valores distintos a los previstos en dicha acta.

17. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Al producirse una de las causas de terminación del contrato, se procederá a su liquidación de mutuo acuerdo en un plazo máximo de cuatro (4) meses, contados a partir de la ocurrencia del hecho o acto que genera la terminación. La liquidación por mutuo acuerdo se hará por acta firmada por las partes, en la cual deben constar los

ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. De no realizarse la liquidación del contrato en el término anterior, se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 o la norma que sea aplicable para el efecto.

18. INDEMNIDAD: LA ENTIDAD EJECUTORA se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante y al DNP, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. La Entidad Ejecutora mantendrá indemne a la Entidad Estatal contratante y al DNP por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. En el mismo sentido, la Entidad Ejecutora, se obliga a mantener indemne a **ENTerritorio S.A.** y al **DNP**, bajo los elementos anteriormente expuestos.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

19. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

20. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: En caso de que con ocasión de la ejecución del contrato surjan situaciones que impliquen un posible incumplimiento parcial de las obligaciones o se suscite alguna controversia, diferencia o reclamo, las partes podrán buscar solucionar en forma ágil y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual al interior del comité operativo y de seguimiento de que trata la cláusula séptima. En el evento que subsista la misma, las partes dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en la que debió acreditarse el cumplimiento de compromisos de acuerdo a lo pactado en el comité operativo, podrán solicitar la etapa de arreglo directo por escrito a la ordenadora del gasto para que realice una audiencia con su participación, en la cual se busque dirimir las diferencias o controversias suscitadas, y acto seguido, se procedan a establecer acuerdos dentro del marco contractual, que garanticen la ejecución del contrato. En el evento que fracase la etapa de arreglo directo, las partes convienen que las diferencias entre ellas, por razón o con ocasión de la ejecución del contrato, serán resueltas a través de mecanismos alternativos de resolución de conflictos de acuerdo con lo previsto en la normatividad vigente.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan la presente cláusula, sin perjuicio de las acciones que ENTerritorio S.A. pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra el contratista, de acuerdo con el régimen de contratación aplicable a ENTerritorio S.A..

21. APREMIO: En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones de la entidad ejecutora derivadas del Contrato, ENTerritorio S.A. puede adelantar los procedimientos establecidos en la ley, para hacer exigibles sanciones mensuales y sucesivas equivalentes al 1% del valor del contrato, las cuales no podrán exceder el 10% del valor total del mismo. El pago de las sanciones aquí pactadas no indemniza los perjuicios sufridos por ENTerritorio S.A., ni implica limitación o renuncia alguna a las posibilidades de reclamación de esta última por los daños causados.

22. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes pactan el valor de la cláusula penal pecuniaria aplicable ante cualquier incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del presente acuerdo, equivalente al 20% del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que ENTerritorio S.A. adeude a la entidad ejecutora con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil.

icontec ISO 9001 TR-CO22-962903
icontec ISO 37001 TR-CMD-SG-0001'2
icontec ISO / IEC 27001 TR-CO22-962904
icontec ISO 45001 TR-CO22-962902
icontec ISO 14001 TR-CO22-962901

PARÁGRAFO PRIMERO: No se tendrá como evento eximente de responsabilidad de la Entidad Ejecutora el hecho de que el contratista haya incumplido su contrato.


PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que haya lugar al cobro de la pena pecuniaria, el Contrato Específico prestará merito ejecutivo, y será para todos los efectos base fundamental de título ejecutivo compuesto, junto con las comunicaciones, actas de comité de seguimiento en la que se denote la no ejecución de las obligaciones de manera parcial o total por parte de la Entidad Ejecutora.

V. ANEXOS

Anexo 1- Pacto Boyacá, Raíz Y Futuro: Transformación Económica Y Justicia Social En Armonía Con La Naturaleza
Anexo 2- Acta Consejo Directivo No. 2 del 07 de noviembre de 2025.
Anexo 3 - Solicitud de verificación de la viabilidad técnica, jurídica y financiera del proyecto, radicada mediante documento**.**
Anexo 4 –Instrucción de gasto remitida por el DNP mediante radicado **DNP 20256000762361 del 07 de noviembre de 2025**

Anexo 5 - Lista de validación de requisitos- Proyectos de inversión. Anexo 6 - Proyecto de inversión presentado por el Departamento de Boyacá.

Atentamente,



JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA
GERENTE DE UNIDAD DEL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES

Proyectó: MARIO ANDRES PATERNINA CASTILLO - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES
Elaboró: MARIO ANDRES PATERNINA CASTILLO - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES
Revisó: MARCELA RAMIREZ ARIAS - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES, WILLIAM ARMANDO MONROY TINJACA - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACTA DE REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO EXTRAORIDINARIO	
Propósito de la reunión:	Consejo Directivo Extraordinario – CD n.° 1 *"Pacto Boyacá, Raíz y Futuro: Transformación Económica y Justicia Social en Armonía con la Naturaleza"*
Modalidad:	Virtual - Microsoft Teams
Fecha:	7 de noviembre de 2025
Hora de inicio:	8:00 a.m.

ASISTENTES AL CONSEJO DIRECTIVO (NOMBRES Y APELLIDOS)	**ENTIDAD/CARGO DE LOS ASISTENTES**
Andrés Felipe Espinosa Zuluaga	Delegado Directora Departamento Nacional de Planeación
Carlos Andrés Amaya Rodríguez Sara Lorena Vega Flórez	Gobernador de Boyacá Delegada Gobernador de Boyacá
Marco Tulio Carvajal	Delegado Alcaldesa de Duitama
Javier Rodríguez Rosales	Suplente Guaqueros Esmeraldas Occidente de Boyacá
Nelson Ricardo Riaño Cocunubo	Representante Federación de Campesinos Parameros del Nororiente Colombiano, Nevado del Cocoy
Sandra Yaneth Tibamosca Villamarín	Secretaría Técnica
Numael Eduardo Parra Martínez	Contratista DNP-GGNPT
Maria Fernanda Rueda García	Contratista DNP-GGNPT
Ana María López Campos	Contratista DNP-GGNPT

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 8:35 am, se da inicio e instalación a la jornada del Consejo Directivo Extraordinario n.° 1 del *"Pacto Boyacá, Raíz y Futuro: Transformación Económica y Justicia Social en Armonía con la Naturaleza"*, con el saludo de apertura a cargo de la delegada del Gobernador de Boyacá.

ORDEN DEL DÍA

Concluido los saludos de apertura, la Secretaría Técnica procede a presentar formalmente el orden del día, con los siguientes temas propuestos:

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Presentación y aprobación del ajuste solicitado por la Gobernación de Boyacá del Plan Estratégico de Inversiones – PEI

1. Verificación del quórum

ASISTENTES MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO (NOMBRES Y APELLIDOS)	ENTIDAD/CARGO DE LOS ASISTENTES
Andrés Felipe Espinosa Zuluaga	Delegado Directora Departamento Nacional de Planeación
Sara Lorena Vega Flórez	Delegada Gobernador de Boyacá
Marco Tulio Carvajal	Delegado Alcaldía de Duitama
Javier Rodríguez Rosales	Suplente Guaquera Esmeraldas Occidente de Boyacá
Nelson Ricardo Riaño Cocunubo	Federación de Campesinos Parameros del Nororiente Colombiano, Nevado del Cocuy

2. Aprobación del orden del día

Se pone a consideración por parte de los integrantes del Consejo Directivo el orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Presentación y aprobación del ajuste solicitado por la Gobernación de Boyacá del Plan Estratégico de Inversiones

Lo integrantes del Consejo Directivo aprobaron el orden día:

ASISTENTES	ENTIDAD/CARGO DE LOS ASISTENTES
Andrés Felipe Espinosa Zuluaga	Delegado Directora Departamento Nacional de Planeación
Sara Lorena Vega Flórez	Delegada Gobernador de Boyacá
Marco Tulio Carvajal	Delegado Alcaldesa de Duitama
Javier Rodríguez Rosales	Suplente Guaqueros Esmeraldas Occidente de Boyacá
Nelson Ricardo Riaño Cocunubo	Representante de la Federación de Campesinos Parameros del Nororiente Colombiano, Nevado del Cocoy

3. Presentación y aprobación del ajuste solicitado por la Gobernación de Boyacá del Plan Estratégico de Inversiones

La Secretaría Técnica informa que, el 6 de noviembre de 2025, se llevó a cabo la primera sesión de Comité Técnico del Pacto Territorial Boyacá, con el propósito de revisar la solicitud del ajuste al Plan Estratégico de Inversiones - PEI, aprobado durante la sesión del primer Consejo Directivo, realizada el 22 de agosto de 2025. En dicha sesión de Comité Técnico, el Secretario de Planeación del departamento de Boyacá presentó la propuesta de modificación al PEI, y expuso la justificación de la solicitud.

Posteriormente, el Gobernador de Boyacá ingresó a la sesión del Consejo Directivo y la Secretaría Técnica le concedió el uso de la palabra, el Gobernado expuso las condiciones de los proyectos y la necesidad de incorporarlos al PEI, objeto del Consejo Directivo Extraordinario, destacando los siguientes aspectos:

- Vía Arcabuco: permitirá solucionar los problemas de movilidad y habilitar la zona de Villa de Leyva para fortalecer el turismo.

- Sotaquirá: al ser el mayor productor de arándanos, el proyecto generará beneficios económicos y sociales para la región.

- Doble calzada Cómbita: requiere intervención debido al avanzado estado de deterioro.

- Tenza – Sutatenza: corresponde a una zona con potencial agropecuario y turístico.

- Tibaná: incluye una vía de carácter nacional.

Adicionalmente, indicó que la nueva cofinanciación de los proyectos permitirá avanzar en la implementación del Pacto, y resaltó que un tema de especial relevancia corresponde a los proyectos de placas huellas, cuya ejecución será liderada por las Juntas de Acción Comunal.

A continuación, se concedió la palabra al Secretario de Planeación del departamento de Boyacá quien presentó un recuento de los proyectos analizados en la primera sesión del Comité Técnico, junto con las cifras y consideraciones técnicas, así:

TRAMO	TOTALES	NACIÓN	DEPARTAMENTO
Mejoramiento de vía departamental en el tramo comprendido entre Villa de Leyva y Arcabuco en el departamento de Boyacá	$73.411.237.199	$38.411.237.199	$35.000.000.000
Mejoramiento de las vías departamentales limite Villapinzón - Turmequé y Turmequé - Nuevo Colon -Tibaná en el departamento de Boyacá	$70.031.648.339	$70.031.648.339	$0
Rehabilitación de la vía cruce ruta 55 ramal acceso al municipio de Sotaquira y mejoramiento de la vía cruce ruta 6209 - el llano de Sotaquirá del departamento de Boyacá	$44.468.813.363	$33.683.999.160	$10.784.814.203
Pavimentación de la vía con código 6101 que conduce del casco urbano del municipio de Tenza al casco	$ 52.410.000.000	$42.410.000.000	$10.000.000.000

TRAMO	TOTALES	NACIÓN	DEPARTAMENTO
urbano del municipio de Sutatenza, departamento de Boyacá			
Mejoramiento de vía secundaria entre los municipios de Chivatá y toca en el departamento de Boyacá	$43.527.000.000	$22.059.592.966	$21.467.407.034
Mejoramiento de las vías departamentales cruce ruta 6209 (sote), cruce ruta 5502 (la bomba) y paso urbano por el municipio de Cómbita en el departamento de Boyacá"	$20.403.522.336	$15.403.522.336	$5.000.000.000
Apoyo al mejoramiento de las vías terciarias y secundarias en el departamento de Boyacá	$28.747.778.763		$28.747.778.763
TOTAL	**$333.000.000.000**	**$222.000.000.000**	**$111.000.000.000**

Para tal efecto, el Secretario de Planeación de Boyacá presentó el esquema de cofinanciación, con el fin de solicitar al DNP el cierre financiero de 6 proyectos viales y 1 financiado en su totalidad con recursos del territorio.

Se concede el uso de la palabra al delegado de la Directora del DNP, quien manifiesta que, honrando el compromiso asumido por el nivel nacional, se confirma la disposición para avanzar en la financiación de los proyectos mencionados anteriormente.

El Gobernador de Boyacá expresó su agradecimiento al DNP**,** destacando la buena voluntad y disposición de la entidad, así como el acompañamiento de la Secretaría Técnica y de la Subdirectora General de Inversiones, Seguimiento y Evaluación – SGISE.

Asimismo, señaló que la Gobernación de Boyacá cuenta con los recursos necesarios para la cofinanciación**,** e indicó que en la cláusula del convenio correspondiente deberá incluirse la posibilidad de sustituir las fuentes de financiación, en caso de ser necesario.

Se somete a consideración de los miembros del Consejo Directivo la modificación del Plan Estratégico de Inversiones - PEI, la cual implica el ajuste de siete (7) proyectos que actualmente hacen parte de la línea Visión Desarrollo Regional, con el fin de incorporarlos en la línea estratégica de Transporte, conforme a lo expuesto en la sesión.

Acto seguido, se procede a la votación, obteniéndose los siguientes resultados:

- El delegado del DNP: aprueba.
- La Gobernación de Boyacá: aprueba.
- El delegado de la Alcaldía de Duitama aprueba.
- El suplente de la Guaquera Esmeraldas Occidente de Boyacá aprueba.
- El representante de la Federación de Campesinos Parameros del Nororiente Colombiano, Nevado del Cocuy aprueba.

En consecuencia, queda aprobada la modificación del Plan Estratégico de Inversiones- PEI con la inclusión de los nuevos 7 proyectos en la línea estratégica de transporte.

Siendo las 9:30 am del 7 de noviembre de 2025, se da por finalizada la sesión extraordinaria n.° 1 del Comité Directivo del "Pacto Boyacá, Raíz y Futuro: Transformación Económica y Justicia Social en Armonía con la Naturaleza", Como constancia de los temas tratados, firman los miembros del Comité Directivo.

En constancia de lo anterior firman,

CARLOS ANDRÉS AMAYA RODRÍGUEZ
Gobernador de Boyacá
Presidente

SANDRA YANETH TIBAMOSCA VILLAMARÍN
Gerencia Nacional Pactos Territoriales
Departamento Nacional de Planeación
Secretaría Técnica

Elaboró: Ana María López Campos – contratista GGNPT *amlc*
Reviso: María Fernanda Rueda García - contratista GGNPT *MafeRueda*

PLAN DE ESTRATEGICO DE INVERSIONES
PACTO BOYACÁ, RAÍZ Y FUTURO: TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA Y JUSTICIA SOCIAL EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA
Fecha de aprobación: 7/11/2025

1. OBJETIVO

Implementar políticas y proyectos estratégicos en el departamento de Boyacá, que promuevan la transformación productiva para una tierra grande, competitiva y equitativa, alineadas con los principios del Gobierno Nacional. Todo ello para lograr una transición energética justa, que permita transitar de las actividades económicas extractivistas, a la agroindustria, el turismo y las energías alternativas, sumado a la generación de bienestar con el fortalecimiento del acceso a servicios esenciales como salud, agua potable y saneamiento básico, educación e infraestructura estratégica, para lograr el cierre de brechas y promover la vida en el territorio Boyacense.

2. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de suscripción	14/08/2025
Plazo de ejecución	5 AÑOS
Suscribientes del Pacto Territorial	Departamento Nacional de Planeación Gobernación de Boyacá Municipio de Duitama Comunidades y Organizaciones de Boyacá
Otro sí (cuando aplique) con su fecha de suscripción	

3. EJES O LINEAS ESTRATÉGICAS

El Pacto Territorial Boyacá está conformado por nueve (9) líneas temáticas que, articuladas contribuirán al logro del objetivo definido, considerando que reflejan la vocación de los territorios que lo componen, la visión del desarrollo y sus potencialidades así:

- Línea estratégica 1. Agua y Saneamiento Básico
- Línea estratégica 2. Educación
- Línea estratégica 3. Salud
- Línea estratégica 4. Deporte
- Línea estratégica 5. Agropecuario
- Línea estratégica 6. Infraestructura para el Turismo
- Línea estratégica 7. Transición Energética
- Línea estratégica 8. Transporte
- Línea estratégica 9. Formalización de Tierras

4. INICIATIVAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES.

A continuación, se presentan las iniciativas estratégicas que fueron priorizadas por ejes o líneas estratégicas para ser implementadas durante la vigencia del Pacto Territorial, y que cuentan con la identificación de las diferentes fuentes indicativas de financiación.

Eje o Línea Estratégica	Nº Iniciativas	Aporte Nación*	Aporte Territorio*	Inversión Total Indicativa
Agua y Saneamiento Básico	5	$71.941.977.122	$25.080.732.740	$97.022.709.862
Educación	13	$35.000.000.000	$82.538.490.817	$117.538.490.817
Salud	5	$169.000.000.000	$16.467.297.838	$185.467.297.838
Deporte	2	$0	$292.397.000.000	$292.397.000.000
Agropecuario	8	$12.721.249.281	$84.941.266.938	$97.662.516.219
Infraestructura para el Turismo	1	$0	$2.740.098.439	$2.740.098.439
Transición Energética	1	$25.000.000.000	$75.000.000.000	$100.000.000.000
Transporte	13	$222.000.000.000	$262.332.616.471	$484.332.616.471
Formalización de Tierras	1	$29.897.846.371	$3.695.239.439	$33.593.085.810
Total Plan Estratégico de Inversiones	**49**	**$565.561.072.774**	**$845.192.742.682**	**$1.410.753.815.456**

***Aporte Nación / Aporte Territorio corresponde con lo estipulado en la Cláusula Octava de la Minuta del Pacto**
Cifras expresadas en pesos.

A continuación se relacionan las iniciativas por cada uno de los sectores con sus fuentes de financiación por eje o línea estratégica.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

Sector	Nombre de la Iniciativa	Aporte Nación	Aporte Territorio	Inversión Total	Entidad Responsable*	Observaciones
Vivienda, Ciudad y Territorio	Plan maestro para la construcción del acueducto del municipio de Tibasosa Boyacá Fase I etapas 1, 2 y 3	$ 50.233.666.966	$ 0	$ 50.233.666.966	Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio	
Vivienda, Ciudad y Territorio	Construcción del Modulo 5 de la Planta de Tratamiento de Agua Residual en el municipio de Tunja, Boyacá	$ 18.487.100.365	$ 11.253.688.964	$ 29.740.789.329	Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio	
Vivienda, Ciudad y Territorio	Construcción del plan maestro de alcantarillado del centro poblado el manzano, municipio de Sotaquira-Boyacá	$ 3.221.209.791	$ 0	$ 3.221.209.791	Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio	

Vivienda, Ciudad y Territorio	Construcción de los interceptores 1 y 2, emisario final, planta de tratamiento de aguas residuales (RAFA- FAFA) y optimización con adecuación de redes, alcantarillado sanitario del municipio de Socotá	$ 0	$ 5.700.000.000	$ 5.700.000.000	Gobernación de Boyacá	
Vivienda, Ciudad y Territorio	Construcción primera etapa de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR para el municipio de Toca Dpto de Boyacá	$ 0	$ 8.127.043.776	$ 8.127.043.776	Gobernación de Boyacá	
Total	**5**	**$ 71.941.977.122**	**$ 25.080.732.740**	**$ 97.022.709.862**		

**La entidad Responsable es la encargada de la fuente de financiación*

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. EDUCACIÓN						
Sector	**Nombre de la Iniciativa**	**Aporte Nación**	**Aporte Territorio**	**Inversión Total**	**Entidad Responsable***	**Observaciones**
Educación Nacional	Construcción De Las Nuevas Aulas Y Ambientes Complementarios De La IE Técnico Nacionalizado De Pauna Departamento De Boyacá	$ 0	$ 5.451.000.000	$ 5.451.000.000	Gobernación de Boyacá	
Educación Nacional	Mejoramiento De La Infraestructura De La Institución Educativa Campo Elías Cortes Sede Principal En El Municipio De Berbeo, Departamento De Boyacá	$ 0	$ 5.612.372.811	$ 5.612.372.811	Gobernación de Boyacá	
Educación Nacional	Elaboración De Estudios Y Diseños Para El Mantenimiento, Adecuación Y Ampliación De La Institución Educativa Departamental De Sora-Boyacá.	$ 0	$ 2.820.000.000	$ 2.820.000.000	Gobernación de Boyacá	
Educación Nacional	Construcción Y Ampliación De La Primera Etapa De Ambientes Complementarios De La I.E. Técnica La Libertad Del Municipio De Samacá - Departamento De Boyacá	$ 0	$ 2.194.000.000	$ 2.194.000.000	Gobernación de Boyacá	
Educación Nacional	Remodelación Y Construcción De La Institución Educativa Mariano Ospina Perez Sede Primaria Centro Tinjacá	$ 0	$ 1.549.000.000	$ 1.549.000.000	Gobernación de Boyacá	
Educación Nacional	Construcción de un bloque de aulas y ambientes complementarios en la Sede Principal de la Institución Educativa Técnica de San Diego de Alcalá, municipio de Guacamayas – Departamento de Boyacá	$ 0	$ 5.816.234.724	$ 5.816.234.724	Gobernación de Boyacá	
Educación Nacional	Mejoramiento, ampliación y dotación de algunas sedes de la Institución Educativa Técnico Simona Anaya y Rosario, en el Municipio de Paya, Departamento de Boyacá	$ 0	$ 2.585.854.691	$ 2.585.854.691	Gobernación de Boyacá	
Educación Nacional	Dotación de mobiliario escolar material didáctico e implementos para menaje en algunas instituciones educativas oficiales en municipios no certificados del departamento de Boyacá	$ 0	$ 30.513.739.550	$ 30.513.739.550	Gobernación de Boyacá	
Educación Nacional	Construcción edificio de laboratorios de ingeniería de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Boyacá	$ 0	$ 11.971.087.886	$ 11.971.087.886	Ministerio de Educación Nacional	
Educación Nacional	Adecuación De La Institución Educativa Técnica Francisco José De Caldas Sede Varones De Socotá – Boyacá	$ 0	$ 6.594.000.000	$ 6.594.000.000	Gobernación de Boyacá	
Educación Nacional	Mejoramiento del Auditorio Central de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Facultad Seccional Sogamoso	$ 0	$ 4.477.295.738	$ 4.477.295.738	Gobernación de Boyacá	
Educación Nacional	Adecuación y dotación del auditorio del Centro Regional de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Seccional Duitama departamento de Boyacá	$ 0	$ 2.953.905.417	$ 2.953.905.417	Gobernación de Boyacá	
Educación Nacional	Ampliación de Cobertura para la educación superior en el municipio de Chiquinquira- Departamento de Boyacá	$ 35.000.000.000	$ 0	$ 35.000.000.000	Ministerio de Educación Nacional	
TOTAL	**13**	**$ 35.000.000.000**	**$ 82.538.490.817**	**$ 117.538.490.817**		

**La entidad Responsable es la encargada de la fuente de financiación*

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. SALUD						
Sector	**Nombre de la Iniciativa**	**Aporte Nación**	**Aporte Territorio**	**Inversión Total**	**Entidad Responsable***	**Observaciones**
Salud y Protección Social	Construcción de la infraestructura de alta complejidad de la E.S.E Hospital universitario San Rafael de Tunja Departamento de Boyacá	$ 115.000.000.000	$ 0	$ 115.000.000.000	Ministerio se Salud y Protección Social	

Salud y Protección Social	Modernización de redes en la sede Unidad Materno Infantil María Josefa Canelones de la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja Departamento de Boyacá	$ 0	$ 9.967.617.935	$ 9.967.617.935	Gobernación de Boyacá	
Salud y Protección Social	Reposición de la ESE Hospital San Vicente de Ramiriquí, Boyacá	$ 9.000.000.000	$ 0	$ 9.000.000.000	Ministerio se Salud y Protección Social	
Salud y Protección Social	Construcción para la terminación de la remodelación y ampliación de la infraestructura física de la Unidad Materno Infantil de la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja Departamento de Boyacá	$ 0	$ 6.499.679.903	$ 6.499.679.903	Gobernación de Boyacá	
Salud y Protección Social	Construcción de la torre de alta complejidad, Hospital Regional de Duitama	$ 45.000.000.000	$ 0	$ 45.000.000.000	Ministerio se Salud y Protección Social	
TOTAL	**5**	**$ 169.000.000.000**	**$ 16.467.297.838**	**$ 185.467.297.838**		

**La entidad Responsable es la encargada de la fuente de financiación*

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. DEPORTE						
Sector	**Nombre de la Iniciativa**	**Aporte Nación**	**Aporte Territorio**	**Inversión Total**	**Entidad Responsable***	**Observaciones**
Deporte	Construcción primera etapa del estadio del sol y su espacio público en el municipio de Sogamoso Departamento De Boyacá	$ 0	$ 16.397.000.000	$ 16.397.000.000	Gobernación de Boyacá	
Deporte	Renovación de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural de Boyacá	$ 0	$ 276.000.000.000	$ 276.000.000.000	Gobernación de Boyacá	
TOTAL	**2**	**$ 0**	**$ 292.397.000.000**	**$ 292.397.000.000**		

**La entidad Responsable es la encargada de la fuente de financiación*

LÍNEA ESTRATÉGICA 5. AGROPECUARIO						
Sector	**Nombre de la Iniciativa**	**Aporte Nación**	**Aporte Territorio**	**Inversión Total**	**Entidad Responsable***	**Observaciones**
Agricultura y Desarrollo Rural	Fortalecimiento del sector agrícola como estrategia de competitividad y productividad en el departamento de Boyacá	$ 0	$ 21.646.495.036	$ 21.646.495.036	Gobernación de Boyacá	
Agricultura y Desarrollo Rural	Fortalecimiento de la agricultura familiar y campesina ante la variabilidad climática en el Departamento de Boyacá	$ 0	$ 23.069.995.735	$ 23.069.995.735	Gobernación de Boyacá	
Agricultura y Desarrollo Rural	Fortalecimiento de las capacidades productivas sostenibles con acceso a factores Productivos para el sector ganadero en el departamento de Boyacá	$ 0	$ 12.229.661.368	$ 12.229.661.368	Gobernación de Boyacá	
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción De La Plaza De Mercado De Mercado Del Norte Del Municipio De Tunja - Departamento De Boyacá	$ 12.721.249.281	$ 4.000.000.000	$ 16.721.249.281	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural/Gobernación de Boyacá	
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción y dotación de la plaza de ferias del municipio de Turmequé, departamento de Boyacá	$ 0	$ 7.729.642.400	$ 7.729.642.400	Gobernación de Boyacá	
Agricultura y Desarrollo Rural	Estudios y diseños de cuatro Plantas de Transformación Productiva en los municipios de Tipacoque, Zetaquira, Samacá y Tununguá del Departamento de Boyacá	$ 0	$ 1.600.000.000	$ 1.600.000.000	Gobernación de Boyacá	
Agricultura y Desarrollo Rural	Elaboración de estudios y diseños para la creación del centro Agroindustrial, logístico y de comercialización del oriente colombiano en el departamento de Boyacá	$ 0	$ 665.472.399	$ 665.472.399	Gobernación de Boyacá	
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción Plaza Mercado en el municipio de Ramiriquí, Departamento de Boyacá	$ 0	$ 14.000.000.000	$ 14.000.000.000	Gobernación de Boyacá	
TOTAL	**8**	**$ 12.721.249.281**	**$ 84.941.266.938**	**$ 97.662.516.219**		

**La entidad Responsable es la encargada de la fuente de financiación*

LÍNEA ESTRATÉGICA 6. INFRAESTRUCTURA PARA EL TURISMO						
Sector	**Nombre de la Iniciativa**	**Aporte Nación**	**Aporte Territorio**	**Inversión Total**	**Entidad Responsable***	**Observaciones**
Turismo	Estudios y diseños para la construcción de un parque temático alusivo a los procesos de transformación agroindustrial como estrategia para el fortalecimiento del turismo en el municipio de Moniquirá departamento de Boyacá	$ 0	$ 2.740.098.439	$ 2.740.098.439	Gobernación de Boyacá	
TOTAL	**1**	**$ 0**	**$ 2.740.098.439**	**$ 2.740.098.439**		

La entidad Responsable es la encargada de la fuente de financiación

LÍNEA ESTRATÉGICA 7. TRANSICIÓN ENERGÉTICA						
Sector	**Nombre de la Iniciativa**	**Aporte Nación**	**Aporte Territorio**	**Inversión Total**	**Entidad Responsable***	**Observaciones**
Transición Energética	Sistemas de Generación Distribuida para el Fortalecimiento Energético en el Departamento de Boyacá	$ 25.000.000.000	$ 75.000.000.000	$ 100.000.000.000	Ministerio de Minas y Energía/ Gobernación de Boyacá	
TOTAL	**1**	**$ 25.000.000.000**	**$ 75.000.000.000**	**$ 100.000.000.000**		

La entidad Responsable es la encargada de la fuente de financiación

LÍNEA ESTRATÉGICA 8. TRANSPORTE						
Sector	**Nombre de la Iniciativa**	**Aporte Nación**	**Aporte Territorio**	**Inversión Total**	**Entidad Responsable***	**Observaciones**
Transporte	Mejoramiento de la segunda etapa de la vía Troncal del Carbón en el municipio de Samacá, Departamento de Boyacá	$ 0	$ 20.869.764.027	$ 20.869.764.027	Gobernación de Boyacá	
Transporte	Estudios y diseños para el mejoramiento de corredores viales estratégicos en el Departamento de Boyacá	$ 0	$ 14.067.033.912	$ 14.067.033.912	Gobernación de Boyacá	
Transporte	Mejoramiento de la vía que conduce del municipio de Ráquira al centro poblado la Candelaría municipio de Ráquira departamento de Boyacá	$ 0	$ 17.997.056.728	$ 17.997.056.728	Gobernación de Boyacá	
Transporte	Fortalecimiento en la gestión vial para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de vías y transporte, a cargo del departamento de Boyacá.	$ 0	$ 85.669.000.000	$ 85.669.000.000	Gobernación de Boyacá	
Transporte	0	$ 0	$ 5.629.761.804	$ 5.629.761.804	Gobernación de Boyacá	
Transporte	Mejoramiento de vías urbanas "bicentenario" en el municipio de Chinavita - Boyacá	$ 0	$ 7.100.000.000	$ 7.100.000.000	Gobernación de Boyacá	
Transporte	Mejoramiento De Vía Departamental En El Tramo Comprendido Entre Villa De Leyva Y Arcabuco En El Departamento De Boyacá	$ 38.411.237.199	$ 35.000.000.000	$ 73.411.237.199	Fondo Regional de Pactos Territoriales	
Transporte	Mejoramiento De Las Vías Departamentales Limite Villapinzón - Turmequé Y Turmequé - Nuevo Colon -Tibaná En El Departamento De Boyacá	$ 70.031.648.339	$ 0	$ 70.031.648.339	Fondo Regional de Pactos Territoriales	
Transporte	Rehabilitación De La Vía Cruce Ruta 55 Ramal Acceso Al Municipio De Sotaquira y Mejoramiento De La Vía Cruce Ruta 6209 - El Llano De Sotaquirá del Departamento de Boyacá	$ 33.683.999.160	$ 10.784.814.203	$ 44.468.813.363	Fondo Regional de Pactos Territoriales	
Transporte	Pavimentación De La Vía Con Código 6101 Que Conduce Del Casco Urbano Del Municipio De Tenza Al Casco Urbano Del Municipio De Sutatenza, Departamento De Boyacá	$ 42.410.000.000	$ 10.000.000.000	$ 52.410.000.000	Fondo Regional de Pactos Territoriales	
Transporte	Mejoramiento de Vía Secundaria Entre Los Municipio De Chivatá Y Toca En El Departamento de Boyacá	$ 22.059.592.966	$ 21.467.407.034	$ 43.527.000.000	Fondo Regional de Pactos Territoriales	
Transporte	Mejoramiento de las vías departamentales cruce ruta 6209 (sote), cruce ruta 5502 (la bomba) y paso urbano por el municipio de Cómbita en el departamento de Boyacá"	$ 15.403.522.336	$ 5.000.000.000	$ 20.403.522.336	Fondo Regional de Pactos Territoriales	
Transporte	Mejoramiento de Vías Terciarias en el Departamento de Boyacá	$ 0	$ 28.747.778.763	$ 28.747.778.763	Gobernación de Boyacá	
TOTAL	**13**	**$ 222.000.000.000**	**$ 262.332.616.471**	**$ 484.332.616.471**		

La entidad Responsable es la encargada de la fuente de financiación

LÍNEA ESTRATÉGICA 9. FORMALIZACIÓN DE TIERRAS						
Sector	**Nombre de la Iniciativa**	**Aporte Nación**	**Aporte Territorio**	**Inversión Total**	**Entidad Responsable***	**Observaciones**
Agricultura y Desarrollo Rural	Formalización de títulos de Tierras en el Departamento de Boyacá	$ 29.897.846.371	$ 3.695.239.439	$ 33.593.085.810	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural/Gobernación de Boyacá	
TOTAL	**1**	**$ 29.897.846.371**	**$ 3.695.239.439**	**$ 33.593.085.810**		

**La entidad Responsable es la encargada de la fuente de financiación*

5. VISION DEL DESARROLLO REGIONAL

El Plan Estratégico de Inversiones del Pacto Boyacá constituye la hoja de ruta que orienta la consolidación de una visión compartida de desarrollo territorial, articulada con las prioridades regionales y nacionales. En este marco, el componente 5 de Visión del Desarrollo Regional integra proyectos e iniciativas estratégicas identificadas en el proceso de construcción del pacto, y consolidado en el documento denominado "listado indicativo de proyectos priorizados" el cual se constituye en una base inicial de los proyectos a tener en cuenta en la elaboración del Plan Estratégico de Inversiones.

A continuación, se presenta el listado de proyectos que fueron identificados en el marco de la construcción del Pacto y que no cuentan de manera parcial o total con fuente de financiación, lo cual requerirá la gestión institucional para identificar y concretar la fuente de financiación durante la vigencia del Pacto Territorial

PROYECTOS QUE REQUIEREN CONCRETAR FUENTE DE FINANCIACIÓN					
Eje o Línea Estratégica	**Nombre de la Iniciativa**	**Valor Total Indicativo**	**Aporte Parcial Indicativo***	**Valor Por Gestionar**	**Observaciones**
Agua y Saneamiento Básico	Optimización y construcción del Plan Maestro Alcantarillado separado fase 1 del área urbana del municipio de Sáchica Boyacá	$ 6.870.701.400	$ 0	$ 6.870.701.400	
Agua y Saneamiento Básico	Construcción del Plan Maestro de alcantarillado sanitario y pluvial del casco urbano del municipio de Paez Boyacá, sistema de colectores y Planta de Tratamiento de Agua Residual PTAR	$ 15.000.000.000	$ 0	$ 15.000.000.000	
Agua y Saneamiento Básico	Construcción Plan maestro de alcantarillado sanitario y pluvial del casco urbano del municipio de Chiscas Boyacá y Planta de tratamiento de Agua residual PTAR	$ 9.000.000.000	$ 0	$ 9.000.000.000	
Agua y Saneamiento Básico	Construcción primera etapa de la Planta de tratamiento de Agua Residual PTAR del municipio de Siachoque, Departamento de Boyacá	$ 3.898.216.203	$ 0	$ 3.898.216.203	
Agua y Saneamiento Básico	Construcción del interceptor de aguas residuales paralelo a la quebrada Chulo hasta la PTAR en el municipio de Samacá, Boyacá	$ 2.500.000.000	$ 0	$ 2.500.000.000	
Educación	Estudios Y Diseños Para La Construcción De Aulas Y Obras Complementarias En La Sede Bachillerato De La Institución Educativa Técnico Agropecuario De Santa Sofía - Departamento De Boyacá.	$ 11.789.810.392	$ 0	$ 11.789.810.392	
Educación	Construcción Y Mejoramiento De La Infraestructura Educativa I.E San Marcos Del Municipio De Muzo, Boyacá.	$ 9.958.000.000	$ 0	$ 9.958.000.000	
Educación	Construcción De La I.E. San Antonio Sede El Sol Del Municipio Ráquira - Departamento De Boyacá.	$ 8.389.000.000	$ 0	$ 8.389.000.000	
Educación	Ampliación de Cobertura para la educación superior en el municipio de Miraflores - Departamento de Boyacá	$ 23.000.000.000	$ 0	$ 23.000.000.000	
Educación	Ampliación de Cobertura para la educación superior en el municipio de Moniquirá - Departamento de Boyacá	$ 23.000.000.000	$ 0	$ 23.000.000.000	
Educación	Construcción De Aulas Y Ambientes Complementarios De La Institución Educativa Técnica Industrial Antonio Ricaute En El Municipio De Villa De Leyva - Departamento De Boyacá	$ 15.716.331.754	$ 1.571.633.175	$ 14.144.698.579	
Educación	Construcción De Aulas Y Ambientes Complementarios De La Institución Educativa Sergio Camargo Sede Central En El Municipio De Miraflores Departamento De Boyacá	$ 9.657.373.893	$ 965.737.389	$ 8.691.636.504	
Educación	Construcción Institución Educativa Integrado Sede Escuela Urbana Mixta, Municipio De Combita, Departamento De Boyacá	$ 6.061.875.840	$ 606.187.584	$ 5.455.688.256	
Educación	Mejoramiento Y Adecuación De Sedes Rurales En Instituciones Educativas Oficiales En El Departamento De Boyacá	$ 43.200.000.000	$ 6.890.282.609	$ 36.309.717.391	
Salud	Dotación para la prestación de servicios de salud en la sede Unidad Materno Infantil María Josefa Canelones de la E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja	$ 23.862.280.986	$ 0	$ 23.862.280.986	
Deporte	Construcción del entro Deportivo de Alto Rendimiento de Paipa Departamento de Boyacá	$ 59.522.000.000	$ 11.161.000.000	$ 48.361.000.000	

Deporte	Construcción de la Villa Deportiva en el Municipio de Puerto Boyacá	$ 49.648.000.000	$ 18.839.000.000	$ 30.809.000.000	
Agropecuario	Fortalecimiento A La Productividad Y Competitividad De Pequeños Productores Agropecuarios Como Estrategia Tecnológica De Desarrollo Rural Y Agrosostenibilidad, En El Departamento De Boyacá	$ 95.101.480.870	$ 1.175.000.000	$ 93.926.480.870	
Agropecuario	Construcción De La Plaza De Mercado De La Provincia De Sugamuxi En El Municipio De Sogamoso.	$ 37.125.901.756	$ 0	$ 37.125.901.756	
Agropecuario	Fortalecimiento De La Competitividad De La Cadena De Cereales En El Departamento Boyacá	$ 34.175.000.000	$ 0	$ 34.175.000.000	
Infraestructura para el Turismo	Restauración Conservación Y Mejoramiento Del Sitio Histórico De La Batalla Del Puente De Boyacá	$ 77.111.672.005	$ 0	$ 77.111.672.005	
Infraestructura para el Turismo	Diseño y Construcción de un escenario cultural, comercial y administrativo en la ciudad de Duitama	$ 45.000.000.000	$ 15.000.000.000	$ 30.000.000.000	
Infraestructura para el Turismo	Construcción Del Parque Principal Del Municipio De Cubará, Departamento De Boyacá	$ 7.765.688.853	$ 0	$ 7.765.688.853	
Transporte	Estudio de factibilidad para la viabilidad del tren mixto Bogotá-Belencito como estrategia de conectividad en el Departamento De Boyacá	$ 88.635.000.000	$ 0	$ 88.635.000.000	
Transporte	Mejoramiento y adecuación del Aeropuerto Alberto Lleras Camargo Del Municipio De Sogamoso	$ 65.919.260.573	$ 0	$ 65.919.260.573	
Transporte	Pavimentación de la vía El Espino-Puente Lata	$ 70.000.000.000	$ 0	$ 70.000.000.000	
Transporte	Mejoramiento de Vías Urbanas en el Departamento de Boyacá	$ 75.000.000.000	$ 37.500.000.000	$ 37.500.000.000	
Transporte	Mejoramiento de la vía sector Nariño - Caldas - Buenavista - Cantino-Coper - Muzo en el departamento de Boyacá	$ 97.440.334.917	$ 21.270.000.000	$ 76.170.334.917	
Total a gestionar	**28**	**$ 1.014.347.929.442**	**$ 114.978.840.757**	**$ 899.369.088.685**	

NOTA: * La Gobernación ha manifestado un aporte parcial de los recursos por un valor total indicativo de $190.764 millones de pesos

6. APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES.

El Plan Estratégico de Inversiones se presentó ante el Consejo Directivo del Pacto Territorial para su aprobación en la Sesión n.°2 realizado el 7 de noviembre de 2025 y que modifica el PEI aprobado el 22 de agosto de 2025. Es importante mencionar que, el Plan Estratégico de Inversiones incluye valores indicativos que podrán modificarse o actualizarse de acuerdo con la dinámica de implementación de cada Pacto Territorial, los cuales también deben contar con la aprobación del Consejo Directivo.

7. VALIDACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES.

En constancia de las decisiones tomadas por el Consejo Directivo, firman:

Firma:

Carlos Andrés Amaya Rodríguez
Gobernador de Boyacá
Presidente del Consejo Directivo

Firma:

Sandra Yaneth Tibamosca Villamarín
Gerente Nacional de Pactos Territoriales - DNP
Secretaría Técnica del Consejo Directivo

Preparo: Numael Parra Martinez *NEPM*
Reviso: Maria Fernanda Rueda *Mafe Rueda*

CLAUSULADO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP) Y LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio No. DNP- 877-2021 / ENT 221009.

PARTES:	**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP)** NIT 899.999.011-0 **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL (ENTerritorio)** NIT 899.999.316-1
OBJETO:	DNP confiere mandato a ENTerritorio para realizar la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan / Pactos Territoriales con los recursos que ingresen a este y los demás que le sean transferidos.
VALOR TOTAL	**DOS BILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($2.765.993.131.307)**
a) VALOR DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR	DOS BILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE **($2.733.893.131.307)**
b) CUOTA DE ADMINISTRACIÓN (VALOR DEL CONTRATO)	TREINTA Y DOS MIL CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE **($32.100.000.000)**
PLAZO:	Cincuenta (50) meses, sin exceder del 15 de noviembre de 2025.

Entre los suscritos, **ALEJANDRA CAROLINA BOTERO BARCO** , identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.451.908 de Bogotá, en su calidad de Directora General del **DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN -DNP**, con NIT 899.999.011-0, nombrada mediante Decreto No. 868 del 03 de agosto de 2021, debidamente posesionada mediante Acta No. 868 del 03 de agosto de 2021 y facultada de conformidad con el numeral 24 del artículo 7 del Decreto 2189 del 23 de diciembre de 2017, quien en el presente documento y para todos los efectos se denominará **DNP**; y por la otra parte, **MARÍA ELIA ABUCHAIBE CORTÉS**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 32.769.815 expedida en Barranquilla, en su calidad de Gerente General de la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL (ENTerritorio)**, con NIT 899.999.316-1, nombrada a través del Decreto No. 653 del 22 de abril de 2019 y el Acta de Posesión No. 047 del 22 de abril del 2019, en cumplimiento de las funciones contenidas en el artículo 8, numeral 8.7 del Decreto No. 288 de 2004, Empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter financiero, dotada de personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y vigilada por la Superintendencia Financiera, y quien adelante se denominará **ENTERRITORIO** y, en lo sucesivo, **LAS PARTES**, hemos acordado suscribir el presente Contrato Interadministrativo de Mandato, mediante la plataforma de Secop II, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. El Departamento Nacional de Planeación (DNP), de conformidad con el literal d) del numeral 1 del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, es un departamento administrativo del sector central de la administración pública, perteneciente a la Rama Ejecutiva del poder público en el orden nacional. Su carácter técnico le ha asignado el objetivo de impulsar una visión estratégica del país en los campos social, económico y ambiental, a través del diseño, la orientación y evaluación de las políticas públicas, el manejo y asignación de la inversión pública y la concreción de éstas en planes, programas y proyectos del Gobierno nacional.

II. Que mediante la Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014 *"Prosperidad para Todos"*, se incorporó al ordenamiento jurídico la figura de los Contratos Plan[1] como

[1] Artículo 8 de la Ley 1450 de 2011 modificado por el artículo 198 de la Ley 1753 de 2015.

acuerdo marco de voluntades entre la Nación y las entidades territoriales que contiene los arreglos programáticos y de desempeño definido para la ejecución asociada de proyectos de desarrollo territorial con concurrencia de esfuerzos de inversión nacional y territorial. En desarrollo de estos se suscriben contratos específicos señalando objeto, metas, plazos, responsable de ejecución, recursos (fuente nacional y territorial), vigencias futuras y mecanismos de seguimiento y control de los recursos.

III. El marco jurídico de los Contratos Plan se complementa con la Ley 1454 de 2011[2], a través de la cual se amplió su espectro a las áreas metropolitanas, puntualizando su celebración para proyectos estratégicos de desarrollo territorial y ejecución de programas del Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, mediante el documento CONPES 3822 de 2014[3], el cual propuso iniciar el plan de expansión, fortaleciendo e institucionalizando esta herramienta como: **i)** instrumento de gestión del desarrollo territorial, **ii)** mecanismo de articulación estratégica multinivel de las inversiones del PND; y **iii)** vehículo para profundizar la descentralización y robustecer el papel de las gobernaciones como agentes intermediarios entre la Nación y los municipios, y definiendo un conjunto de criterios de focalización, condiciones de elegibilidad, reglas de financiamiento y arreglos institucionales a ser tenidos en cuenta en la operación del instrumento.

IV. Adicionalmente, con la expedición del CONPES 3867 de 2016[4], se contemplaron los Contratos Plan como vehículos para la implementación de la estrategia de preparación para la paz y el posconflicto, dada la aproximación netamente territorial de la paz.

V. En virtud del decreto 819 de 2012, en su Artículo 6º, señala que las iniciativas de Contratos Plan de las entidades u organismos del nivel nacional serán coordinadas por el Departamento Nacional de Planeación.

VI. Posteriormente, mediante la expedición de la Ley 1753 de 2015[5], en los artículos 198 y 199 señalaron respecto de la figura de los contratos plan, de una parte, el alcance jurídico de la herramienta, y de otra, se creó el Fondo Regional para los Contratos Plan y los Contratos Específicos como mecanismos para potenciar la gestión y la ejecución de la herramienta de Contratos Plan, consistente en una cuenta de naturaleza especial, sin personería jurídica, adscrita al DNP que podría ser administrada por una entidad financiera del orden nacional, con participación estatal, por medio de un contrato de mandato en los términos previstos en los artículos 2.2.13.1.2.3 y 2.2.13.1.2.4 del Decreto 740 de 2016, constituyéndose en un mecanismo de gestión , que permitiera facilitar el cumplimiento de los acuerdos, metas y resultados acordados en los Contratos Plan para lograr la articulación y convergencia de recursos disponibles.

VII. Así mismo el parágrafo del artículo 2.2.13.1.5. del Decreto 740 del 2016, señaló los lineamientos de operación institucional de la siguiente manera: *"El Departamento Nacional de Planeación como coordinador y orientador de los Contratos Plan, establecerá los mecanismos de seguimiento y evaluación en el reglamento operativo teniendo en cuenta que estos recaen sobre esta herramienta y no sobre los contratos específicos que se deriven de las mismas. Las labores de supervisión e interventoría de los contratos específicos son responsabilidad de las entidades encargadas de la ejecución presupuestal".*

VIII. Seguidamente, el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019[6], creó la figura denominada Pactos Territoriales, entendida como acuerdos marco de voluntades de carácter Regional, Departamental o Funcional, para el desarrollo de las estrategias diferenciadas a las que hacen referencia las bases del Plan Nacional de Desarrollo - PND, cuyo propósito es articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos de impacto regional, conforme a las necesidades de los territorios, a fin de promover, entre otras cosas, la superación de la pobreza, el fortalecimiento institucional de las autoridades territoriales y el desarrollo socioeconómico de las comunidades.

[2] "Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones".
[3] "Lineamiento de Politica y Plan de expansión 2014-2018"
[4] "Estrategia de Preparación Institucional para la Paz y el Posconflicto"
[5] Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 *"Todos por un nuevo país"*
[6] por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 – *"Pacto por Colombia Pacto Por la Equidad"*

IX. Es así como los Pactos Territoriales incorporan un enfoque de asociatividad territorial alrededor de intervenciones o proyectos de impacto regional y formación bruta de capital, de igual forma buscan promover la delegación de competencias y prestación de servicios públicos compartidos, entre entidades territoriales. En este sentido, se espera fortalecer el acceso a fuentes de recursos, acceso directo a los recursos del Sistema General de Regalías – SGR, o a la presentación y ejecución de proyectos como esquema asociativo, mejorando la calidad de la inversión pública y garantizando la coordinación y la articulación de la planeación e inversiones para el desarrollo regional.

X. Dentro de la citada Ley 1955 de 2019 se encargó al DNP de coordinar el proceso de transición y articulación de los Contratos Plan hacia Pactos Territoriales, definiendo los aspectos operativos correspondientes[7].

XI. Ahora bien, en lo referente a la naturaleza y misionalidad del DNP, mediante el artículo 2 del Decreto 2189 de 2017[8], se establece que: *"El Departamento Nacional de Planeación tiene como objetivos fundamentales la coordinación y diseño de políticas públicas y del presupuesto de los recursos de inversión, la articulación entre la planeación de las entidades del Gobierno nacional y los demás niveles de gobierno; la preparación, el seguimiento de la ejecución y la evaluación de resultados de las políticas, planes, programas y proyectos del sector público, así como realizar en forma permanente el seguimiento de la economía nacional e internacional y proponer los estudios, planes, programas y proyectos para avanzar en el desarrollo económico, social, institucional y ambiental, y promover la convergencia regional del país"*.

XII. A su vez, el artículo 3 del mismo Decreto menciona que el DNP tiene dentro de sus funciones, entre otras:

(...) 4. Brindar apoyo técnico a las entidades públicas del orden nacional y territorial para el desarrollo de sus funciones en los temas de competencia del Departamento Nacional de Planeación.

(...) 6. Coordinar y acompañar la formulación, preparación y seguimiento de políticas, planes, programas y proyectos con énfasis en convergencia regional, ordenamiento territorial y articulación entre niveles de gobierno y fuentes de recursos en los territorios.

(...) 15. Promover, coordinar y apoyar técnicamente el desarrollo de esquemas de asociación entre el sector público y privado en temas y proyectos de interés del Gobierno nacional.

(...) 21. Apoyar a las entidades territoriales, cuando estas lo soliciten, en la priorización y formulación de los proyectos financiables con recursos del Sistema General de Regalías y su incorporación en el proyecto de Ley Bienal de Presupuesto del Sistema General de Regalías.

(...) 24. Promover la realización de actividades tendientes a fortalecer los procesos de planificación y gestión pública territorial que contribuyan a la articulación entre los diferentes niveles de gobierno y el desarrollo local y regional.

25. Promover, coordinar y apoyar técnicamente el desarrollo de esquemas de asociación y coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y al interior de los mismos para promover los objetivos de convergencia regional.

26. Orientar y coordinar la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos realizados por las entidades adscritas y vinculadas al Departamento Nacional de Planeación."

XIII. Por su parte, en observancia del numeral 5.4 del manual de contratación del DNP, la elaboración de

[7] Los Contratos Específicos y el Fondo Regional para los Contratos Plan, en adelante Fondo Regional para los Pactos Territoriales, se orientarán a facilitar la ejecución de los Pactos Territoriales y de los Contratos Plan vigentes, estos últimos se mantendrán vigentes por el término de duración pactado que, en todo caso, no podrá superar 31 de diciembre de 2023.

[8] *"Por el cual se modifica la estructura del Departamento Nacional de Planeación"*

los estudios y documentos previos corresponde a la dependencia que solicita la contratación, que para el caso que nos ocupa es la Dirección de Inversiones y Finanzas Publicas (DIFP) a la cual pertenece el Grupo de Gerencia Nacional de Pactos Territoriales (GGNPT) en virtud de lo dispuesto en la Resolución No. 0048 de 2020[9]; dicho Grupo tiene dentro de sus funciones las siguientes:

"(...) 2. Consolidar con las direcciones técnicas, las iniciativas del gobierno nacional a incluir en la matriz de negociación de los Pactos Territoriales y posteriormente en los planes estratégicos de inversiones de los pactos suscritos.

3. *Promover la articulación Nación – Territorio, orientada a la identificación, concertación y gestión técnica y financiera de proyectos e intervenciones regionales y subregionales de gran impacto, incluidas en los Pactos Territoriales o contratos plan vigentes.*

4. *Promover la articulación e interacción entre los diferentes actores que convergen en el territorio y que participan en los Pactos Territoriales o contratos plan vigentes, con el fin de contribuir a su implementación y ejecución.*

5. *Acompañar y asistir técnicamente a las entidades del orden nacional o territorial, para la gestión de recursos de diferentes fuentes, que permitan la financiación de los proyectos incluidos en los Pactos Territoriales o contratos plan vigentes, según los procedimientos establecidos.*

6. *Promover y coordinar el monitoreo o seguimiento de los proyectos que sean priorizados y financiados a través de los Pactos Territoriales o contratos plan vigentes (...)".*

XIV. En ese orden de ideas, a través de dicho Grupo, en ejercicio de la función de articular y financiar los proyectos que hagan parte de los pactos territoriales, con el fin de promover el desarrollo regional y lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley 1753 de 2015, a través del cual se modificó el artículo 8° de la Ley 1450 de 2011, el DNP suscribió trece (13) contratos plan, a saber:

No.	CONTRATO PLAN	FECHA DE SUSCRIPCION	PARTES	ESTADO
1	CONTRATO PLAN TOLIMA	12/01/2013 (otro si 9/11/2017)	Departamento del Tolima - Cortolima - Alcaldía de Ataco- Chaparral -Coyaima -Natagaima - Ortega - Planadas- Rioblanco-Roncesvalles - San Antonio - Rovira-Dolores- Prado - Alpujarra-Villarica	Cerrado por vencimiento de término
2	CONTRATO PLAN ATRATO GRAN DARIEN	13/09/2012	Departamento del Choco- Departamento de Antioquia – Departamento deCordoba-25 municipios de la región Atrato Gran Darien	Cerrado por vencimiento de término
3	CONTRATO PLAN BOYACÁ BICENTENARIO	10/11/2002 (otro si No 1 -9/12/2015) (otro si No 2 -26/10/2017)	Departamento de Boyacá - 123 municipios	Terminación Anticipada
4	CONTRATO PLAN NARIÑO	6/01/2013 (otro si No 01-10/11/2017)	Departamento de Nariño - 64 Municipios	Cerrado por vencimiento de término
5	CONTRATO PLAN CAUCA	19/01/2013 (otro si 22/06/2018)	Departamento del Cauca - 42 Municipios	En ejecución

[9] *"Por la cual se crea un grupo interno de trabajo en el Departamento Nacional de Planeación".*

6	CONTRTATO PLAN ARAUCA	16/02/2013	Departamento de Arauca- Corporinoquia- Oleoducto Bicentenario y municipios de Arauca - Arauquita- Fortul-Saravena - Cravo Norte - Puerto Rondo - Tame	Cerrado por vencimiento de término
7	CONTRATO PLAN SANTANDER	27/07/2013	Departamento de Santander - 87 Municipios	Cerrado por vencimiento de término
8	CONTRATO PLAN BOLIVAR - SUCRE	28/10/2016	Departamento de Bolívar y Departamento de Sucre	Terminación Anticipada
9	CONTRATO PLAN CAQUETÁ	31/08/2017	Departamento del Caquetá	Terminación Anticipada
10	CONTRATO PLAN GUANÍA	11/09/2017	Departamento del Guainía	Terminación Anticipada
11	CONTRATO PLAN GUAVIARE	27/10/2017	Departamento de Guaviare	Terminación Anticipada
12	CONTRATO PLAN META	27/10/2017	Departamento del Meta	Terminación Anticipada
13	CONTRATO PLAN VALLE DEL CAUCA	14/09/2017	Departamento del Valle	Terminación Anticipada

XV. A la fecha se encuentra vigente solo uno de ellos, el Contrato Plan Cauca, razón por la cual las Entidades Territoriales que suscribieron el acta de terminación anticipada tienen la obligación de continuar con el monitoreo de todos los proyectos que siguen en ejecución, debiendo reportar el estado de avance al DNP.

XVI. Para la ejecución de los Contratos Plan, ENTerritorio, en calidad de mandatario y administrador del Fondo Regional de Contratos Plan, hoy Fondo Regional de Pactos Territoriales, adquirió la obligación de suscribir contratos específicos con las entidades ejecutoras de cada proyecto priorizado por el DNP, según lo previsto en el Decreto 740 del 2016.

XVII. Al respecto, es importante resaltar que, de los sesenta y ocho (68) Contratos Específicos suscritos, con las entidades ejecutoras, en el marco de los Contrato Plan, a la fecha se encuentra en fase de ejecución, un total de veinte (20) dentro de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos así:

No.	Contrato Específico	Contrato de Mandato	Entidad Ejecutora	Fecha de suscripción	Fecha de terminación	Estado	Objeto del contrato
1	022-2162980	216138 2016	Departamento del Cauca	23-dic-16	30-nov-21	En ejecución	COFINANCIAR AL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER- ESE SANTANDER DE QUILICHAO- DEPARTAMENTO DEL CAUCA", PRIORIZADO EN EL CONTRATO PLAN DEL NORTE DEL CAUCA.
2	026-2170927	216138 2016	Aguas de Bolivar	28-abr-17	31-oct-21	En ejecución	FONADE Y AGUAS DE BOLIVAR ACUERDAN SUSCRIBIR UN CONTRATO ESPECÍFICO DERIVADO DEL CONTRATO PLAN PARA LA PAZ

No.	Contrato Especifico	Contrato de Mandato	Entidad Ejecutora	Fecha de suscripción	Fecha de terminación	Estado	Objeto del contrato
							BOLIVAR- SUCRE QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN CON EL FIN DE TRANSFERIR LOS RECURSOS DEL FONDO REGOINAL PARA LOS CONTRATOS PLAN PARA LA COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABCERA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2017.
3	035-2171610	216138 2016	Universidad del Cauca - OBRA Departamento de Cauca - Interventoría	19-jul-17	1-jul-21	**Suspendido** Se adelantan trámites administrativos ante el Sistema General de Regalías para el ajuste del proyecto que permita adicionar los recursos al contrato de interventoría del proyecto	FONADE, EL DEPARTAMENTO Y LA UNIVERSIDAD, ACUERDAN SUSCRIBIR UN CONTRATO ESPECÍFICO, DERIVADO DEL CONTRATO PLAN NACIÓN PARA LA REGIÓN DEL NORTE DEL CAUCA, QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON EL FIN DE TRANSFERIR RECURSOS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA PARA LA REGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN PLAN DE ACCIÓN 2017 DEL CONTRATO PLAN
4	039-2172296	216138 2016	Municipio de Sincelejo	31-oct-17	15-oct-21	En ejecución	FONADE, EL MUNICIPIO DE SINCELEJO Y LA E.S.E. – UNIDAD DE SALUD DE ASÍS DE SINCELEJO, ACUERDAN SUSCRIBIR UN CONTRATO ESPECÍFICO, DERIVADO DEL CONTRATO PLAN PARA LA PAZ NACIÓN – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – SUCRE QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON EL FIN DE FINANCIAR EL PROYECTO "REMODELACIÓN DE LA IPS LA CAMPIÑA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN Y DEMÁS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE

No.	Contrato Especifico	Contrato de Mandato	Entidad Ejecutora	Fecha de suscripción	Fecha de terminación	Estado	Objeto del contrato
							BAJA COMPLEJIDAD 5EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO", CON RECURSOS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS CONTRATOS EN TANTO EL PROYECTO SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN PLAN DE ACCIÓN 2017 DEL CONTRATO PLAN.
5	048-2191864	219057 2019	Municipio de Pasto	26-jun-19	6-jun-22	En ejecución	ENTERRITORIO Y EL MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO, ACUERDAN SUSCRIBIR UN CONTRATO ESPECÍFICO, DERIVADO DEL CONTRATO PLAN NARIÑO QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON EL FIN DE DESTINAR RECURSOS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES Y DEL MUNICIPIO DE PASTO (NARIÑO) PARA LA COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS INTERNAS DE LA PLAZA DE MERCADO EL POTRERILLO". QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN PLAN DE ACCIÓN 2019 DEL CONTRATO PLAN NARIÑO.
6	049-2191865	219057 2019	Departamento de Guainía	26-jun-19	3-dic-21	En ejecución	ENTERRITORIO Y EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA, ACUERDAN SUSCRIBIR UN CONTRATO ESPECÍFICO, DERIVADO DEL CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN -DEPARTAMENTO DE GUAINÍA QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON EL FIN DE COFINANCIAR CON RECURSOS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES Y RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE 9 PUESTOS EN SALUD EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA " QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN PLAN DE ACCIÓN 2019 DEL CONTRATO PLAN GUAINÍA.
7	054-2192520	219057 2019	Municipio de Ovejas	30-dic-19	30-sep-21	En ejecución	ENTERRITORIO Y EL MUNICIPIO DE OVEJAS-SUCRE, ACUERDAN SUSCRIBIR UN CONTRATO ESPECÍFICO, DERIVADO DEL CONTRATO PLAN PARA LA PAZ BOLÍVAR-SUCRE, QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON EL FIN DE DESTINAR RECURSOS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS

No.	Contrato Específico	Contrato de Mandato	Entidad Ejecutora	Fecha de suscripción	Fecha de terminación	Estado	Objeto del contrato
							TERRITORIALES Y LOS DEMÁS QUE SE REQUIERAN PARA LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE CHENGUE CON EL TESORO DEL MUNICIPIO DE OVEJAS", QUE SE 8ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2019 DEL CONTRATO PLAN PARA LA PAZ BOLÍVAR-SUCRE.
8	055-2192521	219057 2019	Departamento del Guaviare	30-dic-19	31-oct-21	En ejecución	ENTERRITORIO Y EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE, ACUERDAN SUSCRIBIR UN CONTRATO ESPECÍFICO, DERIVADO DEL CONTRATO PLAN PARA LA PAZ GUAVIARE, QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON EL FIN DE DESTINAR RECURSOS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES Y LOS DEMÁS QUE SE REQUIERAN PARA LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTANDER DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE", QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2019 DEL CONTRATO PLAN PARA LA PAZ GUAVIARE.
9	056-2192522	219057 2019	Departamento del Guainía	30-dic-19	31-oct-21	En ejecución	ENTERRITORIO Y EL DEPARTAMENTO DEL GUAINIA, ACUERDAN SUSCRIBIR UN CONTRATO ESPECÍFICO, DERIVADO DEL CONTRATO PLAN PARA LA PAZ GUAINIA, QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON EL FIN DE DESTINAR RECURSOS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES Y LOS DEMÁS QUE SE REQUIERAN PARA LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO COAYARE COCO-COMUNIDAD DE GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA ", QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2019 DEL CONTRATO PLAN PARA LA PAZ GUAINIA.

CLAUSULADO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP) Y LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio No. DNP- 877-2021 / ENT 221009.

No.	Contrato Específico	Contrato de Mandato	Entidad Ejecutora	Fecha de suscripción	Fecha de terminación	Estado	Objeto del contrato
10	057-2192523	219057 2019	Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes de Sucre	30-dic-19	30-jun-21	**Suspendido** Se necesitan recursos adicionales para la terminación del proyecto que aporta la Gobernación	ENTERRITORIO Y EL FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SUCRE, ACUERDAN SUSCRIBIR UN CONTRATO ESPECÍFICO, DERIVADO DEL CONTRATO PLAN PARA LA PAZ BOLÍVAR-SUCRE, QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON EL FIN DE DESTINAR RECURSOS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES Y LOS DEMÁS QUE SE REQUIERAN PARA LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JOSE ELÍAS CURY LAMBRAÑO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE", QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2019 DEL CONTRATO PLAN PARA LA PAZ BOLÍVAR-SUCRE.
11	059-2192525	219057 2019	Municipio de El Dorado	30-dic-19	1-oct-21	En ejecución	ENTERRITORIO Y EL MUNICIPIO DE EL DORADO – META, , ACUERDAN SUSCRIBIR UN CONTRATO ESPECÍFICO, DERIVADO DEL CONTRATO PLAN PARA LA PAZ DE LA NACIÓN META, QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON EL FIN DE DESTINAR RECURSOS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES Y LOS DEMÁS QUE SE REQUIERAN PARA LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL PUENTE CAÑO PAJUIL 1 HASTA EL PENTE DE CAÑO PAJUIL 2 VEREDA DE SANTA ROSA ALTA DEL MUNICIPIO DE EL DORADO, META ", QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2019 DEL CONTRATO PLAN META.
12	060-2192526	219057 2019	Hospital Nuestra Señora de Lourdes ESE de Ataco Tolima	30-dic-19	31-dic-21	En ejecución	ENTERRITORIO Y EL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES E.S.E. DE ATACO, ACUERDAN SUSCRIBIR UN CONTRATO ESPECÍFICO, DERIVADO DEL CONTRATO PLAN TOLIMA QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON EL FIN DE DESTINAR RECURSOS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES Y LOS DEMÁS QUE SE

No.	Contrato Específico	Contrato de Mandato	Entidad Ejecutora	Fecha de suscripción	Fecha de terminación	Estado	Objeto del contrato
							REQUIERAN PARA LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCION NUEVO CENTRO DE SALUD SANTIAGO PEREZ MUNICIPIO DE ATACO - TOLIMA", QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2019 DEL CONTRATO PLAN TOLIMA.
13	061-2192527	219057 2019	Municipio de Sutamarchan	30-dic-19	31-dic-21	En ejecución	ENTERRITORIO Y EL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, ACUERDAN SUSCRIBIR UN CONTRATO ESPECÍFICO, DERIVADO DEL CONTRATO PLAN BOYACÁ QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON EL FIN DE DESTINAR RECURSOS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES Y LOS DEMÁS QUE SE REQUIERAN PARA LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2019 DEL CONTRATO PLAN BOYACÁ.
14	062-2192528	219057 2019	Departamento del Valle del Cauca	30-dic-19	15-dic -21	En ejecución	ENTERRITORIO Y EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, ACUERDAN SUSCRIBIR UN CONTRATO ESPECÍFICO, DERIVADO DEL CONTRATO PLAN PARA LA PAZ VALLE DEL CAUCA QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON EL FIN DE DESTINAR RECURSOS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES Y LOS DEMÁS QUE SE REQUIERAN PARA LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VIA 25VL22 TULUA - SAN RAFAEL - BARRAGAN - LA UNION LIMITE TOLIMA (VIA RONCESVALLES) TRAMO 2 EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA", QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2019 DEL CONTRATO PLAN PARA LA PAZ VALLE DEL CAUCA.
15	063-2192529	219057 2019	Municipio de Tutaza	30-dic-19	30-nov-21	En ejecución	ENTERRITORIO Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, ACUERDAN SUSCRIBIR UN CONTRATO ESPECÍFICO, DERIVADO DEL CONTRATO PLAN BOYACÁ QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON EL FIN DE DESTINAR

No.	Contrato Específico	Contrato de Mandato	Entidad Ejecutora	Fecha de suscripción	Fecha de terminación	Estado	Objeto del contrato
							RECURSOS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES Y LOS DEMÁS QUE SE REQUIERAN PARA LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA TUTAZÁ CRUCE RUTA 6404 CÓDIGO 55-23 BELÉN SAMACA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2019 DEL CONTRATO PLAN BOYACÁ.
16	064-2200863	219057 2019	Departamento de Santander	27-jul-20	24-abr-21	**Suspendido.** Se necesitan recursos para el equipamiento que deberá aportar la Gobernación. La obra ya está ejecutada al 100%	ENTERRITORIO Y EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ACUERDAN SUSCRIBIR UN CONTRATO ESPECÍFICO, DERIVADO DEL CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN – DEPARTAMENTO DE SANTANDER, QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON EL FIN DE DESTINAR RECURSOS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES Y LOS DEMÁS QUE SE REQUIERAN PARA LA COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO DE LABORATORIOS PARA EL PROCESO MISIONAL DE FORMACIÓN DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ- BARRANCABERMEJA", QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2020 DEL CONTRATO PLAN SANTANDER.
17	065-2201103	219057 2019	Departamento de Arauca	28-dic-20	28-feb-22	En ejecución	ENTERRITORIO Y EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, ACUERDAN SUSCRIBIR UN CONTRATO ESPECÍFICO, DERIVADO DEL CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN – DEPARTAMENTO DE ARAUCA, QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON EL FIN DE DESTINAR RECURSOS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES Y LOS DEMÁS QUE SE REQUIERAN PARA LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LOS MIRADORES DE LOS MUNICIPIOS DE TAME, SARAVENA Y ARAUQUITA, EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA", QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2020 DEL CONTRATO PLAN ARAUCA.

No.	Contrato Específico	Contrato de Mandato	Entidad Ejecutora	Fecha de suscripción	Fecha de terminación	Estado	Objeto del contrato
18	066-2201107	219057 2019	Municipio de Tunja	28-dic-20	28-dic-21	En ejecución	ENTERRITORIO Y EL MUNICIPIO DE TUNJA, ACUERDAN SUSCRIBIR UN CONTRATO ESPECÍFICO, DERIVADO DEL CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON EL FIN DE DESTINAR RECURSOS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES Y LOS DEMÁS QUE SE REQUIERAN PARA LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO "INSTALACION DE LA SEÑALIZACION TURISTICA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE TUNJA, BOYACA", QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2020 DEL CONTRATO PLAN BOYACÁ"
19	067-2210003	219057 2019	Departamento de Arauca	14-ene-21	14-nov-21	En ejecución	ENTERRITORIO Y EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, ACUERDAN SUSCRIBIR UN CON-TRATO ESPECÍFICO, DERIVADO DEL CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN – DEPARTA-MENTO DE ARAUCA, QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON EL FIN DE DESTINAR RECURSOS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES Y LOS DE-MÁS QUE SE REQUIERAN PARA LA FINAN-CIACIÓN DEL PROYECTO "APOYO A LA GENERACIÓN DE INGRESOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS FAMI-LIAS VÍCTIMAS, DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA", QUE SE ENCUENTRA PRIORIZA-DO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2020 DEL CON-TRATO PLAN ARAUCA".
20	068-2210004	219057 2019	Municipio de Fortul	14-ene-21	14-jun-22	En ejecución	ENTERRITORIO, EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y EL MUNICIPIO DE FORTUL – ARAUCA, ACUERDAN SUSCRIBIR UN CON-TRATO ESPECÍFICO, DERIVADO DEL CON-TRATO PLAN DE LA NACIÓN – DEPARTA-MENTO DE ARAUCA, QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON EL FIN DE DESTINAR RECURSOS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES Y LOS DE-MÁS QUE SE REQUIERAN PARA LA COFI-NANCIACIÓN DEL PROYECTO DENOMINA-DO "CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN Y PROTECCIÓN DE TA-LUDES DEL

No.	Contrato Específico	Contrato de Mandato	Entidad Ejecutora	Fecha de suscripción	Fecha de terminación	Estado	Objeto del contrato
							SECTOR CRÍTICO RÍO CUSAY, MUNICIPIO DE FORTUL, ARAUCA" QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2020 DEL CONTRATO PLAN ARAUCA".

XVIII. Por su parte, en el marco de lo dispuesto en el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019, a la fecha hay diez (10) pactos territoriales en ejecución (Bicentenario, Golfo de Morrosquillo, Santander, Casanare, Cesar -La Guajira, Atlántico, Cundinamarca, Bolívar, por la Cultura Bello Antioquia y Río Bogotá).

XIX. De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.3.2 del documento CONPES 4023 del 11 de febrero de 2021, se destaca a los Pactos Territoriales dentro de los mecanismos de articulación institucional entre niveles de gobierno, por lo cual las recomendaciones del referido documento, numeral 3, literal C se solicita al DNP "*implementar una estrategia de dinamización de los proyectos de impacto regional para la reactivación, como impulso importante al proceso de reactivación económica*", para lo cual el Fondo Regional para los Pactos Territoriales – FRPT, se convierte en el vehículo que da cumplimiento a la recomendación como estrategia de dinamización para superar la crisis financiera causada por el COVID-19.

XX. Así las cosas, estos proyectos de inversión priorizados en los Planes Estratégicos de los Pactos Territoriales vigentes han sido concertados de manera articulada entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales, dada su importancia en el desarrollo económico y social del país, por lo que es fundamental impulsar su financiación y ejecución, para apoyar el desarrollo de las regiones y contrarrestar los efectos del COVID-19, que han desencadenado una crisis económica sin precedentes, toda vez que la actual emergencia de salud ha ocasionado una contracción de la economía colombiana calculada para el 2020 en 6,8%, además de un aumento en el índice de pobreza monetaria, que registra un nivel del 42,5% y en el índice de pobreza monetaria extrema, con el 15,1% de acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)[10].

XXI. Así mismo, se evidencia una profunda crisis económica y social por la pérdida de empleos formales, la no generación de ingresos para aquellos colombianos que no tienen un salario fijo y el aumento de la informalidad laboral en el país. Respecto a las proyecciones de la tasa de desempleo afectada por los efectos de la pandemia del COVID-19, esta puede variar entre 15,6 y 11,9 puntos. Esto dependerá de las acciones en inversión pública, así como los diferentes mecanismos que se puedan generar en materia de reactivación económica. De acuerdo con la Federación Nacional de Departamentos, de los 32 departamentos del país, 17 presentaron una disminución mayor al promedio de -37 % de sus ingresos tributarios y no tributarios en el mes de junio de 2020. El impuesto de registro (-38 %), loterías foráneas y ganadores de sorteos ordinarios y extraordinarios (-80 %), los impuestos al consumo de licores (-71 %), cervezas (-40 %), las estampillas (-55 %), son las rentas más afectadas por la emergencia social, económica y ambiental generada por la pandemia del COVID-19. En conclusión, la variación acumulada (enero a junio) alcanza 1.286.591 millones de pesos de recaudos que han dejado de recibir los departamentos.[11]

XXII. Para lograr este objetivo de reactivación económica, se busca la financiación de proyectos de

[10] https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-monetaria
[11] Documento Impacto de la Emergencia del COVID-19 en las finanzas departamentales -FND – Bogotá, julio de 2020

infraestructura priorizados en los Pactos Territoriales suscritos, a través del FRPT, los cuales pertenecen a diferentes sectores como: Agricultura, Ambiente, Comercio, Deporte, Educación, Gobierno, Inclusión Social, Interior, Justicia, Minas y Energía, Transporte y Vivienda; la definición de estos sectores es el resultado de un análisis de su contribución a la reactivación económica, dada su relevancia estratégica. Por lo anterior, se realizó solicitud de aval fiscal[12] para la declaratoria de importancia estratégica por parte del CONPES para el proyecto de inversión "*Apoyo al desarrollo de proyectos a través del Fondo Regional para los Contratos Plan*", hoy Pactos Territoriales, con el propósito de contar con el cupo de vigencias futuras ordinarias y excepcionales, necesarias para impulsar las inversiones estratégicas incluidas en los Pactos Territoriales, definidos en el artículo 250 de la Ley 1955 del 2019, cuya implementación pretende mejorar los niveles en la calidad y cobertura de la prestación de los servicios de salud, educación, transporte, agua potable y saneamiento básico. Así mismo, busca impulsar el desarrollo territorial a través de proyectos enfocados en dinamizar la economía regional, el incentivo a la producción agrícola y la promoción del turismo.

XXIII. De esta manera, los Pactos Territoriales complementan las acciones adelantadas por el Gobierno nacional para afrontar la crisis económica y social actual, mediante la priorización y ejecución de inversiones estratégicas de alto impacto, que aportan al desarrollo de la economía nacional, principalmente por el uso de mano de obra, incidiendo en la generación de empleo y la reactivación del aparato productivo.

XXIV. En ese mismo orden de acción, el pasado 19 de julio del 2021 se expidió el documento CONPES No. 4037 mediante el cual se declaró la importancia estratégica del proyecto de inversión: "*Apoyo al desarrollo de proyectos a través del Fondo Regional para los Contratos Plan*[13]", de acuerdo con el aval fiscal otorgado por el Confis[14], para impulsar el desarrollo territorial a través de la destinación de recursos para la ejecución de 142 proyectos de inversión priorizados en los Pactos Territoriales: Atlántico, Bolívar, Casanare, Cesar - La Guajira, Cundinamarca, Golfo de Morrosquillo, Río Bogotá y Santander[15].

XXV. Recursos para la Financiación del Proyecto[16]

Vigencias futuras ordinarias 2021-2025	Vigencias futuras excepcionales 2022-2025
$1.964.703 millones de pesos	$801.290 millones de pesos
Total $2.765.993 millones de pesos	

Fuente: Conpes 4037 pág. 4

Grupo 1. Vigencias Futuras Ordinarias:

Se contemplan 96 proyectos por un valor de $1.964.703 millones, distribuidos por vigencia de la siguiente manera:

Vigencia	Recursos en millones de pesos corrientes
2021	$307.270
2022	$496.200
2023	$528.673
2024	$532.709
2025	$99.852
Total	**$1.964.703**

Fuente: Grupo Gerencia Nacional Pactos Territoriales

[12] Comunicación con radicado: 2-2021-036396. Bogotá D.C., 15 de julio de 2021 y alcance, mediante comunicación con radicado: 2-2021-036876. Bogotá D.C., 17 de julio de 2021, suscritas por Claudia Marcela Numa Páez - Secretaria Ejecutiva - Consejo Superior de Política Fiscal- CONFIS-.
[13] Código BPIN 2018011000648.
[14] Anexo B documento CONPES 4037.
[15] Anexo C documento CONPES 4037.
[16] En la vigencia 2021 contó con una asignación de 431.853 millones de pesos - Rrecursos PGN.

Grupo 2: Vigencias Futuras Excepcionales

En este grupo se incluyen 46 proyectos de infraestructura por un valor de $801.290 millones, distribuidos por vigencia de la siguiente manera:

Vigencia	Recursos en millones de pesos corrientes
2022	$211.546
2023	$209.256
2024	$300.941
2025	$79.546
Total	**$801.290**

Fuente: Grupo Gerencia Nacional Pactos Territoriales

XXVI. Para coadyuvar la reactivación económica y facilitar la ejecución de los 142 proyectos priorizados del CONPES 4037 de 2021, el DNP solicitó[17] la autorización de vigencias futuras ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por valor total de $2.458.723.131.307.

XXVII. Aunado a lo anterior, como se mencionó en el marco normativo de los Contratos Plan, el Decreto 740 de 2016[18], determinó las condiciones generales de operación y administración del Fondo, estableció las funciones que deberá ejercer el administrador y estipuló la forma en la cual deberán ser administrados los recursos que ingresen a este.

XXVIII. Así mismo, conforme a lo previsto en el artículo 2.2.13.1.2.4 del Decreto 740 de 2016, el administrador del Fondo Regional para los Contratos Plan/Pactos Territoriales, deberá desarrollar como mínimo las siguientes actividades: *"(...) 1) Recibir, custodiar y administrar los recursos del Fondo Regional para los Contratos Plan y aquellos que le sean transferidos por las demás entidades aportantes en los Contratos Plan, en los términos previstos en este título, las normas que lo regulen de conformidad con la naturaleza de los recursos y según las condiciones acordadas en el contrato de administración; 2) Administrar los recursos como un sistema separado de cuentas y constituir subcuentas por cada Contrato Plan, proyecto y fuente de financiación; 3) Mantener en depósito los recursos distintos de los provenientes del Presupuesto General de la Nación que se le transfieran, hasta su giro, de conformidad con las normas del presente título; 4) Efectuar los pagos a que haya lugar en desarrollo de los Contratos Plan, previa verificación del cumplimiento de los requisitos previstos para su desembolso; 5) Administrar la bolsa de los recursos que determine el Gobierno Nacional a través del Departamento Nacional de Planeación para incentivar a las entidades territoriales para que concurran con sus recursos propios y obtengan los mejores resultados en el desarrollo y ejecución de los Contratos Plan, a que se refiere el parágrafo del artículo 199 de la Ley 1753 de 2015, de conformidad con las condiciones que para el efecto defina el Departamento Nacional de Planeación; 6) Rendir informe de la administración de los recursos de cada Contrato Plan al Departamento Nacional de Planeación; 7) Cumplir y hacer cumplir las decisiones y normas expedidas por el Gobierno Nacional y el Departamento Nacional de Planeación, en temas relacionados con la operación y funcionamiento del Fondo, y 8) Las demás que se acuerden en el contrato de mandato."*

XXIX. Bajo el contexto normativo descrito, y teniendo en cuenta que el DNP no cuenta con la infraestructura técnica, operativa, administrativa y logística para atender todas las actividades y requerimientos que se derivan de la administración de los recursos destinados al Fondo, dichas actividades se han venido atendiendo mediante la celebración de contratos interadministrativos de mandato con ENTerritorio

[17] Radicado No. 1-2021-064873 de fecha 28 de julio del 2021.
[18] *"Por el cual se adiciona el Título 13 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin de reglamentar parcialmente la Ley 1454 de 2011 y los artículos 198 y 199 de la Ley 1753 de 2015 sobre los Contratos Plan y el Fondo Regional para los Contratos Plan"*

(antes FONADE) en razón a su idoneidad, capacidad técnica, jurídica y financiera, debidamente analizadas en el estudio de sector[19] dispuesto para este fin.

XXX. Es por ello, que desde el año 2013 FONADE (hoy ENTerritorio) ha venido acompañando el proceso de administración de los recursos destinados para el funcionamiento del programa de Contratos Plan y desde el año 2016 ha actuado en calidad de mandatario como administrador y operador del Fondo Regional de Contratos Plan/Pactos Territoriales, acreditando un amplio conocimiento de esta herramienta y sus requerimientos en el territorio, experiencia dada mediante los contratos interadministrativos de mandato Nos. DNP 505-16/ FONADE 216115, DNP 546-16/ FONADE 216138, y No. 558 de 2019 -ENTerritorio No. 219057.

XXXI. Actualmente, se encuentra vigente el Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 226-21/ FONADE 221001, iniciado el 15 de enero y con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre del 2021, el cual ha sido ejecutado con el cabal cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo con lo dispuesto en los informes de supervisión.[20]

XXXII. No obstante, para las vigencias 2021-2025, se priorizan inversiones para el desarrollo de proyectos identificados, que tienen un valor total de 3.223.337 millones de pesos, de los cuales 2.765.993.131.307 de pesos corresponden a aportes de la Nación[21]. Estas inversiones generan una inyección de capital adicional en los departamentos priorizados en cada Pacto Territorial suscrito.

XXXIII. Así las cosas y ante la necesidad de administrar los recursos que serán ejecutados conforme con los planes territoriales para las vigencias 2021-2025, DNP, en el marco del contrato actualmente vigente, solicitó a Enterritorio una propuesta para la administración de dichos recursos, en atención a la misma, ENTerritorio presentó dicha propuesta por un valor de $32.100.000.000 correspondiente a la cuota de administración de los proyectos priorizados.

XXXIV. Teniendo en cuenta el valor total del contrato de mandato vigente[22] ($5.730.000.000), se encontró que no es posible adicionarlo en la suma de $32.100.000.000, dada la limitación establecida en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, razón por la cual se hace necesaria la suscripción de un nuevo contrato interadministrativo de mandato, para las vigencias 2021 a 2025, que continúe llevando a cabo la administración de los recursos que ingresen al Fondo Regional de Contratos Plan/Pactos Territoriales, para que realice el seguimiento administrativo y financiero, y la validación técnica y jurídica de los contratos específicos vigentes y los proyectos priorizados en el marco de los pactos territoriales.

XXXV. El contrato a suscribir permite la administración de recursos por valor de $2.765.993.131.307 y así como realizar el seguimiento técnico, jurídico y financiero de los proyectos en virtud del CONPES 4037, que declaró la importancia estratégica del proyecto *"Apoyo al desarrollo de proyectos a través del Fondo Regional para los Contratos Plan"*, hoy *"Pactos Territoriales"*.

XXXVI. Lo anterior, considerando que ENTerritorio, de acuerdo al Decreto 495 del 20 de marzo de 2019, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y vigilada por la Superintendencia Financiera, que de conformidad con el artículo 2° del Decreto 288 del 29 de enero de 2004, tiene como objeto principal ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la preparación, financiación, administración y ejecución de proyectos. Adicionalmente, como parte de su misión, ENTerritorio está comprometido con el impulso real al desarrollo socioeconómico del país, a través de la preparación, evaluación, financiación, estructuración, promoción y ejecución de proyectos, principalmente aquellos incluidos en los objetivos

[19] Decreto 1082 de 2015. Artículo 2.2.1.1.1.6.1. *Deber de análisis de las Entidades Estatales.* La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.

[20] Expediente Orfeo 20216400140290000 1E

[21] Aprobados en el Documento CONPES 4037.

[22] DNP 226-21/ FONADE 221001.


del Plan Nacional de Desarrollo.

XXXVII. Dentro de este marco, ENTerritorio ha establecido una estrategia de regionalización con el propósito de ser un socio estratégico de apoyo a las regiones y de las distintas entidades públicas y privadas para la adecuada estructuración, gestión y ejecución de proyectos. En este sentido, ENTerritorio se constituye en un apoyo ideal para desarrollar los propósitos del Gobierno Nacional y específicamente del DNP en la promoción del desarrollo regional, en el marco de la estrategia de los Contratos Plan y Pactos Territoriales y de una mayor articulación Nación -Territorio.


XXXVIII. Adicionalmente, el Decreto 288 del 29 de enero de 2004 señala como parte de las funciones de ENTerritorio, promover, estructurar, realizar la gerencia, ejecutar y evaluar proyectos de desarrollo financiados con recursos de fuentes nacionales o internacionales; celebrar contratos para administrar recursos destinados a la ejecución de proyectos y para el esquema de gerencia de proyectos, prestar asesoría y asistencia técnica a entidades públicas y privadas en materias relacionadas con proyectos de desarrollo, entre otras.

XXXIX. Es así como la presente contratación guarda correspondencia con la línea de negocio *"Gestión de Proyectos"* de ENTerritorio, con la cual se busca contribuir para que las entidades hagan el mejor uso de los recursos disponibles para alcanzar la ejecución exitosa de sus proyectos y alcanzar los resultados esperados. Esta línea de negocio comprende actividades tales como *"administración de recursos"* según lo dispuesto en su Manual de Líneas de Negocios en su numeral 6.2.2.1.

XL. De acuerdo a lo anterior, se debe tener en cuenta el siguiente esquema de operación y funcionamiento del FRPT:

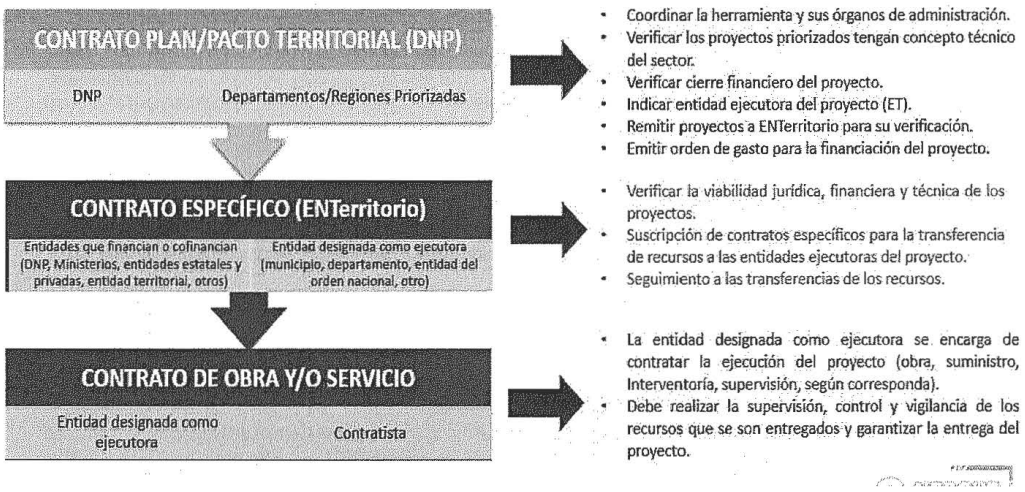

Y finalmente, los mecanismos de control del FRPT son los siguientes:

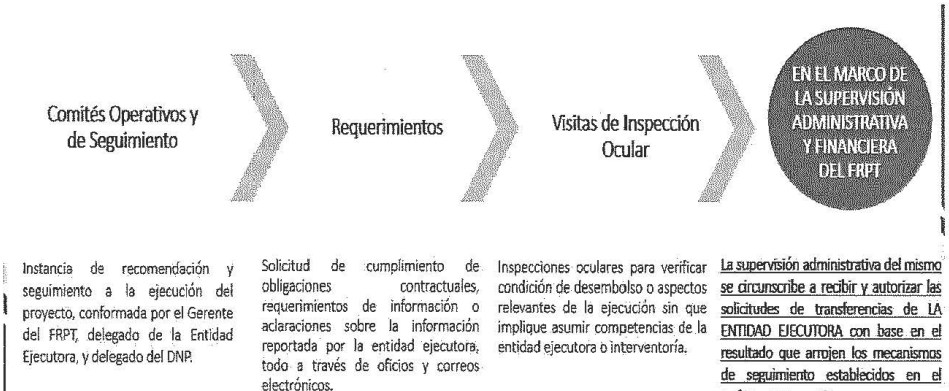

XLI. En ese orden de ideas, el DNP requiere suscribir un Contrato Interadministrativo de Mandato con ENTerritorio con el fin de que apoye la continuidad de los programas de Contratos Plan y Pactos Territoriales, en cumplimiento de lo establecido por el PND y de más normas concordantes, en especial lo contenido en los Documentos CONPES que hacen parte del marco jurídico de esta herramienta, los Decretos 740 de 2016 y 1675 de 2016, atendiendo a la naturaleza jurídica de dicha entidad y la existencia acumulada en los años anteriores con el apoyo en su implementación y en el desarrollo de proyectos similares, relacionados con este tipo de programas.

XLII. Teniendo en cuenta que el presente contrato se trata de aquellos denominados interadministrativos, se regirá por lo establecido en el literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, según el cual las entidades públicas podrán celebrar este tipo de contratos siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora y por el artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015.

XLIII. Mediante oficio ENT No. 2021430026472 DNP No. 20214330744791 del 21 de julio de 2021, el Director General del Departamento Nacional de Planeación solicitó a la Gerente General de ENTerritorio la presentación de una propuesta para suscribir un nuevo contrato de mandato en virtud del cual se continúe la administración y operación del Fondo Regional para los Pactos Territoriales.

XLIV. ENTerritorio en Comité de Negocios No. 20 celebrado el 27 de julio del 2021 y Comité de Negocios No. 22 celebrado el 12 de agosto de 2021 aprobó presentar la precotización de propuesta del nuevo Contrato Interadministrativo de Mandato.

XLV. Mediante oficio No. 20211800145791 del 28 de julio de 2021, se presentó al DNP en detalle la precotización preparada por ENTerritorio, la cual fue aprobada por el Comité de Negocios de la entidad en sesión extraordinaria llevada a cabo el día 27 de julio de 2021. En este oficio se indicó que esta precotización estaba supeditada a la revisión y aprobación de la Junta Directiva de ENTerritorio, tal como lo ordenan sus estatutos. Para esta precotización, se tomó como referencia la información suministrada en la comunicación con radicado ENT No. 2021430026472 DNP No. 20214330744791 del 21 de julio de 2021, con sus respectivos soportes.

XLVI. Que la junta directiva de ENTerritorio en sesión ordinaria desarrollada el 27 de agosto de 2021, aprobó presentar la cotización del nuevo contrato interadministrativo de mandato, con fundamento en el oficio del DNP con radicado ENT No. 2021430026472 DNP No. 20214330744791, el CONPES 4037 de 2021, y los demás documentos remitidos por el DNP.

XLVII. En comité de contratación del 03 de septiembre de 2021 del Departamento Nacional de Planeación se

presentaron los estudios previos del presente contrato los cuales fueron aprobados por todos sus integrantes, y en consecuencia se autorizó llevar a cabo la suscripción de este.

XLVIII. Mediante memorando No. 20214330137123 del 03 de septiembre de 2021 dirigido al Director General del DNP, la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas, en conjunto con la Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, solicitan adelantar la presente contratación.

XLIX. De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, cuando proceda la modalidad de contratación directa, la entidad debe proferir un acto administrativo justificando la contratación, razón por la cual el DNP expidió el Acto Administrativo motivando la presente contratación

L. Por todo lo anterior, las partes acuerdan suscribir el presente Contrato Interadministrativo de Mandato, el cual se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO: DNP confiere mandato a ENTerritorio para realizar la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan / Pactos Territoriales con los recursos que ingresen a este y los demás que le sean transferidos.

ALCANCE: El mandato a conferir es con representación

SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL MANDATARIO: El mandatario deberá ejecutar las obligaciones necesarias para dar cumplimiento al objeto del contrato, y en especial, las siguientes:

1. Presentar al **DNP** dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al inicio del contrato, el Plan Operativo de ejecución donde se incorporarán las actividades generales a desarrollar, los niveles de servicio y atención a que estarán sujetas y el mecanismo de seguimiento y control de los indicadores de gestión y resultado.
2. Recibir, custodiar, administrar, hacer seguimiento a la ejecución de los recursos del Fondo Regional para los Contratos Plan/Pactos Territoriales y aquellos que les sean transferidos por las demás entidades aportantes en los Contratos Plan/Pactos Territoriales, en los términos previstos en el Decreto No. 1082 de 2015, adicionado por el Decreto No. 740 de 2016[23] o la norma que lo modifique o sustituya y según las condiciones que se establezcan en el reglamento operativo de los Contratos Plan/Pactos Territoriales de qué trata este decreto, las incorporadas en este contrato y las demás normas que le resulten aplicables.
3. Manejar una cuenta Bancaria de ahorros especial, que no genere costos de transacción, para los recursos del Fondo, para aquellos que le sean transferidos por las demás entidades aportantes en los Contratos Plan/Pactos Territoriales, para los recursos pendientes de giro por parte de **ENTerritorio** a las entidades ejecutoras en virtud de los contratos específicos suscritos dentro del marco del contrato **DNP 505-16 / FONADE 216115, DNP 546-16 / FONADE 216138, DNP 558-19 / ENTerritorio 219057 y DNP 226-21 / ENTerritorio 221001.**
4. Administrar los recursos como un sistema separado de cuentas y constituir subcuentas por cada Contrato Plan/Pacto Territorial, proyecto y fuente de financiación, de conformidad con los acuerdos, metas y resultados acordados en cada Contrato Plan/Pacto Territorial, y a los lineamientos que las entidades aportantes impartan con relación a la disposición de los recursos en los contratos específicos.
5. Como condición previa a la celebración de los contratos específicos, el mandatario deberá verificar y dejar constancia de la viabilidad técnica que la entidad competente emita con relación a los proyectos

[23] **Por el cual se adiciona el Título 13 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin de reglamentar parcialmente la Ley 1454 de 2011 y los artículos 198 y 199 de la Ley 1753 de 2015 sobre los Contratos Plan y el Fondo Regional para los Contratos Plan**

de inversión o programas priorizados en el marco del Contrato Plan/Pacto Territorial, así como deberá verificar y dejar constancia de la viabilidad jurídica y financiera del mismo con fundamento en la información que le sea remitida, de conformidad con los lineamientos que se establezcan en el reglamento operativo del Fondo Regional de Contratos Plan/Pactos Territoriales que hace parte integral del Contrato.

6. Celebrar los contratos específicos en los términos descritos en el Decreto No. 1082 de 2015, adicionado por el Decreto No. 740 de 2016 o la norma que lo modifique o sustituya, así como los demás actos jurídicos que se requieren para el desarrollo del contrato de mandato con cargo a los recursos del Fondo y adelantar las gestiones previas necesarias para su suscripción de manera autónoma manteniendo indemne al DNP frente a cualquier reclamación.
7. Incorporar en los contratos específicos que se suscriban, que la Entidad Territorial o el ente ejecutor designado, tendrá la obligación de adelantar de manera expedita, dentro de los términos legales, los procesos correspondientes para lograr la adecuada ejecución y seguimiento de los proyectos priorizados.
8. Incorporar en los contratos específicos, que el ente territorial o el ente ejecutor será responsable de adelantar todos los procesos requeridos bajo el marco legal, siguiendo los principios establecidos dentro de la Ley, indicando además una cláusula de indemnidad a favor del DNP y del FONDO para aquellos eventos en que los proyectos no llegaren a feliz término.
9. Llevar a cabo el seguimiento administrativo y financiero de los recursos pendientes de giro, respecto de los contratos específicos celebrados en vigencia de los contratos interadministrativos de mandato **DNP 505-16 / FONADE 216115, DNP 546-16 / FONADE 216138, DNP 558-19 / ENTerritorio 219057 y DNP 226-21 / ENTerritorio 221001**, así como su liquidación. Lo anterior, teniendo en cuenta que, a la finalización de los precitados contratos interadministrativos de mandato, han quedado recursos pendientes de giro para el pago de algunos contratos específicos, que, por consiguiente, continúan siendo administrados por ENTerritorio.
10. Mantener en depósito hasta su giro, los recursos del Presupuesto General de la Nación, así como los que concurran al Fondo de diferentes fuentes, de conformidad con las normas previstas en el Decreto No. 1082 de 2015, adicionado por el Decreto No. 740 de 2016 o la norma que lo modifique o sustituya.
11. Efectuar los giros, liquidaciones y deducciones a que haya lugar en desarrollo de los Contratos Específicos, previa certificación del cumplimiento de los requisitos jurídicos, técnicos y financieros previstos para su desembolso establecidos en los procedimientos de pago de **ENTerritorio** en su calidad de administrador del Fondo.
12. Apoyar, a solicitud del **DNP**, la coordinación interinstitucional de las entidades y organismos que participen en los Contratos Plan/Pactos Territoriales y/o que concurran a la cofinanciación de proyectos o programas priorizados en este instrumento.
13. Participar en los Consejos Directivos de los Contratos Plan/Pactos Territoriales y en los Consejos Técnicos, a solicitud del **DNP**.
14. Administrar la bolsa de los recursos que determine el Gobierno Nacional a través del **DNP** para incentivar a las entidades territoriales para que concurran con sus propios recursos y obtengan los mejores resultados en el desarrollo y ejecución de los Contratos Plan/Pactos Territoriales, a que se refiere el parágrafo del artículo 199 de la Ley 1753 de 2015, de conformidad con las condiciones que para el efecto defina el **DNP**.
15. Proveer una unidad de gestión y operación para la administración del Fondo Regional para los Contratos Plan/Pactos Territoriales conformada por un equipo interdisciplinario para atender de manera oportuna y eficiente las obligaciones que se derivan del objeto del contrato que cuente con los recursos humanos y la infraestructura administrativa, física, financiera, jurídica y tecnológica necesaria para atender de manera oportuna y eficiente las obligaciones que se derivan del objeto del contrato, cuyo costo será asumido por el mandatario con cargo a la cuota de administración acordada en el presente contrato.
16. Cumplir con el reglamento operativo del Fondo Regional de los Contratos Plan/Pactos Territoriales de qué trata el Decreto No. 1082 de 2015, adicionado por el Decreto No. 740 de 2016 o la norma que lo modifique o sustituya.
17. Elaborar e implementar los instrumentos operativos o financieros que sean necesarios para el cumplimiento del contrato de mandato. Estos instrumentos deberán ser socializados y puestos en conocimiento del Comité Directivo del contrato previo a su implementación.

18. Disponer durante toda la etapa de ejecución y liquidación del contrato, de un sistema (software) o mecanismo de administración de la información de acuerdo con los lineamientos que para el efecto determine el mandante; que permita al **DNP** la consulta en tiempo real de la información actualizada, respecto de la administración de los recursos del Fondo Regional para los Contratos Plan/Pactos Territoriales, así como los reportes del estado de ejecución de los contratos específicos.
19. Realizar el seguimiento financiero y administrativo a la ejecución de los recursos que concurran a los proyectos y aquellos que le sean transferidos para el cumplimiento de los acuerdos, metas y compromisos adquiridos en los Contratos Plan/Pactos Territoriales con relación a los contratos específicos que hayan sido celebrados en virtud de los contratos de mandato anteriores o aquellos que se celebren y de acuerdo al mecanismo que se pacte en los contratos específicos y en el reglamento operativo del Fondo. Este seguimiento no implica supervisión ni la vigilancia y el control de la ejecución contractual de los recursos en los proyectos financiados a través del Contrato, en tanto esta es responsabilidad de las entidades ejecutoras; sin embargo, en los contratos específicos se deben incluir los mecanismos necesarios para mantener indemne al DNP y al FONDO para aquellos eventos en que el contrato no llegue a feliz término.
20. Integrar y cumplir los lineamientos del Comité Directivo y de Seguimiento, así como asistir a sus reuniones periódicas.
21. Realizar la devolución de los rendimientos financieros que se generen respecto a los recursos que le sean transferidos por fuente de financiación en cada proyecto de conformidad con los lineamientos que se establezcan en el reglamento operativo del Fondo en concordancia con las disposiciones legales vigentes en la materia. Estos recursos no forman parte de la cuota de gerencia.
22. Rendir mensualmente el informe de administración de los recursos y operación del Fondo al supervisor designado por el **DNP**, discriminando por Contrato Plan/Pacto Territorial, proyecto y fuentes de financiación, así como la relación de los rendimientos financieros generados mensualmente en las cuentas de las entidades ejecutoras con su respectivo soporte y conforme a los lineamientos que para el efecto imparta esta entidad. En dicho informe se deberá reportar la administración de los recursos del Fondo pendientes de giro que fueron administrados en virtud de los contratos de mandatos anteriores. Dichos informes deben ser presentados hasta el último día hábil del mes siguiente.
23. Presentar al supervisor designado por el **DNP** los informes mensuales contables consolidados de los recursos transferidos a las entidades territoriales que contengan, de acuerdo con el nuevo marco normativo contable :Estado de situación financiera , libros auxiliares detallados por terceros, conciliación bancaria y notas trimestrales a los estados financieros de acuerdo con lo establecido por el Régimen de Contabilidad Pública, contados a partir de la firma del presente acuerdo, que den cuenta de la ejecución de las transferencias. Dichos informes deben ser presentados hasta el último día hábil del mes siguiente al cierre financiero que realice el mandatario.
24. Presentar de forma mensual el informe de ejecución financiera a la Subdirección Financiera del DNP con copia al Supervisor del contrato designado por el DNP, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del contrato, con el fin de que el **DNP** realice los correspondientes registros contables, el cual será elaborado de acuerdo con el modelo diseñado por **ENTerritorio** para tal fin, aprobado por el DNP, y será entregado dentro de los primeros veinte (20) días hábiles del mes siguiente.
25. Presentar al supervisor del contrato designado por el DNP, la programación de los giros que se pretendan realizar a las entidades territoriales en el siguiente mes para efectos de la programación del PAC en el **DNP**.
26. Mantener actualizada, organizada y en condiciones de disponibilidad, la información y documentación que se genere o administre con ocasión del cumplimiento de las obligaciones que se derivan de este contrato. Así mismo, garantizar su custodia y entrega al **DNP** una vez finalice el plazo de ejecución del contrato.
27. Mantener la confidencialidad sobre toda la información sometida a reserva que sea conocida en virtud del desarrollo y ejecución del contrato, y realizar el manejo de la información de conformidad con las condiciones establecidas dentro del "Manual y políticas de seguridad de la información" SE-M01 del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, publicado en el portal del DNP.
28. Utilizar la imagen institucional del **DNP** de acuerdo con los lineamientos que para el efecto esta entidad establezca, a través del Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas.

29. Cumplir y hacer cumplir las decisiones y normas expedidas por el Gobierno Nacional y el **DNP**, en temas relacionados con la operación y funcionamiento del Fondo.
30. Dar cumplimiento a la normatividad vigente relacionada con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debiendo aportar al supervisor del **DNP** una certificación firmada por el representante legal de **ENTerritorio** o su delegado, que evidencien el compromiso con la seguridad y salud de sus colaboradores, así mismo aportar los soportes requeridos por Seguridad y Salud en el Trabajo del DNP.

    La certificación debe dar constancia de lo siguiente:

    a. Que cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y en el Trabajo –SGSST.
    b. Que cuenta con una Política en Seguridad y Salud en el Trabajo-SST.
    c. Que da cumplimiento a la normativa aplicable en la realización de los exámenes pre-ocupacionales y periódicos a todas las personas que laboran y prestan sus servicios en la empresa.
    d. Que sus colaboradores se encuentran afiliados a la ARL.
    e. Que cuenta con un programa de capacitación en SST para sus colaboradores.
    f. Que cuenta con una Matriz de identificación de los peligros prioritarios y control de los riesgos de sus colaboradores.
    g. Que cuenta con la Autoevaluación y la calificación de los Estándares Mínimos de su SGSST en concordancia con la normatividad
    h. Que cumple y atiende todas las medidas sanitarias preventivas y correctivas para la protección de la salud y establecer las medidas de bioseguridad necesarias para la protección de sus colaboradores de conformidad con lo señalado en la legislación vigente y demás normas que la adicionen, modifiquen y sustituyan.

Con respecto a los soportes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá aportar lo siguiente:

a. Los datos de contacto de la persona encargada de la seguridad y la salud en el trabajo de sus trabajadores.
b. Copia de la Política en Seguridad y Salud en el Trabajo, firmada por el representante legal, que evidencie el compromiso con la seguridad y salud de sus colaboradores en misión.
c. Aportar previo inicio a la ejecución de las actividades un listado de los colaboradores que realizarán las actividades en el marco del contrato, donde se consignen por cada uno, los datos del grupo sanguíneo (RH), EPS y ARL a la que se encuentre afiliado, nombre y número de contacto en caso de emergencia y enfermedades preexistentes. Este listado deberá ser actualizado por el contratista conforme a las novedades por cambio de personal u otras variables que apliquen.
d. Asegurar la participación en la inducción del componente de SST del SIG del DNP de todos sus colaboradores, coordinada a través del supervisor del contrato con el GSST. En caso de rotación o cambio de personal el proveedor garantizará que el nuevo personal reciba la inducción.
e. Aportar copia de la matriz de identificación de los peligros prioritarios y control de los riesgos de sus colaboradores.
f. Aportar el soporte de la autoevaluación y calificación de los estándares mínimos de su SGSST en concordancia con la normatividad vigente.
g. Reportar a su ARL e informar al GSST del DNP los accidentes de trabajo y enfermedades laborales ocurridos a sus colaboradores en el cumplimiento del objeto contractual, así mismo realizará las investigaciones a que haya lugar contando con la presencia del GSST para que el empleador o contratante ejerza las acciones de prevención y control que estén bajo su responsabilidad.

31. Incorporar en los contratos específicos, que la entidad ejecutora deberá constituir a favor de ENTerritorio una garantía de cumplimiento que podrá consistir en una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, o bajo las condiciones que exija ENTerritorio acorde a su régimen legal y manual de contratación, e incluir como uno de sus beneficiarios al DNP.

32. Realizar los trámites administrativos de posibles incumplimientos en contra de las entidades ejecutoras, acorde a su régimen legal y manual de contratación.
33. Garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente a nivel distrital y nacional aplicable al desarrollo del objeto contractual y toda aquella que sea expedida durante la ejecución del contrato".
34. Designar la persona que desempeñe las labores de supervisor del contrato de mandato
35. Las demás que resulten necesarias para cumplir con el objeto del contrato de mandato.

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

1. Ejecutar los trámites presupuestales y financieros necesarios para realizar la transferencia al mandatario de los recursos que integren el Fondo Regional para los Contratos Plan/Pactos Territoriales y su respectiva ejecución mediante los contratos específicos.
2. Facilitar la información que sea necesaria para que el administrador del Fondo cumpla con sus obligaciones.
3. Integrar y cumplir los lineamientos del Comité Directivo y de Seguimiento, así como asistir a sus reuniones periódicas.
4. Designar la persona que desempeñe las labores de supervisor del contrato de mandato, y a su vez, disponer profesionales de apoyo técnico a la supervisión, en caso de requerirse.
5. Facilitar la interacción con todas las entidades pertinentes que se relacionen o se consideren necesarias para cumplir con el objeto del contrato, contando con el apoyo de **ENTerritorio**.
6. Definir las condiciones, lineamientos y requerimientos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato, con base en las recomendaciones de **ENTerritorio**.
7. Adoptar y/o modificar el Reglamento Operativo del Fondo Regional de Contratos Plan/Pactos Territoriales y los demás instrumentos operativos o financieros que se generen con ocasión de la actividad del administrador del Fondo y que sean necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato, si a ello hubiere lugar.
8. Remitir a **ENTerritorio** los proyectos priorizados para ser financiados con los recursos del Fondo Regional de Contratos Plan/Pactos Territoriales y aquellos que deban ser verificados, indicando el monto de los recursos que se asignarán por parte del **DNP** y la información adicional que se requiera de acuerdo con los lineamientos que para el efecto se establezcan en el Reglamento Operativo del Fondo.
9. Realizar el desembolso de los recursos de este contrato en oportunidad y responder por la ejecución de los trámites, soportes presupuestales y contables de ley necesarios para la vinculación y entrega de los recursos del contrato, una vez **ENTerritorio** realice la verificación de la viabilidad jurídica, financiera y técnica del proyecto de inversión, de conformidad con la documentación aportada por las entidades ejecutoras.
10. Facilitar la interacción con las entidades o instancias que tengan relación con ocasión de la ejecución del Contrato de Mandato.
11. Informar al administrador del Fondo de cualquier eventualidad que sea de su conocimiento pueda afectar el normal desarrollo del contrato de forma inmediata.
12. Establecer los niveles de servicio y atención en el plan operativo y en el reglamento operativo del Fondo.
13. Girar de manera oportuna los recursos necesarios para garantizar el pago de las obligaciones pactadas en cumplimiento del objeto del presente contrato de acuerdo con lo establecido en los contratos específicos y la programación de pagos presentada por ENTerritorio avalada por el Supervisor, previa disponibilidad de PAC, so pena de asumir las responsabilidades derivadas de dicho incumplimiento, una vez ENTerritorio realice la verificación de la viabilidad jurídica, financiera y técnica del proyecto de inversión, de conformidad con la documentación aportada por las entidades ejecutoras.
14. Informar al administrador del Fondo, dentro del mes siguiente a la suscripción del contrato, el nombre y número de la cuenta bancaria destino del giro de los rendimientos financieros que se generen en las cuentas bancarias.
15. Adelantar el trámite de marcación de la cuenta bancaria para la exoneración del Gravamen a los Movimientos Financieros ante la Dirección del Tesoro Nacional, una vez el administrador le suministre la información de la cuenta creada, donde se manejarán los recursos del contrato, con el fin de que no se generen costos financieros adicionales.

16. Comunicar al administrador la cuenta bancaria de destino del giro de los recursos no ejecutados del contrato, cuando este finalice su ejecución.
17. Revocar el mandato al administrador por recomendación del Comité Directivo del contrato.
18. Con la suscripción del presente documento, el **DNP** declara que no se generan tasas, contribuciones o deducciones sobre los recursos entregados al administrador y en caso de que el **DNP**, retenga o deduzca a éste algún valor por este concepto, el administrador deducirá dicho valor a efectos de determinar el valor neto del contrato específico, el cual se destinará al cumplimiento del objeto del mismo.
19. Pagar oportunamente el precio pactado como cuota de administración conforme lo establecido en las cláusulas de valor y forma de pago del contrato.
20. Las demás que resulten necesarias para cumplir con el objeto del contrato

CUARTA. - CONDICIONES ESPECIALES DE OPERACIÓN:

Giro de los recursos por parte de las entidades ejecutoras. En todo caso, los requisitos legales, técnicos y financieros que constituyan condiciones de giro de recursos a los contratistas de los Contratos Específicos serán verificados por quien sea designado como ejecutor (quien celebra el contrato específico con ENTerritorio en calidad de mandatario), conforme a las condiciones que sean pactadas por las partes en el contrato específico y los demás lineamientos que para el efecto se establezcan en el reglamento operativo de los Contratos Plan/Pactos Territoriales, dado que la responsabilidad de la acreditación del cumplimiento recae en la entidad ejecutora y su verificación en la interventoría o supervisión ejercida por la entidad territorial, al proyecto según corresponda.

En este sentido, cuando así proceda, el administrador de los recursos asignados a los Contratos Plan/Pactos Territoriales – ENTerritorio -, para su giro, recibirá la instrucción de pago, en donde se indicará el valor de éste, la subcuenta de los recursos que serán afectados con el pago y la indicación del cumplimiento de las condiciones que se pacten en los contratos específicos para hacer efectivo el mismo. La instrucción de pago deberá estar soportada en la certificación del interventor o supervisor designado por la entidad ejecutora, en donde se acredite el cumplimiento de la condición de pago.

i. **Administración de los recursos del fondo:** En el evento en el que el contrato derivado sea adjudicado por un menor valor, deberá ser girado a la entidad ejecutora, el valor correspondiente al valor adjudicado en el contrato.

En caso de que en la ejecución del proyecto se requieran recursos adicionales para cumplir con las metas pactadas dentro del Contrato Específico, las entidades ejecutoras serán las encargadas de gestionarlos. En caso de que con estos recursos se gestionen con cargo a los recursos del Fondo Regional para los Contratos Plan/Pactos Territoriales, el mandatario deberá verificar la solicitud que presente la entidad ejecutora y los soportes de viabilidad técnica, jurídica y financiera que la interventoría o supervisión de la entidad ejecutora emitan para justificar la necesidad de los recursos adicionales con el fin de garantizar su coherencia y consistencia, de acuerdo con los lineamientos que para el efecto se incluyan en el Reglamento Operativo del Fondo.

ii. **Remanentes del Fondo:** Los remanentes del Fondo que resulten de la diferencia entre los recursos estimados y efectivamente comprometidos en los contratos que celebre el administrador del Fondo, y que no se destinen para el pago de los bienes y servicios contratados, serán devueltos a sus aportantes en los porcentajes asignados una vez se suscriba la correspondiente acta de liquidación.

iii. **Custodia e inversión de los recursos.** Los recursos que se transfieran a Enterritorio, deberán mantenerse en cuenta bancaria separada del manejo de los recursos propios de la Entidad. Los recursos serán administrados según los términos del contrato de mandato y las disposiciones establecidas para la administración de los excedentes de liquidez de los establecimientos públicos del orden nacional.

iv. **Unidad de gestión y operación para la administración del Fondo Regional para los Contratos Plan/Pactos Territoriales:** El administrador del Fondo deberá conformar un equipo de trabajo para el cumplimiento de sus obligaciones, la cual deberá contar con los recursos humanos y la infraestructura administrativa, física, financiera, jurídica y tecnológica necesaria para atender de manera oportuna y eficiente las obligaciones que se derivan del objeto del contrato. Esta unidad será coordinada por un Gerente que se encargará de liderar la gestión que deba desarrollarse para el cumplimiento de las obligaciones del administrador, y estará conformada como mínimo por un coordinador técnico, un coordinador jurídico y un coordinador financiero, además de mínimo 2 profesionales administrativos y 11 profesionales de apoyo a la supervisión.

En cualquier momento de las etapas del contrato, todos los perfiles que conforman la unidad de trabajo del Fondo Regional para los Pactos Territoriales serán verificados y aprobados por ENTerritorio, como entidad que ostenta la competencia de gestionar el proyecto y disponer de los recursos de funcionamiento para este fin. En todo caso, ENTerritorio debe garantizar la calidad e idoneidad de todos los perfiles que conformaran la unidad de trabajo. DNP se reserva el derecho de solicitar información y efectuar recomendaciones en su calidad de mandante, y entidad técnica, sin que esto genere un aumento en la cuota de gestión.

QUINTA-COMITÉ DIRECTIVO DEL MANDANTE: Instancia encargada de realizar recomendaciones de orden técnico para garantizar la correcta ejecución del contrato.

1. Conformación del Comité Directivo: estará conformado por los siguientes miembros con voz y voto:

a. El Director del DNP o su delegado,
b. El Asesor Código 1020 grado 16 de la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del DNP, que ejerza las funciones de Gerente Nacional de Pactos Territoriales.
c. El Director de Inversiones y Finanzas Públicas del DNP o su delegado, quien los presidirá

Como invitado permanente se convocará al profesional que sea contratado por **ENTerritorio** como Gerente del Fondo Regional para los Contratos Plan/Pactos Territoriales, o en su ausencia, el Subgerente de Desarrollo de Proyectos de **ENTerritorio** o quien designe el Gerente General de **ENTerritorio**.

En estas sesiones podrán participar como invitados, profesionales de las entidades que lo conforman, cuya asistencia se considere relevante para la discusión de los temas a tratar en la correspondiente sesión. Todos los invitados asistirán con voz, pero sin voto.

2. Funciones del Comité Directivo: ejercerá las siguientes funciones:

a. Elaborar y aprobar su propio reglamento.
b. Aprobar y modificar el plan operativo de ejecución donde se incorporarán las actividades generales a desarrollar y los niveles de servicio y atención a que estarán sujetas.
c. Adoptar y modificar el reglamento operativo del Fondo Regional para los Contratos Plan/Pactos Territoriales.
d. Realizar recomendaciones de orden técnico y administrativo para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato y de las obligaciones de las partes.
e. Recomendar mecanismos que puedan adoptarse para realizar seguimiento administrativo y financiero a la disposición de los recursos del Fondo.
f. Realizar recomendaciones que se consideren necesarias para garantizar la ejecución del objeto contractual y las obligaciones de las partes en el contrato.
g. Solicitar las reuniones y gestiones que considere necesarias para que el objeto del presente contrato se cumpla a cabalidad.
h. Las demás que sean necesarias para adelantar el seguimiento administrativo y financiero al contrato

3. Secretaría Técnica. El Asesor Código 1020 grado 16 de la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del DNP, que ejerza las funciones de Gerente Nacional de Pactos Territoriales, ejercerá la Secretaría Técnica de esta instancia según las condiciones que se fijen en el respectivo reglamento.

PARÁGRAFO PRIMERO: Este comité definirá su agenda de reuniones y podrá ser convocado extraordinariamente cuando la ejecución del contrato lo requiera.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Reglamento Operativo del Fondo Regional para los Contratos Plan/Pactos Territoriales será parte integral del Contrato de Mandato y podrá ser modificado por el Comité Directivo del contrato a iniciativa de cualquiera de sus miembros, así como por recomendación de **ENTerritorio.**

SEXTA. - VALOR DE LOS RECURSOS PARA ADMINISTRAR Y TRANSFERENCIA:

Los recursos a administrar en el Fondo Regional de Contratos Plan corresponden a aquellos que le sean transferidos al administrador por las entidades aportantes para el cumplimiento de los acuerdos, metas y compromisos de los Contratos Plan/Pactos Territoriales, en los términos previstos en el Artículo 2.2.13.1.2.5 del Decreto No. 740 de 2016 y demás normas que lo complementen, modifiquen o sustituyan.

El valor de los recursos a administrar en el Fondo Regional para los Pactos Territoriales corresponde a **DOS BILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($2.733.893.131.307)**, distribuidos en dos grupos conforme con las vigencias aprobadas:

Grupo 1: Vigencia 2021 y vigencias futuras ordinarias por un valor de **UN BILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA PESOS M/CTE ($1.932.603.334.080)**, distribuidos por vigencia de la siguiente manera.

1. Para la vigencia **2021**, los recursos a administrar ascienden hasta la suma de **TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($301.570.000.000),** los cuales serán transferidos por el **DNP** en la misma proporción con los recursos comprometidos por **ENTerritorio** en cada uno de los contratos específicos para el cumplimiento de los acuerdos, metas y compromisos de los Contratos Pactos Territoriales.

2. Para la vigencia **2022**, los recursos a administrar ascienden hasta la suma de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($489.599.791.162)** que corresponden a los recursos autorizados mediante las vigencias futuras ordinarias, los cuales serán transferidos por el **DNP** en la misma proporción con los recursos comprometidos por **ENTerritorio** en cada uno de los contratos específicos para el cumplimiento de los acuerdos, metas y compromisos de los Contratos Pactos Territoriales.

3. Para la vigencia **2023**, los recursos a administrar ascienden hasta la suma de **QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($522.072.745.628)** que corresponden a los recursos autorizados mediante las vigencias futuras ordinarias, los cuales serán transferidos por el **DNP** en la misma proporción con los recursos comprometidos por **ENTerritorio** en cada uno de los contratos específicos para el cumplimiento de los acuerdos, metas y compromisos de los Contratos Pactos Territoriales.

4. Para la vigencia **2024**, los recursos a administrar ascienden hasta la suma de **QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SIETE PESOS M/CTE ($526.109.181.007)** que corresponden a los recursos autorizados mediante las vigencias futuras ordinarias, los cuales serán transferidos por el **DNP** en la misma proporción con los recursos comprometidos por **ENTerritorio** en cada uno de los contratos específicos para el cumplimiento de los acuerdos, metas y compromisos de los Contratos Pactos Territoriales.

5. Para la vigencia **2025**, los recursos a administrar ascienden hasta la suma de **NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS**

OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($93.251.616.283) que corresponden a los recursos autorizados mediante las vigencias futuras ordinarias, los cuales serán transferidos por el **DNP** en la misma proporción con los recursos comprometidos por **ENTerritorio** en cada uno de los contratos específicos para el cumplimiento de los acuerdos, metas y compromisos de los Contratos Pactos Territoriales.

Grupo 2: Vigencias futuras excepcionales por un valor de **OCHOCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($801.289.797.227)**, distribuidos por vigencia de la siguiente manera.

1. Para la vigencia **2022**, los recursos a administrar ascienden hasta la suma de **DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($211.546.329.611)** que corresponden a los recursos autorizados mediante las vigencias futuras excepcionales, los cuales serán transferidos por el **DNP** en la misma proporción con los recursos comprometidos por **ENTerritorio** en cada uno de los contratos específicos para el cumplimiento de los acuerdos, metas y compromisos de los Contratos Pactos Territoriales.

2. Para la vigencia **2023**, los recursos a administrar ascienden hasta la suma de **DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($209.256.259.894)** que corresponden a los recursos autorizados mediante las vigencias futuras excepcionales, los cuales serán transferidos por el **DNP** en la misma proporción con los recursos comprometidos por **ENTerritorio** en cada uno de los contratos específicos para el cumplimiento de los acuerdos, metas y compromisos de los Contratos Pactos Territoriales.

3. Para la vigencia **2024**, los recursos a administrar ascienden hasta la suma de **TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($300.940.902.206)** que corresponden a los recursos autorizados mediante las vigencias futuras excepcionales, los cuales serán transferidos por el **DNP** en la misma proporción con los recursos comprometidos por **ENTerritorio** en cada uno de los contratos específicos para el cumplimiento de los acuerdos, metas y compromisos de los Contratos Pactos Territoriales.

4. Para la vigencia **2025**, los recursos a administrar ascienden hasta la suma de **SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($79.546.305.516)** que corresponden a los recursos autorizados mediante las vigencias futuras excepcionales, los cuales serán transferidos por el **DNP** en la misma proporción con los recursos comprometidos por **ENTerritorio** en cada uno de los contratos específicos para el cumplimiento de los acuerdos, metas y compromisos de los Contratos Pactos Territoriales.

De igual forma, serán administrados por el Fondo Regional para los Pactos Territoriales, los remanentes posteriores al cierre de los contratos de mandato Nos. DNP 505-16/ FONADE 216115, DNP 546-16/ FONADE 216138, DNP 558-19 / ENTerritorio 219057 y DNP 226-21/ ENTerritorio 221001, que serán destinados a asumir compromisos al ser ejecutados a través de los pagos, una vez se den las condiciones previstas en los contratos específicos, así como aquellos que les sean transferidos por las demás entidades aportantes de los Contratos Plan/Pactos Territoriales, para el cumplimiento de los acuerdos, metas y compromisos , así como los recursos pendientes de giro a los que haya lugar.

Los recursos pendientes de giro serán aquellos correspondientes al saldo que con corte a la fecha de suscripción de este contrato, refleje la cuenta de ahorros No. 492587902 del Banco de Bogotá del Contrato DNP 226-21 / ENTerritorio 221001, a excepción de los rendimientos financieros los cuales son de propiedad de la Dirección del Tesoro Nacional, los cuales serán trasladados a la cuenta que para el efecto determine el mandatario dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio del presente contrato y el informe de cierre financiero del Contrato DNP 226-21 / ENTerritorio 221001.

ENTerritorio deberá efectuar los tramites de los giros pendientes en cada contrato específico de acuerdo con lo pactado en cada uno de ellos, previa verificación del cumplimiento de los requisitos por parte de las entidades ejecutoras. ENTerritorio deberá trasladar estos recursos a la cuenta especial que se constituya para el manejo de los recursos del Fondo dentro del marco del presente contrato de conformidad con lo establecido en el numeral 3 de la cláusula segunda del presente documento.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los recursos que ingresen al Fondo Regional para los Pactos Territoriales serán girados por el **DNP** dentro de los 30 días calendario siguientes a la celebración de los contratos específicos, y de acuerdo con el flujo de caja que se requiera, previa disponibilidad de PAC, siempre que la cuenta se encuentre marcada con la exención del gravamen a los movimientos financieros.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Una vez sean girados los recursos por parte del **DNP**, **ENTerritorio** deberá administrarlos como una unidad de caja y girarlos en la medida en que las entidades ejecutoras acrediten el cumplimiento de los requisitos pactados para el giro de los recursos junto con las garantías e indemnidades en caso de incumplimiento por parte de estos.

PARÁGRAFO TERCERO. ENTerritorio no responderá en ningún caso con sus propios recursos por los pagos a realizar a las entidades territoriales. En su calidad de mandatario solamente girará cuando se cumplan dos condiciones: **i)** Que los recursos hayan sido transferidos por **DNP a ENTerritorio** y, **ii)** Las entidades territoriales acrediten el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el contrato para el giro de los recursos.

PARAGRAFO 4: Para realizar el primer pago deberá estar marcada como exenta la cuenta bancaria destinada para el manejo de los recursos.

SÉPTIMA. - VALOR DEL CONTRATO (CUOTA DE ADMINISTRACIÓN) Y FORMA DE PAGO:

VALOR CUOTA DE ADMINISTRACION:

El DNP reconocerá a ENTerritorio por concepto de cuota de administración, hasta la suma de **TREINTA Y DOS MIL CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($32.100.000.000),** por la administración y operación del Fondo Regional para los Pactos Territoriales durante el periodo de ejecución del presente Contrato. Dicha administración y operación consistirá en:

(1) La realización de los trámites necesarios para la liquidación de los contratos terminados.
(2) La administración de los recursos destinados a los 20 contratos específicos, que continúan en ejecución, y respecto de los cuales el mandatario deberá continuar con el seguimiento administrativo, técnico, jurídico y financiero.
(3) La administración de los recursos objeto de este convenio.

FORMA DE PAGO:

Para la **vigencia 2021**, con cargo al CDP 102121 del 21 de julio de 2021, se pagará por concepto de cuota de administración hasta la suma de **CINCO MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.700.000.000)** de la siguiente manera:

i. Cuatro (4) pagos mensuales iguales cada uno por la suma de **MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.425.000.000)** previa disponibilidad de PAC.

Para la **vigencia 2022**, con cargo a vigencias futuras ordinarias, se pagará por concepto de cuota de administración hasta la suma de **SEIS MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.600.000.000)** de la siguiente manera:

ii. Doce (12) pagos mensuales iguales cada uno por la suma de **QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($550.000.000)** previa disponibilidad de PAC.

Para la **vigencia 2023**, con cargo a vigencias futuras ordinarias se pagará por concepto de cuota de administración hasta la suma de **SEIS MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.600.000.000)** de la siguiente manera:

iii. Doce (12) pagos mensuales iguales cada uno por la suma de **QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($550.000.000)** previa disponibilidad de PAC.

Para la **vigencia 2024**, con cargo a vigencias futuras ordinarias se pagará por concepto de cuota de administración hasta la suma de **SEIS MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.600.000.000)** de la siguiente manera:

iv. Doce (12) pagos mensuales iguales cada uno por la suma de **QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($550.000.000)** previa disponibilidad de PAC.

Para la **vigencia 2025**, con cargo a vigencias futuras ordinarias se pagará por concepto de cuota de administración hasta la suma de **SEIS MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.600.000.000)** de la siguiente manera:

v. Diez (10) pagos mensuales iguales cada uno por la suma de **SEISCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($660.000.000)** previa disponibilidad de PAC.

PARÁGRAFO 1: El valor de la cuota de administración se mantendrá al **DNP** durante la vigencia inicial del contrato. En caso de prórroga o adición de los recursos a administrar, las partes acordarán los ajustes correspondientes.

PARÁGRAFO 2: El valor de la remuneración incluye la administración y operación de la totalidad de recursos que sean transferidos al administrador del Fondo para el cumplimiento de los compromisos, acuerdos y metas pactados en los Contratos Plan/Pactos Territoriales y los demás impuestos que se causen con ocasión del desarrollo de la actividad.

PARÁGRAFO 3: Los pagos se efectuarán en la cuenta señalada por el mandatario al **DNP**, previa certificación por parte del supervisor del contrato designado por el **DNP**, del cumplimiento de la entrega y aprobación de los informes de administración de los recursos en los plazos señalados y con la presentación de la respectiva cuenta de cobro. En la cuenta de cobro deberán discriminarse los recursos que son solicitados como desembolso para su administración y los que son requeridos como pago por la cuota de administración.

Los pagos por concepto de cuota de administración se harán dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación en la Subdirección Financiera del **DNP** del recibo a satisfacción del informe de administración de los recursos y operación del Fondo por parte del Supervisor del contrato y la entrega de la cuenta de cobro y documentos requeridos para el pago, previa disponibilidad de PAC.

PARAGRAFO 4: Para realizar el primer pago deberá estar marcada como exenta la cuenta bancaria destinada para el manejo de los recursos.

OCTAVA. - USO RECURSOS GIRADOS: De los recursos girados a **ENTerritorio** para el desarrollo del presente contrato solo se podrán imputar los gastos necesarios para el desarrollo y cumplimiento de éste.

NOVENA. - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El contrato se financiará con recursos de la vigencia fiscal 2021 del proyecto "APOYO AL DESARROLLO DE PROYECTOS A TRAVÉS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS CONTRATOS PLAN. BPIN: 2018011000648" de la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas, en virtud del CDP 102121 del 21 de julio de 2021, por valor de $ 307.270.000.000, Rubro C-0301-1000-18-0-0301021-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES – SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A PROYECTOS DE INVERSIÓN - APOYO AL DESARROLLO DE PROYECTOS A TRAVÉS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS CONTRATOS PLAN.NACIONAL., el cupo de vigencias futuras ordinarias de inversión para 2022, 2023, 2024 y 2025 por valor de $1.657.433.334.080 y el cupo de vigencias excepcionales de inversión para 2022, 2023, 2024 y 2025 por

valor de $801.289.797.227 autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante la comunicación radicada con el No 2-2021-043072 del 23 de agosto de 2021.

Las vigencias futuras ordinarias y excepcionales aprobadas mediante radicado No 2-2021-043072 del 23 de agosto de 2021 por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público cumplen con lo establecido en los artículos 10 y 11 de la ley 819 de 2003, así como el CONPES 4037 del 19 de julio de 2021 y Art 250 de la Ley 1955 de 2019.

PARÁGRAFO: Producto del registro presupuestal se debe tener en cuenta la imputación contable respecto de los valores de la cuota de administración y los valores de recursos a administrar del Fondo Regional para los Contratos Plan/Pactos Territoriales.

DÉCIMA. - RENDIMIENTOS FINANCIEROS: ENTerritorio deberá realizar la devolución de los rendimientos financieros en el mes siguientes a la causación de los mismos, que se generen de los recursos transferidos por fuente de financiación en cada proyecto de conformidad con los lineamientos que se establezcan en el reglamento operativo del fondo en concordancia con las disposiciones legales vigentes en la materia.

DÉCIMA PRIMERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de este contrato será de cincuenta (50) meses, sin exceder del 15 de noviembre de 2025, plazo que será contado a partir de la suscripción del acta de inicio[24], previa aprobación de la garantía exigida, por parte del Coordinador del Grupo de Contratación, y expedición del Registro Presupuestal.

PARÁGRAFO PRIMERO: La continuidad de las gestiones de operación y administración del fondo, respecto de los proyectos cuya ejecución superen el plazo del actualmandato será asumida por le entidad financiera del orden nacional con participación estatal, que sea contratada para tal efecto, o por el representante legal del fondo, en caso de que el presente contrato no sea prorrogado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento en que la operación y administración del Fondo Regional de Contratos Plan/Pactos Territoriales no continúe en cabeza de **ENTerritorio**, el **DNP** deberá dar aviso de la no continuidad del Contrato de Mandato con una antelación de cuatro (4) meses al vencimiento del término pactado, con el fin de que el mandatario realice la entrega de un informe final que dé cuenta de su gestión y del avance de ejecución presupuestal y física de los contratos específicos que se encuentren vigentes al momento de la terminación.

DÉCIMA SEGUNDA. - MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO:

De acuerdo con lo establecido en el numeral 7 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe realizar una valoración de los riesgos que se deben cubrir para garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor del DNP, con ocasión de la ejecución del contrato y de su liquidación, a través de cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

Por lo anterior, el Contratista deberá constituir garantía que cubra los siguientes amparos:

RIESGO	PORCENTAJE	SOBRE EL VALOR	VIGENCIA

[24] (...) 6.2.3. Inicio del contrato.

a. Acta de Inicio:

El supervisor deberá suscribir conjuntamente con el contratista, cuando así se pacte en el contrato y dentro del término establecido en el mismo, las actas de iniciación, de recibo de bienes o prestación de servicios, según el caso. Cuando se suscriban las actas antes mencionadas en los contratos en que así se pacte, el supervisor deberá enviar el original de estas al Grupo de Biblioteca y Archivo del Departamento Nacional de Planeación, con el fin de que sean incluidas en los expedientes físicos y virtuales (ORFEO). (...). Manual de contratación Departamento Nacional de Planeación Bogotá, 2020.

Cumplimiento	10 %	Del valor pactado como comisión	El plazo de ejecución del contrato y hasta la liquidación del contrato.
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	5 %	Del valor pactado como comisión	El plazo de ejecución del contrato y 3 años más.
Calidad del servicio	10 %	Del valor pactado como comisión	(1) año contado a partir de la terminación del contrato

PARAGRAFO PRIMERO. ENTerritorio deberá constituir las garantías del contrato a más tardar al día siguiente de la suscripción del contrato y deberá cargarla por la plataforma de Secop II. Posteriormente, será aprobada por el DNP de acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015. El término de ejecución a partir de su aprobación deberá estar cubierto por los amparos requeridos. Si al vencimiento de dicho término **ENTerritorio** no ha presentado la garantía pertinente al Grupo de Contratación del **DNP**, este último podrá dejar constancia que el contrato no inició su ejecución.

PARAGRAFO SEGUNDO. - En todo caso, ENTerritorio se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande la ejecución del contrato y hasta su liquidación, so pena de que el DNP haga efectiva la cláusula penal compensatoria de este contrato.

DÉCIMA TERCERA. - PÓLIZAS DEL ADMINISTRADOR: Adicionales al cubrimiento de los riesgos que debe constituir ENTerritorio mediante una garantía única de cumplimiento que ampare el contrato de mandato, deberá incluir al DNP como beneficiario en sus pólizas globales de los siguientes riesgos:

En consideración a que con ocasión del contrato se van a desarrollar actividades financieras que generan riesgos y por su especialidad, ENTerritorio, deberá con relación a las garantías que amparan los riesgos de Infidelidad de empleados y Falsificación de cuentas y de Responsabilidad Civil Profesional de entidades financieras, **incluir** al **DNP** como beneficiario, y mantenerlas vigentes durante el término de ejecución del contrato y hasta su liquidación, si es el caso. De conformidad con lo anterior y bajo el entendido que los recursos a administrar por parte de **ENTerritorio** serán desembolsados por el **DNP** de acuerdo con la situación de PAC y considerando que el administrador realiza transferencias a las entidades ejecutoras según lo pactado en la celebración de los contratos específicos, en tanto los recursos que son transferidos por **ENTerritorio** ya dejan de estar bajo su administración y control, resulta necesario estimar el valor de la cobertura de los amparos de Infidelidad de empleados y Falsificación de cuentas y de Responsabilidad Civil Directores y Administradores en función del valor de los recursos que sean transferidos por DNP y que se encuentren bajo la custodia de **ENTerritorio**, bajo las indicaciones que a continuación se señalan:

ENTerritorio deberá incluir al DNP como beneficiario en sus pólizas globales, con relación a los siguientes amparos, porcentajes y vigencias:

RIESGO	PORCENTAJE	SOBRE EL VALOR	VIGENCIA
Infidelidad de empleados y Falsificación de cuentas	10%	Del valor de los recursos que se encuentran en la cuenta en donde **ENTerritorio** maneja y custodia los recursos del fondo	El plazo de ejecución del contrato y 1 año más
Responsabilidad Civil Directores y Administradores	10 %	Del valor de los recursos que se encuentran en la cuenta en donde **ENTerritorio** maneja y custodia los recursos del fondo	El plazo de ejecución del contrato y 1 año más.

En aquellos casos en donde **DNP** sea incluido como beneficiario de una póliza vigente, **ENTerritorio** deberá garantizar su renovación anual por el periodo en que se requiere cada amparo. Así mismo, en caso de que en estas pólizas se presente un siniestro que afecte el valor asegurado, **ENTerritorio** deberá realizar la modificación de la póliza para garantizar que en cualquier caso esta sea suficiente y cumpla con las condiciones y términos previstos en esta cláusula.

En todo caso, **ENTerritorio** se compromete a verificar e informar mensualmente al supervisor del DNP la suficiencia de la póliza teniendo en cuenta el saldo en la cuenta al finalizar cada mes, a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande la ejecución del contrato y el adicional previsto para cada amparo.

PARAGRAFO PRIMERO. En caso de no tener pólizas globales de los amparos de Infidelidad de empleados y Falsificación de cuentas y de Responsabilidad Civil Directores y Administradores para incluir al DNP como beneficiario, en función del valor de los recursos que sean transferidos por DNP, deberá proceder a constituirlas de acuerdo con las precitadas exigencias.

DÉCIMA CUARTA - REPOSICIÓN DE LA GARANTÍA: ENTerritorio deberá reponer la garantía antes mencionada, cuando debido a las sanciones impuestas, o de otros hechos, se disminuyere o agotare o cuando su valor se viere afectado por razón de siniestros, durante el término de ejecución del presente contrato, según sea el caso. Así mismo, deberá hacerlo en los eventos contemplados en el artículo 2.2.1.2.3.1.18. del Decreto 1082 de 2015.

PARÁGRAFO: SOCIEDAD INTERVENIDA: En el evento en que la entidad que expida la póliza de seguro que sirva de garantía del presente contrato, sea intervenida, tomado su control o liquidada por el Gobierno Nacional a través de entidad competente, y con ello se genere incertidumbre sobre el pago o efectividad de la garantía aportada, ENTerritorio deberá de manera inmediata presentar nuevas pólizas o reemplazar la expedida por la compañía de seguros intervenida, sujeta a toma de control o en proceso de liquidación.

DÉCIMA QUINTA: PENAL COMPENSATORIA: **A.** En caso de declaratoria de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, el **DNP** podrá hacer efectiva la presente cláusula penal pecuniaria en un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato (cuota de administración), a título de pena, la cual se tendrá como estimación y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados al **DNP**. **B.** El valor variará proporcionalmente al incumplimiento parcial del Contrato que no supere el porcentaje señalado. **C.** En concordancia con el artículo 1600 del Código Civil, el cobro de la cláusula penal pecuniaria no impedirá que el **DNP** le solicite al CONTRATISTA la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que exceda del valor de la cláusula penal pecuniaria. **D.** El CONTRATISTA autoriza que el **DNP** descuente de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a la cláusula penal pecuniaria. **E.** Para efectos de esta cláusula, se entenderá por incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA cuando este no cumpla con la totalidad de las obligaciones a su cargo o cuando no cumpla con el fin y objeto contractual pactado, lo cual podrá ser verificado por parte del DNP una vez terminado el Contrato, aun habiéndose hecho pagos parciales.

PARÁGRAFO: Esta cláusula se aplicará sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al **DNP** para el cobro de los demás perjuicios ocasionados.

DÉCIMA SEXTA. - TERMINACIÓN: Son causales de terminación de este contrato las siguientes:

1). De común acuerdo entre las partes, en forma anticipada.

2). Por vencimiento de su vigencia o por el agotamiento de los recursos si no es adicionado o prorrogado con antelación a estos eventos.

4). Por solicitud de reintegro de los recursos por parte del **DNP**, en el momento que este lo requiera.

5). En caso de que se configuren las justas causas para darlo por terminado de conformidad con lo previsto en el Art. 1325 del código de comercio y el artículo 2189 del código civil y

6). Por recomendación del Comité Directivo del contrato, no obstante, el mandante deberá realizar el pago del valor correspondiente de los compromisos adquiridos por el mandatario con ocasión del contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA. - SUSPENSIÓN CONTRATO: Se podrá suspender temporalmente la ejecución del presente contrato por mutuo acuerdo de las partes y, en eventos de caso fortuito o fuerza mayor. Con tal fin se suscribirá un acta de suspensión en la que se señalarán los motivos y la fecha en que se reiniciará su ejecución, sin que para efectos del plazo extintivo del mismo se compute el tiempo de suspensión.

DÉCIMA OCTAVA. - REVOCATORIA DEL MANDATO: El mandante podrá revocar total o parcialmente el mandato previa recomendación del Comité Directivo.

DÉCIMA NOVENA. - PROHIBICIÓN DE CESIÓN: Este contrato se ha celebrado en consideración al objeto que se pretende ejecutar y la capacidad de las entidades que intervienen; en consecuencia, ninguna de ellas podrá cederlo sin previa autorización de la otra parte.

VIGÉSIMA. - PRÓRROGAS, ADICIONES Y MODIFICACIONES: Cualquier adición, prórroga o modificación al presente contrato deberá hacerse de común acuerdo entre las partes y por la plataforma de Secop II.

PARÁGRAFO PRIMERO: Según la naturaleza y fines del presente contrato, este podrá adicionarse con nuevos recursos y/o actividades, previa justificación y por común acuerdo entre las partes.

VIGÉSIMA PRIMERA. - INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL: Cuando haya lugar a celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión, los contratistas actuarán bajo la responsabilidad y supervisión de **ENTerritorio,** pero sin subordinación ni dependencia de **ENTerritorio,** ni del **DNP.**

VIGÉSIMA SEGUNDA.-PARTES INDEPENDIENTES: En cuanto hace referencia a la relación de las partes entre sí, se entiende que ésta será de plena autonomía técnica, administrativa y directiva en el Desarrollo y ejecución del presente contrato y que su actividad se desarrolla en ejercicio de los principios de coordinación y subsidiaridad entre la administración pública y que la responsabilidad de la gerencia, ejecución y desarrollo de los proyectos de inversión objeto del presente contrato será exclusiva de **ENTerritorio.**

VIGÉSIMA TERCERA. - DERECHOS DE AUTOR: Los derechos de autor que recaigan sobre las gestiones objeto del presente contrato se regirán por la legislación nacional aplicable. En todo caso, los derechos patrimoniales corresponderán al **DNP** quien tendrá absoluta autonomía sobre la utilización de los mismos, lo cual constará en los contratos de prestación de servicios que se deriven de este contrato.

VIGÉSIMA CUARTA. RESERVA DE INFORMACIÓN: Las partes se obligan a mantener bajo reserva toda la información recibida y entregada en desarrollo del presente contrato que por su naturaleza tenga carácter de datos privados, durante la vigencia del mismo y dentro de los tres (3) años siguientes a su vencimiento, en los términos previstos en la Ley 1266 de 2008. Transcurrido este tiempo, dejará de regir entre las partes, salvo en lo que se refiere a la Información Confidencial que constituya un secreto comercial respecto del cual el deber de confidencialidad, hasta donde lo permita la ley, continuará en pleno vigor y efecto. Para estos efectos, se entenderá por datos privados aquellos que se definan como tales en las disposiciones constitucionales y legales vigentes, así como las precisiones realizadas al respecto por la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional. Cualquier persona que vaya a participar o a intervenir en el contrato como receptor efectivo de información catalogada como confidencial, la conservará y mantendrá de manera estrictamente confidencial y no revelará a terceros todas las informaciones y datos suministrados en la ejecución del presente contrato.

PARÁGRAFO: Se excluye de la anterior disposición toda información que corresponda a procesamientos de datos en bruto que provengan de información recibida de las fuentes, toda vez que las transformaciones en sí no comprometen normas de confidencialidad, por lo tanto, esta información podrá ser usada sin requerir autorización de alguna de las partes.

VIGÉSIMA QUINTA - HABEAS DATA: Las partes reconocen que en desarrollo del presente contrato pueden llegar a tener acceso a información de carácter privado o reservado por el derecho fundamental del Habeas

Data establecido en el artículo 15 de la Constitución Política. Por consiguiente, las partes se obligan a manipular esta información de carácter privado o reservado con sujeción a las normas y disposiciones constitucionales y/o legales y vigentes, y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia. Adicionalmente, las partes no podrán disponer de bases de datos individuales a entidades públicas o privadas diferentes a las partes de este contrato.

VIGÉSIMA SEXTA. - INDEMNIDAD: Será obligación de **ENTerritorio** mantener indemne al **DNP** de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus propias actuaciones o de sus subcontratistas o dependientes hasta por el monto del daño o perjuicio causado, sin que sea de su responsabilidad la entrega de un producto entendido como tal, el desarrollo, implementación o ejecución del proyecto de que se trate.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. -SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las controversias o diferencias que surjan entre las partes con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a diez (10) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán poro los mecanismos alternativos de solución de controversias previstos en la ley, y de persistir podrán acudir ante la jurisdicción competente.

VIGÉSIMA OCTAVA. - SUPERVISIÓN: ´

1. Por parte del DNP: La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente Contrato de mandato estará a cargo del Asesor Código 1020 grado 16 de la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del DNP que ejerza las funciones de Gerente Nacional de Pactos Territoriales, para el efecto, el Coordinador del Grupo de Contratación del DNP comunicará mediante memorando, de acuerdo con la solicitud de la dependencia.

Funciones del supervisor. Además de las funciones señaladas en el manual de contratación del DNP, el supervisor tendrá las siguientes:

a. Verificar y exigir la adecuada ejecución del contrato, con observaciones soportadas a los informes enviados por ENTerritorio;

b. Analizar y justificar las adiciones, reducciones, prórrogas y demás modificaciones que se requieran al contrato.
c. Revisar y dar visto bueno a los informes de gestión presentados por ENTerritorio en desarrollo del objeto del contrato.

d. Al finalizar el contrato aprobar el informe final entregado por ENTerritorio, para dar inicio a la liquidación del contrato.

e. Avalar las transferencias y pagos establecidos en el presente Contrato.

f. Realizar el control y seguimiento del presente contrato de mandato bajo los procesos, procedimientos, tiempos y formatos que rigen actualmente en el **DNP** que forman parte del Proceso de Gestión de Calidad.

PARÁGRAFO PRIMERO: El supervisor estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1 del Artículo 4º y numeral 1º del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, Resolución Interna 0698 de 2019 por medio de la cual se modificó el Manual de contratación y las demás normas establecidas sobre la materia que regulen el tema o normas que modifiquen las antes mencionadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El supervisor hará por escrito todas las observaciones y sugerencias que considere necesarias para el cabal desarrollo del objeto del contrato y el cumplimiento de las obligaciones de las partes.

PARÁGRAFO TERCERO: El supervisor deberá estar registrado el SECOP II como comprador, de tal manera que le sea posible subir a la plataforma los informes y productos pactados en el presente contrato.

Por parte de ENTerritorio:

La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente Contrato de mandato estará a cargo del Subgerente de Desarrollo de Proyectos o quien designe la Gerente General, de conformidad con lo establecido en el Manual de Supervisión e interventoría de ENTerritorio.

VIGÉSIMA NOVENA. - LIQUIDACIÓN: A la terminación del Contrato y dentro de los siete (7) meses siguientes se levantará un acta de liquidación suscrita por las partes en la cual se deberán declarar las sumas recibidas y se liquidarán los valores correspondientes a su ejecución, la cual debe venir soportada con el informe final y la certificación de cumplimiento del objeto suscrita por el supervisor del contrato. En el evento de que en el mismo resultaren remanentes con relación al valor total del Contrato, **ENTerritorio** se compromete a reintegrarlos una vez se realice el balance financiero.

PARÁGRAFO: Con posterioridad a la terminación del contrato y dentro del término acordado para la liquidación de este, **ENTerritorio** elaborará la respectiva acta para revisión y posterior firma de las partes. Dicho documento deberá venir acompañado de los soportes necesarios, y deberá contener un informe de término, el cual se elaborará con base en los alcances y lineamientos diseñados por **ENTerritorio** para tal fin dentro de su sistema de gestión de calidad.

TRIGESIMA: PLATAFORMA SECOP II: LAS PARTES deberán cumplir oportunamente con todas las exigencias y procedimientos establecidos para los convenios y/o contratos y sus modificaciones en la plataforma de SECOP II, el término para atender dichos procedimientos es inmediato (tiempo real) y las notificaciones son emitidas por Colombia Compra Eficiente al correo electrónico que las partes haya registrado en la plataforma electrónica.

En cuanto a la protección de datos mediante la plataforma de Secop II, las partes deberán indicar cuáles de los documentos aportados son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 4º del artículo 24 de la ley 80 de 1993. Si no se hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá que los documentos son públicos.

Se recomienda que, para cargar información sensible en Secop II, utilice la opción "confidencial" y que adicionalmente tenga en cuenta lo establecido en la ley 1581 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013 y demás disposiciones legales aplicables vigentes que la complementen, adicionen, modifiquen o sustituyan.

Todos los documentos que se generen en desarrollo del presente contrato y que implique modificaciones, suspensión o terminación de este deberán tramitarse por la plataforma de Secop II.

TRIGÉSIMA PRIMERA - PUBLICIDAD: Atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente contrato deberá será gestionado transaccionalmente por el DNP en el SECOP II, que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN INSTRUMENTAL: Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del presente contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas contractuales: 1) Los estudios y documentos previos que comprende: Estudio previo, análisis del sector, propuesta económica de ENTerritorio y demás documentos citados en los considerandos del presente clausulado, y 2) El acto administrativo de justificación de la Contratación Directa.

TRIGÉSIMA TERCERA. - NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que **LAS PARTES** deban efectuarse en desarrollo del presente contrato constarán por escrito y sólo se entenderán debidamente efectuadas si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones

indicadas a continuación:

ENTERRITORIO Cargo: Subgerente de desarrollo de proyectos Dirección: Calle 26 # 13-19 Piso 30 Teléfono: (57 1 5940407 ext. 12521)	**EL DNP** Cargo: Director de Inversiones y Finanzas Públicas Dirección: Calle 26 No. 13 19 piso 33 Teléfono: 3815000

PARÁGRAFO: En caso de presentarse alguna modificación en la información relacionada, ésta deberá ser notificada a las demás Partes, sin que se requiera modificar el presente contrato.

TRIGÉSIMA CUARTA. - LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos las partes señalan que las actividades se ejecutarán en la ciudad de Bogotá D.C. y en las regiones objeto del contrato, los costos de desplazamiento del personal requerido para el cumplimiento del objeto serán asumidos con cargo a la cuota de administración del Contrato. El domicilio será en la ciudad de Bogotá D.C.

TRIGÉSIMA QUINTA. - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se perfecciona con la aprobación de las partes por la plataforma de Secop II. Será requisito de ejecución del presente contrato, el registro presupuestal del mismo, aprobación de las garantías por parte del DNP y suscripción del acta de Inicio.

TRIGÉSIMA SEXTA. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO: Las partes aquí firmantes deben reconocer que han leído, entendido y aceptado los términos del presente Contrato y las contenidas en los documentos previos.

En constancia se firma el presente clausulado del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO mediante la plataforma de Secop II.

Vo.Bo Por DNP:

Preparó: Milton Rene Rodríguez Caicedo, abogado DIFP- GGNPT
Ángela María Restrepo, abogada DIFP- GGNPT
Revisó: María Alejandra González L., Coordinadora Jurídica y Administrativa DIFP- GGNPT
Ajustó: Marisol Olivera Garrido, Contratista Grupo de Contratación
Revisó: Gloria Jeannette Rodríguez Bautista, Abogada Grupo de Contratación
Ingrid Payares Anillo, Coordinadora Grupo de Contratación
Juan Manuel Gutiérrez, Consultor Secretaría General
Aprobó: Yesid Parra Vera, Director de Inversiones y Finanzas Públicas – DIFP
Diana Patricia Rios – Secretaria General

Despacho Dirección General:
Gilberto Estupiñan Parra, asesor del despacho de la Dirección General

Subdirección Financiera:

Flor Zulian Salamanca Díaz, Subdirectora Financiera DNP.
Liliana Villarreal Carreño, Coordinadora Grupo de Presupuesto
Edilberto Herrera Gutiérrez, Coordinador Grupo de Contabilidad
Yesid Correa Torres, Coordinador Grupo de Tesorería.

Vo.Bo Por ENTerritorio:

Andrea Carolina Álvarez Casadiego, Jefe Oficina Asesora Jurídica
Luis Fernando Ariza Jiménez, Subgerente de Desarrollo de Proyectos
Bellaniris Ávila Bermúdez, Subgerente de Operaciones
Ricardo Andres Oviedo León, Subgerente Financiero

PACTO BOYACÁ, RAÍZ Y FUTURO: TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA Y JUSTICIA SOCIAL EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA

INTEGRANTES:

El Departamento Nacional de Planeación, la Gobernación de Boyacá y el municipio de Duitama, en adelante referidos como los signatarios, acuerdan suscribir el Pacto Territorial, denominado "PACTO BOYACÁ, RAÍZ Y FUTURO: TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA Y JUSTICIA SOCIAL EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA (en adelante Pacto Boyacá, Raíz y Futuro), previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. La figura de los Pactos Territoriales, de acuerdo con el actual Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023, artículo 279), es un "*(...) instrumento de articulación para la concertación de inversiones estratégicas de alto impacto que contribuyan a consolidar el desarrollo regional definido en el Plan Nacional de Desarrollo y la construcción de la Paz Total (...)*". Dicho instrumento es una actualización de los anteriores Contratos Plan constituidos mediante las Leyes 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014) y 1454 de 2011 (Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial), dado que mediante el artículo 8 de la Ley 1450 de 2011, modificado por el artículo 198 de la Ley 1753 de 2015. Los Contratos Plan se incorporaron al ordenamiento jurídico como un instrumento de planeación del desarrollo territorial para la articulación de recursos y la concurrencia de esfuerzos institucionales entre diferentes niveles de gobierno.

2. El artículo 279 de la Ley 2294 de 2023, modifica el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019, y señala que los departamentos, los municipios, los Esquemas Asociativos Territoriales y la Nación podrán suscribir Pactos Territoriales, definidos como se consignó en la primera consideración.

3. La referida norma, adicionalmente, promueve la adopción de metodologías con enfoque de género, a través del trabajo articulado con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, y la concurrencia de recursos del orden nacional y territorial, público, privado y/o de cooperación internacional, bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación (DNP). El mencionado artículo 279 de la Ley 2294 de 2023, fue reglamentado mediante el Decreto 105 del 5 de febrero de 2024.

4. El Ministerio de la Igualdad, Viceministerio de las Mujeres expidió las recomendaciones para la incorporación del enfoque de género en los Pactos Territoriales, las cuales fueron socializadas a través de la Subdirección de Género del DNP, mediante comunicación del 13 de marzo de 2025, con radicado DNP 20255390079133.

5. El departamento de Boyacá, reconocido por su riqueza cultural, histórica y natural, enfrenta desafíos significativos que demandan una acción coordinada y estructurada para impulsar su desarrollo integral y sostenible. En este contexto, el Pacto Territorial se presenta como una estrategia esencial para articular esfuerzos y recursos, con el fin de fortalecer el bienestar de sus habitantes y promover el progreso económico, social y ambiental del departamento, implementando estrategias para la superación de la pobreza y el cierre de brechas.

6. Por su parte, el Plan Departamental de Desarrollo de Boyacá resalta la necesidad de fortalecer la infraestructura, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y promover la sostenibilidad ambiental. El mismo se alinea con las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo "Colombia Potencia Mundial de la Vida 2022-2026" (PND) que establecen la importancia de promover un desarrollo territorial equilibrado y equitativo enfocándose en la descentralización y en la potenciación de las capacidades locales.

7. En este sentido, el Pacto Territorial se alinea con los objetivos planteados en el PND y en el Plan Departamental de Desarrollo, priorizando la inversión en áreas clave como la educación, la salud, el turismo sostenible, el medio ambiente, el agua potable y saneamiento básico, la agroindustria y la conectividad vial. Estos proyectos no solo contribuirán al desarrollo económico del departamento, sino que también generarán empleo y mejorarán la calidad de vida de los boyacenses.

8. El Pacto Territorial, mediante la consolidación de la alianza territorio - Nación y la movilización de recursos, permitirá una implementación eficiente y eficaz de los proyectos, asegurando su sostenibilidad en el tiempo. Asimismo, este enfoque integral y colaborativo promoverá la cohesión social y territorial, reduciendo las brechas de desigualdad y fortaleciendo la identidad y el patrimonio cultural de Boyacá.

En consecuencia, las partes suscribientes:

ACUERDAN:

I. OBJETO, ÁMBITO, FOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL PACTO

Cláusula Primera. Objeto. Implementar políticas y proyectos estratégicos en el departamento de Boyacá, que promuevan la transformación productiva para una tierra grande, competitiva y equitativa, alineadas con los principios del Gobierno Nacional. Todo ello para lograr una transición energética justa, que permita transitar de las actividades económicas extractivistas, a la agroindustria, el turismo y las energías alternativas, sumado a la generación de bienestar con el fortalecimiento del acceso a servicios esenciales como salud, agua potable y saneamiento básico, educación e infraestructura estratégica, para lograr el cierre de brechas y promover la vida en el territorio Boyacense.

Cláusula Segunda. Ámbito de Aplicación. El "Pacto Territorial Boyacá, Raíz y Futuro", se suscribe en el marco de lo establecido en el artículo 279 de la Ley 2294 del 2023, PND 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida", y en la Ley 1450 de 2011, Ley de Ordenamiento Territorial, o normas que la modifiquen o sustituyan, como una estrategia de articulación entre los diferentes niveles de gobierno.

Cláusula Tercera. Focalización Territorial. El "Pacto Territorial Boyacá, Raíz y Futuro" se extiende a la totalidad del departamento de Boyacá, que cuenta con 23.189 Km2 de superficie y 123 municipios localizados en 13 provincias. Está ubicado en el centro oriente del país y lo atraviesa la Cordillera Oriental de la región Andina Colombiana, por consiguiente, tiene una topografía muy variada a la cual se suma también la variedad de climas.

Cláusula Cuarta. Vigencia. La vigencia del "Pacto Territorial Boyacá, Raíz y Futuro", será de cinco (5) años, contados a partir de su suscripción.

Cláusula Quinta. Modificación. El presente Pacto podrá modificarse por escrito, previa decisión adoptada por el Consejo Directivo, a petición de cualquiera de los integrantes de esta instancia, atendiendo el procedimiento establecido en el reglamento interno del Consejo Directivo.

Parágrafo. El Consejo Directivo del Pacto podrá ajustar o modificar las líneas temáticas o estratégicas propuestas, incluyendo los componentes que sean necesarios para el logro del objetivo propuesto.

II. FOCALIZACIÓN TEMÁTICA

Cláusula Sexta. Líneas Temáticas. El "Pacto Territorial Boyacá, Raíz y Futuro", está conformado por nueve (9) líneas estratégicas, que, articuladas, contribuyen al logro del objetivo propuesto, considerando que reflejan la vocación de los territorios que la componen, la visión del desarrollo y las potencialidades, el cierre de brechas, entre otras. Estas son:

- Línea Estratégica 1: Agua y Saneamiento Básico
- Línea Estratégica 2: Educación
- Línea Estratégica 3: Salud
- Línea Estratégica 4: Deporte
- Línea Estratégica 5: Agropecuario
- Línea Estratégica 6: Infraestructura para el Turismo
- Línea Estratégica 7: Transición Energética
- Línea Estratégica 8: Transporte
- Línea Estratégica 9: Formalización de Tierras.

Cláusula Séptima. Programas y Proyectos de Inversión. La relación indicativa de proyectos de inversión que se gestionarán en el marco del "Pacto Territorial Boyacá, Raíz y Futuro", de conformidad con el objeto y los ejes estratégicos definidos en el presente acuerdo, serán incorporados en el Plan Estratégico de Inversiones[1], el cual será elaborado de manera conjunta por los integrantes del Comité Técnico y aprobado por el Consejo Directivo del Pacto.

Con el propósito de gestionar los programas y proyectos incorporados en el Plan Estratégico de Inversiones, el Consejo Directivo aprobará un Plan de Acción y Seguimiento, que podrá ser ajustado cuando las necesidades de este así lo exijan, previa justificación técnica, jurídica y financiera.

Parágrafo 1°. El Plan Estratégico de Inversiones podrá identificar: i) los programas y proyectos de inversión priorizados, ii) fuente de financiación y iii) cronograma para su ejecución.

Parágrafo 2. Se adjunta al presente pacto una lista indicativa de proyectos que serán gestionados en el marco del "Pacto Territorial Boyacá, Raíz y Futuro", la cual servirá como base para la elaboración y aprobación del Plan Estratégico de Inversiones.

---

[1] El Plan Estratégico de Inversiones (PEI) es un instrumento de planeación en el que se consolidan todas las inversiones y sus fuentes indicativas de financiación, en concordancia con lo determinado en la minuta del pacto territorial y los documentos de política que hayan priorizado los proyectos. Este instrumento se formula para la vigencia total del Pacto Territorial y puede ser modificado por solicitud del Consejo Directivo, cuando así se requiera.

III. ESQUEMA DE INVERSIONES

Cláusula Octava. Mecanismo de Inversión. El "Pacto Territorial Boyacá, Raíz y Futuro", podrá ser financiado a través de la concurrencia de diferentes fuentes de financiación provenientes de entidades públicas del Gobierno Nacional, nivel territorial, sector privado y cooperación internacional, considerando entre otras, las siguientes:

a) Recursos del Sistema General de Regalías – SGR, recursos del Sistema General de Participaciones – SGP y OCAD Paz, recursos del Presupuesto General de la Nación – PGN y recursos propios de las entidades territoriales;
b) Recursos de financiación del Programa de Apoyo a la Participación Privada, con el fin de promover la vinculación del sector privado en la financiación, operación y mantenimiento de proyectos de infraestructura priorizados en el Pacto;
c) Recursos de Cooperación internacional,
d) Otras fuentes que se identifiquen.

Parágrafo. Las entidades públicas financiadoras de los proyectos estratégicos que componen el Pacto deberán, en el caso que se requiera, comprometer vigencias futuras para la ejecución de los proyectos y adelantar el trámite para su declaratoria de importancia estratégica, según corresponda, de conformidad con la normativa vigente y aplicable.

Cláusula Novena. Complementariedad. Además de las estrategias y acciones contempladas en el presente Pacto, se podrán articular otros programas, proyectos e iniciativas que se desarrollen en el departamento de Boyacá, que guarden relación con los componentes del "Pacto Territorial Boyacá – Raíz y Futuro", y que puedan contribuir al cumplimiento del objeto de este acuerdo.

IV. COMPROMISOS DE LAS PARTES

Cláusula Décima. Compromisos. Para el desarrollo del presente Pacto, las entidades del nivel nacional y territorial se comprometen en el marco de sus competencias, a lo siguiente:

i. Compromisos comunes de los signatarios

1. Adelantar la formulación y estructuración de los proyectos estratégicos de acuerdo con los requerimientos jurídicos, técnicos y financieros que en cada caso sean necesarios para su viabilidad, así como el registro de dichos proyectos en donde la normativa vigente lo indique.
2. Gestionar recursos para la financiación de los proyectos priorizados en el Pacto, de acuerdo con los requerimientos jurídicos, técnicos y financieros que correspondan.
3. Tramitar autorizaciones, permisos y licencias que sean necesarios para implementar los proyectos del Pacto.

4. Brindar al Consejo Directivo y al Comité Técnico del Pacto, la información y el acompañamiento necesario para ejecutar y realizar el seguimiento y evaluación de los compromisos derivados del presente Pacto.
5. Divulgar los acuerdos, compromisos, obligaciones, autorizaciones y procedimientos que surjan en el desarrollo del Pacto.
6. Promover la articulación e interacción entre los diferentes actores y entidades nacionales y territoriales que participen en el Pacto.

ii. Compromisos de las entidades nacionales que participarán en la implementación del presente Pacto Territorial

1. Apoyar y prestar colaboración técnica, directamente o a través de sus entidades adscritas o vinculadas, a las entidades de orden nacional y territorial que hagan parte del Pacto, de conformidad con las competencias de cada uno de los signatarios.
2. Suscribir los convenios específicos o contratos que sean procedentes con las entidades territoriales u otras entidades del nivel nacional, que se deriven del Pacto cuando concurran en la financiación de los proyectos de inversión que sean priorizados.
3. Suscribir los contratos y verificar el cumplimiento de las metas fijadas en los mismos, así como el desarrollo de cada proyecto derivado del Pacto y rendir el informe correspondiente al Comité Técnico y al Consejo Directivo del Pacto.
4. Suscribir los demás actos jurídicos necesarios que permitan alcanzar la financiación o cofinanciación de los proyectos que se determinen en el Plan Estratégico de Inversiones - PEI -.
5. Promover la articulación e interacción entre los diferentes actores y entidades nacionales y territoriales que participan en el pacto.
6. Reportar al DNP la información de avance en la ejecución de los proyectos contenidos en el Pacto que sean de su competencia.

iii. Compromisos de las entidades territoriales signatarias

1. Formular y estructurar los proyectos de inversión en el marco de sus competencias.
2. Gestionar la participación de la comunidad y de los grupos sociales, en el desarrollo de los proyectos estratégicos que se realicen en virtud del presente Pacto.
3. Articular las líneas temáticas del Pacto con los planes de desarrollo departamental y municipal a los que haya lugar.
4. Poner a disposición de los ejecutores de los proyectos, los bienes, aportes, infraestructura o elementos que serán objeto de intervención, o mediante los cuales se va a ejecutar uno o varios de los proyectos que se proponen en el Pacto, los cuales deben encontrarse saneados de cualquier vicio o libres de cualquier gravamen que dificulte la ejecución.

5. Asumir, en virtud de sus competencias, los gastos relacionados con la gestión de los compromisos derivados del Pacto y proveer los recursos humanos y logísticos necesarios para su implementación en el territorio.
6. Una vez se cuente con los estudios y proyectos avalados por los respectivos sectores y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y el Marco de Gasto de Mediano Plazo, adelantar las gestiones para incorporar, en los respectivos presupuestos, las partidas presupuestales concertadas para la ejecución de estos.
7. De ser necesario para la ejecución de los proyectos, comprometer vigencias futuras y, adelantar el trámite que corresponda de conformidad con la normativa vigente y aplicable.
8. Suscribir y verificar el cumplimiento de las metas fijadas en el desarrollo de cada proyecto derivado del Pacto y rendir el informe correspondiente al Comité Técnico y al Consejo Directivo.
9. Remitir la información pertinente al Departamento Nacional de Planeación sobre los proyectos en gestión, en ejecución o terminados, según los compromisos adquiridos con la firma del presente documento.

iv. Compromisos especiales del Departamento Nacional de Planeación

1. Coordinar la implementación, ejecución y monitoreo del Pacto.
2. Elaborar reportes semestrales donde se registren los avances del Pacto.
3. Desarrollar un sistema de información, de cara a la ciudadanía, en el cual se pueda consultar el avance del Pacto y mantenerlo actualizado.
4. Ejercer la Secretaría Técnica del Consejo Directivo y el Comité Técnico del Pacto.

V. MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN DEL PACTO

Cláusula Décima Primera. Modelos de Gobierno. Para el desarrollo e implementación del Pacto se conformarán dos (2) instancias de decisión y administración: el Consejo Directivo y el Comité Técnico. Sus lineamientos y funciones se establecerán, de conformidad con los términos del presente acuerdo y el reglamento interno que expida el Consejo Directivo, así como en los demás instrumentos que los complementen, modifiquen o adicionen.

Parágrafo. La Secretaría Técnica del Pacto presentará al Consejo Directivo en la primera sesión la propuesta de reglamento interno para el presente Pacto.

Cláusula Décima Segunda. Consejo Directivo. El Consejo Directivo será la instancia superior de decisión y administración del Pacto. Su función es dirigir y orientar la implementación del Pacto, definiendo las estrategias y acciones que permitan el cumplimiento de sus objetivos, procurando la adecuada interacción entre los niveles de gobierno participantes.

i. El Consejo Directivo del Pacto Territorial estará integrado por:

1. Nivel nacional: El/la director/a del Departamento Nacional de Planeación o el/la Gerente Nacional de Pactos Territoriales del DNP o su delegado/a.
2. Nivel departamental: El/la Gobernador/a de Boyacá o su delegado/a.
3. Nivel municipal: El/la Alcalde/sa del municipio de Duitama.
4. Nivel de organizaciones sociales: Estará conformado por los representantes de las organizaciones, asociaciones y gremios productivos, grupos étnicos, comunitarios, poblacionales, entre otras fuerzas vivas del departamento.

Parágrafo 1. Los/las delegados/as deberán ser del nivel directivo o asesor y ostentar capacidad para la toma de decisiones.

Parágrafo 2. Para la primera sesión del Consejo Directivo ejercerá como presidente temporal de la sesión el/la Director/a del DNP o el/la Gerente Nacional de Pactos Territoriales del DNP o su delegado/a, y en dicha sesión: i) Se elegirá el/la presidente del Consejo Directivo; y, ii) Se aprobará el Reglamento Interno del Consejo Directivo.

Parágrafo 3. Podrán asistir y participar en las sesiones del Consejo Directivo, en calidad de invitados/as, instancias especializadas cuya presencia se considere necesaria para la ilustración de asuntos en los cuales el Consejo deba formular recomendaciones o tomar decisiones.

Parágrafo 4°. Para efectos de la elección de los representantes o designados de las organizaciones sociales ante el Consejo Directivo, su representatividad se definirá y rotará anualmente de acuerdo con los lineamientos del reglamento interno del Consejo Directivo.

Parágrafo 5°. La Secretaría Técnica del Consejo Directivo del Pacto Territorial estará a cargo de la Gerencia Nacional de Pactos Territoriales del Departamento Nacional de Planeación. Las sesiones del Consejo Directivo serán convocadas por la Secretaría Técnica.

Cláusula Décima Tercera. Funciones del Consejo Directivo. Las funciones del Consejo Directivo del Pacto serán:

1. Definir directrices y lineamientos generales para la implementación y operatividad del Pacto.
2. Aprobar el Plan Estratégico de Inversiones y los Planes de Acción y Seguimiento, con base en las propuestas y recomendaciones presentadas por el Comité Técnico.
3. Realizar el seguimiento a los proyectos incluidos en el Pacto, generando recomendaciones a los responsables de los proyectos en todos los niveles contractuales.

4. Establecer los lineamientos de ejecución y operación de los proyectos incluidos en el Pacto, y en especial de aquellos que han sido priorizados, teniendo en cuenta los criterios propuestos por el Comité Técnico y lo dispuesto en las cláusulas del presente Pacto.
5. Proponer y aprobar las modificaciones que, por razones de pertinencia o conveniencia, se consideren necesarias sobre los proyectos definidos en el Pacto, debiendo contar con la evaluación y aprobación previa del Comité Técnico. En todo caso, las propuestas deberán ser coherentes con la convergencia de prioridades de desarrollo nacional y territorial y deberán ceñirse de manera estricta a criterios técnicos y de viabilidad financiera, en todo caso, atendiendo las disponibilidades presupuestales.
6. Facilitar y promover la interlocución e interacción entre los niveles de gobierno participantes, y con instancias de la sociedad civil y organizaciones sociales y comunitarias cuando se considere necesario.
7. Operar de manera provisional, una vez finalizada la vigencia del pacto territorial, con el fin de ejercer sus funciones exclusivamente respecto de los proyectos que queden en ejecución.
8. Definir y adoptar su reglamento interno.

Cláusula Décima Cuarta. Comité Técnico. Es una instancia especializada de apoyo técnico al servicio del Consejo Directivo, encargada de asesorarlo y asistirlo en el cumplimiento de sus funciones y en los procesos de toma de decisiones relacionadas con la operatividad y ejecución del Pacto.

i. El Comité Técnico estará conformado por:

1. Nivel nacional: La Gerencia Nacional de Pactos Territoriales del DNP o su delegado/a.
2. Nivel departamental: El/la Secretario/a de Planeación de la Gobernación de Boyacá o su delegado/a.
3. Nivel municipal: El/la Secretario/a del municipio de Duitama.
4. Nivel de organizaciones sociales: dos (2) delegados de los miembros que hagan parte del Consejo Directivo y que representen a las organizaciones sociales que hacen parte de este nivel de gobernanza.

Parágrafo 1. Las entidades que estén relacionadas con el desarrollo de cada una de las líneas estratégicas definidas podrán participar en las sesiones que sean pertinentes con voz, pero sin voto.

Cláusula Décima Quinta. Funciones del Comité Técnico. Las funciones del Comité Técnico son:

1. Hacer seguimiento a las acciones y actividades que se deban adelantar para garantizar el cumplimiento de las funciones del Consejo Directivo y las disposiciones contenidas en el Pacto.

2. Elaborar los documentos técnicos necesarios para las discusiones, deliberaciones y toma de decisiones por parte del Consejo Directivo en desarrollo de sus sesiones.
3. Apoyar al Consejo Directivo en el seguimiento de los compromisos definidos en sus sesiones.
4. Identificar y categorizar los proyectos que serán presentados para su aprobación en el Consejo Directivo.
5. Realizar el seguimiento a la ejecución de los proyectos priorizados en el Pacto, de acuerdo con lo establecido en el reglamento interno que se defina para el Comité Técnico.
6. Promover la coordinación de los diferentes actores para articular las prioridades estratégicas del Pacto.

VI. REPORTE DE INFORMACIÓN, RENDICION DE CUENTAS Y CIERRE

Cláusula Décima Sexta. Reporte de Información. Las entidades del orden nacional y territorial ejecutoras de los proyectos priorizados reportarán el avance de la ejecución de los proyectos, de acuerdo con los parámetros e instrucciones suministradas por el Departamento Nacional de Planeación.

Cláusula Décima Séptima. Rendición Pública de Cuentas. El mecanismo de rendición de cuentas del Pacto se realizará a través de la publicación de las fichas trimestrales, informes semestrales y demás documentos elaborados, los cuales se publicarán en la página web del DNP (Sistema de Información de Pactos Territoriales).

Cláusula Décima Octava. Cierre del Pacto. Al vencimiento del plazo de ejecución del Pacto Territorial se debe hacer un balance de los recursos y de los proyectos de inversión asociados, que dé cuenta del avance y resultados del instrumento en términos técnicos, jurídicos y financieros. Igualmente, se continuará con el seguimiento a la implementación del Pacto respecto de los proyectos que queden en ejecución.

Cláusula Décima Novena. Prórroga del Pacto. Únicamente los miembros que conforman el Consejo Directivo podrán acordar la prórroga de este, con la justificación debida y el procedimiento definido en el reglamento interno del Consejo Directivo.

Cláusula Vigésima. Terminación Anticipada. Los suscriptores del pacto podrán acordar la terminación anticipada del mismo.

Se firma a los 14 días del mes de agosto de 2025.

Los suscribientes,

NATALIA IRENE MOLINA POSSO
Directora General
Departamento Nacional de Planeación

CARLOS ANDRÉS AMAYA RODRÍGUEZ
Gobernador
Departamento de Boyacá

INGRITH ROCIO BERNAL MEJÍA
Alcaldesa Municipal
Municipio de Duitama
Departamento de Boyacá

Representantes de las fuerzas vivas de los territorios:

Eudocia ortiz pachon

EUDOCIA ORTÍZ PACHÓN
Guaquera Esmeraldas Occidente de Boyacá

NELSÓN RICARDO RIAÑO COCUNUBO
Federación de Campesinos Parameros del Nororiente Colombiano, Seccional Sierra Nevada de El Cocuy

Departamento
Nacional de Planeación

Bogotá D.C., viernes, 07 de noviembre de 2025

Al responder cite este Nro.
20254330761971

GGNPT

Ingeniero
JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA
Gerente Máster - Grupo de Desarrollo de Proyectos Especiales
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – ENTERRITORIO S.A.
Calle 26 n.° 13-19
Correo: jmontana1@enterritorio.gov.co
correspondencia.lira@enterritorio.gov.co
Bogotá D. C.

Asunto: Solicitud de concepto de verificación técnica, jurídica y financiera del proyecto "*MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES LÍMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON – TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA*", para la asignación de recursos.

Respetado Ingeniero:

De conformidad con las obligaciones previstas en el Contrato Interadministrativo de Mandato nro. DNP-877-2021 / ENTerritorio nro. 221009 suscrito entre el Departamento Nacional de Planeación - DNP y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. – ENTerritorio S.A. y en el Manual Operativo del Fondo Regional para los Pactos Territoriales (FRPT)[1], en el cual se asignaron recursos para financiar el proyecto *"MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES LÍMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON – TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA",* identificado ID 995029; de manera atenta, se solicita proceder con la verificación del cumplimiento de

[1] Capítulo III - Roles y funciones de las partes en la ejecución del contrato, literal **c)** Unidad de gestión y operación del Fondo Regional para los Pactos Territoriales: "Para los contratos específicos en ejecución que requieran adiciones, la entidad ejecutora como responsable del seguimiento, control y supervisión de los recursos asignados al proyecto deberá acreditar con su supervisor y/o interventoría la necesidad de adicionar el contrato con los correspondientes soportes jurídicos, técnicos y financieros. Con fundamento en esta información, el FRPT procederá a emitir el concepto de verificación técnica, jurídica y financiera de los documentos aportados para la adición de recursos del FRPT, los cuales serán el soporte para que el DNP genere la respectiva orden de gasto. El concepto de verificación técnica, jurídica y financiera deberá evidenciar expresamente la situación que justifique la necesidad de adicionar recursos al proyecto, considerando la naturaleza del contrato específico de acuerdo a la información que presente la entidad ejecutora."

los requisitos establecidos por el Fondo Regional para los Pactos Territoriales y emitir el concepto de verificación técnica, jurídica y financiera de los documentos aportados por la entidad ejecutora (departamento de Boyacá), con el fin de avanzar en los trámites para la ejecución de dichos recursos.

Lo anterior, con fundamento en la solicitud de asignación de recursos para la cofinanciación presentada por el departamento de Boyacá al Departamento Nacional de Planeación, mediante radicado DNP n.° 20256631025162 de 7 de noviembre de 2025, con alcance radicado DNP n.° 20256631025212 de 7 de noviembre de 2025.

La documentación presentada se encuentra en el siguiente enlace:

https://boyacagob-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fedgar%5Fnino%5Fboyaca%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPROYECTOS%20TECNICA%202025%2FPRES%2DCRONO%2DANEXO%20TECNICO%20PROY%20PACTO%2FPROYECTOS%20PACTO1%2F2%2E%20VILLAPINZON%2DTURMEQUE%2DTIBANA&viewid=8bc0f6d1%2De280%2D4ae5%2Dbf6b%2D0961516c4e08&login_hint=edgar%2Enino%40boyaca%2Egov%2Eco&source=waffle

Se aclara que, la información contenida en el anterior enlace fue entregada y cargada por funcionarios del departamento en el sistema documental del DNP y su contenido y modificaciones son de integral y total responsabilidad del departamento.

Cordial saludo,

SANDRA YANETH TIBAMOSCA VILLAMARIN
Supervisor Contrato Interadministrativo n.° DNP-877-2021
Asesora / GIT Pactos Territoriales
Subdirección General de Inversiones, Seguimiento y Evaluación - SGISE

Anexos: Radicado n.° 20256631025162 y n.° 20256631025212.

Copia: William Monroy, Gerente Convenio 221009, email: wmonroy@enterritorio.gov.co

Elaboró: Numael Eduardo Parra Martinez – Contratista GIT Pactos Territoriales – SGISE. *Numael Parra*
Revisó: Ana María López Campos - Contratista GIT Pactos Territoriales – SGISE. *amlc*
María Fernanda Rueda García Contratista - GIT Pactos Territoriales – SGISE. *MafeRenda*
Milexza Cristina Roa Cueto - Contratista GIT Pactos Territoriales – SGISE.

FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES

LISTA DE VALIDACIÓN DE REQUISITOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

1. Información general

Fecha: 7/11/2025 Departamento: Boyaca Municipio: Villapinzón - Turmequé - Nuevo Colón —Tibaná

Contrato Plan/Paz/Pacto Territorial Boyaca Número del Consejo Directivo donde se aprobó el Plan de Acción No. 1

Revisado por:
JURÍDICO Marcela Ramírez / Mario Paternina Castillo
TÉCNICO William Monroy
FINANCIERO Cesar Augusto Ramirez- Omaira Carolina Melo

Fecha del Consejo Directivo de Plan de Acción 7 de noviembre de 2025

Plazo de ejecución del proyecto (meses) 13 meses

Nombre del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON -TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

Valor total: $ 70.031.648.339,00
Aporte Sector
Aporte DNP $ 70.031.648.339,00
Aporte Territorio

Eje Estratégico del Contrato Plan al cual de asocia el proyecto: Transporte

Detalle	No.	Documento	Cumple - No Cumple - NA	Observaciones
	1	Carta de presentación del proyecto de inversión, que incluya: Nombre del contrato Plan, fecha de suscripción,fecha de finalizacion. Ejes estratégicos relacionados con el Contrato Plan/Pacto Territorial. Acta de Consejo Directivo No. donde se priorizo el proyecto Nombre del proyecto Valor total del proyecto presentado, especificando el valor solicitado al DNP y/o los valores que serán aportados por otros confinaciadores con sus respectivas vigencias. Plazo de ejecución del proyecto, que debe incluir el tiempo para adelantar el proceso de contratación Entidad designada como ejecutora del proyecto. Entidad designada para la contratación de la interventoria. Justificación de manera resumida de la necesidad del proyecto Indicar si el proyecto hace parte de una fase, si es así realizar un breve resumen sobre lo ejecutado hasta la fecha de radicación, y lo que se requiere para seguir ejecutando con la financiación del DNP. Señalar que el proyecto radicado al DNP es fiel copia del proyecto de inversión radicado en la entidad donde fue viabilizado (en caso de que aplique), la cual debe estar firmada por el Representante Legal de las Entidades Territoriales.	**Cumple**	Se presenta la Carta de presentación firmada por el señor Gobernador de Boyaca De manera atenta me permito presentar el proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON -TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ". El cual ha sido formulado en concordancia con el Plan de Desarrollo Departamental NUESTRO GRAN PLAN ES BOYACÁ 2024-2027en el eje estratégico: INFRAESTRUCTURA VIAL. Meta de producto Vía secundaria mejorada y se encuentra priorizado en el marco del Pacto Territorial Raíz y Futuro del departamento de Boyacá, con las siguientes consideraciones: Nombre del contrato Plan/Paz/Pacto Territorial: Pacto Raíz y Futuro Departamento de Boyacá. • Nombre del contrato Plan/Paz/Pacto Territorial: Pacto Raíz y Futuro del departamento de Boyacá. • Fecha de suscripción: 14 de agosto de 2025. • Fecha de finalización: 13 de agosto 2030 • Ejes estratégicos relacionados con el Pacto Territorial: Transporte. • Componente: Infraestructura red vial regional. • Acta de Consejo Directivo donde se priorizo el proyecto: 07 de noviembre del 2025 Nombre del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON - TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ". Alcance del Proyecto: Dentro del marco del proyecto de mejoramiento de las vías departamentales límite Villa pinzón – Turmequé y Turmequé – Nuevo Colón – Tibaná, se ejecutarán diversas actividades orientadas a garantizar la estabilidad, durabilidad y funcionalidad del corredor vial. Las obras contemplan la excavación de cortes, canales y préstamos en material común, así como el cuneteo, perfilado y compactación de la banca existente como trabajos previos a la pavimentación. Se realizarán rellenos con material seleccionado proveniente de excavaciones, instalación de geotextiles para la separación de capas y control de filtraciones, y la colocación de materiales para afirmado, subbase y base granular, con sus respectivos procesos de extendida y compactación conforme a las especificaciones del INVIAS. • Asimismo, se llevará a cabo la imprimación con emulsión asfáltica, seguida de la instalación de carpeta asfáltica en caliente tipo MDC-19, garantizando una superficie de rodadura uniforme y resistente. El proyecto incluye además la construcción de obras de drenaje, tales como tuberías PVC y de concreto reforzado, filtros, cunetas revestidas, canales de coronación y estructuras hidráulicas en concreto de distintas resistencias (14, 21 y 28 MPa). También se consideran actividades de demolición de estructuras existentes, conformación de elementos estructurales en concreto, y colocación de acero de refuerzo según diseño estructural. • Finalmente, se ejecutarán las labores de señalización y seguridad vial, incluyendo la aplicación de pintura acrílica con microesferas, la instalación de señales preventivas, reglamentarias e informativas, así como tachas reflectivas, delineadores de curva, defensas viales, postes de referencia y marcas viales, conforme a la normativa vigente del INVIAS. Estas actividades en conjunto permitirán mejorar significativamente las condiciones de transitabilidad, seguridad y funcionalidad del corredor, contribuyendo al fortalecimiento de la conectividad regional y al desarrollo económico del departamento de Boyacá. Valor total del proyecto: SETENTA MIL TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS. ($70, 031, 648,339.) MCTE. Valor Obra $ 65,450,138,634.58 Valor interventoría $ 4,581,509,704.42 Plazo de ejecución del proyecto: 13 meses que corresponde a la fase precontractual, ejecución de la obra y cierre, que se discriminan de la siguiente manera: • Fase precontractual: 3 meses. • Fase de ejecución: conforme la documentación anexa a la presente solicitud, se desarrollará en el término de 9 meses. • Fase de cierre (entrega del informe final): Atendiendo que en este punto se deben suscribir las actas de recibo final, elaboración de informe de término, desembolso final de recursos al contratista y el inicio del proceso de liquidación del Contrato, para todo lo anterior se requiere un término de 1 mes. • Entidad designada como ejecutora del proyecto: Gobernación de Boyacá. • Entidad designada para la contratación de la interventoria: Gobernación de Boyacá El proyecto presentado al DNP es fiel copia del presentado al Instituto Nacional de Vías, quien otorgó concepto técnico favorable para ejecución
	2	Concepto técnico sectorial FAVORABLE emitido por parte del Ministerio o entidad respectiva del sector, de acuerdo a las competencias y normas que lo rigen.	**Cumple**	Respetado Señor Gobernador: En atención al Proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON – TURMEQUE Y TURMEQUÉ – NUEVO COLON -TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ., de manera atenta nos permitimos dar alcance al Oficio 2024S-VBOG-079521 de fecha 2024-10-28, en el sentido de indicar que la Subdirección de Vías Regionales emite concepto técnico favorable para su ejecución, con un valor SETENTA MIL TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON TRES CENTAVOS. M/CTE ($ 70.031'648.339,03)
	3	Certificado que indique que el proyecto se encuentra registrado en el banco de programas y proyectos de la entidad Territorial relacionando el número **BPIN,** firmada por el secretario de planeación.	**Cumple**	Se remite el certificado SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ *"(...)CERTIFICA:* *Que el proyecto " MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ (MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON -TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ)" con identificador 99502, se encuentra debidamente registrado en la MGA.* *El presente certificado se expide a los veintiún (21) días del mes de junio de 2024.* *(...)"*
	4	Certificado suscrito por el representante legal de la entidad que presenta el proyecto de inversión y de aquella (s) donde se va a ejecutar el mismo en el cual se indique que las actividades que se pretenden financiar no están siendo, ni han sido financiadas con otras fuentes de recursos	**Cumple**	1) Se Presenta certificado de fecha 06 de noviembre de 2025, firmado por el Sr.Gobernador, donde menifiesta que el proycto no ha sido financiado ni estan siendo financiados con otras fuentes de recursos *1. MEJORAMIENTO DE VÍA DEPARTAMENTAL EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE VILLA DE LEYVA Y ARCABUCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ* *2. MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON, TURMEQUE Y TURMEQUÉ, NUEVO COLON, TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ* *3. MEJORAMIENTO DE LA VIA CRUCE RUTA 6209 - EL LLANO DE SOTAQUIRA, SOBRE LA RUTA 55 SOTAQUIRÁ Y SOTAQUIRA-AGUA VARUNA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA* *4. PAVIMENTACION DE LA VIA CON CODIGO 6101 QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TENZA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUTATENZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. PUNTO CRITICO 1 (K65+193)* *5. MEJORAMIENTO DE VÍA SECUNDARIA ENTRE LOS MUNICIPIO DE CHIVATÁ Y TOCA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 6. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES CRUCE RUTA 6209(SOTE) CRUCE RUTA 5502 (LA BOMBA) Y PASO URBANO POR EL MUNICIPIO DE COMBITA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA No han sido financiadas, y No están siendo financiadas con otras fuentes de recursos-*
	5	Para proyectos que incluyan intervención u ocupación del suelo, certificado de funcionario competente de la entidad territorial en la cual se va a ejecutar el proyecto en el que conste que no está localizado en zona que presente alto riesgo no mitigable y que está acorde con el uso de tratamiento del suelo de conformidad con el respectivo instrumento de ordenamiento territorial: Plan de Ordenamiento Territorial (POT); Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT); o Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT); de conformidad con lo señalado en la normatividad vigente.	**Cumple**	*Se presentan certificaciones de los tres municipios que compone el proeycto:* *1. Municipio TURMEQUE:Certifica que el proyecto "No está localizado en ZONA QUE PRESENTE ALTO RIESGO NO MITIGABLE y que está acorde en el uso de suelo de conformidad con los el respectivo instrumento de ordenamiento territorial ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL /EOT) de conformidad con la normatividad vigente.* *2. Municipio NUEVO COLON: certifica que el proeycto no está localizado en ZONA QUE PRESENTE ALTO RIESGO NO MITIGABLE y que está acorde en el uso de suelo de conformidad con los el respectivo instrumento de ordenamiento territorial ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL /EOT) de conformidad con la normatividad vigente.* *3. Municipio de TIBANA: Certifica qeu el proeycto no está localizado en ZONA QUE PRESENTE ALTO RIESGO NO MITIGABLE y que está acorde en el uso de suelo de conformidad con los el respectivo instrumento de ordenamiento territorial ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL /EOT) de conformidad con la normatividad vigente.*

Detalle	No.	Documento	Cumple - No Cumple - NA	Observaciones
Requisitos Generales	6	Tratándose de proyectos de inversión cofinanciados con recursos del Territorio y/o otras fuentes diferentes a Contratos Plan/Pactos Territoriales, carta suscrita por el ordenador del gasto o quien haga sus veces en la respectiva entidad, que soporte el monto de la cofinanciación. Para el caso de los proyectos de inversión sujetos a convocatorias por parte de la Nación se debe presentar el documento que soporte la inscripción de la entidad territorial a la convocatoria, en el que se especifique el nombre de la convocatoria, fecha de inscripción, nombre del proyecto y los datos de radicación	**Cumple**	Se anexan certificacionesde fecha 06bde noviembre de 2025, por parte de los los municipios: NUevo Colon, Tibana y Turmeque. en las que manifiesta: Que las Actividades que se encuentran dentro del proyecto de inversión denominado «MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZÓN - TURMEQUÉ Y TURMEQUÉ - NUEVO COLÓN – TIBANÁ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ», NO están siendo, NI han sido Cofinanciadas con otras fuentes de recursos, por lo tanto, NO APLICA ESTE REQUISITO.
	7	Para acreditar la titularidad del inmueble: a. Certificado de tradición y libertad expedido con una antelación no superior a tres (3) meses, contados desde la fecha de remisión a la instancia de verificación de requisitos, donde conste que la propiedad corresponde al departamento, municipio, distrito o entidad pública y se encuentra libre de gravámenes que impidan ejercer el derecho de disposición. Lo anterior no aplica para los bienes de uso público que conforme a las normas vigentes no son sujetos de registro. Dicho certificado solo debe adjuntarse una única vez. b. Cuando se trate de inmuebles localizados en resguardos indígenas o asociaciones de cabildos o autoridades indígenas tradicionales, el acto colectivo del resguardo suscrito por la autoridad tradicional o cabildo gobernador, donde señale que el predio se encuentra en su jurisdicción. c. Cuando se trate de inmuebles localizados dentro de los territorios colectivos de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, documento de titulación expedido por la entidad competente, el cual debe acompañarse de un aval suscrito por las correspondientes autoridades de las citadas comunidades certificadas por el Ministerio del Interior. En el caso de los municipios y en aplicación del artículo 48 de la Ley 1551 de 2012, bastará con que éstos acrediten la posesión del bien objeto de intervención y su destinación al uso público o a la prestación de un servicio público.	**Cumple**	Se anexa ertificado de la Secretario de Infraestructura Pública de la gobernación de Boyaca, de fecha 23 de octubre de 2025., donde manifiesta que: Que la vía 55BY01 CRUCE RUTA 55 VENTAQUEMADA - TURMEQUE – TIBANA, de acuerdo a la anterior descripción y localización hace parte de la red vial de SEGUNDO ORDEN administrada por el Departamento de Boyacá de acuerdo al Decreto 1895 de 2008 y/o Resoluciones 20213040050205 del 22/10/2021, 20223040076065 del 15/12/2022; 20223040077335 del 22/12/2022, expedidas por el Ministerio de Transporte.
	8	Proyecto registrado en la Metodología General Ajustada (MGA)	**Cumple**	Se presenta el Documento pdf de 27 folios con código identificador 995029, Impreso el 7/11/2025 2:54:16 p. m PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUE - NUEVO COLON ±TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Fecha creación: 21/06/2024 10:02:25 Identificador: 995029 Dificultad en la intercomunicación terrestre de la red vial secundaria de la provincia de Márquez en el departamento de Boyacá Descripción de la situación existente con respecto al problema Magnitud actual del problema ± indicadores de referencia Dificultad en la intercomunicación terrestre de la red vial secundaria de la provincia de Márquez en el departamento de Boyacá En la actualidad es difícil la intercomunicación terrestre de la red vial secundaria y terciaria de la provincia de Márquez en el departamento de Boyacá; específicamente en Los corredores denominados Ventaquemada - Turmequé ± Tibana y Vía Sector Límites Cundinamarca (Hacia Villapinzón) ± Turmequé, debido a que, estas vías se encuentran en mal estado, y en temporada de lluvias se vuelven intransitables generando restricciones en el tránsito vehicular; A pesar del mantenimiento rutinario que se realiza a estas vías, las condiciones de deterioro de la superficie de rodadura son muy grandes, evidenciando estos problemas en la pérdida de capa de rodadura, hundimientos y fallas que se presentan en estos corredores en mención; lo que hacen que las labores de mantenimiento sean insuficientes y que con esto persistan los problemas de circulación vehicular por cada una de estas vías. La persistencia del problema causa que se aumenten los tiempos de desplazamiento, llevando a que se retrasen actividades como el acceso oportuno a servicios médicos por parte de la población, que aumente la inasistencia de estudiantes a escuelas y colegios; igualmente se incrementan los costos de transporte y mantenimiento de vehículos, lo que repercute en dificultades para la comercialización de los productos agrícolas y pecuarios, generando por tanto que se dé una menor oferta y demanda de los productos producidos por cada uno de estos municipios. El departamento de Boyacá tiene 1561.56 km de vias secundarias de los cuales 700.27 se encuentran pavimentadas y 859.88 se encuentran en mal estado o en material de afirmado Analisis de participantes: La Gobernación de Boyacá a través de la secretaria de infraestructura pública del departamento junto con los municipios se encargaron de la formulación de los estudios del proyecto "Mejoramiento de las vías departamentales límite Villapinzon - Turmeque y Turmequé – Nuevo Colon Tibana en el departamento de Boyacá" y su gestión ante entidades nacionales como el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) quien realizara la revisión técnica y viabilización del proyecto y el Departamento administrativo nacional de planeación DNP quien aportara los recursos necesarios para la cofinanciación .para que de esta manera se vean beneficiadas las comunidades de los municipios de Turmequé, Nuevo Colon y Tibana El proyecto comprende la construcción de una estructura de pavimento flexibles en 7 tramos para un total de 15,194 km de vía. A continuación se presenta el resumen de obras por tramos: TRAMO 01 K5+040 K6+720 1680 metros TRAMO 02 K6+800 K9+609 2809 metros
	9	Documento técnico que soporte la información registrada en la MGA y contenga: planteamiento del problema, antecedentes, justificación, análisis de participantes, objetivos (general y específicos), cronograma de actividades y descripción de la alternativa seleccionada.	**Cumple**	Se presenta el documento técnico de la Mga, el cual contiene Documento técnico que soporte la información registrada en la MGA y contenga: planteamiento del problema, antecedentes, justificación, análisis de participantes, objetivos (general y específicos), cronograma de actividades y descripción de la alternativa seleccionada.
	10	Acta de concertación y socialización con la comunidad	**Cumple**	Se presenta la siguiente infromación: ACTA DE SOCIALIZACIÓN Y/O ACTA DE CONCERTACIÓN: en los Municipios de NUEVO COLON, TURMEQUE y TIBANA en el Departamento de BOYACÁ, secretario de cada muniicio deja constancia que se socializó el proyecto. Se anexan listas de asistencia de cada municipio.
	11	Presupuesto General detallado en fisico y magnetico el cual debe contener como minimo la siguiente información: (a) Actividades a ejecutar. (b) Costo Directo. (c) AIU (discriminado) - Detallando los costos correspondientes a los impuestos aplicables al tipo de contrato por la entidad ejecutora. (d) Presupuesto de Interventoría - Detallado, que incluya analisis de factor multiplicador, en el cual se debe tener en cuenta los costos correspondientes a los impuestos aplicables al tipo de contrato. Para proyectos de Estudios y Diseños se debe presentar el presupuesto desagregado con las actividades a realizarse, entregables, equipo de profesionales, asignación salarial, tiempo de dedicación, factor multiplicador, gastos de Administración e impuestos si aplica. El documento debe estar firmado por el profesional responsable.	**Cumple**	**COMPONENTE FINANCIERO:** El valor total del proyecto, valor de obra e interventoría corresponden al valor relacionado en la carta de presentación. Tecnico se presenta el presupuesto de onra e interventoria
	12	Presentar los Análisis de Precios Unitarios de cada uno de los ítems que se relacionan en el presupuesto los cuales deben detallar los cálculos de estimación. Para ítems que contengan suministros y no se cuenten con precios de referencia de la región se debe incluir un estudio de mercado, se sugiere elaborar un cuadro comparativo de por lo menos tres cotizaciones que soporten el valor incluido en el presupuesto por estos conceptos, los cuales deben estar firmados por el responsable.	**Cumple**	Se presentan los APU de cada uno de los imtes del presupuesto
	13	Certificado de la entidad que presenta el proyecto de inversión en la cual conste que los precios unitarios corresponden al promedio de la región y que son los utilizados para el tipo de actividades contempladas en el proyecto y que incluyen el IVA, firmado por el profesional responsable.	**Cumple**	Se presentan la certificación del GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL BOYACÁ CERTIFICA Para mayor constancia se firma en el Departamento de Boyacá, a los Seis (06) días del mes de NOVIEMBRE del año 2025. Cordialmente, CARLOS ANDRÉS AMAYA RODRIGUEZ GOBERNADOR DE BOYACÁ Revisó: José Leonardo Álvarez – secretario de Infraestructura Los precios unitarios corresponden al promedio de la región y son los utilizados para el tipo de actividades contempladas en el proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZÓN - TURMEQUÉ Y TURMEQUÉ - NUEVO COLÓN – TIBANÁ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"; e incluyen el IVA
	14	Para proyectos con cofinanciación cuya ejecución supere la vigencia, se debe presentar el acuerdo u ordenanza de autorización de vigencias futuras de los recursos afectados, cuando aplique.	**No Aplica**	
	15	Certificado expedido por la entidad propuesta como **EJECUTOR** del proyecto, el cual debe indicar los porcentajes de los impuestos, tasas y contribuciones aplicables al proyecto (Contrato de obra, consultoria o interventoria, Dotación, etc), conforme a lo establecido en la Ordenanza, Acuerdo o estatuto vigente en el régimen contractual de la entidad ejecutora. (Anexar soporte en medio magnético).	**Cumple**	"Se presenta certificación de fecha 6 de noviembre de 2025, suscrita por el Subdirector Técnico de Contabilidad del Departamento de Boyacá, donde indican los impuestos aplicables por la Entidad Territorial tanto para obra como para interventoria. Adicionalmente se presenta: Ordenanza 030 de 2017 por el cual se expide el Estatuto de rentas del Departamento de Boyacá.
	16	Memorias de cálculo discriminadas de las cantidades de cada uno de los ítems presupuesto. El documento debe estar firmado por el profesional responsable.	**Cumple**	Se presenta la memoria de cantiddes en formanto .exe de los itesm del presupuesto

Detalle	No.	Documento	Cumple - No Cumple - NA	Observaciones
	17	Especificaciones técnicas de cada uno de los ítems relacionados en el presupuesto. El documento debe estar firmado por el profesional responsable y ser coherente con cada una de las actividades reportadas en el esquema del presupuesto (Materiales - Proceso constructivo o de desarrollo de la actividad- Unidad de pago).	Cumple	Se presenta copia de las especificaciones técnicas de cada uno de los ítems relacionados en el presupuesto de acuerdo con lo presentado en la entidad publica que viabiliza el proyecto
	18	Presentar cronograma con el flujo de fondos del proyecto en medio fisico y magnetico, dicriminando las fuentes de financiación, firmado por el profesional responsable.	Cumple	En el documento (Excel) se relacionan las actividades a desarrollar con sus respectivos valores durante la ejecución del proyecto.
	19	Estudios con los soportes debidamente firmados por profesional competente, y certificado en el cual conste que se cumplen las Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables, así como las normas que establecen mecanismos de integración para las personas con movilidad reducida. Para el caso de los proyectos que contemplen componentes de infraestructura se deben incluir también los diseños, memorias y planos legibles que lo soportan técnica y financieramente, firmados por profesional competente con su respectiva matrícula profesional o acompañados de un certificado del representante legal o jefe de planeación de la entidad territorial o quien haga sus veces, en el que conste que los documentos o planos originales se encuentran debidamente firmados. Para proyectos tipo, los diseños, memorias y planos legibles que soportan técnica y financieramente el proyecto deben ir firmados por el profesional que los implemente, con su respectiva matrícula profesional.	Cumple	Se presentan los EYD del poryecto los cuales se detallan en los requisitos del sector de la presetne ficha
	20	Certificado de sostenibilidad del proyecto de inversión suscrito por el representante legal de la entidad que desarrollará la operación del proyecto, de acuerdo con su competencia, acompañada del estudio avalado por el operador del servicio, cuando aplique, en el cual garantice la operación y funcionamiento de los bienes o servicios entregados con ingresos de naturaleza permanente . Cuando no proceda debe justificar por escrito esta circunstancia.	Cumple	Se presenta el certificad suscrito por el Gobernador de Boyacá dodne indica: "(…) EL SUSCRITO GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CERTIFICA: Que el departamento de Boyacá garantizará la operación y funcionamiento de los bienes o servicios entregados con ingresos de naturaleza permanente para la SOSTENIBILIDAD de los siguientes proyectos de inversión (…) • Mejoramiento de las vías departamentales cruce ruta 6209 (sote), cruce ruta 5502 (la bomba) y paso urbano por el municipio de . MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON, TURMEQUE Y TURMEQUÉ, NUEVO COLON, TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE
		Requisitos generales adicionales para proyectos de inversión de integración y desarrollo fronterizo.		
	21	Los proyectos de inversión de integración y desarrollo fronterizo, además de los requisitos generales aplicables, deben presentar constancia del trámite de consulta previa expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la pertinencia del proyecto, de conformidad con la Ley 191 de 1995.	No Aplica	
		Requisitos generales adicionales para proyectos de inversión localizados en resguardos indígenas o territorios colectivos.		
	22	Certificado suscrito por el secretario de planeación en el cual conste que el plan de vida o plan de etnodesarrollo está en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y con el plan de desarrollo de las entidades territoriales.	No Aplica	
	23	Certificado suscrito por la autoridad de la comunidad étnica debidamente registrada ante el Ministerio del Interior en el que conste que el proyecto presentado es de su iniciativa y que está acorde con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida.	No Aplica	
	24	**Certificacion expedida por el Secretario de Planeacion donde indique SI el** proyecto interviene o genera espacio público localizado en sectores urbanos de interés cultural del ámbito nacional. **En caso de intervencion se debe anexar copia** del acto administrativo de autorización para la intervención expedida por el Ministerio de Cultura, en el marco de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 1185 de 2008. **Caso contrario certificar NEGATIVAMENTE**	No Aplica	
	25	**Certificacion expedida por el Secretario de Planeación o funcionario competente en la entidad territorial, en la cual se certifique que el proyecto no se localiza en un área protegida del ámbito nacional o regional de acuerdo con la ley 165 de 1994.** En el evento que el proyecto se encuentre en área protegida del ámbito nacional o regional se debe anexar certificacion expedida por la autoridad competente definida en el Decreto 1076 de 2015 así: a. Parques Nacionales Naturales: para áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y para los Distritos Nacionales de Manejo Integrado. b. Corporación autónoma regional o de desarrollo sostenible, de acuerdo con las competencias territoriales: para las Reservas Forestales Protectoras Nacionales o Regionales; para los Parques Naturales Regionales, para los Distritos Regionales de Manejo Integrado; para las Áreas de recreación; y para los Distritos de Conservación de Suelos.	Cumple	Se presenta la certificación del Secretario de Planeación Departamental de la Gobernación de Boyacá que indica: CERTIFICACIÓN El suscrito Secretario de Planeación Departamental de la Gobernación de Boyacá, en ejercicio de las funciones que le son propias, CERTIFICA: Que, de acuerdo con la información disponible en los instrumentos de ordenamiento territorial y con la verificación realizada frente a las áreas protegidas definidas por la legislación ambiental vigente, los siguientes proyectos NO se localiza en un área protegida del ámbito nacional o regional, conforme a lo establecido en la Ley 165 de 1994 y demás normas que regulan la materia (…) • Mejoramiento de Las Vías Departamentales Cruce Ruta 6209 (Sote), Cruce Ruta 5502 (La Bomba) Y Paso Urbano Por El Municipio de Cómbita en el Departamento de Boyacá (…) Se expide la presente certificación a solicitud de parte interesada, para los fines pertinentes. En constancia se firma en Tunja, a los 6 días del mes de noviembre de 2025. (…)'
Requisitos para la firma del Convenio	26	Acto administrativo de nombramiento, actas de posesión del representante legal de la respectiva entidad.	Cumple	Se incluye acta de posecion de fecha 1 de enero de 2024 y certificado electroral E-28- emitido Organismo electora del fecha 17 de noviembre de 2023.
	27	Actos administrativos de creación y funcionamiento para la entidad que así lo requiera	No Aplica	
	28	Certificado de existencia y representación legal para las personas jurídicas de derecho privado	No Aplica	Departamento de Boyacá, es una entidad de carácter público.
	29	Copia de la cedula del representante legal de la entidad respectiva	Cumple	Se presenta la cedulá de ciudadania JORGE MARIO IBAÑEZ ARANGO
	30	Antecedentes disciplinarios de la procuraduría general de la nación del representante legal	Cumple	Se aportó certificado de fecha 20 de octubre de 2025 de la Cédula de Ciudadanía Nro. 7181256 que corresponde al ciudadano **JORGE MARIO IBAÑEZ ARANGO -NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES**
	31	Antecedentes fiscales de la contraloría general de la nación del representante legal	Cumple	Se aportó certificado de fecha 20 de octubre de 2025 de la Cédula de Ciudadanía Nro. 7181256 que corresponde al ciudadano JORGE MARIO IBAÑEZ ARANGO -NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL
	32	RUT del ente Oferente (Gobernación, Alcaldía, Organización).	Cumple	Se aportó el Registro Unico Tributario que corresponde al Nit nro. 8 9 1 8 0 0 4 9 8 - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Documento del 14 de noviembre de 2025
	33	Certificado Cámara de Comercio del lugar de la Sede Principal, con un mes máximo de expedición. (Aplica para operadores).	No Aplica	Departamento de Boyacá, es una entidad de carácter público.
	34	Autorización legal para suscribir el convenio (Ordenanza, Acuerdo o Documento de facultades según sea el caso).	Cumple	Se aporta decreto 093 del 1 de febrero de 2019 donde se delegan funciones al Secretario de Despacho Grdo 020 para celebrar contratos.
	35	Certificación de no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés, prohibición e impedimentos de carácter legal	Cumple	Se aportó documento suscrito por el Secrretario de Contratación del Departamento de Boyacá, donde manifiesta que "Ni el EL DEPARTAMENTO DE BOYACA ni JORGE MARIO IBAÑEZ ARANGO, ni yo nos hallamos incursos en causal alguna de Conflicto de Interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la ley. 2. Ni EL DEPARTAMENTO DE BOYACA ni JORGE MARIO IBAÑEZ ARANGO, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos hallamos incursos en ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en la ley.
	36	Documento de idoneidad e historia de la empresa expedido por el Representante Legal del ente privado.	No Aplica	Departamento de Boyacá, es una entidad de carácter público.
	37	Documento de idoneidad e historia de la empresa expedido por el Representante Legal del ente privado.	No Aplica	Departamento de Boyacá, es una entidad de carácter público.
Requisitos generales para proyectos de inversión que incluyan como uno de sus componentes la compra de predios		**Los proyectos de inversión que tengan que incluyan como uno de sus componentes la compra de predios además de los requisitos generales aplicables, deben presentar los siguientes:**		
	38	Plano de localización del predio	No Aplica	
	39	Estudio de alternativas de los predios, en el cual se identifique y sustente técnica, jurídica y financieramente la selección de los predios a comprar.	No Aplica	
	40	Certificado de funcionario competente de la entidad territorial en la cual se va a ejecutar el proyecto, de conformidad con lo señalado en la normativa vigente indicando usos, tratamiento, índices de ocupación y construcción aplicable a los predios seleccionados.	No Aplica	
	41	Avalúo comercial de los predios seleccionados elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) o por persona natural o jurídica competente.	No Aplica	
	42	Estudio de títulos donde se demuestre que el predio está libre de gravámenes e impedimentos para llevar a cabo la compra.	No Aplica	
	43	Los proyectos de inversión que incluyan como uno de sus componentes la compra de predios deben ser formulados integralmente hasta su construcción o materialización. En consecuencia, no se podrán financiar proyectos cuyo único componente sea la compra de predios.	No Aplica	

Detalle	No.	Documento	Cumple - No Cumple - NA	Observaciones
Requisitos generales adicionales para proyectos que incluyan como uno de sus componentes la adquisición de maquinaria		**Los proyectos de inversión que tengan por objeto la culminación de un proyecto de inversión ya iniciado Y/O en ejecución además de los requisitos generales aplicables, deben presentar los siguientes:**		
	44	Certificado suscrito por el representante legal de la entidad que presenta el proyecto, en el cual se defina: a.La entidad Titular de la maquinaria b.La entidad responsable de la administración, cuidado y custodia. En caso de ser una entidad diferente a la entidad titular se debe adjuntar aval por dicha entidad	**No Aplica**	
	45	Plan de acción de usa de la maquinaria consistente en el sector de clasificación del proyecto y delimitado al horizonte de ejecución del mismo. Este documento debe señalar las actividades que se realizaran, el lugar y la unidad de medida.	**No Aplica**	
Requisitos generales para proyectos que tengan por objeto la culminación de proyectos ya iniciados y/o en ejecución.		**Los proyectos de inversión que tengan por objeto la culminación de un proyecto de inversión ya iniciado Y/O en ejecución además de los requisitos generales aplicables, deben presentar los siguientes:**		
	46	Documento suscrito por el representante legal de la entidad territorial que contenga: a. Justificación de los recursos adicionales mediante cuadro comparativo que dé cuenta de los componentes o actividades financiados inicialmente frente a los que se pretendan financiar con recursos del DNP y su respectiva explicación. b. Estado actual de la contratación (pólizas, suspensiones, modificaciones, reanudaciones).	**No Aplica**	
	47	Copia del último informe de supervisión o de interventoría según corresponda y soporte fotográfico.	**No Aplica**	
	48	Documento técnico suscrito por el supervisor o interventor, según corresponda, en el cual se detalle el estado actual de ejecución física y financiera del proyecto inicial.	**No Aplica**	
	49	Copia del informe de acciones judiciales o investigaciones de los entes de control frente al proyecto de inversión, siempre que la entidad haya sido puesta en conocimiento de las mismas, o certificado suscrito por el representante legal de la entidad territorial en el que se indique que no ha sido notificado de ninguna acción o investigación	**No Aplica**	
Requisitos generales para proyectos bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP)		**Los proyectos de inversión formulados bajo el esquema de APP, además de los requisitos generales aplicables, deben presentar los siguientes:**		
	50	Copia de la aprobación de la valoración de obligaciones contingentes expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	**No Aplica**	
	51	Concepto favorable sobre la utilización del mecanismo de APP expedida por el Departamento Nacional de Planeación, cuando se trate de proyectos cofinanciados por la Nación, o por la secretaría de planeación de la entidad territorial respectiva, tratándose de proyectos financiados por éstas.	**No Aplica**	
	52	Copia de la aprobación de las cláusulas contractuales y financieras cuando se trate de proyectos cofinanciados por la Nación, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	**No Aplica**	
Requisitos generales para proyectos que tengan por objeto estudios y Diseños		**Los proyectos de inversión que tengan por objeto Estudios y Diseño ademas de los requisitos para la firma del convenio, deben presentar los siguientes documentos:**		
	53	Se debe presentar el estudio de factibilidad del proyecto con la alternativa seleccionada para desarrollar los estudios. Los proyectos viales que no cuenten con el correspondiente estudio de factibilidad, debe presentar el documento en donde se soporte la justificación técnica, jurídica, socioeconómica y ambiental, que incluya la alternativa seleccionada.	**No Aplica**	
	54	Se debe presentar el documento con los aspectos técnicos o términos de referencia para la elaboración del estudio y diseño, que incluyan como mínimo: 1. Antecedentes y justificación del proyecto. 2. Objetivos, alcance y actividades del proyecto. 3. Productos esperados, con los profesionales y perfiles que se requieren. 4. Indicadores y cronograma.	**No Aplica**	
	55	Carta de compromiso suscrita por el representante legal de la entidad proponente, en donde se compromete a gestionar los recursos para la realización del resultado de los estudios.	**No Aplica**	
Requisitos para proyectos que tengan como cofinanciador recursos por el SGR		**Los proyectos de inversión donde una de sus fuentes de cofinanciación sean recursos del SGR además de los requisitos generales se deben presentar los siguientes documentos:**		
	56	Copia del proyecto que se encuentra cargado en la plataforma SUIFP SGR y con el cual se aprobó en el correspondiente OCAD.	**No Aplica**	
	57	Si la fecha del acuerdo de aprobación del proyecto en el OCAD supera los tres meses de expedido se debe presentar el estado de los requerimientos establecidos en el art. 2.2.4.1.1.6.1 Etapa de ejecución del decreto 1082 de 2015 y los estipulado ene l acuerdo 038 de 2016, Titulo IV, disposiciones Finales, Articulo 18- Liberación de recursos	**No Aplica**	

La verificación realizada al presente proyecto se emite con base en la documentación presentada por el solicitante, la cual se presume veraz y será este quien deberá responder ante los organismos de control del Estado por cualquier inexactitud o falsedad en la información que pueda ocasionar un detrimento patrimonial de las fuentes de financiación o un perjuicio a la comunidad.

LISTA DE VALIDACIÓN DE REQUISITOS ESPECIFICOS PROYECTOS DE INVERSIÓN TRANSPORTE

1. Información general

Fecha: 7/11/2025 Departamento: Boyaca Municipio: Villapinzón - Turmequé - Nuevo Colón —Tibaná

Contrato Plan/Paz/Pacto Territorial Boyaca Número del Consejo Directivo donde se aprobó el Plan de Acción No. 1

Revisado por:

JURÍDICO Marcela Ramírez / Mario Paternina Castillo Fecha del Consejo Directivo de Plan de Acción 7 de noviembre de 2025

TÉCNICO William Monroy

FINANCIERO Cesar Augusto Ramirez- Omaira Carolina Melo Plazo de ejecución del proyecto (meses) 13 meses

Nombre del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON -TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

Valor total: $ 70.031.648.339,00

Aporte Sector

Aporte DNP $ 70.031.648.339,00

Aporte Territorio $ -

Eje Estratégico del Contrato Plan al cual de asocia el proyecto: Transporte

Detalle	No.	Documento	Cumple - No Cumple - NA	Observaciones
		I. Proyectos de construcción, mantenimiento, adecuación, mejoramiento o rehabilitación de la infraestructura de transporte por carretera, fluvial, aeroportuaria, férrea, logística especializada (ILE), urbana, o por cable.		
	1	Los estudios y diseños técnicos necesarios de acuerdo con los artículos 7 y 12 de la Ley 1682 de 2013, así como lo siguiente, cuando aplique: a. Localización exacta de la obra. b. Estudios hidrológico e hidráulico. c. Estudios geológico y geotécnico. d. Estudios de suelos. e. Diseño de estructuras. f. Planos de construcción generales y de detalle, como planta, perfiles, cortes, estructurales y obras de drenaje. g. Proceso constructivo del proyecto. h. Estudios ambientales de conformidad con la Ley 1682 de 2013 (literal c del artículo 7 y artículo 39) y el costeo para su implementación. i. Plan de manejo de tránsito y el costeo para su implementación.	Cumple	Se presenta el diseño estructural de boxculvert, documento pdf de 223 folios elaborado por Sebastián Felipe Patiño Perez, y se presenta 2 planos cosntructivos. Se presenta el estudio y diseño estructural del muro de contención No.1, documento pdf de 117 folios, elaborado por el ing Diego Paez Moreno y entrega 9 planos constructivos. Se presenta el estudio y diseño estructural del muro de contención No.2, documento pdf de 202 folios, elaborado por el ing Diego Paez Moreno y entrega 9 planos constructivos. Se presenta el memorial de responsabilidad
		II. Proyectos de construcción, mantenimiento, adecuación, mejoramiento o rehabilitación de infraestructura vial, además de los requisitos señalados en el numeral I, los siguientes, cuando aplique:		
	1	Certificado en donde conste que la intervención en la vía es competencia de la entidad. Si la intervención en la vía es competencia de otra entidad, documento que avale la intervención a realizar.	Cumple	Se presenta la certificación SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ donde indica: "(...) Que el tramo de vía que se pretende intervenir con el proyecto de inversión "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON -TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, es competencia del Departamento de Boyacá. Para mayor constancia se firma el presente certificado en Tunja, a los cinco (5) días del mes de Noviembre del año 2025 (...)"
	2	Levantamiento topográfico.	Cumple	Se remite el levantamiento topográfico del proyecto en formato de 24 folios, suscrito por Topografo Darwin Yesid Mariño Fernandez L.P No. 01-21742 CPNT y se anexan los documentos
	3	Diseño geométrico para vías nuevas o proyectos que cambien alineamiento de la vía	Cumple	Se presenta el informe de diseño geométrico documento pdf de 39 folios y se entregan 7 planos de panta perfil debidamente firmados
	4	Estudio de tránsito.	Cumple	Se presenta el Plan de Majeo de Tránsito, documento pdf de 26 folios y se presenta su presupuesto en formato excel Se presenta el estudio de tránsito documento pdf de 35 folios
	5	Diseño de estructura del pavimento	Cumple	Se presenta el informe de diseño de pavimentos, documentos pdf de 50 folios
	6	Cuando no se intervengan estructuras existentes, los chequeos técnicos pertinentes que garanticen la estabilidad y funcionalidad durante la vida útil proyectada, presentando la revisión de la capacidad hidráulica, estructural o funcional de las estructuras.	No Aplica	En el proyecto no se van ha intervenir estructuras existentes
	7	Estudios y diseños definitivos de los puntos críticos incluidos dentro del tramo del proyecto a presentar, puntos críticos del orden geológico, geotécnico, de suelos, hidráulico, drenaje, entre otros.	Cumple	"(...) Se presenta la certificación suscrita por el secretario de infraestructura del Departamento donde: EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA CERTIFICA Que el tramo del proyecto de inversión denominado MEJORAMIENTO DE LAS "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON -TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" no contempla puntos críticos de origen geológico, geotécnico, de suelos, hidráulico drenaje entre otros. Dado en Tunja a los seis (6) días del mes de noviembre de 2025 (...)"
	8	Estudios y diseños definitivos de estructuras especiales como puentes y túneles	No Aplica	En el proyecto no se van ejecutar estructuras especiales
	9	Para proyectos que incluyan vías urbanas o centros poblados, se debe identificar y presentar en concordancia con el artículo 7 de la Ley 1682 de 2013, cuando aplique, certificación en la que se especifique: a. Las redes y activos de servicios públicos, los activos e infraestructura de la industria del petróleo y la infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones. b. Los inmuebles sobre los cuales recaigan medidas de protección al patrimonio de la población desplazada o restitución de tierras. c. Títulos mineros en procesos de adjudicación, otorgados, existentes o en explotación	No Aplica	
	10	Para proyectos en vías urbanas, certificación de que las vías no están siendo intervenidas con otro tipo de obras. En caso contrario, especificar que las características de las obras son concordantes con el proyecto de inversión y con qué fuentes de recursos están siendo ejecutadas	No Aplica	
	11	Certificado de que la vía a intervenir cuenta con redes de servicios públicos en buen estado y que no se planean intervenir	No Aplica	

cos Transporte

Detalle	No.	Documento	Cumple - No Cumple - NA	Observaciones
Requisitos Especifi	12	Esquema de localización y certificación de la ubicación de las fuentes de materiales que van a realizar y garanticen el suministro con las distancias de acarreo.	Cumple	
	13	Para vías primarias, certificado en el que conste que la vía está acorde con el Plan de Adaptación al Cambio Climático de la Red Vial Primaria de Colombia.	No Aplica	el alcance del poryecto es sobre una vía secundaria
	III. Proyectos de infraestructura de transporte marítimo, fluvial y costero como mantenimiento de muelles y terminales; encauzamiento y mantenimiento de la red fluvial navegable; protección y defensa sobre la infraestructura de transporte; construcción de muelles y malecones, además de los requisitos señalados en el numeral I los siguientes, cuando aplique:			
	1	Estudios geomorfológicos e hidráulicos fluviales	No Aplica	
	2	Estudio de demanda para proyectos de infraestructura portuaria y de navegabilidad	No Aplica	
	3	Análisis de riesgo hidráulico de las obras a construir.	No Aplica	
	4	Para proyectos en el río Magdalena, certificado expedido por CORMAGDALENA en el cual conste que el proyecto fluvial en el río Magdalena está acorde con su plan de acción.	No Aplica	
	IV. Proyectos de infraestructura aeroportuaria que comprendan construcción, mantenimiento, adecuación, mejoramiento, rehabilitación de pistas, plataformas terminales para carga y pasajeros, cerramientos, calles de rodaje, hangares, plataformas, torres de control, cuarteles de bomberos, zonas de seguridad y demás infraestructura complementaria, según lo especificado en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, Además de los requisitos señalados en el numeral I , los siguientes, cuando aplique:			
	1	Permiso de construcción del aeródromo que se va a intervenir, expedido por la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil.	No Aplica	
	2	Permiso de operación del aeródromo que se va a intervenir, expedido por la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil.	No Aplica	
	V. Proyectos de infraestructura férrea y puesta en marcha de proyectos férreos de carga y pasajeros, además de los requisitos señalados en el numeral I, los siguientes, cuando aplique			
	1	Levantamiento topográfico.	No Aplica	
	2	Estudio del diseño geométrico del alineamiento que contenga: a. Trazado de línea en planta y perfil. b. Secciones transversales. c. Diagrama de peraltes. d. Incluir desvíos, apartaderos y patios de maniobras.	No Aplica	
	3	Diseños de la infraestructura y la superestructura de vía.	No Aplica	
	4	Diseño de obras especiales como puentes, túneles, tratamiento de taludes.	No Aplica	
	5	Señalización de vía	No Aplica	
	6	Estudio de seguridad en la vía, que incluya pasos a nivel.	No Aplica	
	7	Estudio de equipos a utilizar como material rodante y equipos de vía	No Aplica	
	VI. Proyectos de infraestructura logística especializada (ILE), según el artículo 87 de la Ley 1450 del 2011, además de los requisitos señalados en el numeral I, los siguientes, cuando aplique			
	1	Estudios de localización, diseño y factibilidad de la plataforma logística, que incluya la determinación y caracterización de la oferta y demanda actual y futura de servicios logísticos en el área de influencia, y la conceptualización de una solución específica de plataforma logística.	No Aplica	
	2	Estructuración técnica, legal y financiera de la plataforma logística que incluya el modelo de gestión y la viabilidad de las unidades de negocio del proyecto.	No Aplica	
	VII. Proyectos de transporte urbano, además de los requisitos señalados en el numeral I, los siguientes, cuando aplique			
	1	Estudio de tránsito	No Aplica	
	2	Certificado de que la ubicación del proyecto no está siendo intervenida, en caso contrario debe especificar qué tipo de obras se llevan a cabo y con qué fuentes de recursos están siendo ejecutadas.	No Aplica	
	3	Cuando no se intervengan estructuras existentes, los chequeos técnicos pertinentes que garanticen la estabilidad y funcionalidad durante la vida útil proyectada.	No Aplica	
	VIII. Proyectos de construcción de infraestructura por cable, además de los requisitos señalados en el numeral I, los siguientes, cuando aplique			
	1	Zona de Influencia	No Aplica	
	2	Análisis de la demanda de viajeros y proyección a 15 años.	No Aplica	
	3	Sistema tecnológico y descripción del mismo.	No Aplica	
	4	Costos de operación.	No Aplica	
	5	Análisis de seguridad de equipos y protección de usuarios.	No Aplica	
	IX. Proyectos de transporte urbano que pertenezcan a la categoría de Sistemas Estratégicos de Transporte (SETP) y Sistemas de Transporte Masivo (SITM), además de los requisitos señalados en el numeral I y II , los siguientes, cuando aplique			
	1	Para SITM, documento en el que se señale los números de los documentos CONPES en los que el proyecto fue declarado de importancia estratégica para el país.	No Aplica	
	2	Para proyectos de SETP, el decreto municipal o distrital de adopción del Sistema.	No Aplica	
	3	Certificado de la constitución de un ente gestor, que será el titular del SETP o el SITM.	No Aplica	
	X. Proyectos de construcción, mantenimiento, adecuación, mejoramiento de terminales de transporte., además de los requisitos señalados en el numeral I, los siguientes, cuando aplique			
	1	Certificado expedido por la entidad territorial donde se va a ejecutar el proyecto en el cual conste que el mismo cumple con las condiciones y requisitos establecidos en los artículos 2.2.1.4.10.1 y subsiguientes del Decreto 1079 de 2015.	No Aplica	
	2	Comunicación del Ministerio de Transporte en la cual se señale que las condiciones técnicas de la infraestructura del proyecto cumplen con los estándares mínimos establecidos para terminales de transporte.	No Aplica	
	3	Comunicación del municipio o distrito en la cual acepte la implantación del proyecto en su territorio.	No Aplica	
	XI. Proyectos destinados a la prevención de accidentes y atención en seguridad vial, además de los requisitos señalados en el numeral I , los siguientes, cuando aplique			
	1	Certificado del representante legal de la entidad territorial en la que se va a ejecutar el proyecto, en el cual conste que el proyecto está en concordancia con el Plan Nacional de Seguridad Vial.	No Aplica	

Tunja Boyacá – NOVIEMBRE 06 del 2025

Doctora:
NATALIA IRENE MOLINA POSSO
Directora
Departamento Nacional de Planeación- DNP
Cl. 26 # 13 – 19 Bogotá D.C

ASUNTO: Presentación proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES LÍMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON – TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA".

Cordial saludo,

De manera atenta me permito presentar el proyecto denominado ""MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON -TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"". El cual ha sido formulado en concordancia con el Plan de Desarrollo Departamental NUESTRO GRAN PLAN ES BOYACÁ 2024-2027en el eje estratégico: INFRAESTRUCTURA VIAL. Meta de producto Vía secundaria mejorada y se encuentra priorizado en el marco del Pacto Territorial Raíz y Futuro del departamento de Boyacá, con las siguientes consideraciones: **Nombre del contrato Plan/Paz/Pacto Territorial:** Pacto Raíz y Futuro Departamento de Boyacá.

Fecha de suscripción: 06 de noviembre de 2025.

Fecha de finalización: 31 de julio de 2026.

Ejes estratégicos relacionados con el Contrato Plan/Pacto Territorial: Línea temática 1. Conectividad Segura para un Boyacá grande.

Componente: Infraestructura red vial.

Acta de Consejo Directivo donde se prioriza el proyecto: Nº 2 del 07 de Noviembre de 2025.

Nombre del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON -TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

Alcance del Proyecto: Dentro del marco del proyecto de mejoramiento de las vías departamentales límite Villa pinzón – Turmequé y Turmequé – Nuevo Colón –

Tibaná, se ejecutarán diversas actividades orientadas a garantizar la estabilidad, durabilidad y funcionalidad del corredor vial. Las obras contemplan la excavación de cortes, canales y préstamos en material común, así como el cuneteo, perfilado y compactación de la banca existente como trabajos previos a la pavimentación. Se realizarán rellenos con material seleccionado proveniente de excavaciones, instalación de geotextiles para la separación de capas y control de filtraciones, y la colocación de materiales para afirmado, subbase y base granular, con sus respectivos procesos de extendida y compactación conforme a las especificaciones del INVIAS.

- Asimismo, se llevará a cabo la imprimación con emulsión asfáltica, seguida de la instalación de carpeta asfáltica en caliente tipo MDC-19, garantizando una superficie de rodadura uniforme y resistente. El proyecto incluye además la construcción de obras de drenaje, tales como tuberías PVC y de concreto reforzado, filtros, cunetas revestidas, canales de coronación y estructuras hidráulicas en concreto de distintas resistencias (14, 21 y 28 MPa). También se consideran actividades de demolición de estructuras existentes, conformación de elementos estructurales en concreto, y colocación de acero de refuerzo según diseño estructural.

- Finalmente, se ejecutarán las labores de señalización y seguridad vial, incluyendo la aplicación de pintura acrílica con microesferas, la instalación de señales preventivas, reglamentarias e informativas, así como tachas reflectivas, delineadores de curva, defensas viales, postes de referencia y marcas viales, conforme a la normativa vigente del INVIAS. Estas actividades en conjunto permitirán mejorar significativamente las condiciones de transitabilidad, seguridad y funcionalidad del corredor, contribuyendo al fortalecimiento de la conectividad regional y al desarrollo económico del departamento de Boyacá.

Población Beneficiada: El proyecto afecta directamente a 59.102 habitantes de los municipios de Turmequé, Nuevo Colon, Tibana, Ventaquemada del Departamento de Boyacá y Villapinzon del Departamento de Cundinamarca. Según datos tomados del DANE - Censo 2018 y Proyecciones del DANE al año 2024.A continuación, se presentan los datos poblacionales de los municipios influencia del proyecto, por grupos de edades.

Tabla 2: Población Afectada

GRUPOS DE EDAD	POBLACION
0-14 años	14.027
15-19 años	4.513
20-59 años	29.608
60 en adelante	10.954
Total	59.102

Fuente: DANE CENSO 2018 PROYECCIONES 2024

Valor total del proyecto: SETENTA MIL TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON TRES CENTAVOS. ($70, 031, 648,339.03) MCTE.

Valor Obra	$ 65,450,138,634.66
Valor interventoría	$ 4,581,509,704.43

Fuentes de financiación:

Aportante	**Fuente de financiación**	**Valor solicitado**
Nación	Nación	70, 031, 648,339.03

Plazo de ejecución del proyecto: 9 meses que corresponde a la fase precontractual, ejecución de la obra y cierre, que se discriminan de la siguiente manera:

• Fase de Selección: La fase precontractual es el período previo a la firma de un contrato, en el que las partes interesadas negocian, intercambian información y evalúan las condiciones del posible acuerdo, para todo lo anterior se requiere un término de 3 meses.

• Fase de ejecución: conforme la documentación anexa a la presente solicitud, se desarrollará en el término de 5 meses.

• Fase de cierre (entrega del informe final): Atendiendo que en este punto se deben suscribir las actas de recibo final, elaboración de informe de término, desembolso final de recursos al contratista y el inicio del proceso de liquidación del Contrato, para todo lo anterior se requiere un término de 1 meses.

• **Entidad designada como ejecutora del proyecto**: Gobernación de Boyacá.

• **Entidad designada para la contratación de la interventoría**: Gobernación de Boyacá.

• **Justificación de la necesidad del proyecto:**

Al realizar el mejoramiento de estos tramos viales en el Departamento, se podrá desarrollar planes de Inversión Pública y Privada, coadyuvando a promover el crecimiento económico, elevar las condiciones de vida y reducir la pobreza de estas regiones; al igual bajar casi a cero los índices de accidentalidad en cada uno de estos corredores viales.

Como resultado de estas acciones la comunidad tendrá más oportunidades al construirse la obra, con la comercialización de los productos, aumentarán los ingresos familiares, disminuirán los costos de los insumos, aumentará el turismo y se disminuirá los costos de transporte.

Por este caso la gobernación de Boyacá a través de la secretaria de infraestructura, decide iniciar el proceso de formulación del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON -TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", debido al deterioro de la capa de rodadura lo que genera riesgos para los habitantes de cada uno de estos municipios.

Se anexa link que contiene toda la documentación que soporta la formulación del proyecto en mención:

https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/edgar_nino_boyaca_gov_co/Ei7E7o4ZQltLkzA11J7oT5oBABR42a2ABqN1HWVgz0-7Qg?e=MIRAIC

Cordialmente,

CARLOS ANDRES AMAYA RODRIGUEZ
Gobernador de Boyacá

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 07/11/2025 07:49:10 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **7181256** y Nombre: **JORGE MARIO IBAÑEZ ARANGO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **126244072** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 07:48:21 PM horas del 07/11/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **7181256**
Apellidos y Nombres: **IBAÑEZ ARANGO JORGE MARIO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 284020045

PIB
19:50:44

Bogotá DC, 07 de noviembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JORGE MARIO IBAÑEZ ARANGO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 7181256:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 07 de noviembre de 2025, a las 19:50:50, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	7181256
Código de Verificación	7181256251107195050

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 07 de noviembre de 2025, a las 19:56:08, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	8918004981
Código de Verificación	8918004981251107195608

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 284020157

PIB
19:55:39

Bogotá DC, 07 de noviembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona DEPARTAMENTO DE BOYACA identificado(a) con NIT número 8918004981:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.
