INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO PRINCIPAL

GENERALIDADES DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
NÚMERO DE CONTRATO	223 DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS AISLADOS, EN ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE DEPARTAMENTO DE ARAUCA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Unión Temporal SRH 2025
NIT	901. 988.573-7
REPRESENTANTE LEGAL	HUMBERTO CASTAÑO CASTAÑEDA.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	86.008.000 DE GRANADA
FECHA DE INICIO	22 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	21 DE FEBRERO DE 2026

SEGUIMIENTO PÓLIZAS

Póliza expedida por **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**, No. **625-47-994000003528, ANEXO 0**, expedidas el 19 de septiembre de 2025, que garantiza el **CUMPLIMIENTO – PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND y CALIDAD DEL BIEN**, y para aprobación de las garantías, según coberturas que amparan el Contrato de Suministro No. **223** de **2025**, cuyo objeto es la: "**IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS AISLADOS, EN ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE DEPARTAMENTO DE ARAUCA**".

GARANTÍAS	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO	17/09/2025	27/05/2026	$ 61,511,320.75
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	17/09/2025	27/11/2028	$ 61,511,320.75
CALIDAD DEL BIEN	17/09/2025	27/05/2026	$ 61,511,320.75
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	17/09/2025	20/11/2025	$ 284,700,000.00

FORMA DE PAGO

La Administración Municipal de Cravo Norte pagará el valor del contrato, previa presentación de la Orden de Pago debidamente soportada, así:

Para el componente de instalaciones eléctricas internas, Instalaciones Fotovoltaicas, se realizará el pago contra entrega de los equipos y elementos listos en el Municipio de Cravo Norte, hasta del cincuenta (50%) por ciento del valor por este

INFORME DE ACTIVIDADES PARA ACTA PARCIAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 216 DE 2025

CONTRATISTA: SERVICIOS EMPRESARIALES GROUPS SAS

R/L HOLMAN ARVEY RAMIREZ RANGEL

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS AISLADOS, EN ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

SUPERVISOR: JULIO CESAR DELGADO ALARCÓN
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS DE CRAVO NORTE

CRAVO NORTE/ 26 DE DICIEMBRE DE 2025

Dirección: cr 8 # 7-38 Cravo Norte
Correo: gerente.groupsas@gmail.com
Nit: 901497045-2

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTO:

EJECUCION FINANCIERA	
ITEM	**PORCENTAJE ACUMULADO**
VALOR EJECUTADO	41,91%
SALDO POR EJECUTAR	58,09%

Conclusiones

- De acuerdo con la ejecución del contrato de Suministro No. 223 de 2025 con Objeto "IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS AISLADOS, EN ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE DEPARTAMENTO DE ARAUCA", La firma UNIÓN TEMPORAL SRH 2025, identificada con Nit No. 901.988.573-7, representado legal mente por el señor HUMBERTO CASTAÑO CASTAÑEDA, identificado con cedula de ciudadanía No. 86.008.000, cumplió con los requerimientos establecidos en la forma de pago, siguiendo las indicaciones dadas por la interventoría, realizando la correspondiente entrada a Almacen.

Atentamente,

HOLMAN ARVEY RAMIREZ RANGEL
C.C. 17.595.898
Representante Legal
Correo: gerente.groupsas@gmail.com

LA INTERVENTORÍA EXTERNA SERVICIOS EMPRESARILAES GROUP S.A.S

CERTIFICA:

Que, la firma contratista UNIÓN TEMPORAL SRH 2025, identificada con Nit No. 901.988.573-7, representado legal mente por el señor HUMBERTO CASTAÑO CASTAÑEDA, identificado con cedula de ciudadanía No. 86.008.000, para el contrato de Suministro No. 223 de 2025 con Objeto "IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS AISLADOS, EN ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE DEPARTAMENTO DE ARAUCA", cumplió con sus obligaciones a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante la vigencia de ejecución hasta el Acta Parcial 1.

Se expide en Cravo Norte-Arauca, al mes de diciembre de 2025.

Atentamente,

HOLMAN ARVEY RAMIREZ RANGEL
C.C. 17.595.898
Representante Legal
Correo: gerente.groupsas@gmail.com

LA INTERVENTORÍA EXTERNA SERVICIOS EMPRESARILAES GROUP S.A.S

CERTIFICA:

Que, la firma contratista UNIÓN TEMPORAL SRH 2025, identificada con Nit No. 901.988.573-7, representado legal mente por el señor HUMBERTO CASTAÑO CASTAÑEDA, identificado con cedula de ciudadanía No. 86.008.000, cumplió con las condiciones establecidas dentro de la forma de pago en el contrato de Suministro No. 223 de 2025 con Objeto "IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS AISLADOS, EN ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE DEPARTAMENTO DE ARAUCA"; razón por la cual se aprueba y da visto bueno al pago del Acta Parcial 1.

Se expide en Cravo Norte-Arauca, al mes de diciembre de 2025.

Atentamente,

HOLMAN ARVEY RAMIREZ RANGEL
C.C. 17.595.898
Representante Legal
Correo: gerente.groupsas@gmail.com

SEGUIMIENTO TÉCNICO PROYECTO:

Teniendo en cuenta la forma de pago establecida en los documentos del proceso, esta interventoría mediante entrada a almacén da visto bueno y aprueba el pago de la presente acta parcial, toda vez que esta actividad queda soportada mediante **COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN No. 12 000014**; a continuación, se describe los elementos y la cuantía aprobada mediante el acta parcial.

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS FACTURADOS					
ITEM	**DESCRICIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
3,1	50 % De: Panel Solar 450W 24V Monocristalino PERC - 41,52 Vmp, Suministro, transporte e instalación	Und.	46	856.757,50	39.410.845
3,2	50 % De: Batería De Litio 200Ah 24V (descarga en 20 h) - 12 V, Suministro e instalación	Und.	23	4.484.296,50	103.138.820
3,3	50 % De: Controlador de carga, control MPPT, 40A, tensión de salida 24V, Suministro, transporte e instalación	Und.	23	735.280,00	16.911.440
3,4	50 % De: Inversor 24 VDC / 120 VAC, 60 Hz, onda senoidal pura 1 KW, Suministro, transporte e instalación	Und.	23	951.886,50	21.893.390
3,5	50 % De: Estructura de soporte para 2 módulos a nivel 3m, Suministro e instalación	Und.	23	1.079.023,00	24.817.529
3,6	50 % De: Gabinete de 90X70X30 cm para la instalación de inversor, controlador, baterías y protecciones. Suministro, transporte e instalación.	Und.	23	1.529.052,50	35.168.208
3,9	50 % De: Suministro, transporte e instalación de sistema puesta a tierra para gabinete metálico del sistema solar fotovoltaico	Und.	23	380310	8.747.130
3,1	50 % De: Suministro, transporte e instalación de sistema de medidor de energía eléctrica prepagado, monofásico bifila 120V 1x15(80)CL-2, frecuencia 60Hz, corriente máxima (Imax) 60A, con display, (Incluye Plataforma Tokenergy Light)	Und.	23	335181	7.709.163
EXCLUIDO					$ 257.796.523,50
TOTAL					**$ 257.796.523,50**

Dirección: cr 8 # 7-38 Cravo Norte
Correo: gerente.groupsas@gmail.com
Nit: 901497045-2

concepto, y el restante cincuenta (50%) por ciento de este concepto instalado y puesto en funcionamiento en los lugares de entrega respectivas.

Para el componente de replanteo y capacitaciones se pagará, mediante presentación de actas parciales hasta completar un **OCHENTA POR CIENTO (80%)** del valor, formuladas por el Contratista de acuerdo con las actividades ejecutadas y aceptadas por el supervisor e interventor a satisfacción del Municipio.

El VEINTE POR CIENTO (20%) restante, previa presentación del informe final de la Interventoría, suscripción del acta de recibo final y liquidación del contrato. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el supervisor e interventor designado por el Municipio de Cravo Norte.

Para el pago de actas parciales y de recibo final, deberá estar soportado así:

Mediante actas parciales hasta completar el **OCHENTA (80%)** del valor del contrato, previa presentación de lo siguiente;

- Informe Acta de entrega y recibo definitivo de Los bienes
- Actualización de las garantías exigidas debidamente ampliada y aprobada.
- Informe del contratista.
- Registro fotográfico (antes, durante, después) impresas a color y medio digital.
- Informe con soporte de la inversión de los imprevistos – En caso de requerirse.
- Pago de seguridad social integral del representante legal
- Si el pago del personal se realiza por nómina, anexar: Soportes de pago de seguridad social, afiliación, salud, pensiones, riesgos profesionales, pago de aportes parafiscales, Sena, ICBF, caja de compensación familiar y nóminas.
- Si el personal es subcontratado anexar: Copia del contrato con sus respectivos pagos de seguridad social integral (salud, pensión) de los meses laborados.
- Planillas de verificación de actividades con su respectivo enfoque diferencial.
- Paz y salvo de la caja de compensación familiar y aportes al FIC.
- Formato final de la veeduría ciudadana debidamente diligenciado y firma con nombres legibles.
- Paz y salvo del personal utilizado.
- Factura.
- Certificación de cumplimiento de Contrato y aportes parafiscales por parte de la supervisor e interventor.
- Informe de la supervisor e interventor.
- Certificado de satisfacción por parte del supervisor e interventor.
- Acta recibo final.
- Acta de liquidación firmada.
- Y los demás requisitos que solicite el supervisor

PARÁGRAFO PRIMERO. Para el pago el Contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor e interventor general del contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARP y Parafiscales.

PARÁGRAFO SEGUNDO: SUJECIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Los pagos a los cuales está obligado el MUNICIPIO se realizarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y/o cuenta de cobro, además de la entrega del bien, servicio u obra, junto con los demás requisitos, entre ellos pagos de seguridad social, acta de recibo, constancia de cumplimiento expedida por el supervisor e interventor del contrato, informe del contratista, pago de estampillas, acta de liquidación, planillas con enfoque diferencial y soportes fotográficos, etc. Los pagos están sujetos a la disponibilidad de los recursos del PAC

INFORME PARCIAL 1

GENERALIDADES DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
NÚMERO DE CONTRATO	223 DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS AISLADOS, EN ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE DEPARTAMENTO DE ARAUCA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Unión Temporal SRH 2025
NIT	901. 988.573-7
REPRESENTANTE LEGAL	HUMBERTO CASTAÑO CASTAÑEDA.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	86.008.000 DE GRANADA
FECHA DE INICIO	22 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	21 DE FEBRERO DE 2026
FECHA ADICIONAL	NA
ADICION PLAZO 1	NA
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	21 DE FEBRERO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 615.113.207,50
VALOR ADICIONAL	
VALOR TOTAL	$ 615.113.207,50
ANTICIPOS RECIBIDOS	
COBROS REALIZADOS	
VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA	$ 615.113.207,50

FORMA DE PAGO	La Administración Municipal de Cravo Norte pagará el valor del contrato, previa presentación de la Orden de Pago debidamente soportada, así: el componente de instalaciones eléctricas internas, Instalaciones Fotovoltaicas, se realizará el pago contra entrega de los equipos y elementos listos en fábrica para ser despachados, hasta del cincuenta (50%) por ciento del valor por este concepto, y hasta del restante cincuenta (50%) por ciento de este concepto instalado y puesto de funcionamiento en los lugares de entrega respectivos. Para el componente de replanteo y capacitaciones se pagara hasta un OCHENTA POR CIENTO (80%) del valor, se pagará mediante presentación de actas parciales, formuladas por el Contratista de acuerdo con las actividades ejecutadas y aceptadas por el supervisor a satisfacción del Municipio; del valor bruto se descontará la fracción o porcentaje correspondiente a la amortización del anticipo de acuerdo a los desembolsos autorizados por la ENTIDAD. El VEINTE POR CIENTO (20%) restante, previa presentación del informe final de la Supervisión, suscripción del acta de recibo final y liquidación del contrato. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Supervisor designado por el Municipio de Cravo Norte Para el pago de actas parciales y de recibo final, deberá estar soportado así: Mediante actas parciales hasta completar el OCHENTA (80%) del valor del contrato de obra pública, previa presentación de lo siguiente

CONTROL DE PÓLIZAS

TIPO DE POLIZA	ASEGURADORA Y NUMERO DE POLIZA	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NUMERO 625-47-9940000003528	17/09/2025	27/05/2026	61.511.320,75
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NUMERO 625-47-9940000003528	17/09/2025	27/11/2028	61.511.320,75
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NUMERO 625-47-9940000003528	17/09/2025	27/05/2026	61.511.320,75
	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NUMERO 625-74-9940000001339	17/09/2025	20/11/2025	284.700.000,00

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Cumplir Cabalmente con el objeto del contrato	El contratista está cumpliendo cabalmente con le ejecución del objeto contractual, para la fecha del presente informe ya cuenta con todos los equipos en el municipio de Cravo Norte.
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones que puedan presentarse	El contratista a actuado con celeridad durante el proceso contractual estando presto a realizar las actividades cn la mayor calidad, de acuerdo a las condiciones establecidas en el pliego de condiciones
Realizar la entrada de almacén de los productos a adquirir	De acuerdo a lo establecido en el contrato se realizara Ingreso a Almacén de los productos, el contratista estará presto a brindar la información requerida en los pliegos de condiciones
Ejecutar oportuna e idóneamente el objeto del contrato en la forma y bajo las condiciones estipuladas	El contratista esta cumpliendo cabalmente con le ejecución del objeto contractual, bajo las condiciones estipuladas en las Fichas técnicas
Cumplir las Instrucciones que le Imparta el Municipio y atender sus requerimientos, efectuados a través del supervisor del contrato	Hasta el momento el municipio no a requerido al contratista, sin embargo el contratista estará presto a contestar cualquier inquietud
Cumplir con todas las obligaciones previstas y las relacionadas con la naturaleza del servicio prestado, para lo cual, empleará todos los recursos técnicos, económicos, físicos y logísticos necesarios para el normal desarrollo del objeto contractual	Para la ejecución del objeto contractual el contratista a dispuesto el personal idóneo, la logística necesaria para transportar los equipos, los cuales empezaran a ser instalados de acuerdo a cronograma que se establezca con la entidad y la comunidad
Colaborar con el Municipio , en lo que se necesario para que el objeto contratado se cumpla, conforme a las características y especificaciones, la cual hace parte integral del contrato.	Para la ejecución del objeto contractual el contratista a dispuesto el personal idóneo, para colabora r con el municipio en la logística necesaria para el cumplimiento, conforme a las características y especificaciones técnicas de los equipos a instalar
Defender en todas sus actuaciones los intereses del municipio y obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del contrato	El contratista cumple con el objeto contractual actuando para defender las actuaciones e intereses del municipio, obrando don lealtad y buena fe
Es obligación del contratista manejar con absoluta confidencialidad la información recibida y enviada desde los correos electrónicos.	Toda información es manejada con la estricta confidencialidad de acuerdo a loe establecido en el contrato y en la Ley Colombiana
Informar oportunamente de cualquier amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo hacer u omitir algún acto o actuar hechos que afecten los intereses del Municipio.	No se han presentado ningún tipo de circunstancia que llegase a afectar los intereses del municipio ni de la comunidad

El cumplimiento del objeto del contrato el contratista se obliga a desarrollar los ítems del contrato conforme a las especificaciones técnicas	

INFORME FINANCIERO

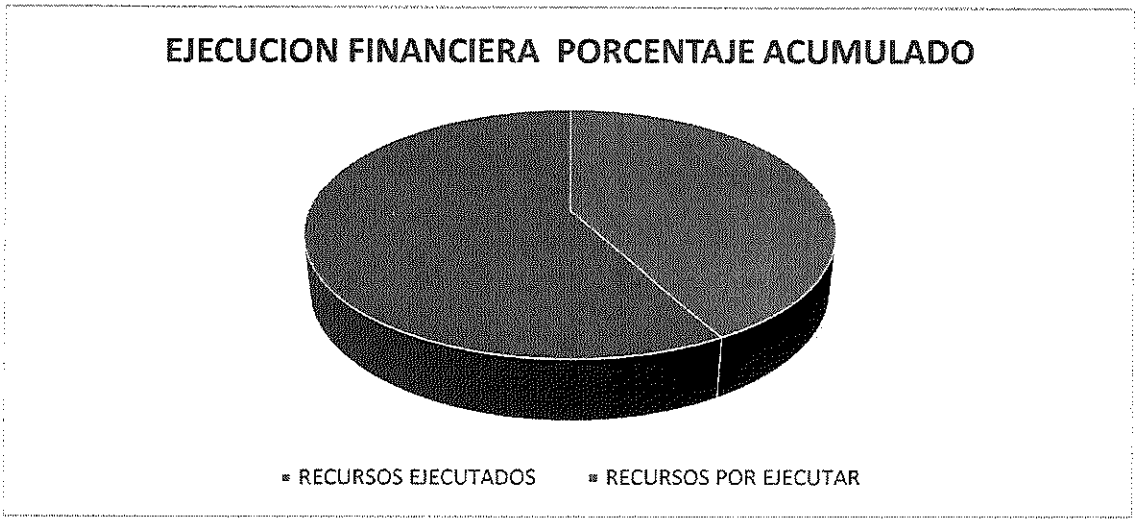
DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS FACTURADOS					
ITEM	**DESCRICIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
3,1	50 % De: Panel Solar 450W 24V Monocristalino PERC - 41,52 Vmp, Suministro, transporte e instalación	Und.	46	856.757,50	39.410.845
3,2	50 % De: Bateria De Litio 200Ah 24V (descarga en 20 h) - 12 V, Suministro e instalación	Und.	23	4.484.296,50	103.138.820
3,3	50 % De: Controlador de carga, control MPPT, 40A, tensión de salida 24V, Suministro, transporte e instalación	Und.	23	735.280,00	16.911.440
3,4	50 % De: Inversor 24 VDC / 120 VAC, 60 Hz, onda senoidal pura 1 KW, Suministro, transporte e instalación	Und.	23	951.886,50	21.893.390
3,5	50 % De: Estructura de soporte para 2 módulos a nivel 3m, Suministro e instalación	Und.	23	1.079.023,00	24.817.529
3,6	50 % De: Gabinete de 90X70X30 cm para la instalación de inversor, controlador, baterías y protecciones. Suministro, transporte e instalación.	Und.	23	1.529.052,50	35.168.208
3,9	50 % De: Suministro, transporte e instalación de sistema puesta a tierra para gabinete metálico del sistema solar fotovoltaico	Und.	23	380310	8.747.130
3,1	50 % De: Suministro, transporte e instalación de sistema de medidor de energia electrica prepagado, monofasico bifila 120V 1x15(80)CL-2, frecuencua 60Hz, corriente máxima (Imax) 60A, con display, (Incluye Plataforma Tokenergy Light)	Und.	23	335181	7.709.163
EXCLUIDO					$ 257.796.523,50
TOTAL					**$ 257.796.523,50**

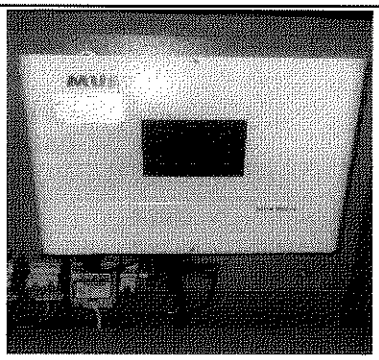
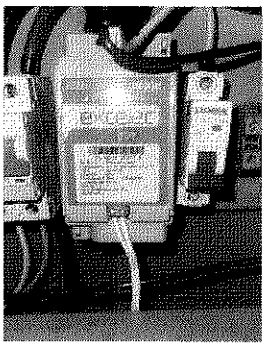
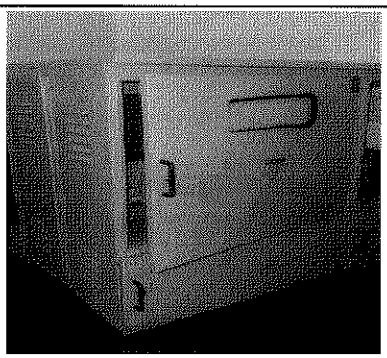
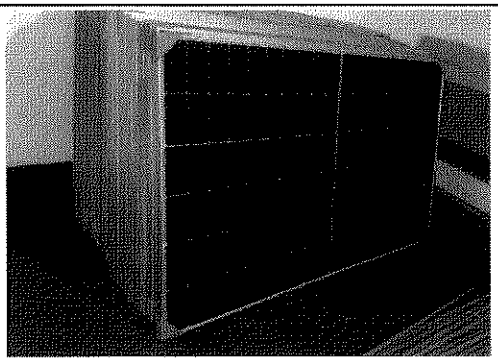
RELACIÓN DE FATURAS REALIZADAS			
NUMERO	**BASE**	**IVA**	**VR TOTAL**
FE -1	257.796.523,50	-	257.796.523,50
TOTALES	**257.796.523,50**	-	**257.796.523,50**



BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN

ESTADO FINANCIERO CONTRATO DE SUMINISTRO No 110.10.01-126 DE 2023			
ITEM	**PRESUPUESTO**	**VALORES**	**PAGOS**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 615.113.207,50		
ANTICIPOS RECIBIDOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ADICIONAL AL CONTRATO	$ 0,00	$ 0,00	
VALOR ACTA PARCIAL 1		$ 257.796.523,50	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		$ 0,00	
VALOR A PAGAR			$ 257.796.523,50
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 0,00	$ 0,00
SUMAS IGUALES	**$ 615.113.207,50**	**$ 257.796.523,50**	**$ 257.796.523,50**

EJECUCION FINANCIERA	
ITEM	**PORCENTAJE ACUMULADO**
RECURSOS EJECUTADOS	41,91%
RECURSOS POR EJECUTAR	58,09%



REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATO 223 DE 2025 INFORME FINAL		
REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO : 223 DE 2025		
DESCRIPCIÓN		**DESCRIPCIÓN**
CONTROLADOR: Controlador de carga, control MPPT, 40A, tensión de salida 24V, Suministro, transporte e instalación		INVERSOR: Inversor 24 VDC / 120 VAC, 60 Hz, onda senoidal pura 1 KW, Suministro, transporte e instalación
		
DESCRIPCIÓN		**DESCRIPCIÓN**
MEDIDOR: Suministro, transporte e instalación de sistema de medidor de energia electrica prepagado, monofasico bifila 120V 1x15(80)CL-2, frecuencua 60Hz, corriente máxima (Imax) 60A, con display, (Incluye Plataforma Tokenergy Light)		GABINETE: Gabinete de 90X70X30 cm para la instalación de inversor, controlador, baterías y protecciones. Suministro, transporte e instalación.
		
DESCRIPCIÓN		**DESCRIPCIÓN**
BATERIA: Bateria De Litio 200Ah 24V (descarga en 20 h) - 12 V, Suministro e instalación		PANELES SOLARES: Panel Solar 450W 24V Monocristalino PERC - 41,52 Vmp, Suministro, transporte e instalación
		
DESCRIPCIÓN		**DESCRIPCIÓN**
ESTRUCTURA SOPORTE: Estructura de soporte para 2 módulos a nivel 3m, Suministro e instalación		ESTRUCTURA SOPORTE: Estructura de soporte para 2 módulos a nivel 3m, Suministro e instalación

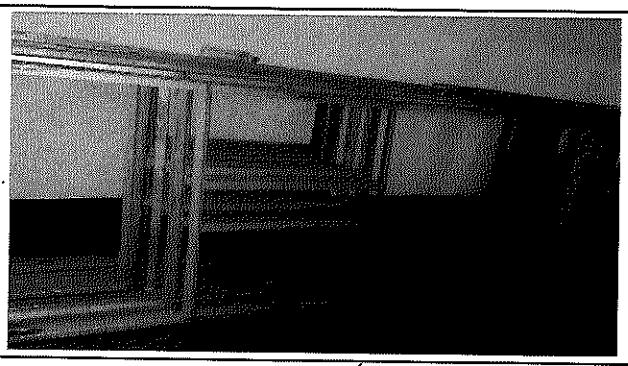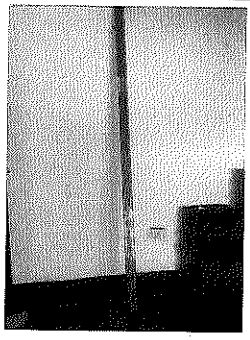	
DESCRIPCIÓN	**DESCRIPCIÓN**
VARILLA PUESTA TIERRA: Suministro, transporte e instalación de sistema puesta a tierra para gabinete metálico del sistema solar fotovoltaico	
	

HUMBERTO CASTAÑO CASTAÑEDA
C. C. No. 86008000
Representante Legal

Sonia Merchan Orozco
Contador Publico UPTC Sogamoso

CERTIFICACION APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

En cumplimiento a lo previsto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en nuestra condición de Representante Legal y contador respectivamente de la UNIONTEMPROAL SRH 2025 identificado con NIT. No. 901.988.573- 7, nos permitimos certificar que se cumplió con el Pago de los Aportes al Sistema de Seguridad Social de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondiente a la nómina del personal, durante el tiempo de ejecución del contrato.

CONTRATO DE COMPRAVENTA 223 DE 2025

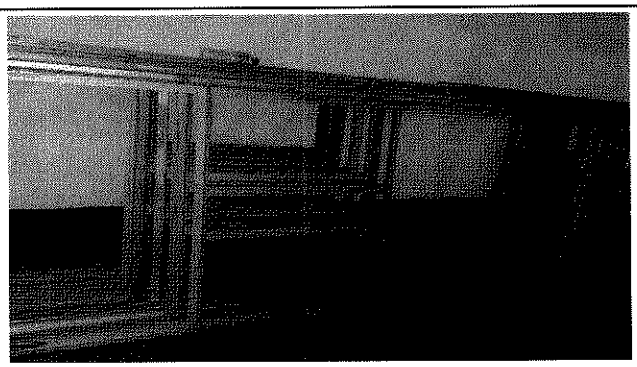
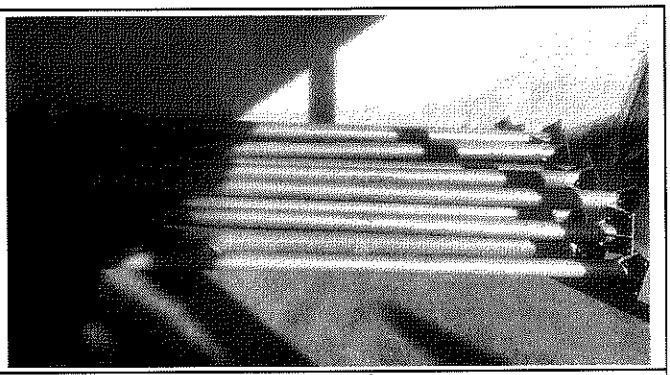
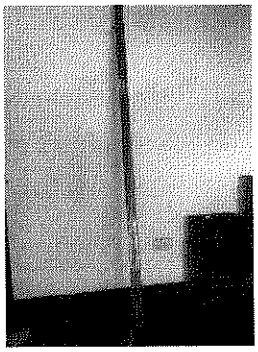
Cuyo objeto: ACONTRATO DE SUMINISTRO

CIMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS AISLADOS, EN ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE DEPARTAMENTO DE ARAUCA

La presente certificación se expide en Yopal-Casanare a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre de 2025.

HUMBERTO CASTAÑO CASTAÑEDA
C. C. No. 86008000
Representante Legal

SONIA MERCHAN OROZCO
Contador Publico
C.C. No. 46.370.505 T.P. 71 040 - T

	
DESCRIPCIÓN	**DESCRIPCIÓN**
VARILLA PUESTA TIERRA: Suministro, transporte e instalación de sistema puesta a tierra para gabinete metálico del sistema solar fotovoltaico	
	

— Firma Contratista

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 1 D E 3 1 D A 3 C B 5 E 2 3 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
SONIA MERCHAN OROZCO

Que el contador público **SONIA YAMILE MERCHAN OROZCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 46370505 de SOGAMOSO (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 71040-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****
****


Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado





en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900931215	6	INTEGRAL DE SERVICIOS PROFESIONALES COMPANY S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	CL 29 20 75 BRR PROVIVIENDA	YOPAL-CASANARE	6348691	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2017647457	9496592890	E	2025/12/04	2025/12/18	BANCOLOMBIA	14	$705,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	86008000	CASTAÑO HUMBERTO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
2	CC	1057412370	VELASQUEZ LEYDY																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Total	Afiliados(2)																						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0		$698,600

2025/12/17 07:05 PM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900931215	6	INTEGRAL DE SERVICIOS PROFESIONALES COMPANY S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	CL 29 20 75 BRR PROVIVIENDA	YOPAL-CASANARE	6348691	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2017647457	9496592890	E	2025/12/04	2025/12/18	BANCOLOMBIA	14	$705,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$455,600	$4,200	$0	$459,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$2,100	$0	$229,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$2,100	$0	$229,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$15,000	$200	$0	$15,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$15,000	$200	$0	$15,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$1,100	$0	$115,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$114,000	$1,100	$0	$115,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$1,100	$0	$115,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$114,000	$1,100	$0	$115,100
TOTAL				2	$698,600	$6,600	$0	$705,200

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ce41485918c0870fca8fcf2f515e361fc41f27990263fbe9a34d5108a4192777c5083cb2af557a1430648cf1141c9140

Número de Factura: FE-1
Fecha de Emisión: 24/12/2025
Fecha de Vencimiento: 31/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL SRH 2025
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL SRH 2025
Nit del Emisor: 901988573
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 3511

País: Colombia
Departamento: Arauca
Municipio / Ciudad: Arauca
Dirección: CL 23 # 22 - 75
Teléfono / Móvil: 3244064665
Correo: utsrh2025@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800014434
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Arauca
Municipio / Ciudad: Cravo Norte
Dirección: CR 4 2 62 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 315223159
Correo: contabilidad@cravonorte-arauca.gov.co


Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	50 por ciento De Panel Sol ar 450W 24V Monocristali no PERC 41,52 Vmp, Sumi nistro, transporte e instal acion	94	46,00	$ 856.757,50	$ 0,00	$ 0,00					$ 39.410.845,00
2	002	50 por ciento De Bateria D e Litio 200Ah 24V descarg a en 20 h 12 V, Suministro e instalacion	94	23,00	$ 4.484.296,50	$ 0,00	$ 0,00					$ 103.138.819,50
3	003	50 por ciento De Controla dor de carga, control MPP T, 40A, tension de salida 24V, Suministro, transport e e instalacion	94	23,00	$ 735.280,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.911.440,00
4	004	50 por ciento De Inversor 24 VDC 120 VAC, 60 Hz, o nda senoidal pura 1 KW, S uministro, transporte e ins talacion	94	23,00	$ 951.886,50	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.893.389,50
5	005	50 por ciento De Estructur a de soporte para 2 modul os a nivel 3m, Suministro e instalacion	94	23,00	$ 1.079.023,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.817.529,00
6	006	50 por ciento De Gabinete de 90X70X30 cm para la in stalacion de inversor, con trolador, baterías y prote cciones. Suministro, trans porte e instalacion.	94	23,00	$ 1.529.052,50	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.168.207,50
7	007	50 por ciento De Suministr o, transporte e instalacion de sistema puesta a tierra para gabinete metálico del sistema solar fotovoltalco	94	23,00	$ 380.310,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.747.130,00
8	008	50 por ciento De Suministr o, transporte e instalacion de sistema de medidor de energia electrica prepaga do, monofasico bifila 120V 1x15 80 CL 2, frecuencua 60Hz, corriente máxima Im ax 60A, con display, Inclu ye Plataforma Tokenergy Light	94	23,00	$ 335.181,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.709.163,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
24/12/2025 11:53:25
Documento validado por la DIAN:
24/12/2025 11:53:25
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	257796523.5
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	257796523.5
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	257796523.5
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 257796523.5

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	257.796.523,50
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	257.796.523,50
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	257.796.523,50
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $257.796.523,50

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764102825692 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-12-10
