AUTORIZACIÓN: 033
13/4/2026

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA PRECONTRACTUAL
FORMATO AUTORIZACIÓN

CONSIDERANDO

De conformidad con la Resolución No. 2862 de 2025, compete a la Dirección Regional proferir autorizaciones previas a las contrataciones que deben efectuar los Centros de Formación en materia de prestaciones de servicios con personas naturales o jurídicas, Contratos de suministro, mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y reposición o mantenimiento del parque automotor.

Que el Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico de la Regional Santander, requiere **Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas que adelanta el CIDT vigencia 2026.**

Que el Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico de la Regional Santander, cuenta con los recursos presupuestales suficientes, los cuales fueron asignados por la Dirección General, para la presente contratación y ha cumplido con los trámites previos a la autorización de acuerdo a las normas generales e internas de la Entidad

Que de acuerdo con certificación expedida por el subdirector de Centro (E), en la planta de personal no existe personal suficiente y teniendo en cuenta las especiales características y necesidades técnicas de la contratación, se requiere contratar el presente suministro.

Que en cumplimiento del artículo 12° de la Resolución No. 2862 de 2025, se procede a autorizar la contratación.

Que sin perjuicio de lo anterior, el Subdirector (E) del Centro de Formación deberá velar por el cumplimiento de los requisitos legales de acuerdo con la normatividad vigente y aplicable en concordancia con el manual de contratación vigente y la modalidad de contratación aplicable, así como la publicación de los documentos remitidos a este Despacho Regional para su autorización.

Que en virtud de lo anterior,

AUTORIZA LA CONTRATACION

Descripción breve de la solicitud:	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas que adelanta el CIDT vigencia 2026.
Valor total de la contratación:	SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y TRES PESOS MCTE ($764.384.033)
Modalidad	Selección Abreviada por Subasta Inversa
CDP:	7026 del 13 de enero de 2026
Rubro:	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 C-3605-1300-4-40402A-3605021-02
Radicado - NIS	RAD. 68-9-2026-014622 N.I.S 2026-02-133030

Firmado digitalmente por JIMENEZ MARTINEZ JHON EDISON
Fecha: 2026.04.13 08:35:51 -05'00'

JHON EDISON JIMENEZ MARTINEZ
Director Regional (E)

Vo.Bo: Elmer Fair Santana Rojas
Cargo: Subdirector de Centro (E)

Proyectó: Kelly Johana Rincon Tarazona
Apoyo Contratación ByS

ACTA No. 01			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Presentación de los estudios previos y demás documentos precontractuales para la estructuración del proceso de contratación de selección abreviada por subasta inversa, cuyo objeto es: "*Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas que adelanta el CIDT vigencia 2026*".			
CIUDAD Y FECHA: Barrancabermeja, 16 de marzo de 2026		**HORA INICIO:** 8:00 am	**HORA FIN:** 11:00 am
LUGAR Y/O ENLACE:	Ambiente Lego	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Saludo de apertura.
2. Verificación y conformación del Comité de Contratación.
3. Exposición de los documentos precontractuales del proceso de contratación, incluyendo los estudios previos, análisis del sector, estudio de mercado y demás soportes relacionados con la contratación cuyo objeto es: *"Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas que adelanta el CIDT, vigencia 2026."*
4. Designación de la secretaria técnica del comité de contratación
5. Revisión y aprobación de los estudios previos del proceso de contratación para el suministro de materiales de formación correspondiente a la vigencia 2026.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

1. Presentar al comité de contratación del CIDT, la necesidad y justificación de contratación del proceso que tiene como objeto: "*Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas que adelanta el CIDT vigencia 2026*".
2. Aprobar los documentos precontractuales del proceso de SUMINISTRO MATERIALES DE FORMACIÓN VIGENCIA 2026 y recomendar la publicación al ordenador del gasto por parte de los miembros del Comité de Contratación en concordancia con la Resolución No. 3090 de 2025 "Por medio de la cual se expide el reglamento interno del comité de contratación y de convenios de la Dirección General, Direcciones Regionales y Centro de Formación Profesional del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
3. Establecer presupuesto para cada lote.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se inicia la reunión con el saludo a los asistentes, agradeciendo su participación. Acto seguido, se expone la necesidad de llevar a cabo la sesión del Comité de Contratación en el marco del proceso cuyo objeto es el **"*Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas que adelanta el CIDT, vigencia 2026***".

Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 3090 de 2025, la cual dispone:

ARTÍCULO 8o. CREACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN Y CONVENIOS EN LOS CENTROS DE FORMACIÓN. Créase el Comité de Contratación y Convenios en los Centros de Formación profesional del SENA, cuyo objetivo principal es realizar el seguimiento, asesoría y apoyo a la gestión contractual para los procesos de contratación y convenios que deba realizar el respectivo Centro de Formación, cuya cuantía sea superior a doscientos cincuenta (250 smlmv) en la vigencia respectiva, independientemente de la naturaleza o modalidad.

En ese sentido, y teniendo en cuenta que el presente proceso cuenta con un presupuesto oficial de **setecientos sesenta y cuatro millones trescientos ochenta y cuatro mil treinta y tres pesos MCTE ($764.384.033)**, se hace obligatoria la conformación del Comité de Contratación, conforme a la normatividad vigente.

2. El Comité de Contratación y Convenios, en los Centros de Formación Profesional, estará integrado por:

Miembros del comité con voz y voto:

- Elmer Fair Santana Rojas, Ordenador del gasto o su delegado quien lo presidirá
- Rosa Tulia Gutierrez Vera
- Jairo Uribe Castro, coordinador grupo apoyo adm.
- Cristian Farid Barbosa Barros, coordinador académico
- Juan Carlos Blanco Arenas, coordinador Académico
- Diana Carolina Lopez Martinez, coordinadora programas Especiales
- Instructores técnicos de las áreas solicitadas

Invitados con voz, pero sin voto:

- Kelly Johana Rincon Tarazona, Apoyo contratación bienes y servicios
- Laura Guevara- Abogada contratación
- Andry Yulieth Diaz A- Dinamizadora ambiental y energética
- Jessica Vanessa Gómez Moreno- Apoyo SST

Se da a conocer el artículo de la Resolución 3090 de 2025 el cual establece las funciones del comité de contratación:

ARTÍCULO 9o. FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN Y CONVENIOS A NIVEL REGIONAL Y CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. Las funciones de los comités de contratación y convenios de las Direcciones Regionales y Centros de Formación serán las mismas señaladas en al artículo 3 de la presente resolución para el comité de contratación y convenios de la Dirección General.

ARTÍCULO 3o. FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN Y CONVENIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA. Son funciones del comité:
1. Presentar sugerencias, proponer ajustes y, en general, efectuar todas aquellas recomendaciones tendientes a garantizar la eficiencia, eficacia y oportunidad en el trámite de las solicitudes de contratación.
2. Recomendar al ordenador de gasto la apertura del proceso, previa verificación de los documentos soporte y de acuerdo con la modalidad del proceso de selección.
3. Solicitar informes o requerir información sobre los procesos de contratación y convenios, respecto de su planeación, trámite y suscripción, a las respectivas áreas que generen la necesidad.
4. Analizar y realizar las recomendaciones en los procesos contractuales o convencionales que, por su naturaleza, complejidad, cuantía o importancia, solicite el Director General.
***PARÁGRAFO.** Las decisiones del Comité, en relación con los procesos contractuales y convencionales, son una asesoría y se emiten a manera de concepto, por lo que no obligan a los ordenadores del gasto. No obstante, lo anterior, cuando el ordenador del gasto decida, bajo su propia responsabilidad, apartarse de la decisión del comité, deberá enviar un informe justificando su decisión al director general con copia a la Oficina de Control Interno de Gestión.*

3. Presupuesto

Se confirma el presupuesto por rubro

DEPE SIIF	POSICIÓN DEL GASTO	NOTAS CIDT	PRESUPUESTO 2026
954010	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02	Desplazados	$129.619.000,00
954011	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	Articulación	$76.949.019,00
954018	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	FIC	$37.707.299,00
954038	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	Titulada y complementaria CAMPESENA	$202.627.435,00
954045	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	Regular - Titulada	$247.000.000,00
954064	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	Formación continua especial CampeSena y Full Popular (FEC PLACA HUELLA, FEC CONSTRUCCION, FEC TRASFORMACION y FEP)	$20.250.000,00
954085	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	Formación titulada y complementaria FULL POPULAR	$6.931.280,00
954068	C-3605-1300-4-40402A-3605021-02	PA_LABORATORIO_2025_308_89	$ 43.300.000,00
			$764.384.033,00

REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS MINIMOS:

- CÁMARA DE COMERCIO O REGISTRO MERCANTIL: Se verifica fecha de expedición (dentro de los 30 días)
  objeto social
  calidad del representante legal
  representante legal y facultades para contratar
  autorización para contratar
  Renovación
- FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL
- FOTOCOPIA DE LIBRETA MILITAR PARA VARONES MENORES DE 50 AÑOS
- SEGURIDAD SOCIAL
- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA
- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORÍA
- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES
- REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS
- CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM
- CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE APRENDIZAJE
- RUT
- CERTIFICACIÓN BANCARIA (Expedición dentro de los 30 días)
- RUP VIGENTE Y RENOVADO
- PÓLIZA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

CONCLUSIONES

El Comité de Contratación aprueba por votación unánime los documentos precontractuales (estudios previos, análisis del sector, estudio de mercado y demás soportes), los cuales justifican la contratación del proceso cuyo objeto es: "*Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas que adelanta el CIDT vigencia 2026*".

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS


ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA
Una vez se firmen los documentos previos por parte del comité estructurador, adelantar el trámite de publicación en la plataforma del SECOP II.	Mes de abril de 2026	Kelly Rincon	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA / EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

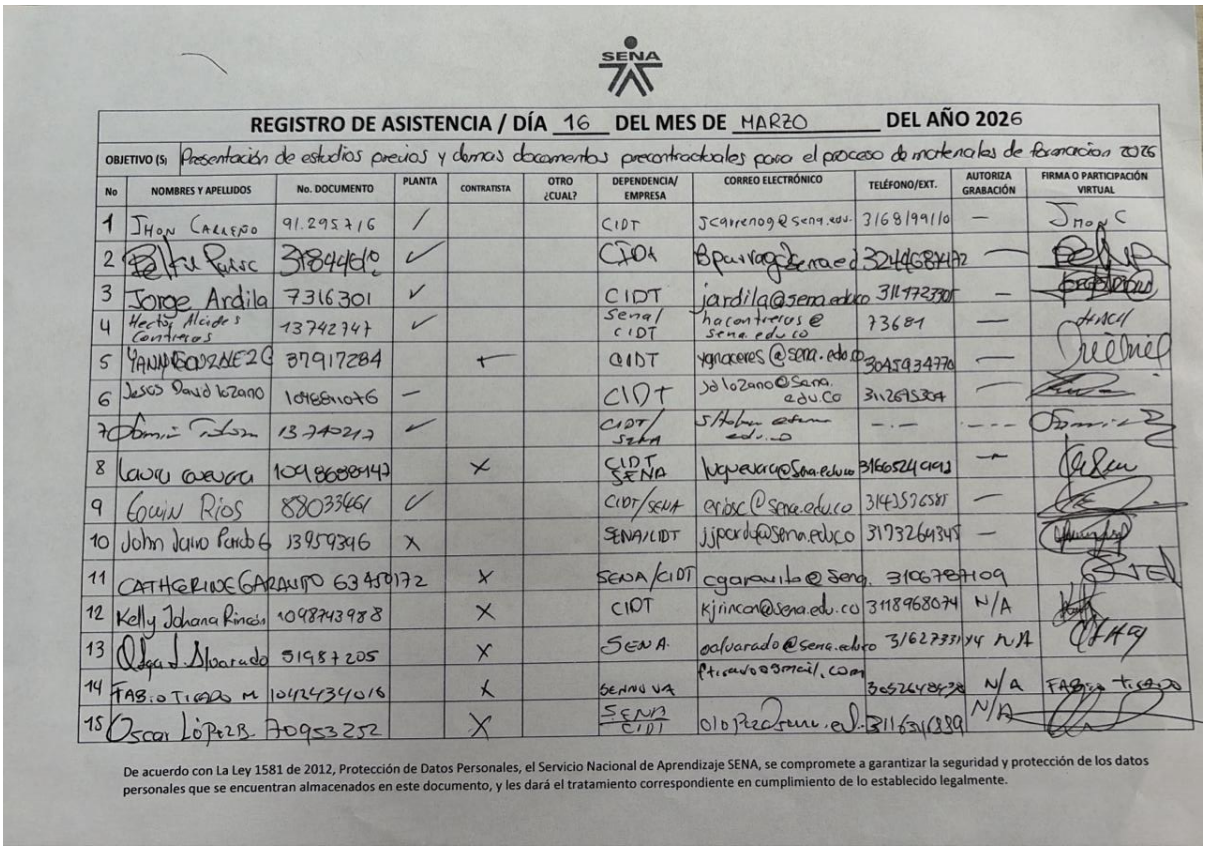


REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 16 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2026

OBJETIVO (S): Presentación de estudios previos y demas documentos precontractuales para el proceso de matriculas de formación 2026

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	JHON CARREÑO	91.295.716	/			CIDT	JCarreno@sena.edu.	3168199110	—	
2	[illegible]	3184464[illegible]	✓			CIDT	Bparraga@sena.e	3246084172	—	
3	Jorge Ardila	7316301	✓			CIDT	jardila@sena.edu.co	3114723307	—	
4	Hector Alcides Contreras	13742747	✓			Sena/ CIDT	hacontreras@ sena.edu.co	73681	—	
5	YANNA[illegible]	37917284		+		CIDT	ygnacores@sena.edu.co	3045934776	—	
6	Jesus David Lozano	1048611076	—			CIDT	jdlozano@sena. edu.co	3112695304	—	
7	[illegible]	13.740.217	✓			CIDT/ SENA	S/Helmer [illegible] edu.co	—	—	
8	Laura Oviedo	1049608147		X		CIDT SENA	lmpevedo@Sena.edu.co	3160524 ext 43	—	
9	Edwin Ríos	88033461	✓			CIDT/SENA	eriosc@sena.edu.co	3143576581	—	
10	John Jairo Pardo G	13859346	X			SENA/CIDT	jjpardo@sena.educo	3173264345	—	
11	CATHERINE GARAVITO	63450172		X		SENA/CIDT	cgaravito@Sena.	3106784109		
12	Kelly Johana Rincón	1098743988		X		CIDT	Kjrincon@sena.edu.co	3118968074	N/A	
13	Olga J. Alvarado	51987205		X		SENA	ojalvarado@sena.edu.co	3162733144	N/A	
14	FABIO TIBADA M	1014243401[illegible]		X		SENNOVA	ftibadam@gmail.com	3052648[illegible]	N/A	
15	Oscar López B.	70953252		X		SENA CIDT	olopezb@sena.edu.	3116311339	N/A	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

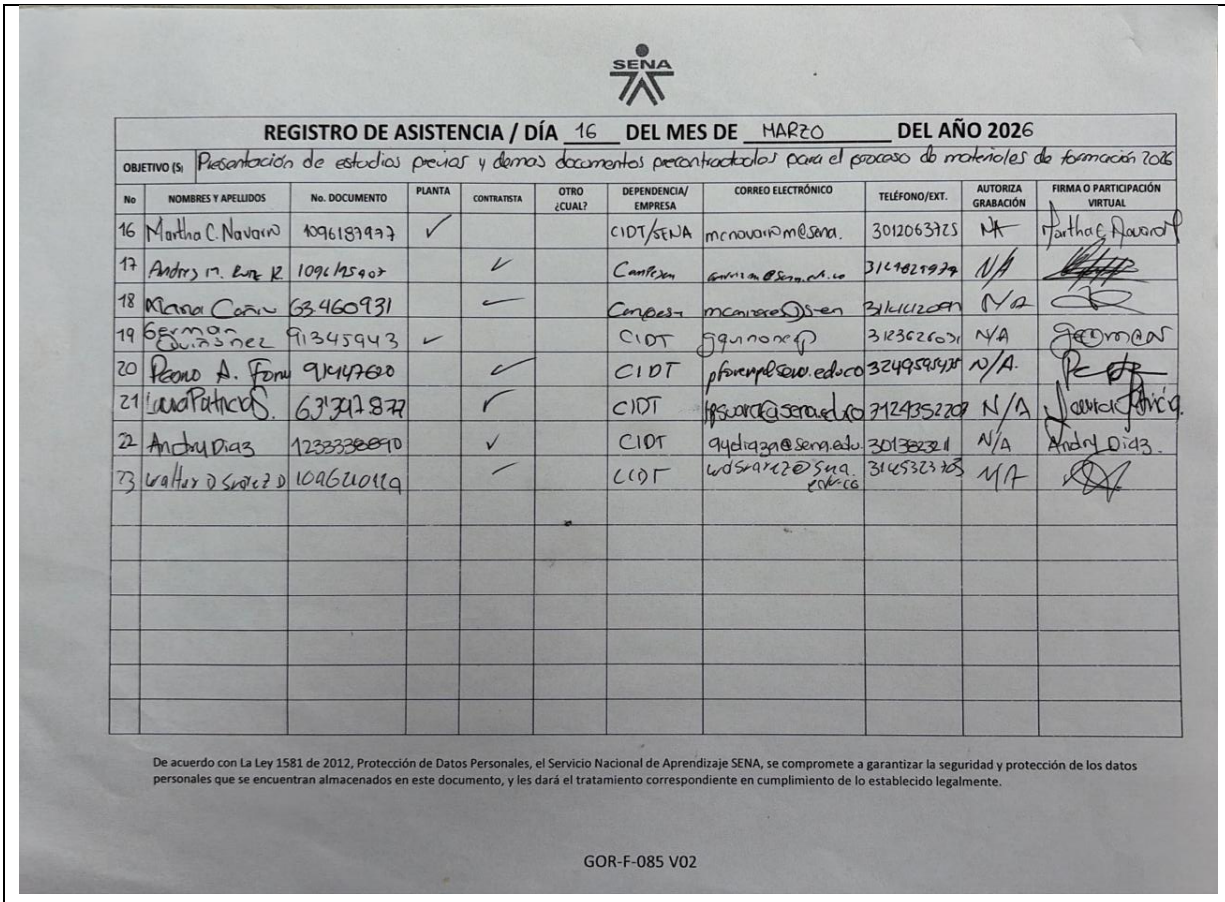

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 16 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2026

OBJETIVO (S): Presentación de estudios previos y demas documentos precontractuales para el proceso de materiales de formación 2026

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
16	Martha C. Navarro	1096187977	✓			CIDT/SENA	mcnavarro@sena.	3012063725	NA	
17	Andrés M. Ruiz R.	1096125407		✓		Campesa		3164821934	N/A	
18	Maria Cañas	63460931		✓		Campesa	mcanasas@sena	3146112041	N/A	
19	Germán Quintanilla	91345943	✓			CIDT	gquintanilla	3123626031	N/A	
20	Pedro A. Fonseca	91447820		✓		CIDT	pfonseca@sena.edu.co	3249585438	N/A.	
21	Laura Patricia S.	63371877		✓		CIDT	lpsarria@sena.edu.co	7124352209	N/A	
22	Andry Diaz	1233338810		✓		CIDT	aydiaza@sena.edu	3013823211	N/A	
23	Walter D Suarez D	1096210119		✓		CIDT	wdsuarez@sena.edu.co	3145323763	NA	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

GOR-F-085 V02

De: grupoadmondocumentos@sena.edu.co
A: Jairo Uribe Castro
Cc: Elmer Fair Santana Rojas; Claudia Milena Toloza Patiño; Laura Vanessa Guevara Uribe; Jessica Vanessa Gomez Moreno; Rosa Tulia Gutierrez Vera; Maria Elena Amaya Rios; Maria Del Rosario Cañizares Linares; Pedro Antonio Forero Perez; Oscar de Jesus Lopez Botero; Andres Mauricio Ruiz Rueda; Laura Patricia Suárez Carrillo; Edwin Yesidh Rios Contreras; Walter David Suárez Durán; Ana Carmela Contreras De Sierra; Olga Lucía Alvarado Martínez; Catherinne Garavito Echavarria; Samir Leonardo Toloza; Belky Jazmin Parra Guarin; Muviro Mendoza López; Deicy Yadira Ayala Ayala; Emerso Paolo Villa Plazas; Jhon Jairo Pardo; Jhon Javier Carreno Garcia; Martha Cecilia Navarro Macana; Jorge Manuel Ardila; Hector Alcides Contreras; German Quinonez Pardo; Janeth Zulima Ruiz Rueda; Jesus David Lozano Sánchez; Fabio Nelson Tirado Meza; Cristian Farid Barbosa Barros; Diana Carolina Lopez Martinez; Juan Carlos Blanco Arenas; Paul Fernando Urzola Nuñez; Kelly Johana Rincon Tarazona
Asunto: CPE No. 68-9-2026-011656 - SOLICITUD INICIO- UNIDAD CONTRATACIÓN- MATERIALES DE FORMACIÓN 2026
Fecha: lunes, 16 de marzo de 2026 10:50:38 a. m.
Archivos adjuntos: ATT00001.bmp
C.I.(FRM)-9-2026-011656-(68)-6895403-+ (E) JAIRO URIBE CASTRO--SOLICITUD INIC.html

---

Apreciado(a) * (E) JAIRO URIBE CASTRO
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
68-9-2026-011656	2026-02-103988	3/16/2026 10:50:10 AM

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES SENA	SOLICITUD INICIO- UNIDAD CONTRATACIÓN- MATERIALES DE FORMACIÓN 2026

Cordial saludo,

De acuerdo con lo establecido en el aplicativo interno “compromiso” en el formato de la lista de cheque de selección abreviada subasta inversa GCCON-F-055, solicito el Inicio del trámite contractual del proceso de selección cuyo objeto es: Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas que adelanta el CIDT vigencia 2026.

Designación Líder de Proceso: Kelly Johana Rincon Tarazona, apoyo contratación ByS

De otra parte, atendiendo el lineamiento contenido en el Manual de Contratación GCCON-M- 001 V7, se establece la siguiente designación:

Área Requirente:

Personal designado por el ordenador del gasto, el grupo de apoyo administrativo mixto o quien haga sus veces, cuya labor consiste en la elaboración de los documentos de la fase preparatoria de los procesos contractuales, así como la formulación de respuestas a observaciones presentadas por los interesados hasta tanto culmine el plazo habilitado para la recepción de ofertas; por lo anterior estará integrado por las siguientes personas:

Jurídico: Laura Vanessa Guevara Uribe
SST: Jessica Vanessa Gomez Moreno

Ambiental: Andry Yulieth Diaz Arrieta
Aspectos financieros: Rosa Tulia Gutierrez Vera

Técnico: Maria Elena Amaya Rios; Maria Del Rosario Cañizares Linares, Pedro Antonio Forero Perez, Oscar de Jesus Lopez Botero, Andres Mauricio Ruiz Rueda, Laura Patricia Suárez Carrillo, Edwin Yesidh Rios Contreras, Walter David Suárez Durán, Ana Carmela Contreras De Sierra, Olga Lucía Alvarado Martínez, Catherinne Garavito Echavarria, Samir Leonardo Toloza, Belky Jazmin Parra Guarin, Muviro Mendoza López, Deicy Yadira Ayala Ayala, Emerso Paolo Villa Plazas, Jhon Jairo Pardo, Jhon Javier Carreno Garcia, Martha Cecilia Navarro Macana, Hector Alcides Contreras, Jorge Manuel Ardila, German Quiñonez Pardo, Janeth Zulima Ruiz Rueda, Jesus David Lozano Sánchez, Fabio Nelson Tirado Meza.

Unidad de contratación:

Las unidades de contratación son las áreas de compras de la entidad o grupos contractuales que estarán integrados con el nombre de la cuenta de la entidad en SECOP II o en la TVEC, las cuales están dirigidas por el Ordenador del gasto. Las unidades de contratación serán las encargadas de estructurar, realizar seguimiento y publicar los documentos generados en la plataforma SECOP con ocasión de la etapa precontractual, la cual comprende hasta la suscripción del contrato o la declaratoria de desierto. La etapa de ejecución, liquidación y cierre del expediente contractual será responsabilidad del supervisor del contrato. Por lo expuesto, cada Unidad de contratación se conformará así:

Kelly Johana Rincon Tarazona: Apoyo contratación ByS
Laura Vanessa Guevara Uribe: Abogada contratación ByS
Elmer Fair Santana Rojas: Subdirector de Centro (E)

Atentamente,

ELMER FAIR SANTANA ROJAS
Subdirector de Centro (E)

Atentamente,

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcserrato	CAMILA ANDREA SERRATO BANAVIDES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954010	CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-12-7:05 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	7026	**Fecha Registro:**	2026-01-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	773.283.540,00	**Valor Total Operaciones:**	-8.899.507,00			**Valor Actual.:**	764.384.033,00	**Saldo x Comprometer:**	764.384.033,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	7126	**Fecha Registro:**	2026-01-13	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF						
					Total:	129.619.000,00	0,00	129.619.000,00	129.619.000,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
954011 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF						
					Total:	76.949.019,00	0,00	76.949.019,00	76.949.019,00	0,00

954018 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-FONDO INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCION FIC-SANTANDER	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Propios	26	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	37.707.299,00	0,00	37.707.299,00	37.707.299,00	0,00
954038 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER - ECONOMÍA CAMPESINA Y SER	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	202.627.435,00	0,00	202.627.435,00	202.627.435,00	0,00
954045 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-03-12	255.899.507,00	-8.899.507,00			
					Total:	255.899.507,00	-8.899.507,00	247.000.000,00	247.000.000,00	0,00
954064 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO - FORMACION CONTINUA ESPECIALIZADA-SANTANDER	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	20.250.000,00	0,00	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00

954068 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO - FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS	C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO EN EL SENA NACIONAL	Propios	27	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	43.300.000,00	0,00	43.300.000,00	43.300.000,00	0,00
954085 CENTRO IND Y DEL DESARR TECN SANTANDER, SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION - ECONOMIA POPULAR	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	6.931.280,00	0,00	6.931.280,00	6.931.280,00	0,00

Objeto:	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE ADELANTA EL CIDT, VIGENCIA 2026



Firma Responsable

SENA REGIONAL SANTANDER.
MATRIZ DE RIESGOS
Proceso de Subasta Inversa: Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas que adelanta el CIDT vigencia 2026.

Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Etapa					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto despues del tratamiento				Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
					Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega					SENA	proponente/adjudicatario	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
Económico	La fluctuación de los precios de los insumos.	1	General	Externo	X			X	X	2	4	6	Riesgo Alto	0	100%	Verificar que las obsevaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda	1	4	5	Riesgo medio	Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor	Etapa de Planeación. Fecha acta de inicio	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
	Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado.	2	General	Externo	X					3	5	8	Riesgo Extremo	50%	50%	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	1	3	4	Riesgo Bajo	Personal encargado de la Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
	Ofertas artificialmente bajas	3	General	Externo		X				3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015.	1	3	4	Riesgo Bajo	Comité evaluador	Etapa de Selección	Etapa de Selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
	Tendencia Inflacionaria	4	General	Externo	X					1	4	5	Riesgo Alto	0%	100%	Contar con un margen de imprevistos frente a los valores ofertados a la entidsd territorial	1	3	4	Riesgo Bajo	Personal encargado de la Etapa de Planeación. Estudio de sector	Etapa de Planeación	Finalización del proceso precontractual	Validación frente al estudio de mercado y estudios previos por parte del grupo de contratación	Por Evento
	Rompimiento del equilibrio económico del contrato.	5	General	Interno / Externo				X	X	2	4	6	Riesgo Alto	50%	50%	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	1	4	5	Riesgo medio	Personal encargado de la Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Revisión aleatoria de procesos contractuales	Trimestral
Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	6	General	Interno / Externo	X	X	X	X	X	1	4	5	Riesgo medio	100%	0%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Diario
Operacional	Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos	7	General	Interno	X	X	X	X		2	2	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de planeación	Fecha de Liquidación	Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento	Diario
	Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso	8	General	Interno	X			X		2	2	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor y/o Interventor	Etapa de planeación	Fecha de Liquidación	Informes de Supervisión	De conformidad con los plazos del contrato
	No suscripción del contrato por parte del contratista	9	General	Externo			X			3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Aplicación de la póliza de la garantía de seriedad de la oferta y/o normatividad vigente.	2	4	6	Riesgo Alto	Profesional encargado del proceso	Etapa Contratación	Etapa de Contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento
	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	10	General	Interno / Externo				X		3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	2	4	6	Riesgo Alto	Profesional encargado del proceso	Etapa Contratación	Etapa de Contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento
	Falta de expedición del registro presupuestal	11	General	Interno				X		2	5	7	Riesgo Alto	100%	0%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	4	5	Riesgo Medio	Profesional encargado del proceso	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	A través de la lista de chequeo	Por Evento
	Incumplimiento de la publicación del contrato	12	General	Interno			X			4	2	6	Riesgo Alto	100%	0%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	3	1	4	Riesgo Bajo	Profesional encargado del proceso	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Semanal
	Incumplimiento parcial, total o imperfecto por parte del contratista respecto de sus obligaciones y el alcance del objeto contractual.	13	General	Interno	X			X		3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	1) Garantiza la mitigación de los riesgos a través de cualquier garantía legalmente admisible conforme el conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, y en los términos del artículo 2.2.1.2.3.1.12 ibídem y demás aplicables ; 2) Aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal.	3	1	4	Riesgo Bajo	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Por Evento
	Perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado.	14	General	Interno	X			X		2	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	1) Garantiza la mitigación de los riesgos a través de cualquier garantía legalmente admisible conforme el conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de 2015, y en los términos del artículo 2.2.1.2.3.1.12 ibídem y demás aplicables ; 2) Aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal.	3	1	4	Riesgo Bajo	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Por Evento
	Suministro de mala calidad de los bienes ofrecidos por parte del contratista.	15	General	Interno	X			X		3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	1) Garantiza la mitigación de los riesgos a través de cualquier garantía legalmente admisible conforme el conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015 y demás aplicables ; 2) Aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal.	3	1	4	Riesgo Bajo	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Por Evento
	Liquidación del contrato de manera oportuna	16	General	Interno / Externo					X	2	2	4	Riesgo Bajo	50%	50%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapa ejecución	Etapa Pos-entrega	A través de la lista de chequeo	Semestral
Salud Y Seguridad en el Trabajo	No establecer requistos que demuestren de manera objetiva el nivel de implementacion de salud y seguridad en el trabajo ubicados en los estudios previos del proceso	17	Especifico	interno	x					3	4	7	Riesgo Extremo	100%	0%	Incluir dentro de los documentos del proceso por parte del area de Salud y Seguridad en el trabajo los requisitos que permitan identificar de manera objetiva si el oferente cumple con las obligaciones establecidas para el SG-SST.	1	1	2	Riesgo Bajo	Area estructuradora de salud y seguridad en el trabajo	Etapa precontractual	Etapa precontractual	En cada proceso contractual se establecen los requisito de salud y seguridad en el trabajo en los estudios previos	Por Evento
	Incumplimiento en la entrega de la documentacion solicitada que evidencie la implementacion del SG-SST.	18	Especifico	Externo				x		3	4	7	Riesgo Extremo	50%	50%	verificar los documentos aportados durante la ejecucion del contrato conforme a los requisitos establecidos en el estudio previo aportados pro el contratista.	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervicion del contrato	Etapa de Ejecución	Etapa de liquidaciòn	Con la verificacion del supervisor del cumplimiento de los requisitos en salud y seguridad en el trabajo	Por Evento
	Que se presenten documentos adulterados por parte de proponente que este participando en algun proceso contractual	19	Especifico	Externo				x		4	4	8	Riesgo Extremo	0%	100%	verificacion de los documentos aportados por el proponente en los entes correpondientes.	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervicion del contrato	Etapa precontractual	Etapa de liquidaciòn	Establecer en la supervision rigurosidad a la hora de verificar los documentos aportados por el proponente	Por Evento
	Incumplimiento en los requisitos solicitados por el centro de formación para el ingreso de proveedores al centro de formación.	20	Especifico	Externo				x		4	3	7	Riesgo Alto	0%	100%	Informar por medio de corre electronico al adjudicatario del contrato, los requisitos de ingreso al centro de formacion.	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervicion del contrato	Etapa de ejecucion	Etapa de Ejecución	Verificacion del cumplimiento de los requisitos de SST mediante correo electronico.	Por Evento
Financiero	Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas	21	General	Externo				X		3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro contratista. Estudiar la viabilidad de otorgar anticipos o pagos anticipados	2	3	5	Riesgo Medio	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Etapa de Selección	Análisis del Sector	En cada proceso contractual
Regulatorio	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad	22	Especifico	Externo	X	X	X	X		3	2	5	Riesgo medio	100%	0%	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2	1	3	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Mensual
	Falta de publicidad en los procesos de contratación	23	Especifico	interno	x		x			1	1	2	Riesgo Bajo	100%	0%	Revision por parte del grupo de contratacion responsables de estructurar el proceso en secop II y de quienes integran el flujo de aprobacion de los procesos contractuales.	1	1	2	Riesgo Bajo	profesionales del area de Contratacion de Bienes y Servicios, Abogado de Centro y Ordenador del gasto	Etapa de Planeaciòn	Etapa de contratacion	Mediante alertas del secop a los integrantes del flujo de aprobacion asi como las listas de chequeo de las modalidades de los procesos	Por proceso
	Falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión o interventoría.	24	Especifico	interno				x		1	1	2	Riesgo Bajo	100%	0%	Revision por parte del supervisor del cumplimiento de las obligaciones contractuales de cada proceso y su publicacion en la plataforma secopII	1	1	2	Riesgo Bajo	supervisor y/o interventor	Etapa de Ejecución	etapa de liquidacion	Mediante las publicacion de los informes de ejecucion de lo contratos y todos sus soportes.	Por Evento
De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse	25	General	Externo				X		3	2	5	Riesgo medio	50%	50%	N/A					Supervisor y/o Interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución		Por evento
Ambiental	Incumplimiento por parte del proveedor y/o falta de revisión y seguimiento a las obligaciones que emanan de cumplimiento a requisitos legales ambientales (Licencias, permisos, registros sanitarios).	26	Especifico	Interno	X	X		X		4	3	7	Riesgo Alto	50%	50%	Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos, durante las etapas de planeacion,selección y ejecución.	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable	Por Evento
	Falta de seguimiento a la implementacion de los requisitos Ambientales y Energeticos inmersos en el anexo de verificación criterios de contratación, durante las etapas precontractual y contratual.	27	Especifico	Interno	X	X	X	X	x	4	3	7	Riesgo Alto	100%	0%	seguimiento riguroso por parte del supervisor y/o apoyo del supervisor en la implementacion del anexo para garantizar el cumplimiento de los requisitos ambientales , de Salud y seguridad en el trabajo y Energeticos dependiendo de las caracteristicas del proceso.	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal responsable de la etapa de planeación y selección, Evaluador , Supervisor y/o Interventor	Etapa de Planeación	Etapa Pos-entrega	A traves de los informes de supervision.	Por Evento
	Desconocimiento por parte de los supervisores de contrato y/o apoyos de supervisión sobre los requisitos inmersos en el anexo de verificación criterios de contratación y su aplicabilidad según el tipo de contrato.	28	Especifico	Interno				x		5	3	8	riesgo extremo	100%	0%	incluir en el informe de supervision las listas de chequeo que confoman el anexo de verificacion de acuerdo a las caracteristicas del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	Supervisor y/o Interventor	Etapa de ejecucion	Etapa de liquidaciòn	A traves de los informes de supervision	De conformidad con la forma de pago
Tecnológico	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos	29	General	Interno / Externo	X	X	X	X		1	2	3	Riesgo Bajo	50%	50%	Establecer cronograma alternos para los posibles eventos de riesgo, requerir medios de comunicación alternos (mail, trunking), revisar la aplicabilidad de los procesos modernos a las normas vigentes	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de sus administradores	Por Evento


Proceso : Materiales de formación 2026 - SIP-STD-CIDT-0002-2026 (id.CO1.BDOS.10033020)

EN ANÁLISIS

Solicitud de información a los Proveedores
SIP-STD-CIDT-0002-2026 (En análisis)

Unidad de contratación CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO

PROVEEDORES



Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas que adelanta el CIDT vigencia 2026.

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de presentación de ofertas 12/03/2026 6:00 PM - **Fecha de publicación** 5/03/2026 2:58 PM

LÍNEA DE TIEMPO

Fecha de publicación de concurso	Plazo para solicitar aclaraciones	Presentación de ofertas
05/03/2026	11/03/2026	12/03/2026

LISTA DE OFERTAS

Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Presentada	Oferta
SOLICITUD DE COTIZACION SIP-STD-CIDT-0002-2026	SUCONEL	12/03/2026 3:36 PM	1.220.821

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Nuevo | Opciones

EVALUACIÓN

Opciones

OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

Contestar

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

MENSAJES

Crear

RE: AMPLIAR FECHA DE PRESENTACION PROPUESTA
SENA REGIONAL SANTAN... 9/03/2026 2:20 PM

AMPLIAR FECHA DE PRESENTACION PROPUESTA
SUMINISTROS Y CONTRO... 6/03/2026 10:41 AM

Ver más »

TAREAS

Crear

Sin tareas

MODIFICACIONES / ADENDAS

Crear

CO1.AMD.6039772
Razón: La presente modificación a la solicitud de información a proveedores se realiza con el fin de ampliar el cronograma establecido y adicionar un nuevo lote, con el propósito de garantizar una adecuada participación de los proveedores interesados y que se realice un estudio del sector aterrizado a los precios reales en el mercado.
9/03/2026 4:00 PM

Ver más »

PROVEEDORES SUSCRITOS

SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRÓNICOS S.
A
6/03/2026 10:38 AM

CIENCIA EDUCACION Y TECNOLOGIA LTDA
10/03/2026 4:54 PM

Ver más »

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: solicitud de cotización para estudio de mercado / 23/02/2026 7:30 AM (UTC -5 horas)((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobar publicación de la solicitud de información
Paso 1 - Con orden - (0)
Tarea Tarea:LAURA VANESSA GUEVARA URIBE
Tarea Tarea:Elmer Fair Santana Rojas

EVENTOS DEL PROCESO

Oportunidad CO1.OPDOS.29576946 fue consultado por el Proveedor ESPUMADOS S.A..
ESPUMADOS S.A.
13/03/2026 7:18 AM

El proceso CO1.BDOS.10033020 ha cambiado de Solicitud información publicada a En análisis.
Sistema
12/03/2026 6:00 PM

El proceso CO1.REQ.10200580cambiado de estado Solicitud información publicada a En análisis.
Sistema
12/03/2026 6:00 PM

Oportunidad CO1.OPDOS.29476563 fue consultado por el Proveedor SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRÓNICOS S.A.
SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRÓNICOS S.A
12/03/2026 3:36 PM

La información CO1.RPL.5501205 fue presentada
SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRÓNICOS S.A
12/03/2026 3:36 PM


Ver más »

☆Proceso : Materiales de formación 2026 - Agrotronica - SIP-STD-CIDT-0007-2026 (id.CO1.BDOS.10088499) EN ANÁLISIS

Solicitud de información a los Proveedores
SIP-STD-CIDT-0007-2026 (En análisis)

PROVEEDORES

Unidad de contratación CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO



Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas que adelanta el CIDT vigencia 2026.

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de presentación de ofertas 16/03/2026 6:00 PM - **Fecha de publicación** 12/03/2026 3:54 PM

LÍNEA DE TIEMPO

Fecha de publicación de concurso	Plazo para solicitar aclaraciones	Presentación de ofertas
12/03/2026	13/03/2026	16/03/2026

LISTA DE OFERTAS
Opciones

Ver más »

EVALUACIÓN ECONÓMICA
Nuevo | Opciones

EVALUACIÓN
Opciones

OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES
Contestar

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

MENSAJES
Crear

Sin mensajes

TAREAS
Crear

Sin tareas

MODIFICACIONES / ADENDAS
Crear

No tiene ninguna modificación

PROVEEDORES SUSCRITOS

Sin proveedores interesados

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: solicitud de cotización para estudio de mercado / 11/03/2026 5:04 PM (UTC -5 horas)((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobar publicación de la solicitud de información
Paso 1 - Con orden - (0)
Tarea Tarea:LAURA VANESSA GUEVARA URIBE
Tarea Tarea:Elmer Fair Santana Rojas

EVENTOS DEL PROCESO

El proceso CO1.BDOS.10088499 ha cambiado de Solicitud información publicada a En análisis.
Sistema
16/03/2026 6:01 PM

El proceso CO1.REQ.10258714cambiado de estado Solicitud información

publicada a En análisis.
Sistema
16/03/2026 6:01 PM

Oportunidad CO1.OPDOS.29585913 fue consultado por el Proveedor JOSBEING SAS.
JOSBEING SAS
13/03/2026 1:03 PM

El proveedor cancelo la suscripción en el proceso CO1.NTC.10119089.
JOSBEING SAS
13/03/2026 1:03 PM

Oportunidad CO1.OPDOS.29585913 fue consultado por el Proveedor JOSBEING SAS.
JOSBEING SAS
13/03/2026 1:00 PM

Ver más »
