



| | | | |
|--|-----------------|--------|---------|
| ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO | | | |
| SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) | | | |
| Código | CCE-EICP-IDI-10 | Página | 1 de 19 |
| Versión No. | 5 | | |

**ANEXO 5
MINUTA DEL CONTRATO**

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|--------------|--|
| CLÁUSULA 1. | DEFINICIONES |
| CLÁUSULA 2. | OBJETO |
| CLÁUSULA 3. | ALCANCE DEL OBJETO |
| CLÁUSULA 4. | PLAZO DEL CONTRATO |
| CLÁUSULA 5. | VALOR DEL CONTRATO |
| CLÁUSULA 6. | ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO |
| CLÁUSULA 7. | APROPIACIÓN PRESUPUESTAL |
| CLÁUSULA 8. | FORMA DE PAGO |
| CLÁUSULA 9. | OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA |
| CLÁUSULA 10. | OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA |
| CLÁUSULA 11. | DERECHOS DEL CONTRATISTA |
| CLÁUSULA 12. | OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD |
| CLÁUSULA 13. | RESPONSABILIDAD |
| CLÁUSULA 14. | INDEMNIDAD |
| CLÁUSULA 15. | MULTAS |
| CLÁUSULA 16. | CLÁUSULA PENAL |
| CLÁUSULA 17. | CLÁUSULAS EXCEPCIONALES |
| CLÁUSULA 18. | GARANTÍAS |
| CLÁUSULA 19. | INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA |
| CLÁUSULA 20. | INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA |
| CLÁUSULA 21. | CESIÓN |
| CLÁUSULA 22. | LIQUIDACIÓN |
| CLÁUSULA 23. | SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN |
| CLÁUSULA 24. | LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL |
| CLÁUSULA 25. | DOCUMENTOS |

| | | | |
|--------|-----------------|---------|---|
| Código | CCE-EICP-IDI-10 | Versión | 4 |
|--------|-----------------|---------|---|





| ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO | | | |
|--|-----------------|--------|---------|
| SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) | | | |
| Código | CCE-EICP-IDI-10 | Página | 2 de 19 |
| Versión No. | 5 | | |

| ACTO CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS | NUMERO 916-2026 | FECHA: ABRIL DE 2026 |
|--|---|--|
| CONTRATISTA | ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S- EDYCONST S.A.S Nit No 900354156-4 CARLOS ANDRES NIETO LAGUNA No 11.226.681 | |
| DIRECCION: | DIAGONAL 8 N 32 - 36 BRR BLANCO | |
| CIUDAD: | GIRARDOT- CUNDINAMARCA | |
| TELEFONO: | 3115571381 | CORREO ELECTRÓNICO: edyconst@hotmail.com |
| INFORMACION TRIBUTARIA | | |
| PERSONA JURIDICA | RÉGIMEN TRIBUTARIO 05- Impto renta y compl régimen ordinar 07- Retención en la fuente a título de rent 14- Informante de exógena 42- Obligado a llevar contabilidad 48- impuesto sobre las ventas- IVA 52- Facturador Electrónico 55- Informante de Beneficiarios Finales | FECHA RUT 2026 - 01- 20 |
| PLAZO | El contrato a suscribir tendrá un plazo de ejecución de TRES (3) MESES , Contado a partir del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización y cumplimiento de la fase de instalación por parte del contratista, sin superar la vigencia 2026. | |
| VALOR | TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$399.292.467) M/CTE y los impuestos obligatorios de ley y demás emolumentos a que haya lugar | |
| OBJETO | CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD y DEMARCACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA. | |
| SUPERVISOR | YEISON CAMILO TORRES DUQUE- SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE | |

| | | | |
|--------|-----------------|---------|---|
| Código | CCE-EICP-IDI-10 | Versión | 4 |
|--------|-----------------|---------|---|





| ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO | | | |
|--|-----------------|--------|---------|
| SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) | | | |
| Código | CCE-EICP-IDI-10 | Página | 3 de 19 |
| Versión No. | 5 | | |

Entre el **MUNICIPIO DE GIRARDOT**, identificado con NIT 890.680.378 – 4, representado legalmente por **SALOMON SAID ARIAS**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 11.206.736 de Girardot, quien para efectos del presente contrato en calidad de Alcalde Municipal, debidamente posesionado mediante Acta No. 05 de fecha 27 de Diciembre de 2023 expedida por la Notaria Primera del Círculo de Girardot (en adelante la "Entidad"), por una parte; y, por la otra **ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S- EDYCONST S.A.S**, identificada con Nit No 900354156-4, representada legalmente por el señor **CARLOS ANDRES NIETO LAGUNA**, identificada con cedula de Ciudadanía No 11.226.681, (en adelante el "Contratista"), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

- I. Que mediante **Resolución No. 0756 del 20 de Marzo de 2026** la Entidad abrió el Proceso de Contratación número No. **SAMC-003-2026**
- II. Que mediante **Resolución No. 1259 del 16 de abril de 2026**, la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la "Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el presente Contrato se registrará por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLÁUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es **"CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y DEMARCAACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA"**

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. **SAMC-003-2026**, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

| | | | |
|--------|-----------------|---------|---|
| Código | CCE-EICP-IDI-10 | Versión | 4 |
|--------|-----------------|---------|---|





| ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO | | | |
|--|-----------------|--------|---------|
| SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) | | | |
| Código | CCE-EICP-IDI-10 | Página | 4 de 19 |
| Versión No. | 5 | | |

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de **TRES (3) MESES**, contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de **TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$399.292.467) M/CTE** y los impuestos obligatorios de ley y demás emolumentos a que haya lugar, equivalentes a **228.0492 SMLMV** para el año de suscripción del contrato 2026 suma que se discrimina de la siguiente manera:

| | | | |
|--------|-----------------|---------|---|
| Código | CCE-EICP-IDI-10 | Versión | 4 |
|--------|-----------------|---------|---|





| ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO | | | |
|--|-----------------|--------|---------|
| SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) | | | |
| Código | CCE-EICP-IDI-10 | Página | 6 de 19 |
| Versión No. | 5 | | |

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado. ✓

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: ✓

- Disponibilidad presupuestal expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal No. 2026000064 del 08 de Enero de 2026.

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Alcaldía Municipal cancelará el valor del contrato así:

1. Pagos parciales: el municipio de Girardot cancelara el valor del contrato hasta un 90% mediante actas parciales según avance de la ejecución del contrato y aprobación de la supervisión, previa presentación de los siguientes documentos:

- factura o cuenta de cobro ✓
- Informe de ejecución de las actividades contractuales ✓
- Soportes de cumplimiento de las obligaciones con el sistema general de seguridad social (sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello haya lugar), respecto a sus trabajadores de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y al Decreto 1703 del 2 de agosto del 2002. ✓
- ⊙ Acta de verificaciones y coordinación para la entrega de cada uno de los ítems, y de entrega con registro fotográfico.
- ⊙ Recibido a satisfacción por parte del supervisor designado.

2. Pago final: el municipio de Girardot cancelara un pago final correspondiente al 10% del contrato contra suscripción del acta de liquidación por parte de la supervisión del municipio.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

| | | | |
|--------|-----------------|---------|---|
| Código | CCE-EICP-IDI-10 | Versión | 4 |
|--------|-----------------|---------|---|





| ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO | | | |
|--|-----------------|--------|---------|
| SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) | | | |
| Código | CCE-EICP-IDI-10 | Página | 7 de 19 |
| Versión No. | 5 | | |

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en el estudio previo, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior del diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, que no podrá superar el treinta por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal para la ejecución del contrato.

2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom' o gitana; entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

| | | | |
|--------|-----------------|---------|---|
| Código | CCE-EICP-IDI-10 | Versión | 4 |
|--------|-----------------|---------|---|





| ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO | | | |
|--|-----------------|--------|---------|
| SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) | | | |
| Código | CCE-EICP-IDI-10 | Página | 8 de 19 |
| Versión No. | 5 | | |

El supervisor o Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al supervisor o el Interventor dentro de los Cinco (5) días siguientes contados a partir del acta de inicio.

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Opción 1:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar

| | | | |
|--------|-----------------|---------|---|
| Código | CCE-EICP-IDI-10 | Versión | 4 |
|--------|-----------------|---------|---|





| ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO | | | |
|--|-----------------|--------|---------|
| SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) | | | |
| Código | CCE-EICP-IDI-10 | Página | 9 de 19 |
| Versión No. | 5 | | |

- que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
 14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
 15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
 16. El contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) hábiles siguientes a la suscripción del contrato.
 17. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes actividades:
 - Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.
 - Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista cuente con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos.
 - Realizar acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educación alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a lo establecido en los planes de Gestión Social, para lo cual se podrá gestionar espacios de formación a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre otras.
 18. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.
 19. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.
 20. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.
 21. Acreditar de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de

| | | | |
|--------|-----------------|---------|---|
| Código | CCE-EICP-IDI-10 | Versión | 4 |
|--------|-----------------|---------|---|





| ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO | | | |
|--|-----------------|--------|----------|
| SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) | | | |
| Código | CCE-EICP-IDI-10 | Página | 10 de 19 |
| Versión No. | 5 | | |

- salud, riesgos laborales pensiones, cajas de compensación familiar ICBF, SENA, cuando a ello haya lugar.
22. Constituir la garantía única que avale las obligaciones surgidas del contrato de acuerdo a los amparos solicitados; así como ampliar y modificar sus vigencias en los eventos en que conforme a la Ley lo solicite el MUNICIPIO.
 23. Cumplir con las obligaciones consagradas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.
 24. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, y en la etapa post-contractual evitando las dilaciones y entramamientos que pudieren presentarse.
 25. El contratista se compromete a mantener indemne al MUNICIPIO de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista.
 26. Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecución del contrato.
 27. Guardar la debida reserva y confidencialidad en relación con los documentos y demás información que le sea suministrada por EL MUNICIPIO.

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

1. El oferente debe cumplir con la entrega e instalación de los elementos cumpliendo con las características técnicas descritas y exigidas por el Municipio.
2. Los elementos entregados e instalados por el contratista deben ser de excelente calidad y durabilidad, además de cumplir con las normas legales vigentes para cada uno de los ítems.
3. Deberá garantizar la buena calidad de los productos y proceder de inmediato se le notifique al proveedor, la reposición de aquellos productos que no cumplan con las especificaciones y calidad requerida.
4. El contratista se obliga a desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos por la entidad.
5. El contratista deberá contar con el personal mínimo requerido, maquinaria y equipo exigidos en los pliegos para el cumplimiento del objeto contractual, así como los elementos de bioseguridad
6. Cumplir con el objeto en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con el pliego de condiciones y la propuesta presentada por el proponente favorecido.
7. Garantizar la permanencia de los diferentes frentes de trabajo.
8. Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta y atender los requerimientos del supervisor del contrato.
9. Recibir por parte del municipio para el cumplimiento de las obligaciones pactadas las instalaciones donde se desarrollarán las obras de construcción objeto de este contrato. Tal circunstancia se hará constar en un acta donde se indique el estado de las diferentes áreas de trabajo, las áreas intervenidas o no y el estado de estas; dicha acta será suscrita por el supervisor, el contratista y el Municipio y hará parte integral del presente contrato, junto con los documentos fotográficos en los que conste el estado en que se entrega las áreas.
10. Ejecutar las obras e instalaciones objeto de este contrato a los precios y condiciones señalados en su propuesta, ciñéndose a las normas técnicas nacionales y a rehacer a su expensa cualquier obra que resultare mal ejecutada a juicio del supervisor.
11. Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza.

| | | | |
|--------|-----------------|---------|---|
| Código | CCE-EICP-IDI-10 | Versión | 4 |
|--------|-----------------|---------|---|





| ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO | | | |
|--|-----------------|--------|----------|
| SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) | | | |
| Código | CCE-EICP-IDI-10 | Página | 11 de 19 |
| Versión No. | 5 | | |

12. Ejecutar en su totalidad el objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones y cantidades establecidas por la entidad y acorde a las normas técnicas establecidas para tal efecto por INVIAS.
13. Reparar las vías o andenes cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución del objeto contratado.
14. Responder frente a la Entidad Territorial y frente a terceros por todo daño que cause con ocasión de la ejecución del presente contrato.
15. El Contratista deberá mantener los precios unitarios sin formula de reajuste ofertados durante el plazo de ejecución del contrato.
16. Todas aquellas obligaciones que se requieran para satisfacer totalmente las necesidades de la entidad relacionadas con el objeto contractual.

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad está obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.
4. Exigir al contratista la ejecución idónea del objeto contratado.
5. Aprobar la garantía única que en debida forma constituya el contratista.
6. Cancelar al contratista, el valor del contrato de acuerdo con la forma de pago, en los términos previstos en el presente proceso.
7. Vigilar la correcta ejecución del contrato, a través del supervisor designado.
8. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el proponente elegido de conformidad con los pliegos de condiciones y demás documentos que la integran.
9. Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido en los términos consagrados por la Ley.
10. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.
11. Verificar si el contratista se encuentra afiliado y al día con el último pago al sistema de seguridad social integral.

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD

| | | | |
|--------|-----------------|---------|---|
| Código | CCE-EICP-IDI-10 | Versión | 4 |
|--------|-----------------|---------|---|





| ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO | | | |
|--|-----------------|--------|----------|
| SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) | | | |
| Código | CCE-EICP-IDI-10 | Página | 12 de 19 |
| Versión No. | 5 | | |

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA acuerda y se obliga en forma irrevocable a mantener indemne al MUNICIPIO de cualquier tipo de reclamación proveniente de terceros, que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, en desarrollo del objeto contractual.

CLÁUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el Diez (10)% de mano de obra no calificada de la región causará multas equivalentes a (1 SMMLV) por cada día de Incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el Cinco (5) % de la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato", causará multas equivalentes a (1 SMMLV) por cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causarán multas equivalentes a (1 SMMLV) por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

1. Se impondrá una multa equivalente a (1 SMMLV) cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.

2. Así mismo, cuando el Interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omite presentarla, se causarán multas equivalentes a (1 SMMLV) por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas:

Causales:

| | | | |
|--------|-----------------|---------|---|
| Código | CCE-EICP-IDI-10 | Versión | 4 |
|--------|-----------------|---------|---|





| ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO | | | |
|--|-----------------|--------|----------|
| SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) | | | |
| Código | CCE-EICP-IDI-10 | Página | 13 de 19 |
| Versión No. | 5 | | |

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.
4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
6. Por incumplir las órdenes dadas por la supervisión el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
8. Por cambiar el personal presentado a la supervisión sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.
9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 1 salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

| | | | |
|--------|-----------------|---------|---|
| Código | CCE-EICP-IDI-10 | Versión | 4 |
|--------|-----------------|---------|---|





| ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO | | | |
|--|-----------------|--------|----------|
| SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) | | | |
| Código | CCE-EICP-IDI-10 | Página | 14 de 19 |
| Versión No. | 5 | | |

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.

Opción 1:

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato.

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS

| | | | |
|--------|-----------------|---------|---|
| Código | CCE-EICP-IDI-10 | Versión | 4 |
|--------|-----------------|---------|---|





| ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO | | | |
|--|-----------------|--------|----------|
| SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) | | | |
| Código | CCE-EICP-IDI-10 | Página | 15 de 19 |
| Versión No. | 5 | | |

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

| Característica | Condición | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------------|-----------------|---|-----------------------------------|----------------------------|---|---|---------------------------|---|--|----------------------------|
| Clase | Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. | | | | | | | | | | | | |
| Asegurado/ beneficiario | Municipio de Girardot identificado con NIT 890680378-4 | | | | | | | | | | | | |
| Amparos, vigencia y valores asegurados | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>Vigencia</th> <th>Valor Asegurado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td> <td>Hasta la liquidación del contrato</td> <td>10% del valor del contrato</td> </tr> <tr> <td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato</td> <td>Plazo del contrato y tres (3) años más.</td> <td>5% del valor del contrato</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td> <td>Cuya vigencia será de un (01) año contados a partir del acta de recibo final</td> <td>10% del valor del contrato</td> </tr> </tbody> </table> | Amparo | Vigencia | Valor Asegurado | Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan | Hasta la liquidación del contrato | 10% del valor del contrato | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato | Plazo del contrato y tres (3) años más. | 5% del valor del contrato | Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción | Cuya vigencia será de un (01) año contados a partir del acta de recibo final | 10% del valor del contrato |
| | Amparo | Vigencia | Valor Asegurado | | | | | | | | | | |
| | Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan | Hasta la liquidación del contrato | 10% del valor del contrato | | | | | | | | | | |
| | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato | Plazo del contrato y tres (3) años más. | 5% del valor del contrato | | | | | | | | | | |
| Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción | Cuya vigencia será de un (01) año contados a partir del acta de recibo final | 10% del valor del contrato | | | | | | | | | | | |
| Tomador | <ul style="list-style-type: none"> Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------|-----------------|---------|---|
| Código | CCE-EICP-IDI-10 | Versión | 4 |
|--------|-----------------|---------|---|





| ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO | | | |
|--|-----------------|--------|----------|
| SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) | | | |
| Código | CCE-EICP-IDI-10 | Página | 16 de 19 |
| Versión No. | 5 | | |

| Característica | Condición |
|---|---|
| | su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. |
| Información necesaria dentro de la póliza | <ul style="list-style-type: none"> • Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es \$14.980.420,20 aproximar a \$14.980.421 |

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de **garantía de UN (1) AÑO** contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

| | | | |
|--------|-----------------|---------|---|
| Código | CCE-EICP-IDI-10 | Versión | 4 |
|--------|-----------------|---------|---|





| ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO | | | |
|--|-----------------|--------|----------|
| SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) | | | |
| Código | CCE-EICP-IDI-10 | Página | 17 de 19 |
| Versión No. | 5 | | |

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:

| Característica | Condición |
|---|---|
| Clase | Contrato de seguro contenido en una póliza |
| Asegurados | Municipio de Girardot identificado con NIT 890680378-4 y el contratista |
| Tomador | <ul style="list-style-type: none"> Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. |
| Valor | 200 SMMLV |
| Vigencia | Igual al período de ejecución del contrato. |
| Beneficiarios | Terceros afectados y el Municipio de Girardot identificado con NIT 890680378-4 |
| Amparos | Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. |
| Información necesaria dentro de la póliza | <ul style="list-style-type: none"> Número y año del contrato Objeto del contrato Firma del representante legal del contratista En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es \$14.980.420,20 aproximar a \$14.980.421 |

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

| | | | |
|--------|-----------------|---------|---|
| Código | CCE-EICP-IDI-10 | Versión | 4 |
|--------|-----------------|---------|---|





| ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO | | | |
|--|-----------------|--------|----------|
| SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) | | | |
| Código | CCE-EICP-IDI-10 | Página | 18 de 19 |
| Versión No. | 5 | | |

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad; ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLÁUSULA 21. CESIÓN

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN

| | | | |
|--------|-----------------|---------|---|
| Código | CCE-EICP-IDI-10 | Versión | 4 |
|--------|-----------------|---------|---|





| ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO | | | |
|--|-----------------|--------|----------|
| SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) | | | |
| Código | CCE-EICP-IDI-10 | Página | 19 de 19 |
| Versión No. | 5 | | |

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de **Cuatro (04) Meses**.

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en MUNICIPIO DE GIRARDOT- CUNDINAMARCA y el domicilio contractual es MUNICIPIO DE GIRARDOT- CUNDINAMARCA.

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS


Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE IMPRESIÓN NI FIRMA.
 El presente documento se entenderá perfeccionado con la aceptación de las partes en el SECOP II o en la plataforma equivalente y conforme a la legislación aplicable.

| | | | |
|--------|-----------------|---------|---|
| Código | CCE-EICP-IDI-10 | Versión | 4 |
|--------|-----------------|---------|---|



| | | | |
|---|---------------------------------------|--|------------------|
|  Alcaldía de Girardot | ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT | | Código: CR08 |
| | ACTA DE INICIO | | Version: 2 |
| | | | Año: 2023 |
| | | | Copia controlada |

| | | | | | |
|-------|----|----|-------|----|------|
| FECHA | 29 | DE | Abril | DE | 2026 |
|-------|----|----|-------|----|------|

| GRADO DE RESPONSABILIDAD | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida. | |
| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | |
| CONTRATO: | 916-2026 |
| OBJETO: | "CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y DEMARCACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA" |
| CONTRATISTA: | ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S. |
| NIT/C.C.: | 900354156-4 |
| CDP: | 2026000064 |
| RP: | 2026001459 |
| VALOR: | TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MC (\$399.292.467) |
| PLAZO: | TRES (3) MESES |
| FECHA DE TERMINACION: | 28 DE JULIO DE 2026 |

CONSIDERANDO:

• Teniendo en cuenta que el contrato se encuentra perfeccionado y se expidió el correspondiente Registro Presupuestal, de acuerdo con la **CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA**, proceden el supervisor y el contratista a suscribir la presente Acta de Inicio.

ACUERDAN:

Fijar como fecha de inicio del contrato de la referencia el día Veintinueve (29) de abril de 2026; por lo tanto, la fecha de terminación será el día Veintiocho (28) de julio de 2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron,

POR EL MUNICIPIO;




YEISON CAMILO TORRES DUQUE
Secretario de Tránsito y Transporte
Supervisor

POR EL CONTRATISTA;



CARLOS ANDRES NIETO LAGUNA
Cedula de Ciudadanía 11.626.681 de Girardot
Representante Legal Estudios y Diseños Carlos Nieto
Nit: 900354156-4



| | | |
|---|--|------------------|
|  MUNICIPIO DE GIRARDOT | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Código: GRF09 |
| | FORMATO: REGISTRO PRESUPUESTAL | Versión: V0 |
| | | Año : 2019 |
| | | COPIA CONTROLADA |

RES-2026001459

Nit: 890680378-4

viernes, 24 de abril de 2026

EL SECRETARIA DE HACIENDA - SECCION DE PRESUPUESTO

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

CONTRATO No. 916-2026. CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINSITRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL REDUCTORES DE VELOCIDAD Y DEMARCACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA

| | | | |
|-------------------|--|------------|-----------|
| A FAVOR DE | ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S | NIT | 900354156 |
|-------------------|--|------------|-----------|

| | | |
|-----------------------|-----|------------|
| DISPONIBILIDAD | DIS | 2026000064 |
|-----------------------|-----|------------|

IMPUTACION PRESUPUESTAL

| RUBRO / FUENTE | NOMBRE DEL RUBRO | TERCERO | VALOR |
|---|---|--|----------------|
| 2.4.24.2409013.20242530700 34.MT212.12322511 | APOYO A LA PROMOCION DE PLANES Y PROGRAMAS PARA LA PRESTACION DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT, CUNDINAMARCA - FUENTE: 12322511-MULTAS DE TRANSITO Y TRANSPORTE C.S.F. | ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S | 100,000,000.00 |
| 2.4.24.2409013.20242530700 34.MT212.124303 | APOYO A LA PROMOCION DE PLANES Y PROGRAMAS PARA LA PRESTACION DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT, CUNDINAMARCA - FUENTE: 124303-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S | 299,292,467.00 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL | 399,292,467.00 |
|------------------------------------|-----------------------|

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MC.

Se expide en GIRARDOT a los 24 días del mes de Abril de 2026



JOHN HARRY AVENDAÑO OCHOA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO COD 222

Elaboró: LIDA.GONZALEZ

Modificó: *WASB*



Alcaldía de Girardot

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Código : GFR12

FORMATO: SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Versión : V4

Año : 2024

COPIA CONTROLADA

FECHA DE SOLICITUD

08 ENF 2026

SOLICITUD No.

1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA

SECRETARIA DE TRANSITO DE GIRARDOT

SECTOR

24

PRODUCTO

2409013

BPIN

2024253070034

META

MT212

FUENTE

12322511

CODIGO PRESUPUESTAL

2.4.24.2409013.2024253070034.MT212.12322511 - \$100.000.000

SECTOR

24

PRODUCTO

2409013

BPIN

2024253070034

META

MT212

FUENTE

124303

CODIGO PRESUPUESTAL

2.4.24.2409013.2024253070034.MT212.124303 - \$ 300.000.000

NOMBRE SECRETARIO DE DESPACHO O JEFE DE DEPENDENCIA

YEISON CAMILO TORRES

ESTA SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SE SOLICITA COMO REQUISITO PREVIO EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS VIGENTES EN MATERIA PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL CON EL FIN DE GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION PARA PODER ASUMIR UN COMPROMISO

2. DESCRIPCIÓN:

CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y DEMARCACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA

3. VALOR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SOLICITADA:

VALOR (\$)

400,000,000

LETRAS

CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS

4. PLAZO


TRES (3) MESES

5. VISTO BUENO AUTORIZADO POR EL ORDENADOR DEL GASTO Y EL JEFE DE LA DEPENDENCIA

SALOMON SAID ARIAS
ORDENADOR DEL GASTO
ALCALDE MUNICIPAL

YEISON CAMILO TORRES
SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

V.B ASESOR DESPACHO DEL ALCALDE





GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Código: GRF08
 Versión: V0
 Año : 2019
 COPIA CONTROLADA

DIS-2026000064

Nit: 890680378-4

jueves, 8 de enero de 2026

EL SECRETARIA DE HACIENDA - SECCION DE PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2026 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

| OBJETO | | |
|---|---|----------------|
| CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINSITRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL REDUCTORES DE VELOCIDAD Y DEMARCAACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA | | |
| RUBRO - FUENTE | NOMBRE | VALOR |
| SECT: 24 PROG: 2409 PROD: 2409013 CPC: 83990 | Transporte seguridad de transporteTRANSPORTE Infraestructura de transporte para la seguridad vialTRANSPORTEseguridad de transporte Otros servicios profesionales tecnicos y empresariales n c pSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION URBANISMO JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD) | |
| META: MT212 BPIN: 2024253070034 | | |
| 2.4.24.2409013.2024253070034.MT212.12322511 | APOYO A LA PROMOCION DE PLANES Y PROGRAMAS PARA LA PRESTACION DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT, CUNDINAMARCA - FUENTE: 12322511-MULTAS DE TRANSITO Y TRANSPORTE C.S.F. | 100,000,000.00 |
| SECT: 24 PROG: 2409 PROD: 2409013 CPC: 83990 | Transporte seguridad de transporteTRANSPORTE Infraestructura de transporte para la seguridad vialTRANSPORTEseguridad de transporte Otros servicios profesionales tecnicos y empresariales n c pSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION URBANISMO JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD) | |
| META: MT212 BPIN: 2024253070034 2024253070034 | Herramientas de señalización instaladas | |
| 2.4.24.2409013.2024253070034.MT212.124303 | APOYO A LA PROMOCION DE PLANES Y PROGRAMAS PARA LA PRESTACION DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT, CUNDINAMARCA - FUENTE: 124303-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | 300,000,000.00 |
| TOTAL CDP | | |
| SON: | CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MC. | 400,000,000.00 |

Elaboró JOHN.AVENDAÑO
 Modificó:



MUNICIPIO DE GIRARDOT

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Código: GRF08

Versión: V0

Año : 2019

COPIA CONTROLADA

DIS-2026000064

Nit: 890680378-4

jueves, 8 de enero de 2026

SOLICITANTE


| | |
|--------------|-------------------------------------|
| DEPENDENCIA: | SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE |
| RESPONSABLE: | YEISON CAMILO TORRES DUQUE |
| CARGO: | SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE |

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta:

31/12/2026

JOHN HARRY AVENDAÑO OCHOA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO COD 222

Elaboró JOHN AVENDAÑO
Modificó:

| | | |
|---|--|------------------|
|  Alcaldía de Girardot | ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT Secretaría de Planeación | Código: PIR07 |
| | Certificado de Inscripción, Registro, Actualización, de Proyectos de Inversión Municipal en el Banco de Programas y Proyectos De Inversión Municipal | Version: 3 |
| | | Año: 2024 |
| | | Copia Controlada |

EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT DEPARTAMENTO DE GUNDINAMARCA

CERTIFICA QUE:

Que el Proyecto 2024253070034, "APOYO A LA PROMOCIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS PARA LA PRESTACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT, CUNDINAMARCA", Se encuentra incluido y en concordancia con el Plan Desarrollo Municipal "GIRARDOT SOCIALMENTE JUSTA" y vincula la siguiente estructura;

LINEA ESTRATEGICA: GIRARDOT COMPETITIVA E INNOVADORA

NOMBRE DEL PROGRAMA: Prestación de servicios de transporte público de pasajeros Seguridad de Transporte

El presente proyecto es viable metodológicamente y es coherente con las políticas de los planes de desarrollo municipal y se radica para su Inscripción y Registro o Actualización en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal con el Número 2024253070034.

Se expide en el Municipio de Girardot, Enero 2026.


MARIA ISBETH CARDENAS VERGAÑO
 Secretaria de Planeación


MARIA LILIA ALDANA HERNÁNDEZ
 Profesional Universitario (E)



EL SUSCRITO ALMACENISTA GENERAL DEL MUNICIPIO GIRARDOT CUNDINAMARCA

CERTIFICA:

Que el Objeto "CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y DEMARCACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA.", se encuentra incluido dentro del Plan Anual de Adquisiciones Vigencia 2026, ubicado en la línea No. (LN1513) y aprobado mediante Decreto No. 0006 del 02 de enero de 2026.

| Código UNEPSC | Descripción | Fecha estimada de inicio de proceso de selección | Fecha estimada de presentación de ofertas | Duración del contrato | Modalidad de selección | Fuente de los recursos | Valor total estimado |
|--|---|--|---|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|
| 72103300 72141000 72151300 40161500 81102201 40161504 | (LN1513) CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y DEMARCACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA. | Febrero | Febrero | 3 Mes (s) | Selección abreviada menor cuantía | Recursos propios | 400.000.000 COP |

En constancia de lo anterior se firma en Girardot, Cundinamarca, en el mes de Enero de 2026.


JUAN DAVID BETANCOURT RODRIGUEZ
Almacenista General Código 215 Grado 01


VoBo Yelson Camilo Torres Duque
CARGO: Secretario De Tránsito Y Transporte





STTG.170.47.

EL SUSCRITO SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE GIRARDOT

CERTIFICA

Que recibió satisfactoriamente de **ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S.**, identificado con NIT 900.354.156-4, por concepto de **“CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD y DEMARCAACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA”**, contrato No 916 2026, dentro del plazo establecido del contrato:

- Factura electrónica de venta No EDDY 2447 por valor de **Ciento Once Millones Quinientos Diecinueve Mil Quinientos pesos (\$119.519.500) M/CTE.**
- Soporte de salud y pensión al día; los cuales hacen parte integral del presente documento, lo anterior en cumplimiento a lo conforme en la minuta del contrato 916 2026.

Esta solicitud se expide a solicitud del interesado para los fines pertinentes.

YEISON CAMILO TORRES DUQUE
Secretario de Tránsito y Transporte

Revisó: **LUIS RAÚL SALAS NUÑEZ**
Cargo: Abogado Contratista STTG.





**ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT
INFORME DE SUPERVISIÓN**

| | |
|------------------|-------|
| Código | GFR06 |
| Versión | 1 |
| Año | 2022 |
| Copia Controlada | |

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Nombre del (la) Contratista: **EDYCONST SAS (ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS)**

Tipo de Contrato: **CONTRATO DE OBRA**

Contrato N°: **916** DE **2026** OBJETO: **CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y DEMARCACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA**

Documento de Identidad: **NIT** N° **900354156-4**

Nombre de Supervisor(a) o Interventor(a): **YEISON CAMILO TORRES DUQUE**

Cargo Supervisor(a) (c) o Interventor(a): **SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE GIRARDOT**

INFORMACIÓN FINANCIERA

Numero cuenta del (a) Contratista: **65967156099** Entidad: **BANCOLOMBIA** Tipo cuenta: **CUENTA AHORROS**

Fecha de inicio (Según Acta): **29-abr-2026** Plazo de Ejecución: **3** meses y **0** días

Fecha de terminación (Incluye prórrogas): **28-jul-2026**

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Valor Inicial del contrato | 399.292.467 | Prórrogas | Días |
| Adición 1 | | Prórroga 1 | |
| Adición 2 | | Prórroga 2 | |
| Adición 3 | | Prórroga 3 | |
| Reducción | | Prórroga 4 | |
| Valor total del contrato | 399.292.467 | | |

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

| No. Certificado Disponibilidad Presupuestal | No. Registro Presupuestal | Fecha Registro Presupuestal | Código Rubro Presupuestal | Valor a pagar por Rubro Presupuestal en el presente pago |
|---|---------------------------|-----------------------------|---|--|
| 2026000064 | 2026001459 | ABRIL 24 DE 2026 | 2 4 24 2409013 2024253070034 MT212 124303 | \$ 148 320 935,00 |
| | | | | |
| | | | | |

INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

| | | | | | |
|------------------|---|-----------------|---------------|--------------------|------------|
| Salud 12,5% | CERTIFICACION REPRE LEGAL Y CONT. PUBLICO | EPS | CERTIFICACION | Numero de planilla | 9504704533 |
| Pension 16% | CERTIFICACION REPRE LEGAL Y CONT. PUBLICO | Fondo Pensiones | CERTIFICACION | Numero de planilla | 9504704533 |
| Restos Laborales | CERTIFICACION REPRE LEGAL Y CONT. PUBLICO | ARI | CERTIFICACION | Numero de planilla | 9504704533 |
| FSP *** | | Fondo pensiones | | Numero de planilla | |

***Nota: El pago del Fondo de Solidaridad Pensional - FSP, aplica únicamente cuando la base de cotización es mayor a 4 SMMVL

INFORMACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN DEL PAGO

| No. PAGO | PERIODO DE PAGO | | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | VALOR PAGADO | VALOR A PAGAR CON IVA | POLIZAS | VALOR TOTAL A PAGAR | SALDO POR PAGAR |
|----------|-----------------|-----------|-------------------------|--------------|-----------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | DESDE | HASTA | | | | | | |
| 1 | 29-abr-26 | 19-may-26 | 37,15% | - | \$ 111 519 500,00 | \$ 36 801 435,00 | \$ 148 320 935,00 | \$ 250 971 532,00 |

OBSERVACIONES:

CERTIFICACIÓN

El / la suscrito (a) supervisor (a) / interventor (a) certifica
 Que, **EDYCONST SAS (ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS)** identificado(a) con **NIT** N° **900354156-4** cumplió a satisfacción con el objeto del (la) **CONTRATO DE OBRA** N° **916** de **2026**, de acuerdo con el informe presentado.

Que se verificaron los pagos efectuados por el (la) contratista al Sistema General de Seguridad Social y/o aportes parafiscales, correspondiente al presente periodo de pago, los cuales se efectuaron de acuerdo con lo establecido en la Ley 789/2002 y Decreto 1703/2002, y demás Decretos Reglamentarios

Que, con base en lo anterior se avala el pago por un valor de **\$ 148.320.935,00** incluido IVA.

Fecha de expedición: **19** **MAYO** **2026**
 Día Mes Año

**YEISON CAMILO TORRES DUQUE
SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE GIRARDOT**

Certificado Bancario

Martes, 28 de abril de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION identificado(a) con NIT 900354156, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|-------------------|--------------|----------------|--------|
| CUENTA DE AHORROS | 65967156099 | 2011/02/25 | ACTIVA |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

141175914834



(415)7707212489984(8020) 0000141175914834

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 5 4 1 5 6 4 6. DV 4 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Grandot 14. Buzón electrónico 8

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 1 26. Número de identificación 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio 31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres 35. Razón social ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S 36. Nombre comercial 37. Sigla EDYCONST S.A.S

38. País COLOMBIA 39. Departamento Cundinamarca 40. Ciudad/Municipio Girardot 41. Dirección principal DG 8 32 36 BRR BLANCO 42. Correo electrónico edyconst@hotmail.com 43. Código postal 44. Teléfono 1 8 8 8 7 4 5 2 45. Teléfono 2 3 1 1 5 5 7 1 3 8 1

Actividad económica 46. Código 7 1 2 0 47. Fecha inicio actividad 2 0 1 0 0 4 2 6 48. Código 4 3 9 0 49. Fecha inicio actividad 2 0 1 0 0 4 2 6 50. Código 4 1 1 1 4 6 6 3 51. Código 52. Número establecimientos 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos 53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 07- Retención en la fuente a título de rent 14- Informante de exogena 42- Obligado a llevar contabilidad 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA 52 - Facturador electrónico 55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros 54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Exportadores 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

59. Anexos SI NO X 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante: 984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA 985. Cargo

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 11.226.681

NIETO LAGUNA

APellidos

CARLOS ANDRES

Nombres

[Handwritten Signature]
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 11-AGO-1981

GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73
ESTATURA


O+
G.S. RH

M
SEXO

05-OCT-1999 GIRARDOT
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1510900-00158286-M-0011226681-20090801

0012044257A 1

1750007056

ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES
CARLOS NIETO S.A.S
NIT 900.354.156-4
DG 8 32 36 BRR BLANCO
Tel: (3115571381) undefined - Ext. undefined
Girardot - Colombia
edyconst@hotmail.com
www.edyconst.com.co



Espacio para
Logo Corporativo

Factura electrónica de venta
No. EDY 2447

Señores MUNICIPIO DE GIRARDOT
NIT 890.680.376-4
Dirección CR 11 17 ESQ
Teléfono 6018314134 - Ext. 0
Ciudad Girardot - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 19/05/2026, 17:26
Expedición 19/05/2026, 17:26
Vencimiento 19.05.2026

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|------|---|----------|----------------|
| 1 | CONTRATO DE OBRA 916 DE 2026 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALIZACION VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y DEMARCAION VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA. | 1.00 | 111,519,500.00 |

Total items: 1

Valor en Letras: Ciento cuarenta y ocho millones trescientos veinte mil novecientos treinta y cinco pesos m/cte

Forma de pago: Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-19 por \$ 148,320,935.00

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Total Bruto | 111,519,500.00 |
| Administración 27.00% | 30,110,265.00 |
| Imprevistos 1.00% | 1,115,195.00 |
| Utilidad 5.00% | 5,575,975.00 |
| Total a Pagar | 148,320,935.00 |

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comproador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: Número Autorización Electrónica 18764082817296 aprobado en 20250506 prefijo EDY desde el número 2001 al 3006 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7120 Ensayos y análisis técnicos Tarifa
CUFE: 4121e1538e927c1bba4fe6e4241ef6b2f81390ffa1Dc08130555e55703960dea152c5cedfa3e2553aacb08b21778c5

Fabricante Software y Tecnología S.A.S. - 1118320481125-9. Nombre Software: Edy. Firmado: Carlos Nieto S.A.S. en 19/05/2026



**ESTUDIOS, DISEÑOS Y
CONSTRUCCIONES
CARLOS NIETO S.A.S.**



EDYCONST 2026
Página 1 de 1

Girardot-Cundinamarca, 19 de mayo de 2026

Señores

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
Girardot - Cundinamarca

**SECRETARIA DE TRANSITO
Y TRANSPORTE MUNICIPAL
GIRARDOT**


Radicado No. _____
Fecha: 19 MAY 2026
Hora: 5:30 P.M.
Recibido: JANICA CANTO

REFERENCIA: entrega factura electrónica y anexos- Contrato de obra No. 916 de 2026.

Nos permitimos hacer entrega de la documentación de soporte para pago de la factura electrónica, correspondiente al contrato 916 de 2026 que tiene por Objeto: **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y DEMARCACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA.**

Documentos entregados:

- Informe de obra
- Planilla de pago aportes seguridad social
- Factura electrónica
- Certificación bancaria
- Rut de la empresa
- Copia cedula representante legal
- Copia cedula, tarjeta profesional y certificado de antecedentes del contador
- Pólizas de garantías del contrato



CARLOS ANDRES NIETO LAGUNA
C.C 11.226.681 de Girardot
Representante legal
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO SAS
NIT 900.354.156-4

Diagonal 8 No. 32-36 Barrio Blanco/Girardot-Cundinamarca

Tel: 8887452- Cel: 3115571381

edyconst@hotmail.com-gerencia@edyconst.com.co

Girardot, Cundinamarca 19 de mayo de 2026

Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT
Att: Yeison Camilo Torres Duque
Secretario de Tránsito y Transporte


Ref. Contrato de obra No. 916 - 2026.

Respetados Señores:

Con la presente les estamos haciendo entrega del Informe Parcial N° 1 del Contrato de obra No. **916 - 2026** que tiene por objeto **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y DEMARCACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA"** del período comprendido entre el 29 de abril al 19 de mayo de 2026.

Quedando a su entera disposición para cualquier aclaración o información complementaria que pudiesen requerir.

Cordialmente,



CARLOS ANDRÉS NIETO LAGUNA
Representante Legal

Diagonal 8 No. 32-36 Barrio Blanco/Girardot-Cundinamarca

Tel: 8887452- Cel: 3115571381

edyconst@hotmail.com - gerencia@edyconst.com.co

CONTRATO No. 916 DEL 30 DE ABRIL DE 2026

**“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN
VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y
DEMARCACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT
CUNDINAMARCA”.**



ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT CUNDINAMARCA

EJECUTADO POR:

**ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES
CARLOS NIETO S.A.S.**

Diagonal 8 No. 32-36 Barrio Blanco/Girardot-Cundinamarca

Tel: 8887452- Cel: 3115571381

edyconst@hotmail.com - gerencia@edyconst.com.co

CONTENIDO

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1. | INFORME DE AVANCE DE OBRA..... | 6 |
| | 1.1.INTRODUCCION..... | 6 |
| 2. | GENERALIDADES DEL PROYECTO..... | 7 |
| | 2.1.ANTECEDENTES..... | 7 |
| | 2.2.FINALIDAD DEL PROYECTO..... | 8 |
| | 2.3.LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO..... | 8 |
| 3. | ALCANCE DE LA OBRA..... | 10 |
| | 3.1.INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO..... | 11 |
| | 3.2.CONTROL DE POLIZAS..... | 12 |
| 4. | INFORME CONTRATO DE OBRA..... | 14 |
| | 4.1.INFORMACIÓN DEL PROYECTO..... | 14 |
| | 4.2.AVANCE DE OBRA..... | 15 |



TABLA DE FIGURAS

Figura 1. Localización del Municipio..... 9

Figura 2. Localización de la zona en vista Satelital..... 9



ANEXOS

| | |
|--|----|
| ANEXO 1 – OFICIOS Y ACTAS DE COMITÉ DE OBRA..... | 17 |
| ANEXO 2 – REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRA..... | 17 |
| ANEXO 3 – CANTIDADES DE OBRA..... | 36 |
| ANEXO 4 – CERTIFICADOS DE CALIDAD | 37 |

1. INFORME DE AVANCE DE OBRA

1.1. INTRODUCCION

La alcaldía del Municipio de Girardot, Cundinamarca en su calidad de contratante celebro el Contrato de obra N° 916 de 2026 cuyo objeto es el **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y DEMARCACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA"** celebrado entre **YEISSON CAMILO TORRES DUQUE**, en condición de Supervisor del contrato, Secretario de Tránsito y Transporte, conforme a la delegación en materia de contratación para el **MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA** y el Representante legal de **ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S**, Carlos Andrés Nieto Laguna identificado con cedula 11.626.681 de Girardot-Cundinamarca.

El presente informe de avance de obra contiene la descripción general de las actividades realizadas, durante el periodo comprendido del 29 de abril al 19 de mayo de 2026.

El contrato de Obra se inició formalmente el día 29 de abril del 2026, Suscribiendo el acta de inicio entre **CARLOS ANDRÉS NIETO LAGUNA** en calidad de Representante legal de **ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S.** con Nit. 900.354.156-4. y el Secretario de tránsito y transporte **YEISSON CAMILO TORRES DUQUE** en calidad de Supervisor del contrato.

Diagonal 8 No. 32-36 Barrio Blanco/Girardot-Cundinamarca

Tel: 8887452- Cel: 3115571381

edyconst@hotmail.com - gerencia@edyconst.com.co

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

2.1. ANTECEDENTES

El Municipio de Girardot-Cundinamarca, a través de la secretaría de Tránsito y Transporte atiende las necesidades de señalización vial horizontal y vertical, la cual le corresponde planear, dirigir, organizar, vigilar y controlar las actividades, programas y proyectos de tránsito y transporte, regulación del tránsito, transporte público y educación vial en el municipio, así como también cumplir y hacer cumplir las disposiciones y normas legales vigentes.

Es importante resaltar que el tránsito vehicular en el área urbana del municipio de Girardot presenta problemas como son: congestión vehicular, accidentes en las intersecciones generadas por diferentes situaciones, como la velocidad en la vía, la falta de cultura ciudadana, conciencia, disciplina social, la invasión de espacio público y el desconocimiento de la normatividad por parte de los conductores y peatones.

Teniendo en cuenta, las necesidades de las diferentes vías donde se evidencia, la falta de señalización vertical, horizontal e implementación de reductores de velocidad, que brindan una seguridad vial para los habitantes del municipio.

Es claro afirmar que se fortalecerá el sistema de seguridad vial mediante la instalación de señales verticales de tránsito y demarcación, lo cual mejorará el sistema de movilidad. Las señales que se instalen además de satisfacer una necesidad, llamar la atención, ser legibles para los usuarios, permitirá una adecuada reacción del conductor aun cuando este se acerque a la señal a alta velocidad, esto implica que los dispositivos cuentan con buena visibilidad tamaño de las letras adecuado, leyenda corta, mensaje simple y claro e imponen respeto a los usuarios de las calles o carreras con la finalidad de mejorar el tránsito vehicular y la calidad de vida de los habitantes del municipio.

2.2. FINALIDAD DEL PROYECTO

El proyecto de "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y DEMARCACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA". Tiene como finalidad mejorar la calidad de vida, la movilidad terrestre de los habitantes del municipio, mejorando la infraestructura vial y el tránsito vehicular, a través de la instalación de señales verticales de tránsito, demarcación señalización horizontal y reductores de velocidad como lo son resaltos portátiles en el municipio de Girardot - Cundinamarca.

2.3. LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO.

El proyecto se encuentra ubicado en el municipio de Girardot departamento de Cundinamarca.

El municipio de Girardot se encuentra localizado en el departamento de Cundinamarca, a una distancia aproximada de 134 km de Bogotá, consolidándose como uno de los principales centros urbanos, comerciales y turísticos de la región del Alto Magdalena; limita al norte con los municipios de Tocaima y Nariño, al oriente con el municipio de Ricaurte, al sur con el municipio de Flandes en el departamento del Tolima y al occidente con el municipio de Nariño y el río Magdalena, contando con una extensión territorial aproximada de 138 km², de los cuales cerca de 20,46 km² corresponden al área urbana y 107,79 km² al área rural, lo que lo posiciona como un municipio estratégico por su ubicación geográfica, dinámica económica y vocación turística dentro del departamento de Cundinamarca.

Diagonal 8 No. 32-36 Barrio Blanco/Girardot-Cundinamarca


Tel: 8887452- Cel: 3115571381

edyconst@hotmail.com - gerencia@edyconst.com.co

Figura1. Localización del Municipio.



Figura 2. Localización de la zona en vista Satelital.

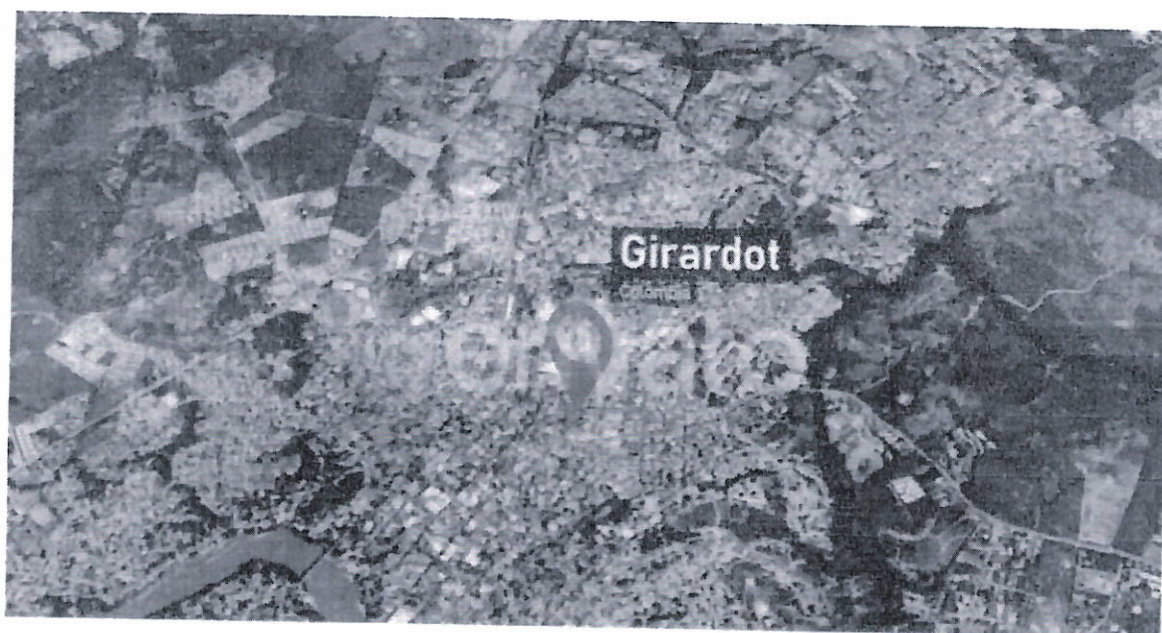

3. ALCANCE DE LA OBRA

Las obras de demarcación o señalización horizontal y señalización vertical en el municipio de Girardot Cundinamarca contemplan la ejecución de actividades de la siguiente manera:

| N° | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES | | DESCRIPCION | UNID. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|----------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|-------|----------|----------------|------------------|----------------|
| | | GENERAL | PARTICULAR | | | | | | |
| 1 | | Señalización vertical | Señales reglamentarias y preventivas | Suministro e instalación de señal vertical reglamentaria preventiva e informativa, material reflectivo de alta intensidad tipo IV | U/C | 20.00 | \$ 729.700,00 | \$ 14.594.000,00 | |
| 2 | | Señalización horizontal | Pintura plástica en frío | Suministro y aplicación de pintura de plástico en frío para marcas viales incluye pictogramas. | V2 | 525.00 | \$ 71.400,00 | \$ 37.485.000,00 | |
| 3 | | Señalización horizontal | Impresante acrílico | Suministro y aplicación de impresante acrílico para marcar vial | V2 | 525.00 | \$ 36.750,00 | \$ 19.330.500,00 | |
| 4 | | Señalización horizontal | Línea continua | Suministro y aplicación de pintura de plástico en frío color blanco y/o amarillo para demarcación de línea continua (Art. 128) | ML | 8.000,00 | \$ 8.750,00 | \$ 70.000.000,00 | |
| 5 | | Señalización horizontal | Impresante para demarcación lineal | Suministro y aplicación de impresante para demarcación lineal de (40 15M) | ML | 8.000,00 | \$ 4.000,00 | \$ 32.000.000,00 | |
| 6 | | Dispositivos de seguridad vial | Reductores de velocidad en concreto | Mantenimiento reductores de velocidad existentes (en concreto) incluye pintura | V2 | 35,00 | \$ 285.250,00 | \$ 10.029.000,00 | |
| 7 | | Dispositivos de seguridad vial | Resalto portátil en caucho o plástico | Suministro y anclaje de resalto portátil de caucho o plástico con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 30 cm y una altura entre 5 y 8 cm incluye accesorios y materiales para fijación. (Incluye herramienta) | ML | 200,00 | \$ 215.000,00 | \$ 43.000.000,00 | |
| Subtotal | | | | | | | | | |
| | | | | | | | SUBTOTAL OBRAS | | 340.219.500,00 |

Diagonal 8 No. 32-36 Barrio Blanco/Girardot-Cundinamarca

Tel: 8887452- Cel: 3115571381

edyconst@hotmail.com - gerencia@edyconst.com.co

3.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|--------------------------|---|
| CONTRATO DE OBRA PUBLICA | N° 916 DEL 2026 |
| OBJETO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y DEMARCACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA. |
| CONTRATISTA | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S. |
| NIT/C.C | 900354156-4 |
| CDP | 2026000064 |
| RP | 2026001459 |
| VALOR | TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MC (\$399.292.467) |
| PLAZO | TRES (3) MESES |
| FECHA DE INICIO | 29 DE ABRIL DE 2026 |
| FECHA DE TERMINACION | 28 DE JULIO DE 2026 |

Diagonal 8 No. 32-36 Barrio Blanco/Girardot-Cundinamarca

Tel: 8887452- Cel: 3115571381

edyconst@hotmail.com-gerencia@edyconst.com.co

3.2. CONTROL DE POLIZAS

| AMPARO | Nº PÓLIZA | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | VALOR ASEGURADO |
|---|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
| SERIEDAD DE LA OFERTA | 25-44-101213207 | 6/04/2026 | 5/08/2026 | \$ 39.999.732,30 |
| PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES - ANEXO 0 | 25-40-101056752 | 21/04/2026 | 31/07/2026 | \$ 350.181.000,00 |
| PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES - ANEXO 2 | 25-40-101056752 | 29/04/2026 | 8/08/2026 | \$ 350.181.000,00 |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - ANEXO 0 | 25-44-101213589 | 21/04/2026 | 30/11/2026 | \$ 39.929.246,70 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES - ANEXO 0 | 25-44-101213589 | 21/04/2026 | 31/07/2029 | \$ 19.964.623,35 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA - ANEXO 0 | 25-44-101213589 | 31/07/2026 | 31/07/2027 | \$ 39.929.246,70 |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - ANEXO 2 | 25-44-101213589 | 29/04/2026 | 8/12/2026 | \$ 39.929.246,70 |

Diagonal 8 No. 32-36 Barrio Blanco/Girardot-Cundinamarca

Tel: 8887452- Cel: 3115571381

edyconst@hotmail.com-gerencia@edyconst.com.co



| | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES - ANEXO 2 | 25-44- 101213589 | 29/04/2026 | 8/08/2026 | \$ 19.964.623,35 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA - ANEXO 2 | 25-44- 101213589 | 8/08/2026 | 8/08/2027 | \$ 39.929.246,70 |

Diagonal 8 No. 32-36 Barrio Blanco/Girardot-Cundinamarca

Tel: 8887452- Cel: 3115571381

edyconst@hotmail.com - gerencia@edyconst.com.co

4. INFORME CONTRATO DE OBRA

4.1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución de las actividades del Contrato de obra 916 de 2026, el cual tiene por objeto realizar el "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y DEMARCACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA".

A través de este documento, se presenta el informe de avance, durante las fases del proyecto, de manera tal que permita visualizar el progreso en la ejecución.

La implementación de la señalización y demarcación se efectuó de acuerdo al procedimiento descrito en el MANUAL DE SEÑALIZACION 2024 DEL INVIAS en el cual se describen las normas, método constructivo, especificaciones generales y particulares de los elementos y dispositivos a implementar y/o suministrar para la ejecución del componente obra.

Diagonal 8 No. 32-36 Barrio Blanco/Girardot-Cundinamarca

Tel: 8887452- Cel: 3115571381

edyconst@hotmail.com - gerencia@edyconst.com.co

4.2. AVANCE DE OBRA

Durante el periodo de tiempo, del lapso que comprende el presente informe, se evidencia el registro fotográfico del avance y las actividades realizadas en la ejecución de obra con sus respectivas cantidades.



**ESTUDIOS, DISEÑOS Y
CONSTRUCCIONES
CARLOS NIETO S.A.S.**



EDYCONST 2026


ANEXO 1

OFICIOS Y ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Diagonal 8 No. 32-36 Barrio Blanco/Girardot-Cundinamarca

Tel: 8887452- Cel: 3115571381

edyconst@hotmail.com · gerencia@edyconst.com.co



Girardot, Abril 29 de 2026

Cto. No. 001-26

Señor(es):

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT

Atte. Yeison Camilo Torres Duque
Secretario de Tránsito y Transporte
Ciudad

Ref.: Convocatoria comité técnico de obra del Contrato de obra No. 916 de 2026.

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos dirigimos a usted muy respetuosamente con el propósito de citarlo al primer comité de obra que tendrá lugar el jueves 30 de abril del 2026 a las 8:30 am en las instalaciones de la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio, para tratar temas técnicos respecto a la ejecución de las actividades contractuales como son:

1. Coordinar recorrido para localización y ubicación de los tramos de vía donde se instalarán los reductores plásticos de velocidad, se instalará la señalización vertical y se hará la respectiva demarcación vial.
2. Descripción de las actividades para el mantenimiento preventivo de los reductores de velocidad existentes en concreto, acorde con el rubro destinado para el mismo.

Cordialmente,

Ing. CARLOS ANDRÉS NIETO LAGUNA
Mat. 25202-190306 CND.
Especialista en Geotecnia
Especialista en Diseño y Construcción de Pavimentos
Representante Legal Edyconst S.A.S

Diagonal 8 No. 32-36 Barrio Blanco/Girardot-Cundinamarca

Tel: 8887452- Cel: 3115571381

edyconst@hotmail.com - gerencia@edyconst.com.co



Girardot, Abril 29 de 2026

Cto. No. 002-26

Señor(es):
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT
Atte. Yeison Camilo Torres Duque
Secretario de Tránsito y Transporte
Ciudad

02801567
29/04/26
12:00 AM
SERVITIA Fw: W h

Asunto: Solicitud de cambio de profesional Ingeniero Residente - Contrato No. 916 de 2026

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos informar y solicitar el cambio del profesional designado como **Ingeniero Residente** dentro del **Contrato No. 916 de 2026**, cuyo objeto corresponde a:

"CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y DEMARCACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT, CUNDINAMARCA".

En ese sentido, el profesional inicialmente presentado para desempeñar dicho cargo fue el Ingeniero Civil **SERGIO ANDRÉS VERA ACOSTA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 93.133.403 del El Espinal, especialista en Gerencia de Obras.

No obstante, por razones administrativas y operativas del proyecto, se realizará el reemplazo del mencionado profesional por el Ingeniero **FRANCISCO ALEJANDRO DEVIA SUÁREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.108.452.671 de Flandes, especialista en Gerencia de Proyectos, quien asumirá las funciones de Ingeniero Residente del contrato en mención.

Lo anterior se informa para su conocimiento, trámite y fines pertinentes dentro de la ejecución contractual.

Diagonal 8 No. 32-36 Barrio Blanco/Girardot-Cundinamarca

Tel: 8887452- Cel: 3115571381

edyconst@hotmail.com-gerencia@edyconst.com.co



**ESTUDIOS, DISEÑOS Y
CONSTRUCCIONES
CARLOS NIETO S.A.S.**



EDYCONST S.A.S
Página 2 de 2

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.

- Se anexa hoja de vida del Ingeniero Francisco Alejandro Devia Suarez, con sus respectivos Soportes

Cordialmente,

Ing. CARLOS ANDRÉS NIETO LAGUNA
Mat. 25202-190306 CND.
Especialista en Geotecnia
Especialista en Diseño y Construcción de Pavimentos
Representante Legal Edyconst S.A.S


Diagonal 8 No. 32-36 Barrio Blanco/Girardot-Cundinamarca

Tel: 8887452- Cel: 3115571381

edyconst@hotmail.com - gerencia@edyconst.com.co



**ESTUDIOS, DISEÑOS Y
CONSTRUCCIONES
CARLOS NIETO S.A.S.**




EDYCONST 2026

ANEXO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRA

Diagonal 8 No. 32-36 Barrio Blanco/Girardot-Cundinamarca
Tel: 8887452- Cel: 3115571381
edyconst@hotmail.com-gerencia@edyconst.com.co


SEÑALIZACION VERTICAL REGLAMENTARIA

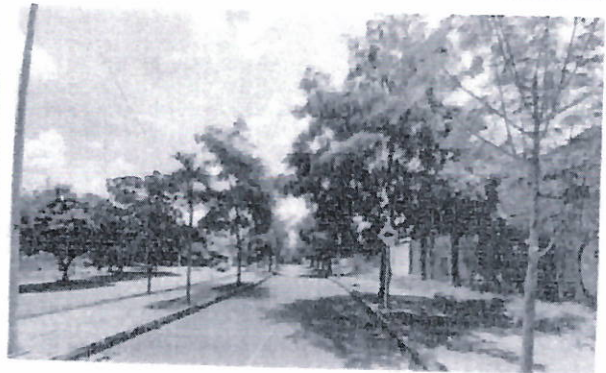


Diagonal 8 No. 32-36 Barrio Blanco/Girardot-Cundinamarca

Tel: 8887452- Cel: 3115571381

edyconst@hotmail.com-gerencia@edyconst.com.co

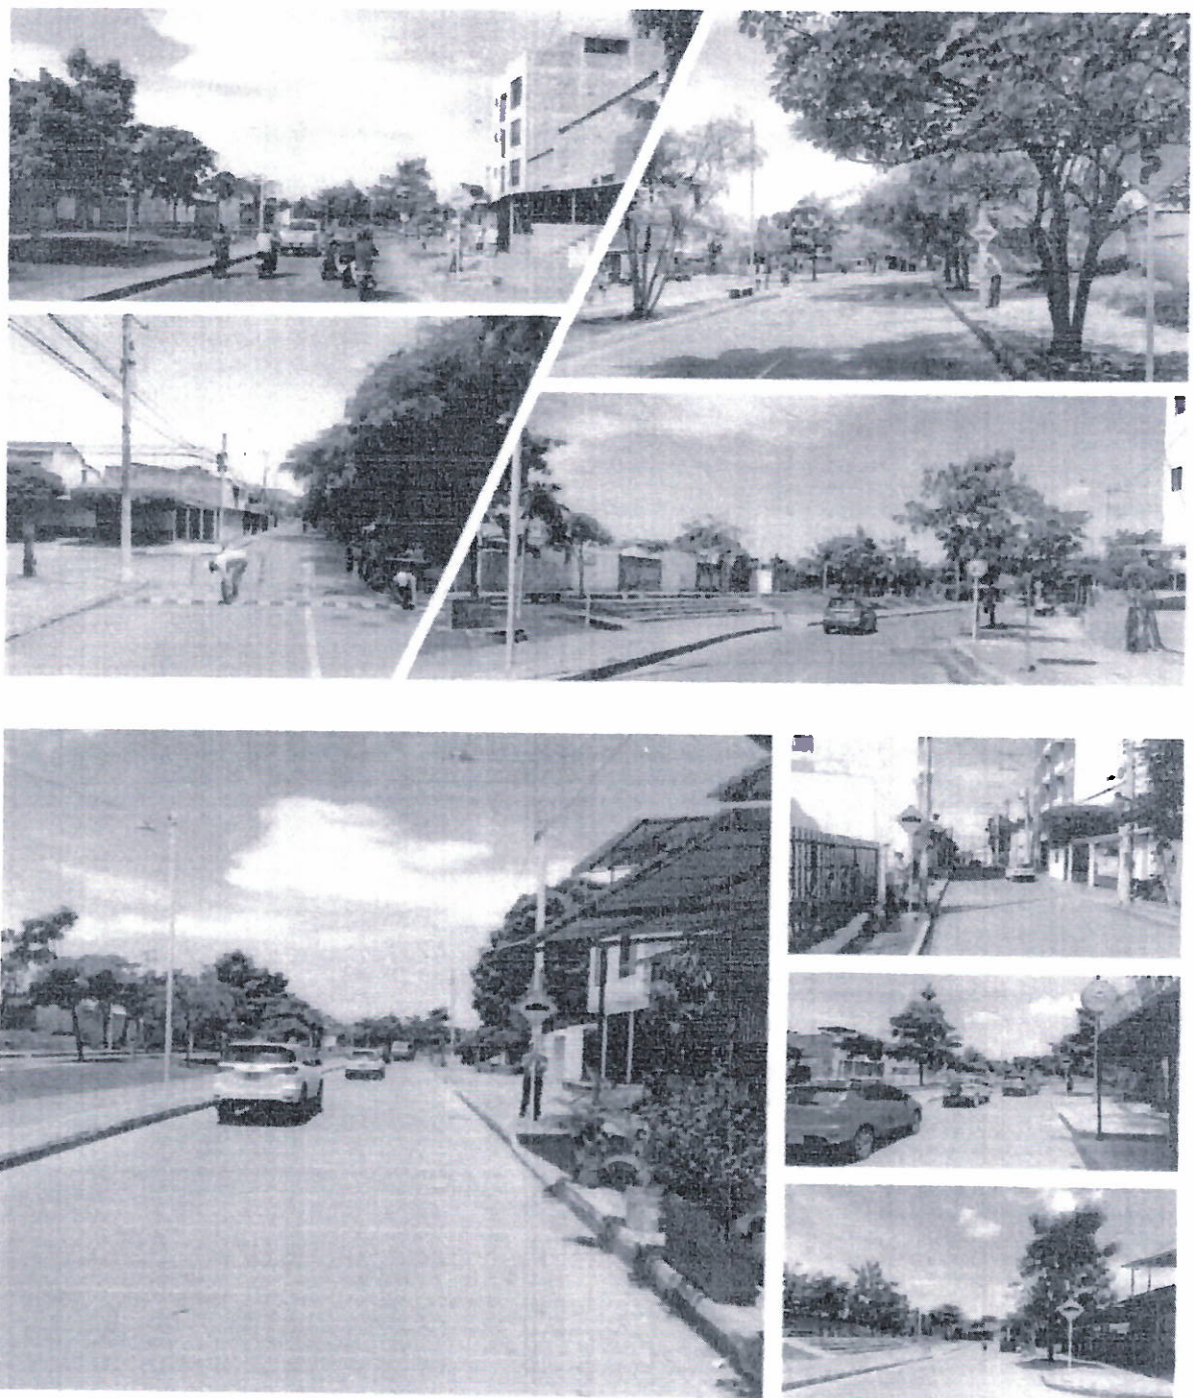

Diagonal 8 No. 32-36 Barrio Blanco/Girardot-Cundinamarca
Tel: 8887452- Cel: 3115571381
edyconst@hotmail.com - gerencia@edyconst.com.co

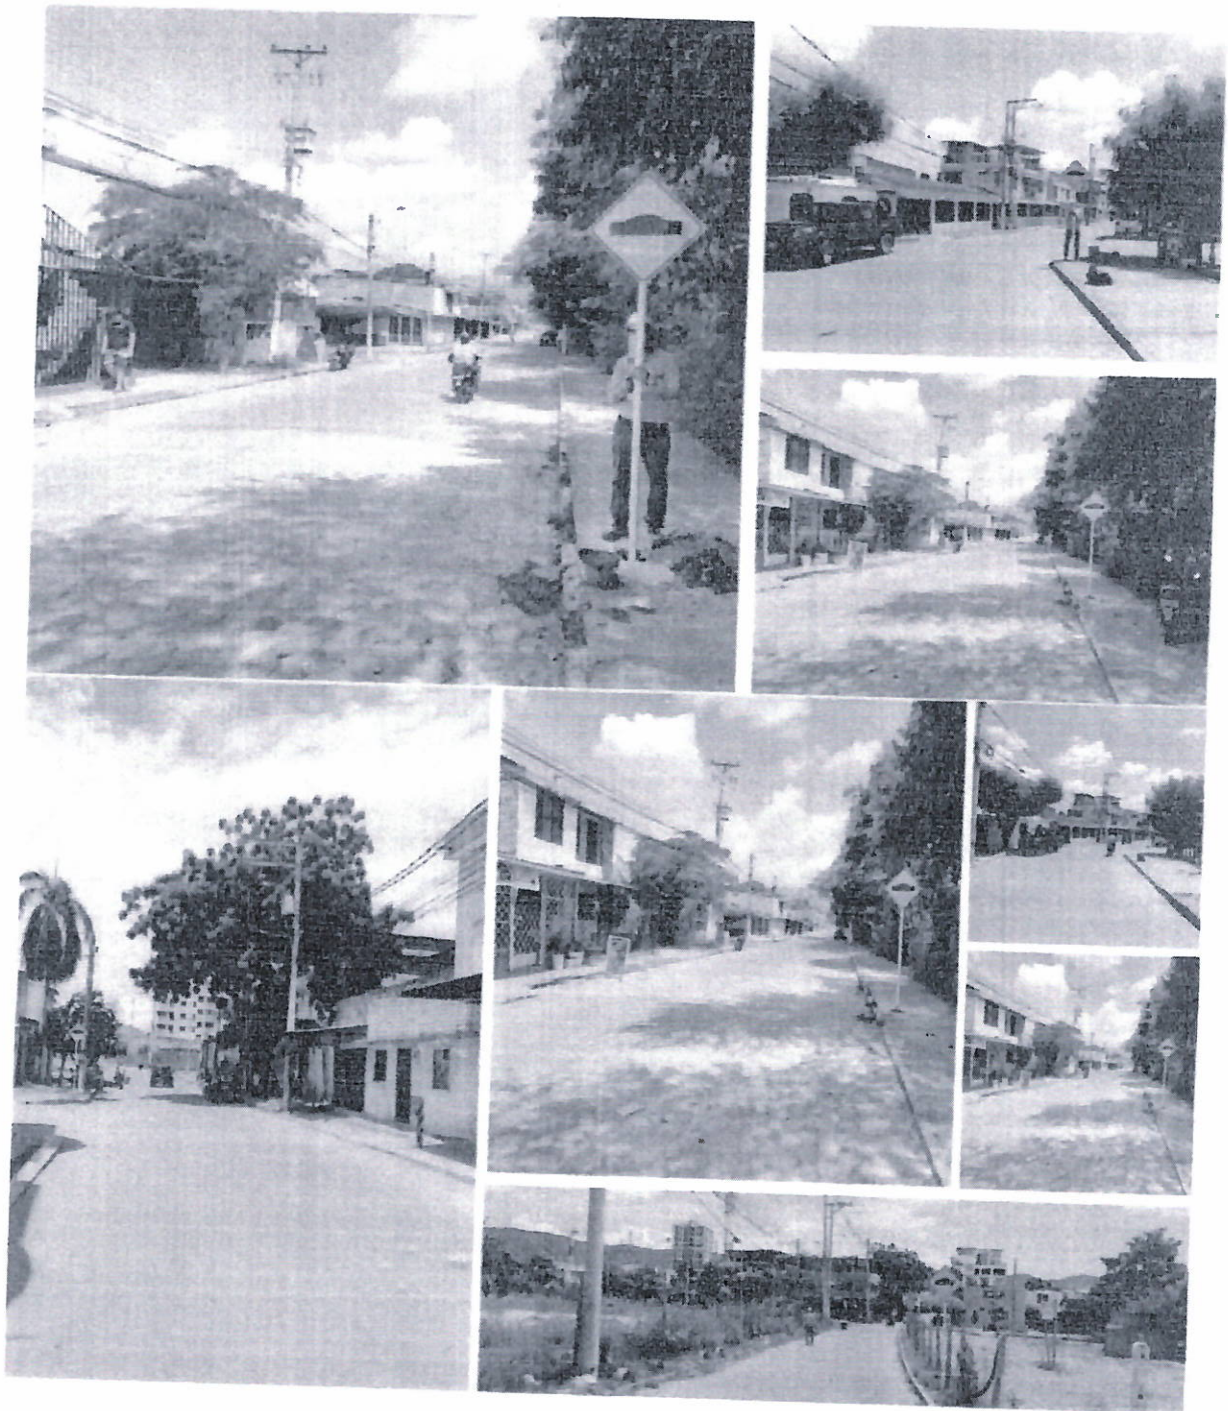

Diagonal 8 No. 32-36 Barrio Blanco/Girardot-Cundinamarca


Tel: 8887452- Cel: 3115571381

edyconst@hotmail.com - gerencia@edyconst.com.co

SEÑALIZACION HORIZONTAL
RESALTOS PORTATILES



Diagonal 8 No. 32-36 Barrio Blanco/Girardot-Cundinamarca
Tel: 8887452- Cel: 3115571381
edyconst@hotmail.com - gerencia@edyconst.com.co

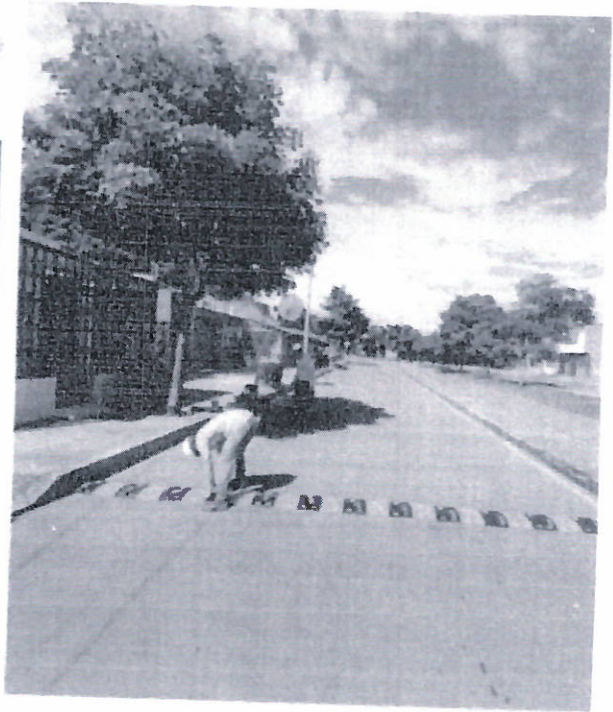

Diagonal 8 No. 32-36 Barrio Blanco/Girardot-Cundinamarca

Tel: 8887452- Cel: 3115571381

edyconst@hotmail.com - gerencia@edyconst.com.co




Diagonal 8 No. 32-36 Barrio Blanco/Girardot-Cundinamarca

Tel: 8887452- Cel: 3115571381

edyconst@hotmail.com - gerencia@edyconst.com.co

**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE
ACRÍLICO PARA MARCAS VIALES**

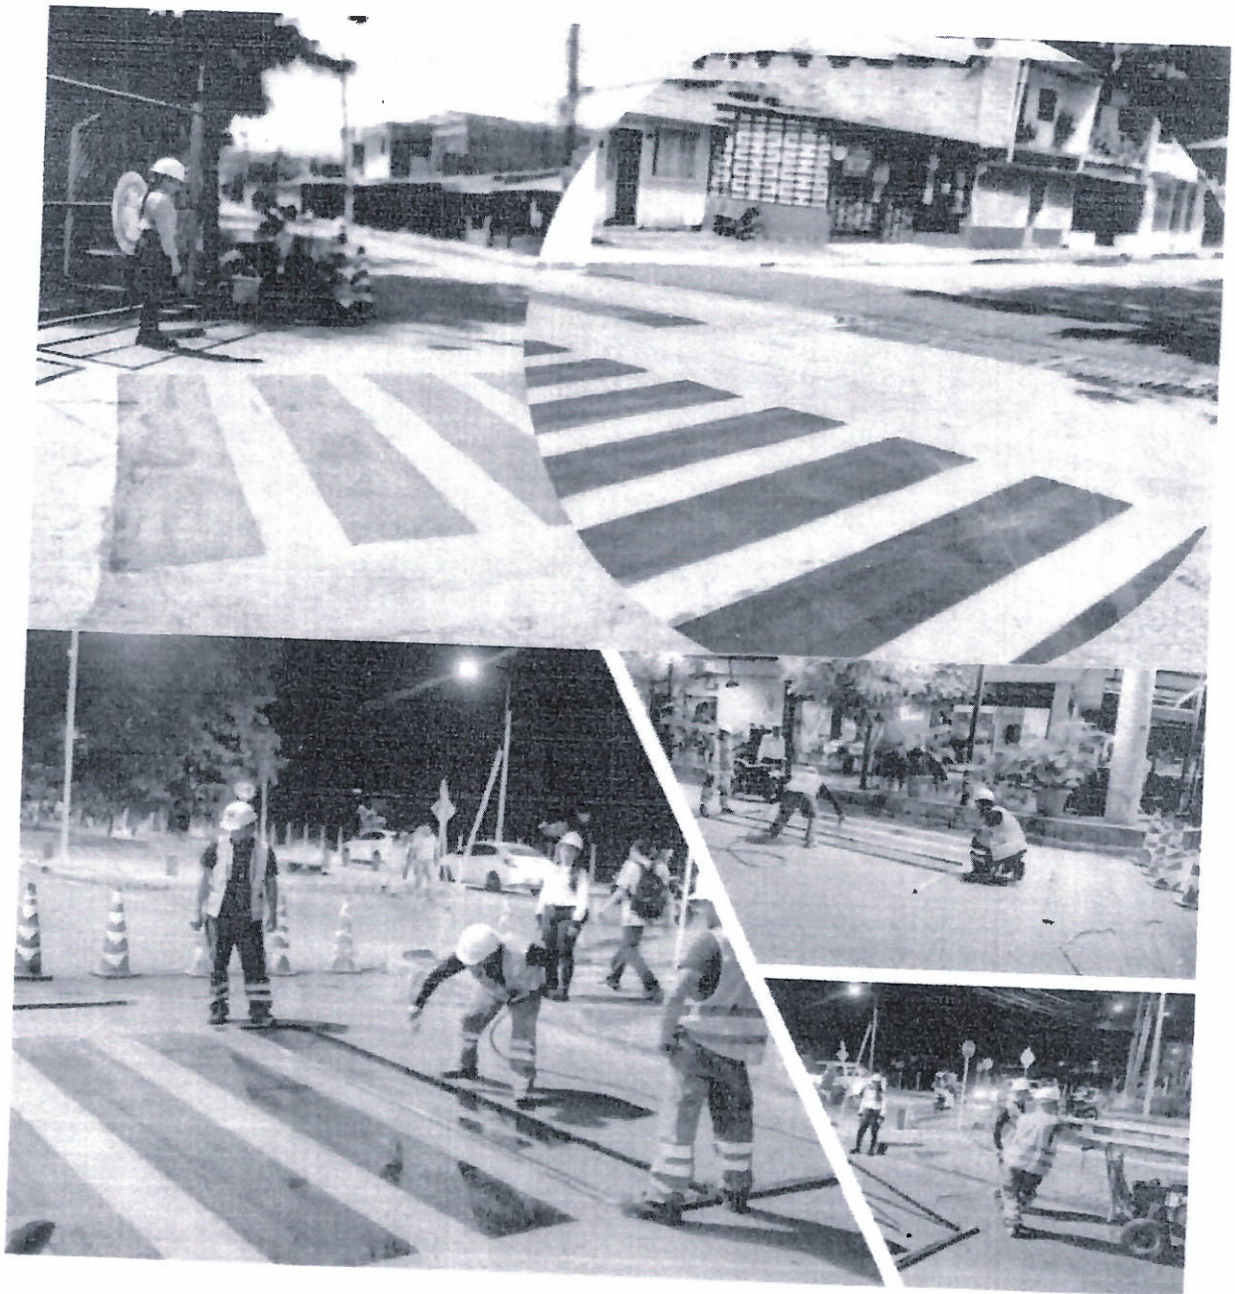

Diagonal 8 No. 32-36 Barrio Blanco/Girardot-Cundinamarca

Tel: 8887452- Cel: 3115571381


edyconst@hotmail.com - gerencia@edyconst.com.co



**ESTUDIOS, DISEÑOS Y
CONSTRUCCIONES
CARLOS NIETO S.A.S.**




EDYCONST 2026

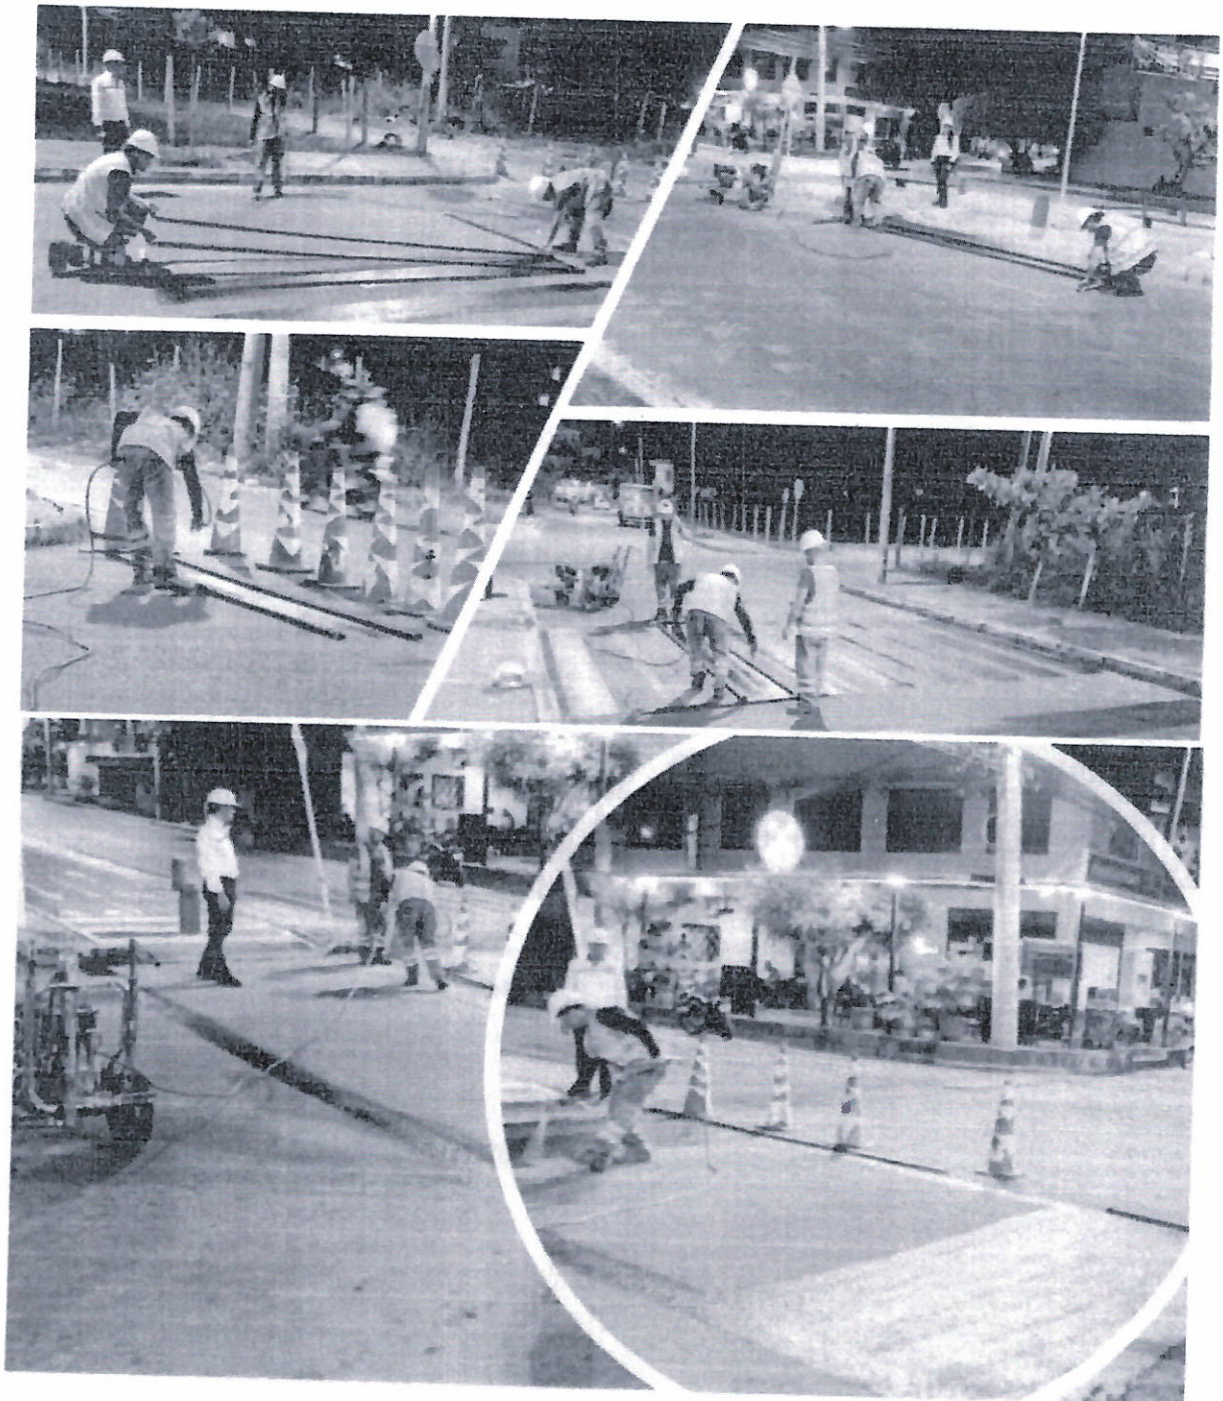

Diagonal 8 No. 32-36 Barrio Blanco/Girardot-Cundinamarca

Tel: 8887452- Cel: 3115571381


edyconst@hotmail.com - gerencia@edyconst.com.co

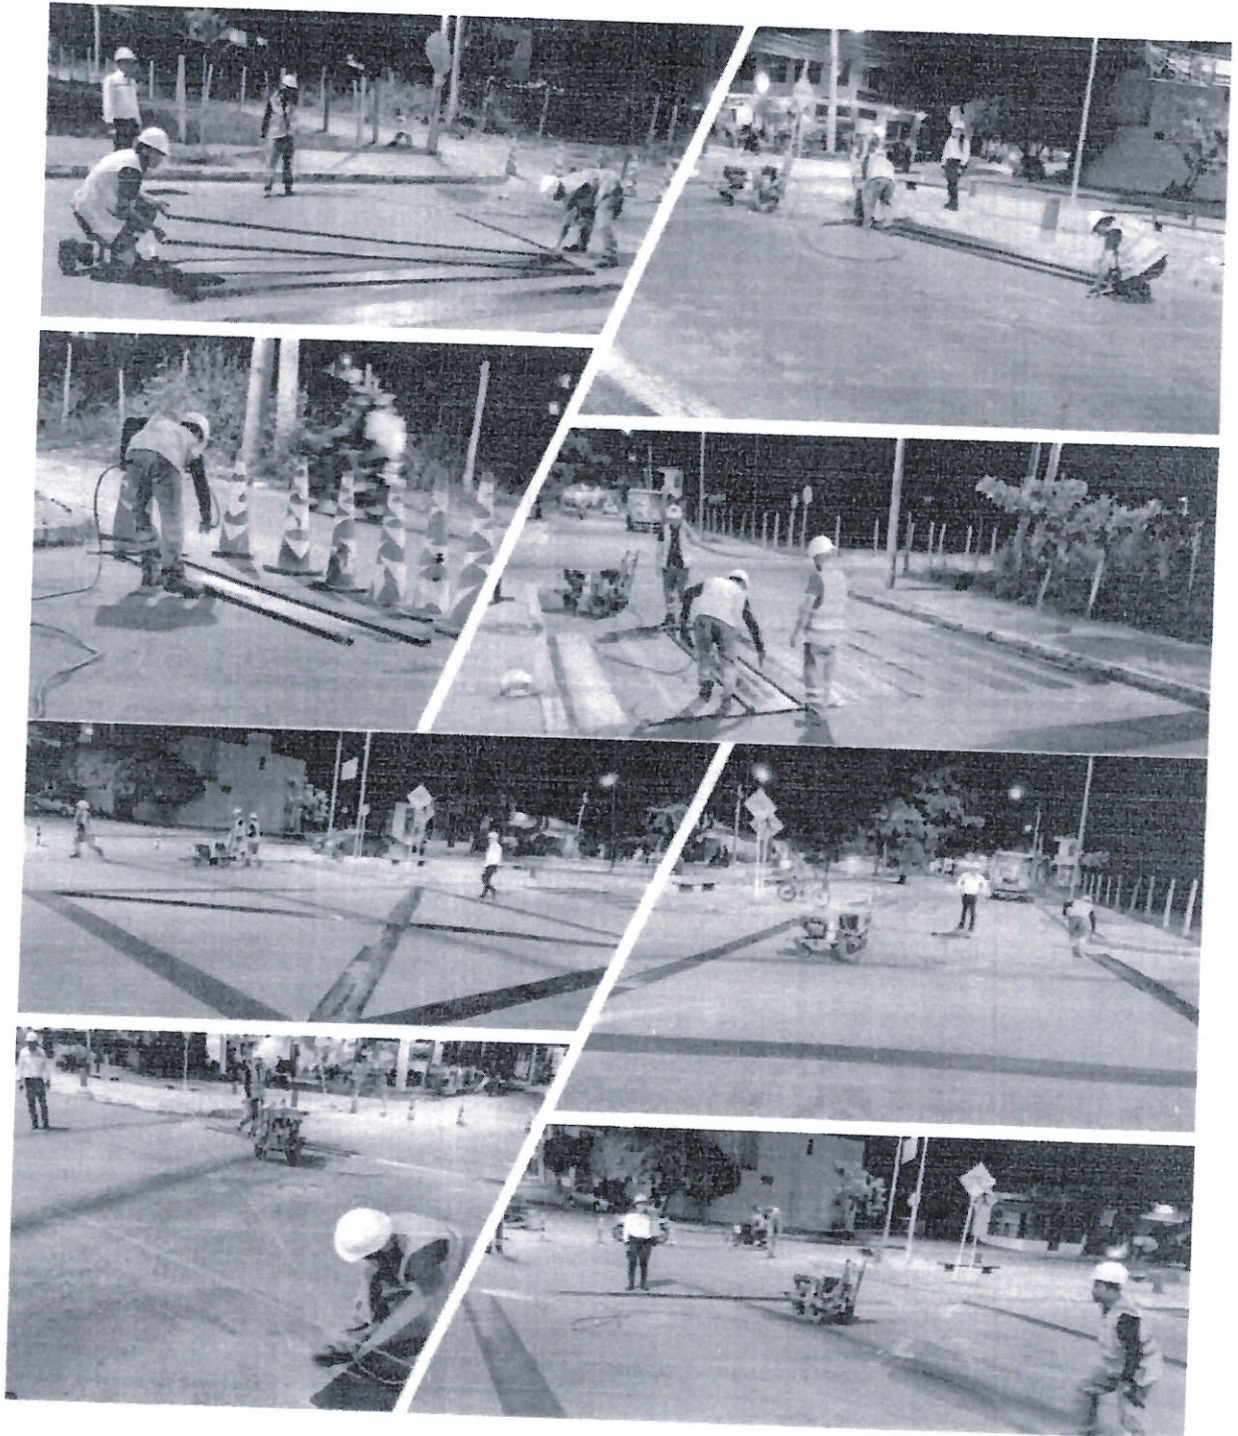

Diagonal 8 No. 32-36 Barrio Blanco/Girardot-Cundinamarca

Tel: 8887452- Cel: 3115571381

edyconst@hotmail.com - gerencia@edyconst.com.co

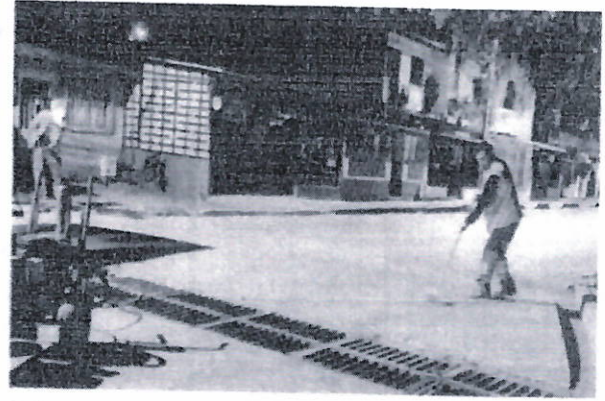

Diagonal 8 No. 32-36 Barrio Blanco/Girardot-Cundinamarca

Tel: 8887452- Cel: 3115571381

edyconst@hotmail.com - gerencia@edyconst.com.co



Diagonal 8 No. 32-36 Barrio Blanco/Girardot-Cundinamarca


Tel: 8887452- Cel: 3115571381

edyconst@hotmail.com - gerencia@edyconst.com.co

**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE
PLÁSTICO EN FRÍO PARA MARCAS VIALES**



Diagonal 8 No. 32-36 Barrio Blanco/Girardot-Cundinamarca
Tel: 8887452- Cel: 3115571381
edyconst@hotmail.com-gerencia@edyconst.com.co

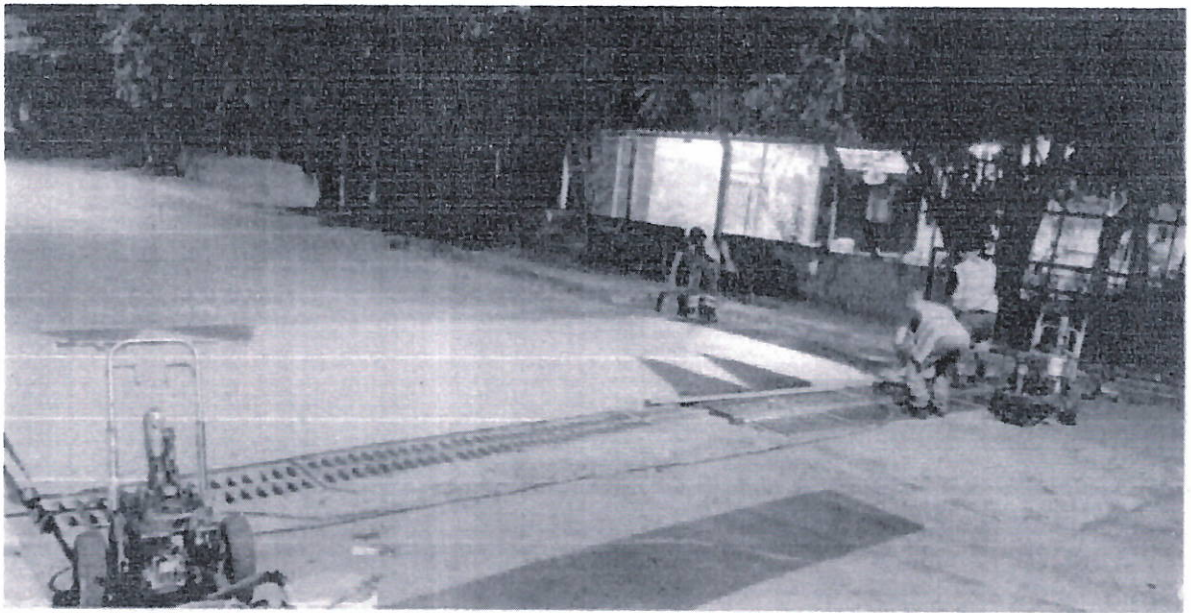

Diagonal 8 No. 32-36 Barrio Blanco/Girardot-Cundinamarca

Tel: 8887452- Cel: 3115571381

edyconst@hotmail.com-gerencia@edyconst.com.co




Diagonal 8 No. 32-36 Barrio Blanco/Girardot-Cundinamarca

Tel: 8887452- Cel: 3115571381

edyconst@hotmail.com-gerencia@edyconst.com.co

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE
DEMARCACION LINEAL

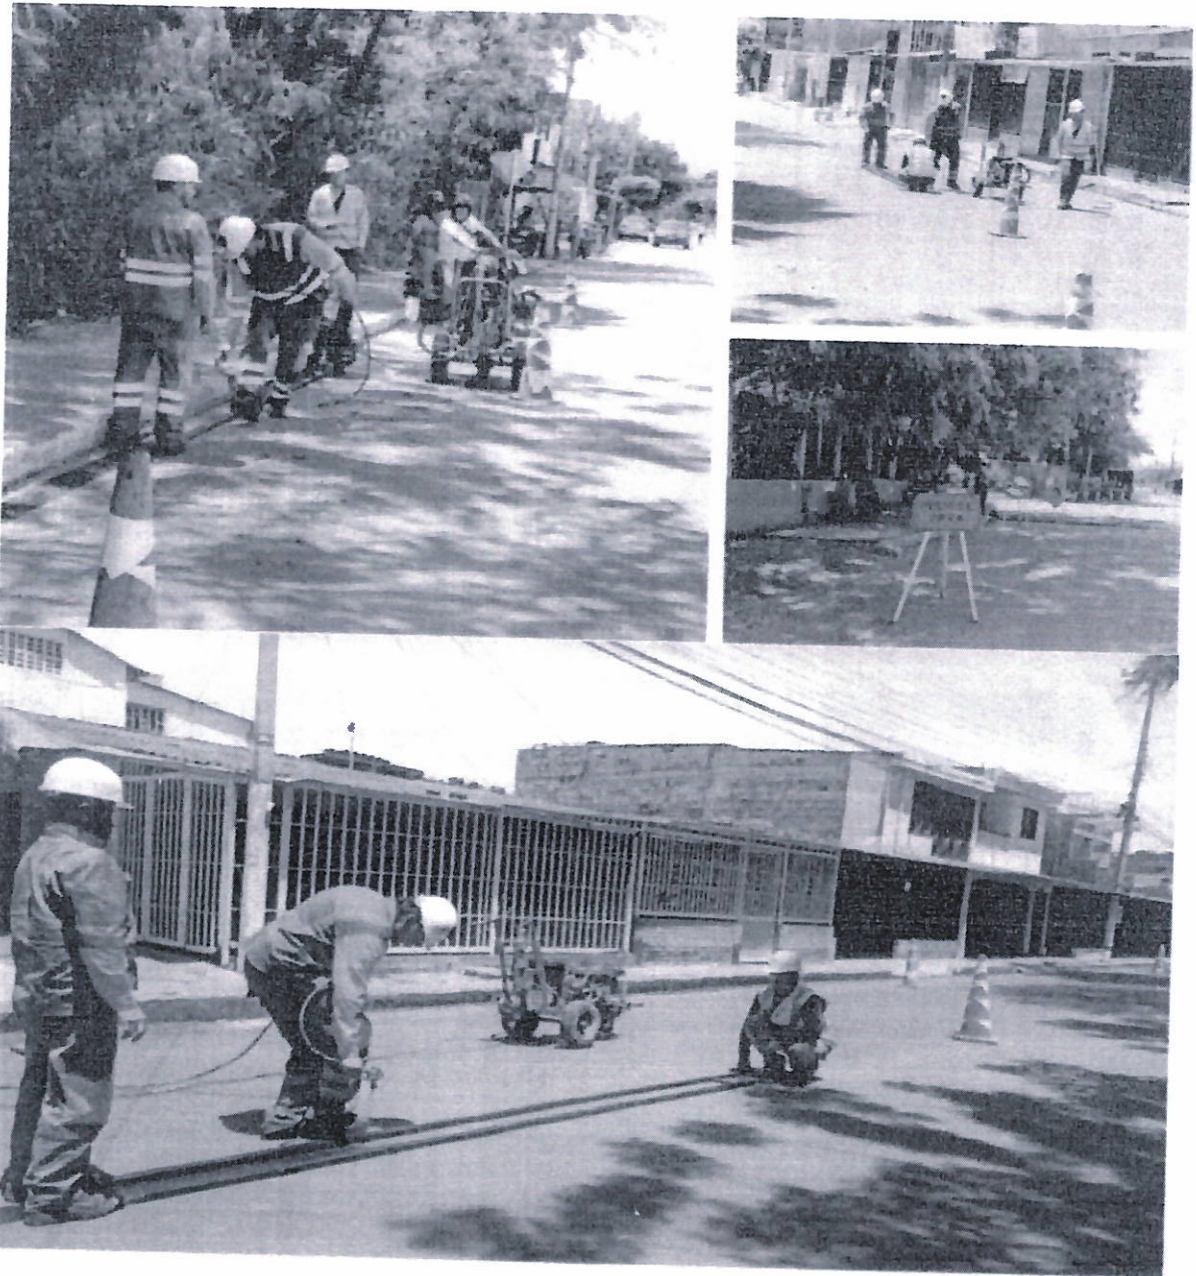

Diagonal 8 No. 32-36 Barrio Blanco/Girardot-Cundinamarca
Tel: 8887452- Cel: 3115571381
edyconst@hotmail.com - gerencia@edyconst.com.co




Diagonal 8 No. 32-36 Barrio Blanco/Girardot-Cundinamarca

Tel: 8887452- Cel: 3115571381

edyconst@hotmail.com - gerencia@edyconst.com.co

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA
DEMARCACION LINEAL

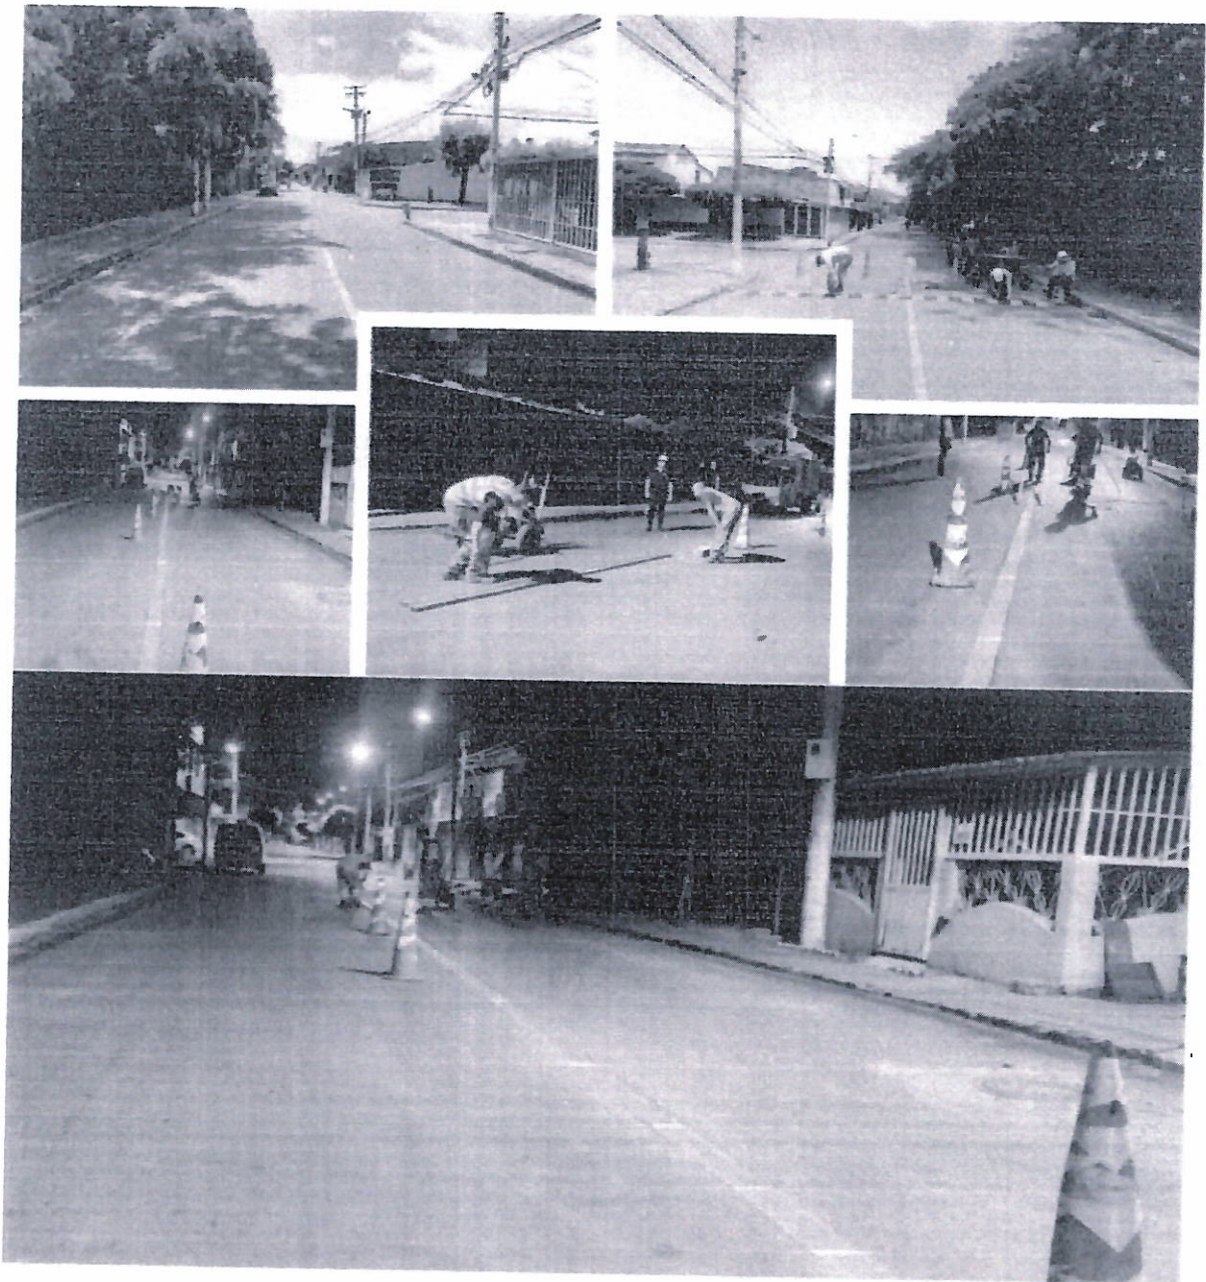

Diagonal 8 No. 32-36 Barrio Blanco/Girardot-Cundinamarca

Tel: 8887452- Cel: 3115571381


edyconst@hotmail.com - gerencia@edyconst.com.co



Diagonal 8 No. 32-36 Barrio Blanco/Girardot-Cundinamarca

Tel: 8887452- Cel: 3115571381

edyconst@hotmail.com - gerencia@edyconst.com.co



ANEXO 3

CANTIDADES DE OBRA

Diagonal 8 No. 32-36 Barrio Blanco/Girardot-Cundinamarca

Tel: 8887452- Cel: 3115571381


edyconst@hotmail.com - gerencia@edyconst.com.co

| CONDICIONES CONTRACTUALES | |
|---------------------------|----------------|
| VALOR CONTRATO | \$ 399.292.467 |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 01 | \$ 148.320.935 |
| SALDO POR EJECUTAR | \$ 250.971.532 |
| SUMAS IGUALES | \$ 399.292.467 |

PORCENTAJE OBRA EJECUTADA 37%

| VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA | |
|-------------------------------------|-------------------|
| VALOR TOTAL CONTRATO | \$ 399.292.467,00 |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 01 | \$ 148.320.935,00 |
| VALOR AMORTIZAR ACTA PARCIAL No. 01 | 37% |
| VALOR NETO A CANCELAR | \$ 148.320.935,00 |

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA : CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE


 EDYCONST S.A.S.
 CONTRATISTA


 YERSON FAMILLO TORRES DUQUE
 SUPERVISOR DEL CONTRATO

ANEXO 4

CERTIFICADOS DE CALIDAD

Diagonal 8 No. 32-36 Barrio Blanco/Girardot-Cundinamarca

Tel: 8887452- Cel: 3115571381

edyconst@hotmail.com - gerencia@edyconst.com.co



CERTIFICADO DE CALIDAD

ACESCO COLOMBIA S.A.S.
Nit. 8600267530
Parque Industrial Malambo S.A.
Km 3 Via Malambo-Sabanagrande
Atlántico, Colombia.
PBX: 57-5-3718100
www.acesco.com
calidad@acesco.com

N. ENTREGA: 8000290314
CLIENTE: CYRGO S.A.S (IBAGUÉ)

FECHA 10.02.2026
PAG. 1 DE 2

SB21591 - 61521

| | | | | |
|--|------------|--|--|--|
| MATERIAL: 302629 - Lam 1.45-1220x2140 Z180 Galv. | | | | |
| NORMA DE CALIDAD: ASTM A 653 | | | | |
| LOTE No | 0006047217 | | | |
| COLADA No | 533546 | | | |
| PESO | 3.450 kg | | | |
| PORCENTAJE DE CARBONO | 0,050 % | | | |
| PORCENTAJE DE MANGANESO | 0,240 % | | | |
| PORCENTAJE DE FÓSFORO | 0,018 % | | | |
| PORCENTAJE DE AZUFRE | 0,004 % | | | |
| PORCENTAJE DE ALUMINIO | 0,001 % | | | |
| PORCENTAJE DE COBRE | % | | | |
| PORCENTAJE DE NIQUEL | % | | | |
| PORCENTAJE DE CROMO | 0,010 % | | | |
| PORCENTAJE DE MOLIBDENO | % | | | |
| PORCENTAJE DE VANADIO | 0,001 % | | | |

Las propiedades químicas presentadas son las reportadas por el proveedor de origen de la materia prima.

Certificamos que el material aquí descrito ha sido inspeccionado y ensayado conforme a los estándares mencionados. No requiere firma autógrafa ya que los resultados son generados por computador.

Certificado de Análisis



PINTUCO COLOMBIA S.A
 Mh. 890.900.148-2
 Dirección: Calle 19A No. 43B - 41.
 Medellín, Colombia.
 PBX: 384 84 84. Fax: 323 04 70.
 Apartado Aéreo: 1194
 www.pintuco.com

**Autopista Med-Bog Via Belen Rionegro Km 1
 Medellín, Antioquia**

Artículo1: **10290276**
POLIESTER LIBRE TGIC BLANCO HINDU GLOBAL TXT BTC CAJA 25 KG
 Lote: **PP2-57037**
 Cliente:
 Fecha de Fabricación: **08-FEB-26** Fecha de Vencimiento: **08-FEB-27**

| Prueba/Método/Norma | Resultado | Min | Max | Unid Prueba |
|---|-----------|--------|--------|-------------|
| DUREZA A LAPIZ / I-GC-QAP-015-PINTUCO I-GC-QAP-015-PINTUCO | H | H | 3H | |
| FLEXIBILIDAD MANDRIL CONICO 1/8" / I-GC-QAP-064-PINTUCO I-GC-QAP-064-PINTUCO | Pasa | Pasa | | |
| ADHERENCIA EN CUADRICULA / I-GC-QAP-007-PINTUCO I-GC-QAP-007-PINTUCO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | % |
| MASTERSIZER DIAMETRO MEDIO D(4,3) | 49.00 | 46.00 | 49.00 | Åµm |
| ESPESOR DE PELICULA / I-GC-QAP-016-PINTUCO I-GC-QAP-016-PINTUCO | 90.00 | 70.00 | 90.00 | Åµm |
| COLOR INSTRUMENTAL (Delta E) / I-I&D+i-012-PINTUCO I-I&D+i-012-PINTUCO | 0.06 | 0.00 | 0.50 | Adimens |
| CICLO DE CURADO | 190 | 190 | 190 | Grados Cent |
| TIEMPO DE HORNEO (Efectivo del Metal) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | min |
| RENDIMIENTO / I-I&D+i-080-PINTUCO I-I&D+i-080-PINTUCO | 8.58 | 8.58 | 8.58 | m2/kg |
| IMPACTO DIRECTO / I-GC-QAP-021-PINTUCO I-GC-QAP-021-PINTUCO | 60.00 | 60.00 | 60.00 | lb/in |
| IMPACTO INVERSO / I-GC-QAP-021-PINTUCO I-GC-QAP-021-PINTUCO | 60.00 | 60.00 | 60.00 | lb/in |

Observaciones:

Certificado generado electronicamente, no requiere firma. Producto aprobado por Personal de Calidad. Metodos de ensayo basados en normas ASTM o NTC

Gestion de calidad de la compania garantiza el cumplimiento de todas las propiedades de calidad referenciadas en la hoja tecnica de este producto.

Persona Responsable de Aprobación: **JOHN.MEJIA**

Avery Dennison T-6500 AIP/HIP

Película Retrorreflectiva Microprismática de Alta Intensidad

CERTIFICACIÓN PELÍCULA SERIE T-6500 HIP

Conversión: sobrelaminado, serigrafía, película sobre película.

AVERY DENNISON COLOMBIA S.A.S. con el respaldo de su casa matriz **AVERY DENNISON CORP.**, certifica su material **T-6500 HIP** película retrorreflectiva Microprismática de Alta Intensidad en los siguientes términos:

1. Descripción

Las películas retrorreflectivas microprismáticas de alta intensidad (HIP) Avery Dennison serie T-6000 para señales de tránsito permanentes y temporales son un material retrorreflectivo microprismático durable y de gran calidad que posee un adhesivo sensible a la presión. Su construcción microprismática única ofrece un alto nivel de retrorreflectividad para situaciones exigentes de señalización vial. Las películas serie T-6000 son películas microprismáticas omnidireccionales formadas por un arreglo de prismas dispuestos en múltiples orientaciones. Esta tecnología, "Inteligente a todos los ángulos", beneficia a las agencias, al brindarles la confianza de que todas las señales funcionarán con una reflectividad visual uniforme, cualquiera sea la orientación de la superficie de la señal.

2. Construcción

| | |
|-----------------------------------|---|
| Construcción | Película retrorreflectiva acrílica de alto brillo con un adhesivo permanente sensible a la presión protegido con un revestimiento de polipropileno. Los productos con adhesivo plástico utilizan un revestimiento de papel. |
| Calibre de película típico | 14 - 19 mils (356 - 483 µm) |

3. Coeficiente Mínimo de Retrorreflexión (RA) cd/ft² (cd·lx⁻¹·m²) -

Tabla A

| | | Coeficiente Mínimo de Retrorreflexión (R _A) cd/ft ² (cd·lx ⁻¹ ·m ²) (ASTM D4956 Película Tipo IV) | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--|----------|------|-------|-------|-------------|----------------------|
| Ángulo de Observación | Ángulo de Entrada | Blanco | Amarillo | Azul | Verde | Rojos | Marrón/Café | Naranja/Fluorescente |
| 0.2° | +4° | 360 | 270 | 30 | 30 | 65 | 10 | 105 |
| | +30° | 270 | 135 | 14 | 25 | 30 | 3.5 | 50 |
| 0.5° | +4° | 150 | 110 | 13 | 11 | 27 | 1.5 | 45 |
| | +30° | 71 | 54 | 6 | 10 | 10 | 0.5 | 20 |

Avery Dennison Colombia S.A.S
 NIT: 880.933.815-3
 Calle 45 Sur #43-30 Envigado, Colombia
 Tel: +574 355 0000

Tabla B

Límites de especificación de color durante el día (ASTM D4956)

| Colores | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | Factor de Luminancia Y |
|-------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------------------------|
| | x | y | x | y | x | y | x | y | |
| Blanco | 90.1 | 99.0 | 90.0 | 99.0 | 92.0 | 99.0 | 97.4 | 99.9 | ≥ 27 |
| Amarillo | 49.9 | 42.0 | 48.1 | 44.0 | 47.9 | 49.0 | 43.8 | 47.2 | 25 to 45 |
| Azul | 1.40 | 0.26 | 0.44 | 0.1 | 0.19 | 0.55 | 0.65 | 0.16 | 1.0 to 10 |
| Verde | 10.6 | 9.9 | 1.66 | 5.84 | 1.86 | 4.46 | 0.07 | 0.71 | 3.0 to 12 |
| Rojo | 6.48 | 9.01 | 7.35 | 0.66 | 6.75 | 0.781 | 6.66 | 0.44 | 2.5 to 15 |
| Marrón/Café | 4.00 | 3.40 | 6.10 | 3.90 | 5.50 | 4.50 | 4.00 | 3.90 | 1.0 to 9.0 |
| Anaranjado Fluorescente | 5.83 | 4.16 | 3.05 | 4.00 | 5.25 | 3.01 | 6.45 | 3.55 | ≥ 20 |

Tabla C

Límites de especificación de color durante la noche (ASTM D4956)

| Colores | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
|-------------------------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| | x | y | x | y | x | y | x | y |
| Blanco | 47.5 | 45.0 | 38.0 | 41.5 | 39.2 | 37.0 | 51.5 | 47.8 |
| Amarillo | 51.9 | 4.87 | 50.0 | 4.70 | 54.3 | 4.25 | 19.2 | 4.05 |
| Azul | 0.00 | 0.70 | 1.80 | 0.70 | 0.00 | 0.40 | 0.91 | 1.53 |
| Verde | 0.07 | 0.70 | 1.00 | 0.00 | 0.22 | 0.90 | 1.93 | 0.80 |
| Rojo | 0.00 | 0.48 | 0.20 | 0.46 | 0.10 | 0.53 | 0.93 | 0.65 |
| Marrón/Café | 0.95 | 4.10 | 0.40 | 4.05 | 0.70 | 0.65 | 0.19 | 3.55 |
| Anaranjado Fluorescente | 4.70 | 5.00 | 4.40 | 4.80-4.00 | 5.11 | 4.01 | 5.57 | 4.42 |

4. Durabilidad:

La película retrorreflectiva Microprismática de Alta Intensidad T-6500 es un producto con 10 años de garantía en exposición vertical cuando es aplicada y procesada adecuadamente, y 3 años para el color anaranjado fluorescente W-6514.

5. Conversión:

La serie T-6000 se puede convertir en señales vias utilizando los siguientes métodos:

- Serigrafía: siempre y cuando se utilicen las tintas de la serie Avery Dennison 4930 provistas por Avery Dennison.
- Aplicación directa sobre aluminio.
- Película transparente coloreada - Overlay
- Corte en plotter de tambor o cama plana.
- Corte por troquelado

6. Sustratos

Las películas de la serie T-6500 de Avery Dennison se limitan a sustratos debidamente preparados que difieren según el producto. Para los productos de la serie T-6500, la aplicación se limita al aluminio

debidamente preparado. Se insta a los usuarios a evaluar cuidadosamente, bajo las condiciones de uso reales, cualquier aplicación de películas a otros sustratos. Las fallas causadas por otros sustratos, materiales, contaminación o preparación inadecuada de la superficie no son responsabilidad de Avery Dennison. Consulte los boletines de instrucciones para obtener detalles completos sobre los requisitos del sustrato.

7. Reconocimiento Visual de la película original: Marca de agua de la película T-6500 de Avery Dennison

HIP Las marcas de agua pueden variar debido a las regulaciones locales. Comuníquese con Avery Dennison para
4A2116 obtener más detalles.

La presente Certificación se expide a los 11 días del mes de Mayo del 2026 a nombre de Grupo Delva SAS, por solicitud de nuestro Distribuidor Autorizado ADH Papeles Adhesivos S.A.S.; se confirma que el siguiente material cumple con la Norma NTC4739

| Referencia | Lote |
|---|----------------------|
| T-6500 HIP WHITE 30X50 T-6501 HIP YELLOW 30X50 | LR465347 LR424110 |

Cordialmente,

Tatiana Muñoz

Tatiana Munoz

Analista servicio al cliente Reflectivos
Avery Dennison Colombia | Reflective Solutions

reflectives.averydennison.com

WhatsApp: +573104551491

Email: tatiana.munoz1@averydennison.com

ESTAS CARTAS SON ORIGINALES, AUTÉNTICAS, LEGALES EMITIDAS POR AVERY DENNISON, SUBSIDIARIA COLOMBIA, CUALQUIER SOSPECHA DE FALSIFICACIÓN, ADULTERACIÓN O QUE PRESENTEN EMPRESAS NO AUTORIZADAS POR AVERY DENNISON O SUS REPRESENTANTES ESTRATÉGICOS COMUNICARSE DIRECTAMENTE AL CORREO carolina.restrepo@averydennison.com

Avery Dennison Colombia S.A.S
N.I.T. 990 990 814-9
Calle 48 Sur #48-30 Envigado, Colombia
Tel. +574 335 0000



| | | |
|--|---|--|
| <p>MUNICIPIO DE GIRARDOT</p> <p>CONTRATO DE OBRA: 916-2026</p> | <p>CONTRATISTA: EDYCONST S.A.S SUPERVISOR: YEISON CAMILO TORRES DUQUE</p> <p>OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD y DEMARCACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA.</p> | <p>Página 1 de 4</p> <p>Día: <u>30</u> Mes: <u>4</u> Año: 2026</p> |
|--|---|--|

ACTA DE COMITÉ TECNICO DE OBRA No. 1

1. OBJETO

En el municipio de Girardot, a los treinta días del mes de abril de 2026, siendo las 8:30 am, se reunieron en la oficina de la Secretaría de tránsito y transporte con el objeto de tratar temas relacionados con la ejecución de las actividades del CONTRATO DE OBRA No. 916 de 2026 que tiene por objeto "CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD y DEMARCACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA".

• TEMAS O ASUNTOS PLANTEADOS

- Inicio y presentación de invitados al comité.
- Coordinación de recorrido para localización de tramos de intervención.
- Definición de actividades de mantenimiento preventivo de reductores de velocidad existentes.
- Solicitud de inclusión de imagen institucional en la demarcación
- Compromisos y acuerdos

• DESARROLLO DE TEMAS

Inicio y presentación de invitados al comité.

Se da inicio a la reunión con presencia del Ing. Yeison Camilo Torres Duque Supervisor del Contrato, la Ing. Angela Pedraza directora de obra, el Ing. Alejandro Devia residente de obra Diana María Díaz Profesional SST y el Ing. Carlos Andrés Nieto Laguna en representación de la empresa Edyconst S.A.S.



| | | |
|--|--|--|
| <p>MUNICIPIO DE GIRARDOT CONTRATO DE OBRA: 916-2026</p> | <p>CONTRATISTA: EDYCONST S.A.S SUPERVISOR: YEISON CAMILO TORRES DUQUE</p> <p>OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD y DEMARCACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA.</p> | <p>Página 2 de 4</p> <p>Día: <u>30</u> Mes: <u>4</u> Año: 2026</p> |
|--|--|--|

Coordinación de recorrido para localización de tramos de vía

Se acuerda realizar un recorrido técnico en campo con el fin de localizar y georreferenciar los tramos de vía donde se proyecta la instalación de:

- Instalación de reductores plásticos de velocidad.
- Instalación de señalización vertical reglamentaria y preventiva.
- Ejecución de demarcación vial horizontal conforme a la normatividad vigente.

Durante el recorrido se verificará:

- Condiciones actuales de la vía.
- Flujo vehicular y puntos críticos.
- Viabilidad técnica de instalación.
- Cumplimiento de criterios de seguridad vial.

Descripción de actividades para mantenimiento preventivo de reductores existentes

Se definen las actividades correspondientes al mantenimiento preventivo de reductores de velocidad en concreto, conforme al rubro presupuestal asignado:

- Inspección técnica de estado físico (fisuras, desgaste, desprendimientos).
- Limpieza mecánica y/o manual de la superficie
- Reparación de grietas o deterioros menores mediante mortero o material adecuado.
- Reposición parcial en caso de pérdida de material.
- Aplicación de pintura reflectiva para mejorar visibilidad.
- Verificación y ajuste de la señalización horizontal y vertical asociada.

Se aclara que las intervenciones se priorizarán según nivel de riesgo para los usuarios de la vía y criticidad del punto intervenido.

Una vez terminada la intervención del contratista y dando claridad a sus solicitudes, el Ing Yeison Torres secretario de tránsito y transporte y supervisor del contrato toma la palabra e informa al



| | | |
|--|---|--|
| <p>MUNICIPIO DE GIRARDOT CONTRATO DE OBRA: 916-2026</p> | <p>CONTRATISTA: EDYCONST S.A.S SUPERVISOR: YEISON CAMILO TORRES DUQUE</p> <p>OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD y DEMARCAION VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA.</p> | <p>Página 3 de 4</p> <p>Día: <u>30</u> Mes: <u>4</u> Año: 2026</p> |
|--|---|--|

contratista que la Entidad Contratante manifestó la necesidad de fortalecer la identificación institucional del proyecto.

En tal sentido, comunica que se solicita al contratista incluir dentro de la demarcación vial de los tramos definidos, la incorporación del logo oficial del municipio, procurando que dicha inclusión no afecte la funcionalidad, visibilidad ni la correcta interpretación de la señalización vial reglamentaria.

La entidad entregará al contratista la plantilla del logo para su respectiva demarcación y la forma de pago de este será en m², dentro el ítem de demarcación horizontal.

La responsabilidad por la definición del contenido institucional, diseño, especificaciones, dimensiones del logo y su pertinencia recae exclusivamente en la Entidad Contratante.

3.3 COMPROMISOS PACTADOS

| COMPROMISO | RESPONSABLE |
|---|---------------------------|
| Ejecutar recorrido, levantamiento de información y localización de los tramos a intervenir el día 2 de mayo del 2026. | SUPERVISOR CONTRATISTA |
| Entrega de la plantilla del logo del municipio, que se implantara en la demarcación vial de los tramos a intervenir el día 11 de mayo del 2026. | SUPERVISOR |

2. PRÓXIMA REUNIÓN






| | |
|--------|---|
| FECHA: | 4 de mayo de 2026 |
| HORA: | 8:00 am |
| LUGAR: | Oficina de la Secretaría de Tránsito y Transporte |

PARTICIPANTES



| | | |
|--|--|--|
| <p>MUNICIPIO DE GIRARDOT</p> <p>CONTRATO DE OBRA: 816-2026</p> | <p>CONTRATISTA: EDYCONST S.A.S</p> <p>SUPERVISOR: YEISON CAMILO TORRES DUQUE</p> <p>OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD y DEMARCACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA.</p> | <p>Página 4 de 4</p> <p>Día: <u>30</u></p> <p>Mes: <u>4</u></p> <p>Año: 2026</p> |
|--|--|--|

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Nombre: | Yeison Camilo Torres Duque |  Firma |
| En representación de: | Entidad Contratante – supervisor del Contrato/Secretario de transito y transporte | |
| Teléfono: | 3112671402 |  Firma |
| Nombre: | Carlos Andrés Nieto Laguna | |
| En representación de: | Edyconst S.A.S |  Firma |
| Teléfono: | 3115571381 | |
| Nombre: | Diana María Díaz Ortiz/Profesional SST |  Firma |
| En representación de: | Edyconst S.A.S/Representante legal | |
| Teléfono: | 3175262303 |  Firma |
| Nombre: | Angela Johana Pedraza | |
| En representación de: | Edyconst S.A.S/Directora de Obra | |
| Teléfono: | 3012875159 | |
| Nombre: | Francisco Alejandro Devia/ Residente de obra | |
| En representación de: | Edyconst S.A.S | |
| Teléfono: | 3007799065 | |



| | | |
|--|--|--|
| MUNICIPIO DE GIRARDOT CONTRATO DE OBRA: 916-2026 | CONTRATISTA: EDYCONST S.A.S SUPERVISOR: YEISON CAMILO TORRES DUQUE OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD y DEMARCACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA. | Página 1 de 7 Día: <u>4</u> Mes: <u>5</u> Año: 2026 |
|--|--|--|

ACTA DE COMITÉ TECNICO DE OBRA No. 2

1. OBJETO

En el municipio de Girardot, a los cuatro días del mes de mayo de 2026, siendo las 8.00 am, se reunieron en la oficina de la Secretaría de tránsito y transporte con el objeto de tratar temas relacionados con la ejecución de las actividades del CONTRATO DE OBRA No. 916 de 2026 que tiene por objeto "CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD y DEMARCACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA".

• TEMAS O ASUNTOS PLANTEADOS

- Inicio y presentación de invitados al comité.
- Aprobación tramos de vía a intervenir
- Coordinación de recorrido para localización de tramos de intervención faltantes
- Compromisos y acuerdos

• DESARROLLO DE TEMAS

Inicio y presentación de invitados al comité.

Se da inicio a la reunión con presencia del Ing. Yeison Camilo Torres Duque Supervisor del Contrato, la Ing. Angela Pedraza directora de obra, el Ing. Alejandro Devia residente de obra, Diana María Díaz Profesional SST y el Ing. Carlos Andrés Nieto Laguna en representación de la empresa Edyconst S.A.S.

Aprobación de tramos de vía a intervenir

De acuerdo con el recorrido realizado el día 2 de mayo del 2026 con el supervisor del contrato el Ing. Yeison Camilo Torres Duque actual Secretario de Transito y Transporte y por parte del



| | | |
|---|--|---|
| <p>MUNICIPIO DE GIRARDOT</p> <p>CONTRATO DE OBRA: 916-2026</p> | <p>CONTRATISTA: EDYCONST S.A.S SUPERVISOR: YEISON CAMILO TORRES DUQUE</p> <p>OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y DEMARCACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA.</p> | <p>Página 2 de 6</p> <p>Día: <u>4</u> Mes: <u>5</u> Año: 2026</p> |
|---|--|---|

Contratista la Ing. Angela Pedraza directora de obra, el Ing. Alejandro Devia residente de obra, la SISO Diana María Díaz Ortiz y el Ing. Carlos Andrés Nieto Laguna en representación de la empresa Edyconst S.A.S. donde de acuerdo a las solicitudes radicadas ante la Secretaria de Tránsito y Transporte de la Alcaldía de Girardot, el supervisor indico donde se deben realizar las intervenciones de demarcación e instalación de señales tanto verticales como horizontales. Para ello se realizó una hoja de ruta donde se localizaron los tramos priorizados para intervención, teniendo en cuenta criterios de seguridad vial, flujo vehicular y necesidades identificadas por la Secretaria de Tránsito.

Dichos tramos fueron verificados, ajustados y georreferenciados en campo mediante recorrido técnico entre el Contratista y la Supervisión, dando cumplimiento a las directrices impartidas por esta última.

En este sentido, el Contratista solicita el aval y aprobación formal de los tramos relacionados, conforme a la validación técnica realizada durante el recorrido.

El Ing. Yeison Camilo Torres Duque Supervisor del Contrato responde al contratista que quedan aprobados los tramos socializados en el presente comité.

A continuación, se relacionan los tramos de vía inspeccionados a la fecha y quedan aprobados para intervención.



| | | |
|---|--|---|
| <p>MUNICIPIO DE GIRARDOT</p> <p>CONTRATO DE OBRA: 916-2026</p> | <p>CONTRATISTA: EDYCONST S.A.S SUPERVISOR: YEISON CAMILO TORRES DUQUE</p> <p>OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y DEMARCAACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA.</p> | <p>Página 3 de 7</p> <p>Día: <u>4</u> Mes: <u>5</u> Año: 2026</p> |
|---|--|---|

| SUMINISTRO E INSTALACION DE RESALTOS PLASTICOS MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA | | | |
|--|---------------------------|--|--|
| RP N° | BARRIO | LOCALIZACION | COORDENADAS |
| 1 | AV. CIUDAD DE LAS ACACIAS | SENTIDO CAÑOS DEL NORTE CON CRA 10 | https://www.google.com/maps/@4.5308115,-74.5308115,15z |
| 2 | AV. CIUDAD DE LAS ACACIAS | SENTIDO CAÑOS DEL NORTE CON CRA 10 | https://www.google.com/maps/@4.5308115,-74.5308115,15z |
| 3 | AV. CIUDAD DE LAS ACACIAS | SENTIDO CAÑOS DEL NORTE CON CRA 10 | https://www.google.com/maps/@4.5308115,-74.5308115,15z |
| 4 | BARRIO ROSABLANCA | CALLE 32 CON AV. CIUDAD DE LAS ACACIAS | https://www.google.com/maps/@4.5308115,-74.5308115,15z |
| 5 | AV. CIUDAD DE LAS ACACIAS | SENTIDO CRA 10 CON CAÑOS DEL NORTE | https://www.google.com/maps/@4.5308115,-74.5308115,15z |
| 6 | BARRIO BLANCO | CALLE 32 CON AV. CIUDAD DE LAS ACACIAS | https://www.google.com/maps/@4.5308115,-74.5308115,15z |
| 7 | AV. CIUDAD DE LAS ACACIAS | SENTIDO CRA 10 CON CAÑOS DEL NORTE | https://www.google.com/maps/@4.5308115,-74.5308115,15z |
| 8 | AV. CIUDAD DE LAS ACACIAS | SENTIDO CRA 10 CON CAÑOS DEL NORTE | https://www.google.com/maps/@4.5308115,-74.5308115,15z |
| 9 | BARRIO BLANCO | DIAGONAL 8 CON CALLE 31 | https://www.google.com/maps/@4.5308115,-74.5308115,15z |
| 10 | BARRIO SUCRE | CRA 12 ENTRE CIL 22 Y 25 | https://www.google.com/maps/@4.5308115,-74.5308115,15z |
| 11 | BARRIO SUCRE | CALLE 20, COLEGIO NUESTRA SRA DEL PILAR | https://www.google.com/maps/@4.5308115,-74.5308115,15z |
| 12 | AV. CIUDAD DE LAS ACACIAS | SENTIDO CRA 10 CON CAÑOS DEL NORTE | https://www.google.com/maps/@4.5308115,-74.5308115,15z |
| 13 | BARRIO EL DIAMANTE | FRENTE A LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL EL RIN PATARRHOYO | https://www.google.com/maps/@4.5308115,-74.5308115,15z |
| 14 | BARRIO EL DIAMANTE | FRENTE A LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL EL RIN PATARRHOYO | https://www.google.com/maps/@4.5308115,-74.5308115,15z |
| 15 | BARRIO DIAMANTE | MANZANA E CASA 1 | https://www.google.com/maps/@4.5308115,-74.5308115,15z |
| 16 | BARRIO DIAMANTE POPULAR | MANZANA E CASA 1 | https://www.google.com/maps/@4.5308115,-74.5308115,15z |
| 17 | BARRIO DIAMANTE POPULAR | MANZANA E CASA 1 | https://www.google.com/maps/@4.5308115,-74.5308115,15z |



| | | |
|---|--|---|
| <p>MUNICIPIO DE GIRARDOT</p> <p>CONTRATO DE OBRA: 916-2026</p> | <p>CONTRATISTA: EDYCONST S.A.S</p> <p>SUPERVISOR: YEISON CAMILO TORRES DUQUE</p> <p>OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD y DEMARCAACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA.</p> | <p>Página 4 de 7</p> <p>Día: <u>4</u></p> <p>Mes: <u>5</u></p> <p>Año: 2026</p> |
|---|--|---|

| SEÑALIZACION Y DEMARCAACION VIAL (PINTURA m2) | | | | |
|---|---------------------------|---|-------------|---------------------------------|
| MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA | | | | |
| Nº | BARRIO | LOCALIZACION | COORDENADAS | TIPO DE DEMARCAACION |
| 1 | BARRIO SUR RE | CRA ENTRE CLAYSON Y EL PUEBLO PALMERITO | | CEBRA-LINEA DE PARE |
| 2 | BARRIO SUR NOR | MANZANA CASAS | | RESALTO DE CONCRETO |
| 3 | BARRIO TRIUNFO | MANZANA EL CASAS | | RESALTO DE CONCRETO |
| 4 | BARRIO SUR ORE | CARRERA 42 21 72 | | RESALTO DE CONCRETO |
| 5 | BARRIO SUR ORE | CALLE 22 91 10 | | RESALTO DE CONCRETO |
| 6 | AV. CIUDAD DE LAS AMOLAS | SENTIDO CASOS DEL NORTE CON CRA 19 | | CEBRA-LINEA DE PARE |
| 7 | AV. CIUDAD DE LAS AMOLAS | SENTIDO CASOS DEL NORTE CON CRA 19 | | CEBRA |
| 8 | AV. CIUDAD DE LAS AMOLAS | SENTIDO CRA 19 CON CASOS DEL NORTE | | CEBRA-LINEA DE PARE |
| 9 | AV. CIUDAD DE LAS AMOLAS | SENTIDO CRA 19 CON CASOS DEL NORTE | | CEBRA |
| 10 | AV. CIUDAD DE LAS AMOLAS | SENTIDO CASOS DEL NORTE CON CRA 19 | | LINEA ANTI-DEQUE |
| 11 | AV. CIUDAD DE LAS AMOLAS | SENTIDO CRA 19 CON CASOS DEL NORTE | | LINEA ANTI-DEQUE |
| 12 | AV. CIUDAD DE LAS AMOLAS | SENTIDO CRA 19 CON CASOS DEL NORTE | | PAS. DE PELETERIA-LINEA DE PARE |
| 13 | BARRIO CENTRO | PARKING PRINCIPAL | | BAMPA PARA DISCAPACITADOS |
| 14 | LAGO ALCALDIA DE GIRARDOT | V. ALCALIA DE GIRARDOT 2011-2017 | | LOGO ALCALIA |
| 15 | BARRIO EL DIAMANTE | FRENTE A LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ELIAS PATARRROY | | RESALTO DE CONCRETO |
| 16 | BARRIO EL DIAMANTE | FRENTE A LA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR | | RESALTO DE CONCRETO |
| 17 | BARRIO EL DIAMANTE | FRENTE A LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ELIAS PATARRROY | | CEBRA-LINEA DE PARE |
| 18 | BARRIO EL DIAMANTE | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ELIAS PATARRROY SOBRE CALLE 24 | | CEBRA-LINEA DE PARE |
| 19 | BARRIO PUERTA BUENO | CALLE 98-2 | | RESALTO DE CONCRETO |
| 20 | BARRIO PUERTA BUENO | CALLE 98-2 | | RESALTO DE CONCRETO |



| | | |
|--|---|---|
| <p>MUNICIPIO DE GIRARDOT CONTRATO DE OBRA: 916-2026</p> | <p>CONTRATISTA: EDYCONST S.A.S SUPERVISOR: YEISON CAMILO TORRES DUQUE</p> <p>OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y DEMARCAACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA.</p> | <p>Página 5 de 7</p> <p>Día: <u>4</u> Mes: <u>5</u> Año: 2026</p> |
|--|---|---|

| DEMARCACION VIAL (m) | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--|-------------|
| MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA | | | |
| Nº | BARRIO | LOCALIZACION | COORDENADAS |
| 1 | VIA NARIÑO - TORCAMEL CRA 21 | CARRIL DERECHO FRENTE A CONDOMINIO RESERVAS DE NODIA | |
| 2 | VIA NARIÑO - TORCAMEL CRA 21 | CARRIL DERECHO SEMINARIO - BARRIO VALLE DEL SOL | |
| 3 | VIA NARIÑO - TORCAMEL CRA 21 | CARRIL DERECHO FRENTE A CONDOMINIO CASA LOMA | |
| 4 | VIA NARIÑO - TORCAMEL CRA 21 | CARRIL DERECHO FRENTE A CONDOMINIO CASA LOMA | |
| 5 | VIA CILLAS | FRENTE A COLEGIO MANUEL ELKIN PATARROYO | |
| 6 | BARRIO ROSA BLANCA | CALLE ENTRE CRA 10 Y 12A | |
| 7 | BARRIO ROSA BLANCA | CRA 10A ENTRE CALLE 8A Y 9A | |
| 8 | VIA BARRIO DIAMANTE | MEZCLA CAÑOS ESMERALDA Y PARALELO A LA IMPRESA | |
| 9 | VIA BARRIO ESMERALDA 3 | MEZCLA CALLE DERECHO | |
| 10 | BARRIO TRINIDAD | CRA 7A ENTRE DIAGONAL 40 Y CALLE 11A | |
| 11 | BARRIO MINAZULENES | CRA 11 FRENTE AL MONUMENTO DE LA LIBERTAD | |
| 12 | BARRIO BLANCO | DIAGONAL FRENTE CALLE 8A | |
| 13 | BARRIO SANTIAGO | CALLE ENTRE CRA 7A Y 8 | |
| 14 | BARRIO SUCRE | CALLE ENTRE CALLE 20 Y 22 | |
| 15 | BARRIO SUPER | CALLE ENTRE CALLE 20 Y 22 | |

Las señales verticales serán instaladas en los tramos donde se ubiquen los resaltos plásticos cumpliendo con lo especificado en el manual de señalización vial 2024 del INVIAS.

Coordinación de recorrido para localización de tramos faltantes

Se programa realizar un nuevo recorrido técnico conjunto entre supervisión y contratista con el objetivo de:



| | | |
|---|---|---|
| <p>MUNICIPIO DE GIRARDOT</p> <p>CONTRATO DE OBRA: 916-2026</p> | <p>CONTRATISTA: EDYCONST S.A.S SUPERVISOR: YEISON CAMILO TORRES DUQUE</p> <p>OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD y DEMARCACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA.</p> | <p>Página 6 de 7</p> <p>Día: <u>4</u> Mes: <u>5</u> Año: 2026</p> |
|---|---|---|

- Localizar y georreferenciar los tramos faltantes de intervención para cumplir con las cantidades contratadas.
- Identificar puntos críticos no contemplados inicialmente.
- Validar la viabilidad técnica de instalación de señalización, reductores y demarcación.

El recorrido permitirá consolidar el alcance definitivo del proyecto.

3.3 COMPROMISOS PACTADOS

| COMPROMISO | RESPONSABLE |
|---|---------------------------|
| Ejecutar recorrido, levantamiento de información y localización de los tramos a intervenir faltantes el día 5 de mayo del 2026. | SUPERVISOR CONTRATISTA |

2. PRÓXIMA REUNIÓN

| | |
|--------|---|
| FECHA: | 11 de mayo de 2026 |
| HORA: | 9:00 am |
| LUGAR: | Oficina de la Secretaría de Tránsito y Transporte |



| | | |
|--|--|---|
| <p>MUNICIPIO DE GIRARDOT</p> <p>CONTRATO DE OBRA: 816-2026</p> | <p>CONTRATISTA: EDYCONST S.A.S</p> <p>SUPERVISOR: YEISON CAMILO TORRES DUQUE</p> <p>OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD y DEMARCACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA.</p> | <p>Página 7 de 7</p> <p>Día: <u>4</u></p> <p>Mes: <u>5</u></p> <p>Año: 2026</p> |
|--|--|---|

PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

| | | |
|-----------------------|---|-------|
| Nombre: | Yeison Camilo Torres Duque | |
| En representación de: | Entidad Contratante - supervisor del Contrato/ Secretario de Transito y Transporte. | |
| Teléfono: | 3112671402 | Firma |
| Nombre: | Carlos Andrés Nieto Laguna | |
| En representación de: | Edyconst S.A.S. / Representante Legal | |
| Teléfono: | 3115571381 | Firma |
| Nombre: | Angela Johana Pedraza | |
| En representación de: | Edyconst S.A.S. / Directora de Obra | |
| Teléfono: | 3012875159 | Firma |
| Nombre: | Francisco Alejandro Devia Suarez | |
| En representación de: | Edyconst S.A.S./ Residente de obra | |
| Teléfono: | 3007799065 | Firma |
| Nombre: | Diana Maria Diaz Ortiz | |
| En representación de: | Edyconst S.A.S./ Profesional SST | |
| Teléfono: | 3212231493 | Firma |



**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES**

Girardot-Cundinamarca, 19 de mayo de 2026

Señores

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
Girardot - Cundinamarca

Yo, **CARLOS ANDRÉS NIETO LAGUNA**, identificado con C.C. No. 11.226.681, en mi condición de Representante Legal de **ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S.**, identificada con NIT 900.354.156-4, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Girardot, Cundinamarca, luego de examinar conforme a la documentación interna de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2007.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad del juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Ing. Carlos Andrés Nieto Laguna
MAT. 25202-190306 CND.
Representante Legal

José Nilson Pava Flórez
Contador Publico
T.P. No.131706-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
93.435.029

PAVA FLOREZ
PELLUCO
JOSE NILSON
NOMBRE



Handwritten signature and scribbles



ADICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-NOV-1978


GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73
ESTATURA

O+
G.R. P.H.

M
PESO

12-MAR-1997 FLANDES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



L-2005200-00 15605 L-M-0005435025-2007000 04712070448 02 2108027 15

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO**



131706-T

JOSE NILSON
PAVA FLOREZ
C.C. 93435029

RESOLUCION INSCRIPCION 011 FECHA 14/02/2008
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

PRESIDENTE


LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 141648

FIRMA DEL TITULAR

5413

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 5 E 7 0 F B 0 2 0 0 5 5 3 0 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JOSE NILSON PAVA FLOREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 93435029 de FLANDES (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 131706-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDAD | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|--------------------|----------------|------------------------|--------------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 9 | \$1,251,900 | \$0 | \$0 | \$1,251,900 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | \$280,200 | \$0 | \$0 | \$280,200 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | \$560,400 | \$0 | \$0 | \$560,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 6 | \$411,300 | \$0 | \$0 | \$411,300 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 10 | \$301,900 | \$0 | \$0 | \$301,900 |
| ARL SUBA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 10 | \$301,900 | \$0 | \$0 | \$301,900 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 10 | \$338,600 | \$0 | \$0 | \$338,600 |
| CONSUBSIDIO | CCF22 | 860,087,336 | 1 | 10 | \$338,600 | \$0 | \$0 | \$338,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 10 | \$339,200 | \$0 | \$0 | \$339,200 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | \$7,100 | \$0 | \$0 | \$7,100 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | \$70,100 | \$0 | \$0 | \$70,100 |
| NIJEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 4 | \$93,700 | \$0 | \$0 | \$93,700 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 3 | \$98,200 | \$0 | \$0 | \$98,200 |
| SANITAS | EPS005 | 800,231,440 | 6 | 1 | \$70,100 | \$0 | \$0 | \$70,100 |
| TOTAL | | | | 10 | \$1,231,600 | \$0 | \$0 | \$1,231,600 |



POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

N.T. 860.009.574-6

RCE CONTRATOS

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|-----------|-------------|----------------------|-------------------------------|------------|-------------|----------------------|-------------------------------------|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE | | | SUCURSAL IBAGUE | | | COD.SUC 26 | NO. POLIZA 25-40-101058752 | ANEXO 0 | | | |
| FECHA EXPEDICIÓN DÍA 21 | MES 04 | AÑO 2026 | VIGENCIA DESDE DÍA 21 | MES 04 | AÑO 2026 | A LAS HORAS 00:00 | VIGENCIA HASTA DÍA 31 | MES 07 | AÑO 2026 | A LAS HORAS 23:59 | TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | |
|---|-----------------------------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S | IDENTIFICACIÓN NIT: 800.354.156-4 |
| DIRECCIÓN: KR 9 A NRO. 32 - 1118 ROSA BLANCA | Ciudad: GIRARDOT CUNDINAMARCA |
| | TELÉFONO: 3115571381 |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | |
|--|-----------------------------------|
| ASEGURADO: MUNICIPIO DE GIRARDOT | IDENTIFICACIÓN NIT: 890.880.378-4 |
| DIRECCIÓN: CRA 11 NO. 17 - ESQUINA PALACIO MUNICIPAL | Ciudad: GIRARDOT, CUNDINAMARCA |
| BENEFICIARIO: 890880378 - MUNICIPIO DE GIRARDOT | TELÉFONO: 8314134 |

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-25-00000-E-RCS-8038-0001 / 21-03-22 - 1329-P-25-00000-E-RCS-8038-0001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLAMAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, SEGUN ASO CONTRACTUAL, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 840-2020 RELACIONADO CONTRATO DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE EDUCACIÓN PRECATORIA, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COLABORACIÓN CON EL COMITÉ DE GESTIÓN CUNDINAMARCA.

AMPAROS

| AMPAROS | DESCRIPCION | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | COTA ASES ACTUAL |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| RIESGO: SUBINVESTAC DE BIENES | | | | |
| AMPAROS | | | | |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 19.06 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 MILLY | 21/04/2026 | 31/07/2026 | \$350,181,900.00 |

ACLARACIONES

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | I/A | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
| \$ ****242.248.00 | \$ ****3.000.00 | \$ ****46.597.00 | \$ ****291.845.00 | \$ ****350.181.000.00 | CONTADO |
| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COSEGURO | | |
| NOMBRE | C.A.F | % DE PART | NOMBRE COMPAÑIA | % DE PART | VALOR ASEGURADO |
| TE REESTRUCTURA S.A LTDA | 107193 | 100.00 | | | |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 02 - TELÉFONO: 2701040 - IBAGUE

25-40-101058752

FORMA AUTORIZADA: *[Firma]*



[Firma]

VISADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 890.009.378-4

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE | | | SUCURSAL IBAGUE | | | COD.SUC 25 | NO.PÓLIZA 25-40-101056752 | ANEXO 0 |
| FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 21 04 2026 | VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 21 04 2026 | | | A LAS HORAS 00:00 | VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 31 07 2026 | A LAS HORAS 23:59 | TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL | |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | |
|--|--|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S | IDENTIFICACIÓN NIT: 900.354.156-4 |
| DIRECCIÓN: KR 9 A NRO. 32 - 111 B ROSA BLANCA | CIUDAD: GIRARDOT CUNDINAMARCA |
| | TELÉFONO: 3115671361 |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | |
|---|--|
| ASEGURADO MUNICIPIO DE GIRARDOT | IDENTIFICACIÓN NIT: 890.890.378-4 |
| DIRECCIÓN: CRA 11 NO. 17 - ESQUINA PALACIO MUNICIPAL | CIUDAD: GIRARDOT CUNDINAMARCA |
| BENEFICIARIO: | TELÉFONO: 8314134 |

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PAGOS WEB

CORREOS POSTALES BANCARIOS

PAGOS CON CONVENIO (No aplica para transferencias)

Banco de Bogotá

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|
| VALOR PRIMA NETA \$ ****242.248.00 | GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****3.000.00 | IVA \$ *****46.597.00 | TOTAL A PAGAR \$ *****291.846.00 | VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****660.181.000.00 | PLAN DE PAGO CONTADO |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|

| | | | | | |
|-----------------------|--------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------|
| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCIÓN COMERCIO | | |
| NOMBRE | CLAVE | T. DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | T. DE PART. | VALOR ASEGURADO |
| 78 ASB37RN109 RA 1222 | 114053 | 100.00 | | | |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y PARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO, QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REPIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 99 - TELÉFONO: 2701040 - IBAGUE

FORMA DE PAGO

| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
|------------------|------------|-------|
| EFFECTIVO | | |
| CHEQUE | | |
| TOTAL \$ | | |



REFERENCIA PAGO:
1100581176901-0

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

NT. 890.009.578-6

RCE CONTRATOS

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|----------------------|--|---|--|----------------------|--|--|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE | | | SUCURSAL IBAGUE | | | COD.SUC 25 | | NO.PÓLIZA 25-40-101056752 | | ANEXO 2 | | | |
| FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 30 04 2025 | | | VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 29 04 2025 | | | A LAS HORAS 00:00 | | VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 05 08 2026 | | A LAS HORAS 23:59 | | TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA | |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|----------------------|--|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NIT: 900.354.166-4 | | | | |
| DIRECCIÓN: KR 9 A NRO. 32 - 111 B ROSA BLANCA | | | | | | | CIUDAD: GIRARDOT, CUNDINAMARCA | | | TELÉFONO: 3115571381 | |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|------------------|--|
| ASEGURADO: MUNICIPIO DE GIRARDOT | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NIT: 900.890.378-4 | | | | |
| DIRECCIÓN: CRA 11 NO. 17 - ESQUINA PALACIO MUNICIPAL | | | | | | | CIUDAD: GIRARDOT, CUNDINAMARCA | | | TELÉFONO 8314134 | |
| BENEFICIARIO: 890680378 - MUNICIPIO DE GIRARDOT | | | | | | | | | | | |

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXIAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D001 / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE SE ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN SABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO ESTIPULADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:
SE GARANTIZA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL SEGUN ACTO CONTRACTUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 916-2024 RELACIONADO CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y DEMARCAACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA.

AMPAROS

| | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES | | | | | |
| AMPAROS | DEDUCTIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASRG ACTUAL | SUMA ASRG ANTERIOR |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 29/04/2025 | 08/08/2026 | \$ 3350.181.000.00 | |

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE ACLARA VIGENCIA SEGUN ACTA DE INICIO

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
| \$ ****242,248.00 | \$ ****3,000.00 | \$ ****46,597.00 | \$ ****291,845.00 | \$ ****350,181,000.00 | CONTADO |

| | | | | | |
|-----------------------|--------|-----------|------------------------|--------|-----------------|
| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION OCASEGURO | | |
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART | NOMBRE COMPAÑIA | % PART | ALICR ASEGURADO |
| TR ASEGURADOS RG LTDA | 164053 | 100.00 | | | |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 05 - TELEFONO: 2701040 - IBAGUE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

[Firma Autorizada]



[Firma Tomador]

25-40-101056752

FIRMA AUTORIZADA: Juan Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 183 - 05, PISO 5 TELEFONO: 881-2188877, 801-8918330

DIAMANTINAR



POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE CONTRATOS

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|------|--------------------|-----|------|----------------|--|-------------------------------|-----|------------|-------------|--|
| CUIDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE | | | SUCURSAL IBAGUE | | | COD. SUC 25 | | NO. PÓLIZA 25-40-101056752 | | ANEXO 3 | | |
| FECHA EXPEDICIÓN | | | VIGENCIA DESDE | | | A LAS HORAS | | VIGENCIA HASTA | | | A LAS HORAS | |
| DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO | | | DÍA | MES | AÑO | | |
| 30 | 04 | 2026 | 29 | 04 | 2026 | 00:00 | | 08 | 08 | 2026 | 23:59 | |
| TIPO MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | |
| ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA | | | | | | | | | | | | |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S
 IDENTIFICACIÓN NIT: 900.364.168-4
 DIRECCIÓN: KR 9 A NRO. 32 - 111 B ROSA BLANCA
 CIUDAD: GIRARDOT, CUNDINAMARCA
 TELÉFONO: 3115871381

DATOS DEL ASEGURADO - BENEFICIARIO
 ASEGURADO: MUNICIPIO DE GIRARDOT
 IDENTIFICACIÓN NIT: 890.680.378-4
 DIRECCIÓN: CRA 11 NO. 17 - ESQUINA PALACIO MUNICIPAL
 CIUDAD: GIRARDOT, CUNDINAMARCA
 TELÉFONO: 8314134
 BENEFICIARIO: 890680378 - MUNICIPIO DE GIRARDOT

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA ENIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELÉFONO: 2701040 - IBAGUE

25-40-101056752

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Viceministro de Finanzas

FIRMA TOMADOR

DIANAMARCA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

NIT. 860.009.578-6

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|----------------------|--|---|--|----------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE | | | SUCURSAL IBAGUE | | | COD SUC 25 | | NO. POLIZA 25-44-101213589 | | ANEXO 0 | |
| FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 21 04 2026 | | | VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 21 04 2026 | | | A LAS HORAS 00:00 | | VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 31 07 2029 | | A LAS HORAS 23:59 | |
| TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL | | | | | | | | | | | |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S | | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NIT: 900.354.158-4 | | | |
| DIRECCIÓN KR 9 A NRO 32 - 111 B ROSA BLANCA | | | | | | CIUDAD GIRARDOT, CUNDINAMARCA | | TELÉFONO: 3115571381 | | | |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO MUNICIPIO DE GIRARDOT | | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NIT: 890.880.378-4 | | | |
| DIRECCIÓN CRA 11 NO. 17 - ESQUINA PALACIO MUNICIPAL | | | | | | CIUDAD GIRARDOT, CUNDINAMARCA | | TELÉFONO 8314134 | | | |

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN AQUÍ, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLAMAN HABER ACEPTADO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES Y CONTRACTUALES DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT, EN ESPECIAL EN LO REFERENTE AL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

| AMPARO | VIGENCIA INICIO | VIGENCIA FIN | VALOR ASEG. ORIGINAL |
|---|-----------------|--------------|----------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 21/04/2026 | 30/11/2026 | \$39.309.246,70 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 21/04/2026 | 31/07/2026 | \$19.864.623,35 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 21/07/2026 | 31/07/2027 | \$37.829.246,70 |

ACLARACIONES

| VALOR PRIMA META | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|------------------|-------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|
| \$ 292.872,00 | \$ 6.906,00 | \$ 57.165,00 | \$ 356.943,00 | \$ 99.823.116,75 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | |
|-----------------------|--------|-----------|------------------------|-------|----------------|
| NOMBRE | C.A.E | % DE PART | NOMBRE COASEGURO | PARTE | % DE ASEGURADO |
| IF ASESORADOS AS LTDA | 144192 | 100,00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN



25-44-101213589

AGENCIA AUTORIZADA: Jose Luis Quiroga - Municipio de Girardot

FIRMA ASEGURADOR

LEA ESTE CUADRO CON ATENCIÓN EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 80, PISO 6 TELEFONO: 891-2100077, 801-6510326

DLF1840835

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NIT. 890.009.578-6

DECRETO 1082 DE 2015

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|----------------------|--|---|--|------------|----------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICION IBAGUE | | | SUCURSAL IBAGUE | | | COD.SUC 25 | | NO.POLIZA 25-44-101213539 | | ANEXO 0 | | |
| FECHA EXPEDICIÓN DIA MES AÑO 21 04 2026 | | | VIGENCIA DESDE DIA MES AÑO 21 04 2026 | | | A LAS HORAS 00:00 | | VIGENCIA HASTA DIA MES AÑO 31 07 2029 | | | A LAS HORAS 23:59 | |
| TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL | | | | | | | | | | | | |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S | | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NIT: 900.354.156-4 | | | |
| DIRECCIÓN: KR 9 A NRO. 32 - 111 B ROSA BLANCA | | | | | | CIUDAD: GIRARDOT, CUNDINAMARCA | | TELÉFONO: 3115671361 | | | |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE GIRARDOT | | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NIT: 890.090.378-4 | | | |
| DIRECCIÓN: CPA 11 NO. 17 - ESQUINA PALACIO MUNICIPAL | | | | | | CIUDAD: GIRARDOT, CUNDINAMARCA | | TELÉFONO: 8314134 | | | |

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|
| VALOR PRIMA NETA \$ *****292.872.00 | GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8.000.00 | IVA \$ *****57.165.00 | TOTAL A PAGAR \$ *****358.038.00 | VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****99.823.116.75 | PLAN DE PAGO CONTADO |
|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|


| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION DE ASESORO | | |
|------------------------|--------|-----------|-------------------------|--------|-----------------|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART | NOMBRE COMPAÑIA | % PART | VALOR ASEGURADO |
| TE ASESORANCIA RG LIDA | 144953 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA. POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 40 NO. 33 - 08 - TELÉFONO: 3761040 - IBAGUE

FORMA DE PAGO

| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
|-----------|------------|-------|
| EFFECTIVO | | |
| CHEQUE | | |
| TOTAL \$ | | |



REFERENCIA PAGO:
1100561176898-8

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VICIADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NIT. 000.009.578-6

DECRETO 1082 DE 2016

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|----------------------|--|---|--|----------------------|--|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE | | | SUCURSAL IBAGUE | | | COD.SUC 25 | | NO.POLIZA 25-44-101213589 | | ANEXO 2 | | |
| FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 30 04 2026 | | | VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 29 04 2026 | | | A LAS HORAS 00:00 | | VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 08 08 2029 | | A LAS HORAS 23:59 | | TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------------|--|----------------------|--|
| DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO | | | | | | | |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S | | | | | | | |
| IDENTIFICACIÓN NIT: 900.354.196-4 | | | | | | | |
| DIRECCIÓN: KR 9 A NRO. 32 - 111 B ROSA BLANCA | | | | CIUDAD: GIRARDOT, CUNDINAMARCA | | TELÉFONO: 3115571381 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------|--|-------------------|--|
| DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO | | | | | | | |
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE GIRARDOT | | | | | | | |
| IDENTIFICACIÓN NIT: 000.000.378-4 | | | | | | | |
| DIRECCIÓN: CRA 11 NO. 17 - ESQUINA PALACIO MUNICIPAL | | | | CIUDAD: GIRARDOT, CUNDINAMARCA | | TELÉFONO: 8314134 | |
| ADICIONAL: | | | | | | | |

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE AÑEXAN INCORPORADAS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLAMAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO EL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, ESTABILIDAD DE LA OBRA SEGUN ACTO CONTRACTUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 916-2026 RELACIONADO CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y DESACELERACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASG/ACTUAL | SUMA ASG/ANTERIOR |
|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 29/04/2026 | 08/12/2026 | \$39,929,246.70 | |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 29/04/2026 | 08/08/2029 | \$19,964,622.35 | |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 08/08/2026 | 08/08/2027 | \$39,929,246.70 | |

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE ACLARA VIGENCIA SEGUN ACTA DE INICIO

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
| \$ ****292,872.00 | \$ *****8,000.00 | \$ *****57,165.00 | \$ *****358,038.00 | \$ *****99,823,116.75 | CONTADO |
| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION OCASEGURO | | |
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART | NOMBRE COMPAÑIA | % PART | ALCR ASEGURADO |
| TE ASEGURAMOS RG LTDA | 164053 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELÉFONO: 2701040 - IBAGUE

[Signature]

25-44-101213589

FIRMA AUTORIZADA: Juan Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

[Signature]

FIRMA TOMADOR



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 950.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|--|--|---------------|--|-------------------------------|--|-------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE | | | SUCURSAL IBAGUE | | | COD.SUC 25 | | NO.PÓLIZA 25-44-101213589 | | ANEXO 2 | |
| FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO | | | VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO | | | A LAS HORAS | | VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO | | A LAS HORAS | |
| 20 04 2026 | | | 29 04 2026 | | | 00:00 | | 08 09 2029 | | 23:59 | |
| TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA | | | | | | | | | | | |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|--|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S | | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NIT: 909.354.156-4 | | | |
| DIRECCIÓN: KR 9 A NRO. 32 - 111 B ROSA BLANCA | | | | | | CIUDAD: GIRARDOT, CUNDINAMARCA | | | TELÉFONO: 3115571351 | | |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE GIRARDOT | | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NIT: 990.000.376-4 | | | |
| DIRECCIÓN: CRA 11 NO. 17 - ESQUINA PALACIO MUNICIPAL | | | | | | CIUDAD: GIRARDOT, CUNDINAMARCA | | | TELÉFONO: 6314134 | | |

ADICIONAL:

TENTE ACLARANDO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELÉFONO: 2701040 - IBAGUE

25-44-101213589

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DIAMATOPAR

VIGILADO ASESORIA/INFORMACION



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

TEL. 880 009 578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|------|--------------------|-----|------|----------------|----------------|-------------------------------|------|-------------|------------------|
| CUIDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE | | | SUCORSAL IBAGUE | | | COD. SUC 25 | | NO. POLIZA 25-44-101213207 | | ANEXO 0 | |
| FECHA EXPEDICIÓN | | | VIGENCIA DESDE | | | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA | | | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
| DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO | | DÍA | MES | AÑO | | |
| 01 | 04 | 2025 | 06 | 04 | 2025 | 00:00 | 05 | 08 | 2026 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|----------------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S | | IDENTIFICACIÓN NIT: 900.354.158-4 | |
| DIRECCIÓN: KR 9 A NRO 32 - 111 B ROSA BLANCA | | CIUDAD: GIRARDOT, CUNDINAMARCA | TELÉFONO: 3115571381 |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|-------------------|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE GIRARDOT | | IDENTIFICACIÓN NIT: 890.690.378-4 | |
| DIRECCIÓN: CRA 11 NO. 17 - ESQUIVA PARCOTO MUNICIPAL | | CIUDAD: GIRARDOT, CUNDINAMARCA | TELÉFONO: 5314134 |

ADICIONAL

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 40 NO. 33 - 02 - TELÉFONO. 2761040 - IBAGUE

25-44-101213207

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NIT. 860.000.578-6

DECRETO 1082 DE 2015

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE | | | SUCURSAL IBAGUE | | | COD.SUC 25 | | NO.PÓLIZA 25-44-101213589 | | ANEXO 1 | |
| FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 30 04 2026 | | | VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 21 04 2026 | | | A LAS HORAS 00:00 | | VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 31 07 2029 | | A LAS HORAS 23:59 | |
| TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE MODIFICACION | | | | | | | | | | | |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S | | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NIT: 900.354.156-4 | | | |
| DIRECCIÓN: KR 9 A NRD. 32 - 111 B ROSA BLANCA | | | | | | CIUDAD: GIRARDOT, CUNDINAMARCA | | TELÉFONO: 3115571381 | | | |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE GIRARDOT | | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NIT: 890.880.378-4 | | | |
| DIRECCIÓN: CRA 11 NO. 17 - ESQUINA PALACIO MUNICIPAL | | | | | | CIUDAD: GIRARDOT, CUNDINAMARCA | | TELÉFONO: 8314134 | | | |
| ADICIONAL: | | | | | | | | | | | |

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN SEGUROS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA: SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO, EL PAGO DE SALARIOS Y PREPENSIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, ESTABILIDAD DE LA OBRA SEGUN ACORDO CONTRACTUAL, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO 916-2026 RELACIONADO CONTRATO ES OTRA PARA EL MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEÑALIZACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA.

AMPAROS

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|--------------------|--|--|
| RIESGO: ADMINISTRO DE BIENES | | | | | | | | | | | |
| AMPAROS | | | | | | | | | | | |
| VIGENCIA DESDE | | | VIGENCIA HASTA | | | SUMA ASES/ACTUAL | | | SUMA ASES/ANTERIOR | | |
| | | | | | | | | | | | |

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE ACLARA VIGENCIA SEGUN ACORDO DE INTENTO

| | | | | | |
|-----------------------|--------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
| \$ ****(282.872.00) | \$ *****(6.000.00) | \$ *****(57.166.00) | \$ *****(358.038.00) | \$ *****(89.823.116.75) | CONTADO |
| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART | NOMBRE COMPAÑIA | % PART | VALOR ASEGURADO |
| TE PSEJVRANOS EG LTDA | 164053 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 06 - TELEFONO: 2701040 - IBAGUE



25-44-101213589

SERVA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

SERVA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 100 - 60, PISO 6 TELEFONO: 801-2100977, 801-8010330

GRANATOVAR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------|--------------------|-----|------|----------------|--|-------------------------------|-----|------------|-------------|--|
| CUIDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE | | | SUCURSAL IBAGUE | | | COD. SOC 25 | | NO. PÓLIZA 25-44-101213589 | | ANEXO 1 | | |
| FECHA EXPEDICIÓN | | | VIGENCIA DESDE | | | A LAS HORAS | | VIGENCIA HASTA | | | A LAS HORAS | |
| DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO | | | DÍA | MES | AÑO | | |
| 30 | 04 | 2026 | 21 | 04 | 2026 | 00:00 | | 31 | 07 | 2026 | 23:59 | |
| TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE MODIFICACION | | | | | | | | | | | | |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|----------------------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S | | IDENTIFICACIÓN NIT: 800.384.156-4 | |
| DIRECCIÓN: KR 9 A NRO. 32 - 111 B ROSA BLANCA | | CIUDAD: GIRARDOT, CUNDINAMARCA | TELÉFONO: 3115571381 |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--------------------|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE GIRARDOT | | IDENTIFICACIÓN NIT: 890.890.378-4 | |
| DIRECCIÓN: CRA 11 NO. 17 - ESQUINA PALACIO MUNICIPAL | | CIUDAD: GIRARDOT, CUNDINAMARCA | TELÉFONO: 351-1134 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELÉFONO: 2701840 - IBAGUE

25-44-101213589

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIA DE CALIMA



POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

NT. 860.009.578-8

RCE CONTRATOS

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE | | | SUCURSAL IBAGUE | | | COD.SUC 25 | | NO.PÓLIZA 26-00-101066762 | | ANEXO 1 | |
| FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 30 04 2026 | | | VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 21 04 2026 | | | A LAS HORAS 00:00 | | VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 31 07 2026 | | A LAS HORAS 23:59 | |
| TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE MODIFICACION | | | | | | | | | | | |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S | | | | | | | | IDENTIFICACIÓN MT: 900.354.156-4 | | | |
| DIRECCIÓN: KR 9 A NRO. 32 - 111 B ROSA BLANCA | | | | | | CIUDAD: GIRARDOT, CUNDINAMARCA | | | TELÉFONO: 3115571361 | | |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--------------------------|--|--|
| ASEGURADO: MUNICIPIO DE GIRARDOT | | | | | | | | IDENTIFICACIÓN MT: 090.800.370-4 | | | |
| DIRECCIÓN: CRA 11 NO. 17 - ESQUINA PALACIO MUNICIPAL | | | | | | CIUDAD: GIRARDOT, CUNDINAMARCA | | | TELÉFONO: 8314134 | | |
| BENEFICIARIO: 890680378 - MUNICIPIO DE GIRARDOT | | | | | | | | | | | |

OBJETO DEL SEGURO

CON SUjeción A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE ES ANEXA 15-05-2020 - 1329-P-06-00999-0-RCE-002A-D001 / 31-03-22 -1329-P-06-00000-0-RCE-001P-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIDIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA: SE GARANTIZA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL SEGUN ACTO CONTRACTUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 916-2026 RELACIONADO CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y DENEGACION VIAJ EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA.

AMPAROS

RIESGO: **SUMINISTRO DE BIENES**

| AMPAROS | DEDUCTIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASG ACTUAL | SUMA ASG ANTERIOR |
|---------|------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | |

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE ACLARA VIGENCIA SEGUN ACTA DE INICIO

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | RVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
| \$ *** (242,248.00) | \$ **** (3,000.00) | \$ *** (46,597.00) | \$ ***** (291,845.00) | \$ **** (350,161,000.00) | CONTADO |
| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART | NOMBRE COMPAÑIA | % PART | VALOR ASEGURADO |
| TE ASSECRAMOS RG LTDA. | 164053 | 100.00 | | | |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REPIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO. NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELEFONO: 2701040 - IBAGUE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

26-40-101066762

FIRMA AUTORIZADA: Jona Lida Ojeda - Vicepresidenta de Ejecución

FIRMA TOMADOR



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

MT. 890.009.578-8

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|------|--------------------|-----|------|---------------|--|------------------------------|-----|-------------|-----------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE | | | SUCURSAL IBAGUE | | | COD.SUC 25 | | NO.POLIZA 25-40-101056752 | | ANEXO 1 | | |
| FECHA EXPEDICIÓN | | | VIGENCIA DESDE | | | A LAS HORAS | | VIGENCIA HASTA | | A LAS HORAS | | |
| DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO | | | DÍA | MES | AÑO | TIPO MOVIMIENTO | |
| 30 | 04 | 2026 | 21 | 04 | 2026 | 60:00 | | 31 | 07 | 2026 | 23:59 | |
| ANEXO DE MODIFICACION | | | | | | | | | | | | |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S | | IDENTIFICACIÓN NIT: 900.364.188-4 | |
| DIRECCIÓN: KR 9 A NRO. 32 - 111 B ROSA BLANCA | | CIUDAD: GIRARDOT, CUNDINAMARCA | |
| | | TELÉFONO: 3115571381 | |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| ASEGURADO: MUNICIPIO DE GIRARDOT | | IDENTIFICACIÓN NIT: 890.880.378-4 | |
| DIRECCIÓN: CRA 11 NO. 77 - ESQUINA PALACIO MUNICIPAL | | CIUDAD: GIRARDOT, CUNDINAMARCA | |
| | | TELÉFONO: 8314134 | |
| BENEFICIARIO: 890880378 - MUNICIPIO DE GIRARDOT | | | |

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y PARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EMPEZAR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO, QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELÉFONO: 2701049 - IBAGUE

25-40-101056752

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

DAMAYVAR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
