HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

META ACREDITACIÓN

EL JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA

CERTIFICA:

Que **UNION TEMPORAL BIOAGUAS**, con Nit. 901460623-1, suscribió contrato de PRESTACION DE SERVICIOS, en el HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO.

Contrato No.	002 de 2022
Objeto	DIRECCION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTAS TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES "PTAR" Y POTABLE "PTAP" DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA
Fecha de Iniciación:	01 DE ENERO DE 2022
Fecha de Finalización:	31 DE MARZO DE 2022
Valor:	$ 263.202.948.oo, IVA INCLUIDO $ 42.024.000.oo

Se expide a solicitud del interesado, en Neiva a los (21) días del mes de Abril de dos mil veintidós (2022).

Atentamente,

THOMAS ANDRES MURCIA OLAYA
Jefe Oficina de Contratación

000232

HOSPITAL UNIVERSITARIO
NEIVA - HUILA

ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN

Nuestra META ACREDITACIÓN

CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No138 DE 2013
CONTRATANTE:	HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA
CONTRATISTA:	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.
INTERVENTOR:	JESÚS ERNESTO GUZMÁN LARRARTE
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DENTRO DEL PROYECTO TORRE MATERNO INFANTIL PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	(60) SESENTA DIAS
FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE MARZO DE 2013.
FECHA DE MODIFICACIÓN:	09 DE MAYO DE 2013.
PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIONAL:	(1) UN MES
FECHA DE TERMINACION:	13 DE JUNIO DE 2013.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 247.461.078,00
VALOR ADICIONAL DE CONTRATO:	$ 42.218.395,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 295.679.473,00
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO:	$ 295.405.817,00
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:	(3) TRES MESES
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	11 DE JUNIO DE 2013

Entre los suscritos a saber **JESÚS ANTONIO CASTRO VARGAS**, mayor, identificado con la cédula de ciudadania número 12.226.376 expedida en Pitalito, Huila, Gerente designado según el Decreto número 821 del 08 de Junio del 2012 y Acta de posesión N. 282 del 08 de Junio de 2012, y por ende en nombre y representación de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO "HERNANDO MONCALEANO PERDOMO" DE NEIVA-HUILA**, creado mediante reconocimiento jurídico según Resolución 085 de 1973 expedida por la Gobernación de Huila y confirmado mediante Resolución 1806 de 1973 expedida por el Ministerio de salud; Transformado en ESE por medio del decreto 730 del 1 agosto 1994 emanado de la Gobernación del Departamento y Constituido como ESE mediante Ordenanza 054 del 24 de noviembre del 1998, NIT. 891.180.268-0, quien para los efectos del mismo se denominará **EL HOSPITAL**, y por la otra, **GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL**, identificado con cedula de ciudadanía 12-193-284 de Garzon, Huila, en representación de **EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.**, identificado con NIT. 900.410.655-8 y quien para los efectos de la presente acta de **LIQUIDACIÓN** se llamará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido liquidar por mutuo acuerdo el contrato teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1. Entre las partes se celebró el día 27 de Febrero de 2013, el contrato de obra No 138 de 2013, siendo su objeto CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DENTRO DEL PROYECTO TORRE MATERNO INFANTIL PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA.2. El valor del contrato fue acordado en la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE **($247.461.078,00)** 3. El plazo de ejecución de la obra fue de sesenta (60) dias, contados a partir del 14 de Marzo de 2013. 4. Se celebró otros no 1, el día 11 de Mayo de 2013, en donde se adiciono el presente contrato en Un (1) mes y en

$48.218.395,00, para un total en plazo de tres (3) Meses y un valor total de $295.679.473,00. 5. Que el plazo de ejecución se cumple el próximo 13 de Junio de 2013 y el contratista termino las obras contratadas el dia 30 de Mayo de 2013 6. Que está pendiente de pago las Acta de Recibo Final por valor de $295.405.817.oo. 7 Que a la fecha de celebración de la presente acta, el objeto contratado se encuentra cumplido en su totalidad, y los bienes objeto del presente contrato se encuentran entregados por el Contratista y recibidos por el Hospital a satisfacción, y que por tanto las partes deciden terminar y liquidar el presente contrato de obra. 8. Que el Contratista actualizo las pólizas del contrato suscritas con Seguros del Estado y cuyos números y amparos se relacionan a continuación:

POLIZA #	AMPARO	DESDE	HASTA	SUMA ASERGURADA
61-44-101008319	CUMPLIMIENTO	27-02-2013	27-10-2013	$ 59.135.894,60
61-44-101008319	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMINAZCIONES	27-02-2013	27-06-2016	$ 44.351.920,95
61-44-101008319	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	27-02-2013	27-02-2014	$ 88.703.841,90
61-44-101008319	ESTABILIDAD DE OBRA	27-02-2013	27-02-2018	$ 59.135.894,60
61-40-101002381	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	27-02-2013	27-06-2014	$ 29.567.947,30

En atención a las anteriores manifestaciones, se acuerda:

PRIMERO: Las partes acuerdan, precisar el valor y alcance del contrato de obra No 138 de 2013 suscrito el 27 de Febrero de 2013, terminar y liquidar bilateralmente el mismo tomando como base el siguiente balance económico:

Valor del Contrato	$ 295.679.473,oo
Valor Ejecutado	$ 295.405.817.oo
Valor Pagado al Contratista	$ 0000000000.oo
Saldo a favor del Contratista	$ 295.405.817.oo
Saldo a favor del Hospital	$ 273.656.oo

SEGUNDO: Que fue facturado el valor total ejecutado del contrato de obra.

TERCERO: Que los valores aquí consignados obedecen a los soportes del contrato y a la buena fe de las partes.

CUARTO: Que una vez sea pagado por la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo el valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE. ($295.405.817.oo) al contratista EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S., las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto en relación con el contrato de obra No 138 de 2013.

Para constancia se firma en Neiva, a los ONCE (11) días del mes de junio de 2013.

JESÚS ANTONIO CASTRO VARGAS
GERENTE

JESÚS ERNESTO GUZMÁN LARRARTE
INTERVENTOR

MARIA ALEJANDRA MORENO OME

GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL

HOSPITAL UNIVERSITARIO
HERNANDO MONCALEANO PERDOMO E.S.E.
NEIVA - HUILA

ACTA DE RECIBO FINAL

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATO CONTRATO DE OBRA

Contrato número: 138 **de** 2013

Objeto del contrato:
CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DENTRO DEL PROYECTO TORRE MATERNO INFANTIL PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA.

Interventor: JESÚS ERNESTO GUZMÁN LARRARTE

Contratista: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.

Fecha de inicio del contrato:	14	de	MARZO	de	2013
Fecha de Modificación del contrato:	7	de	MAYO	de	2013
Fecha de Terminación del contrato:	13	de	JUNIO	de	2013

Valor del contrato:	$ 247.461.078,00
Valor Adicional del contrato:	$ 48.218.395,00
Valor Total del contrato:	$ 295.679.473,00
Valor Ejecutado del contrato:	$ 295.405.817,00

Duración del contrato: TRES (3) MESES

ACUERDO DE INICIO

En NEIVA a TREINTA (30) días del mes de MAYO de 2013 se reunieron JESÚS ERNESTO GUZMÁN LARRARTE en calidad de interventor del contrato y GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL como Representante Legal del contratista, con el fin de iniciar el contrato anteriormente citado.

000234

HOSPITAL UNIVERSITARIO
HERNANDO LIONCALENTO PERDOMO E.S.E.
NEIVA - HUILA

ACTA DE RECIBO FINAL

OBSERVACIONES

- El contratista presenta póliza No 61-44-101008319 con la empresa SEGUROS DEL ESTADO amparando cumplimiento del contrato y pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, calidad de los elementos y estabilidad de obra; de igual manera adjunta póliza No 61-40-101002381 con la empresa SEGUROS DEL ESTADO de Responsabilidad Civil Extracontractual.
- El contratista presento comprobante de pago de impuestos de legalización y publicación del día 28 de Febrero de 2013.
- El presente contrato esta soportado mediante la Disponibilidad Presupuestal 318 y el Registro Presupuestal 768.
- El contratista debe presentar un informe final de las actividades realizadas.
- Se realizó visita conjunta con el fin de verificar las condiciones finales de las obras.
- El contratista ejecuto las obras objeto del presente contrato cumpliendo con las especificaciones y planos entregados por el Hospital para la ejecución de las mismas.
- El contratista entrego a satisfacción las obras objeto del contrato al Hospital por medio del interventor.
- Informar sobre cualquier cambio, dificultad o modificación que se de en el tiempo del desarrollo del contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

Firma

JESÚS ERNESTO GUZMÁN LARRARTE

INTERVENTOR

Firma

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.
GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
CONTRATISTA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	OBJETO:	CONSTRUCCION A TODO COSTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DENTRO DEL PROYECTO TORRE MATERNO INFANTIL PARA LA E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA			ACTA DE RECIBO FINAL			
HOSPITAL UNIVERSITARIO Empresa Social del Estado HOSPITAL UNIVERSITARIO NEIVA "HERNANDO MONCALEANO PERDOMO" NIT. 891 180.268-9	CONTRATISTA: INTERVENTOR: MUNICIPIO: Iniciación 4 de marzo de 2013	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS JESUS ERNESTO GUZMAN LARRAHONDO NEIVA Suspensión	Reinicio	VALOR CONTRATO $ 295.679.473 VALOR ACUMULADO $ 295.405.617 VALOR ACTA $ 295.405.617	ACTA No. 1 Hoja	Parcial Final X de		
					Fecha Acta	Día: 24	Mes: Mayo	Año: 2013

CONDICIONES CONTRACTUALES						OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
3001,0	ZAPATAS CONCRETO PARA TANQUE DE 4000 PSI	M3	2,00	$ 401.000	$ 802.000	2,00	$ 802.000	2,00	$ 802.000
3002	COLUMNAS RECTANGULARES EN CONCRETO PARA TANQUE 5000 PSI	M3	4,24	$ 520.002	$ 2.204.808	4,24	$ 2.204.808	4,24	$ 2.204.808
3003	LOSA FONDO PARA TANQUE EN CONCRETO BAJA PERMEABILIDAD DE 4000 PSI	M2	227,94	$ 101.200	$ 23.067.528	227,94	$ 23.067.528	227,94	$ 23.067.528
3004	MUROS Y ZARPA EN CONCRETO BAJA PERMEABILIDAD DE 4000 PSI- INCLUYE CINTA PVC V-15	M3	95,16	$ 562.000	$ 53.479.920	95,16	$ 53.479.920	95,16	$ 53.479.920
3005	PLACA ALIGERADA PARA LOSA SUPERIOR DE TANQUE H=0,35 Y 0,17 M3/M2 DE CONCRETO 4000 PSI	M2	306,66	$ 128.900	$ 39.528.474	306,66	$ 39.528.474	306,66	$ 39.528.474
4116	PASAMUROS HG 2"	Und.	5,00	$ 50.200	$ 251.000	4,00	$ 200.800	4,00	$ 200.800
4117	PASAMUROS HG 3"	Und.	2,00	$ 74.284	$ 148.568	1,00	$ 74.284	1,00	$ 74.284
4118	PASAMUROS HG 4"	Und.	3,00	$ 98.000	$ 294.000	2,00	$ 196.000	2,00	$ 196.000
4119	PASAMUROS INOXIDABLES 6"	Und.	2,00	$ 1.750.000	$ 3.500.000	2,00	$ 3.500.000	2,00	$ 3.500.000
2003	RELLENO	M3	571,85	$ 54.900	$ 31.394.565	571,85	$ 31.394.565	571,85	$ 31.394.565
6001	PAÑETE IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE DE 2CM	M2	300,27	$ 11.500	$ 3.453.105	300,27	$ 3.453.105	300,27	$ 3.453.105
3015	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURA (60000PSI)	KG	22.752,00	$ 2.240	$ 50.964.480	22.752,00	$ 50.964.480	22.752,00	$ 50.964.480
A1	CONCRETO LANZADO	M2	349,38	7217	$ 2.521.504	349,38	$ 2.521.504	349,38	$ 2.521.504
A2	SOLADO 2000 PSI ESPESOR 5 CM	M2	203,50	15032	$ 3.059.012	203,50	$ 3.059.012	203,50	$ 3.059.012
A3	FILTRO PARA ABATIMIENTO NIVEL FREATICO 4"	ML	25,00	25502	$ 637.550	25,00	$ 637.550	25,00	$ 637.550
A4	CERRAMIENTO PROVISIONAL TIPO I	ML	38,00	$ 17.103	$ 649.914	38,00	$ 649.914	38,00	$ 649.914
A5	EXCAVACION MECANICA CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL	M3	216,00	$ 21.059	$ 4.550.904	216,00	$ 4.550.904	216,00	$ 4.550.904
A6	EXCAVACION MANUAL PARA NIVELACION ZARPA E=0.3M, FOSO SUCCION, CARCAMO SUCCION	M3	61,12	$ 32.462	$ 1.984.045	61,12	$ 1.984.045	61,12	$ 1.984.045
A7	TAPA METALICA EN PUNTA DIAMANTE - LAMINA ALFAJOR 1X1, INCLUYE MARCO INTERNO DE RECIBO	UN	2,00	$ 757.066	$ 1.514.132	2,00	$ 1.514.132	2,00	$ 1.514.132

000235

000235

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

HOSPITAL UNIVERSITARIO
Empresa Social del Estado
HOSPITAL UNIVERSITARIO NEIVA
"HERNANDO MONCALEANO PERDOMO"

OBJETO:	CONSTRUCCION A TODO COSTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DENTRO DEL PROYECTO TORRE MATERNO INFANTIL PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA				
CONTRATISTA:	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS		VALOR CONTRATO	ACTA No. 1	Parcial
INTERVENTOR:	JESUS ERNESTO GUZMAN LARRARTE		$ 295.675.473		Final X
MUNICIPIO:	NEIVA		VALOR ACUMULADO	Hoja	de
Iniciación	Suspensión	Reinicio	$ 295.405.817		
4 de marzo de 2013			VALOR ACTA $ 295.405.817	Fecha Acta	Día 24 / Mes Mayo / Año 2013

	CONDICIONES CONTRACTUALES					OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
A6	TAPA METALICA EN PUNTA DIAMANTE - LAMINA ALFAJOR 1X2 INCLUYE MARCO INTERNO DE RECIBO	UN	1,00	$ 918.400	$ 918.400	1,00 ✓	$ 918.400	1,00 ✓	$ 918.400
A9	CERRAMIENTO PROVISIONAL TIPO II	M2	286,00	$ 39.015	$ 11.156.290	286,00 ✓	$ 11.156.290	286,00 ✓	$ 11.156.290
A10	ENTIBADO TEMPORAL H> 1.5 METROS	M2	122,40	$ 27.023	$ 3.307.615	122,40 ✓	$ 3.307.615	122,40 ✓	$ 3.307.615
A11	SALIDAS PVC 6" PLACA SUPERIOR, INCLUYE CODO 6"	UN	10,00	$ 100.000	$ 1.000.000	10,00 ✓	$ 1.000.000	10,00 ✓	$ 1.000.000
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 240.389.815		$ 240.167.331 ✓		$ 240.167.331 ✓
	ADMINISTRACION	%	14,00%		$ 33.654.574		$ 33.623.426 ✓		$ 33.623.426 ✓
	IMPREVISTOS	%	5,00%		$ 12.019.491		$ 12.008.367 ✓		$ 12.008.367 ✓
	UTILIDAD	%	4,00%		$ 9.615.593		$ 9.606.693 ✓		$ 9.606.693 ✓
	COSTO TOTAL				$ 295.679.473		$ 295.405.817 ✓		$ 295.405.817 ✓
							MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO		$ 0
							TOTAL A PAGAR CONDICIONES CONTRACTUALES		$ 295.405.817

VALOR PRESENTA ACTA: $ 295.405.817 ✓

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE. ✓

GUSTAVO E. RODRIGUEZ ESQUIVEL
EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS
Contratista

JESÚS ERNESTO GUZMÁN LARRARTE
Interventor

000236

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES D&R S.A.S.
900.791.618-9

ACTA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA CT-01

OBJETO: CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE LA OBRA CIVIL COMPLETA Y MANO DE OBRA DE REDES HIDROSANITARIAS PARA LA PLAZA DE COMIDAS "THE PLACE".

FECHA:	Neiva, 4 de Abril de 2017
Contratante:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES D&R S.A.S.
Identificación:	900.791.618-9
Contratista:	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.
Identificación:	900.410.655-8

EN LA FECHA SE REUNEN LOS SEÑORES: MAXIMILIANO DUQUE RENGIFO, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 12.123.640 DE NEIVA, OBRANDO COMO REPRESENTATE LEGAL DE CONSTRUCCIONES E INVERSIONES D&R S.A.S. CON NIT. 900.791.618-9. EN CALIDAD DE CONTRATANTE, GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 12.193.284 DE NEIVA, OBRANDO COMO REPRESENTANTE LEGAL DE EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S., EN CALIDAD DE CONTRATISTA Y ANDRES AFANADOR ARMENTA, EN CALIDAD DE DIRECTOR DE OBRA DEL PROYECTO; CON EL FIN DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION AL CONTRATO ASI:

VALOR DEL CONTRATO:	$ 274.195.720,00
VALOR DEL OTRO SI:	$ 397.364.760,00
VALOR EJECUTADO:	$ 397.364.760,00
FECHA DE INICIO:	02 DE NOVIEMBRE DE 2016
FECHA DE ENTREGA:	20 DE ENERO DE 2017

Las partes que intervienen dan por terminado este contrato y declaran encontrarse a Paz y Salvo.

Es constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

EL CONTRATANTE

MAXIMILIANO DUQUE RENGIFO
GERENTE
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES
D&R S.A.S.

EL CONTRATISTA

GUSTAVO E. RODRIGUEZ ESQUIVEL
REPRESENTATE LEGAL
EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S

ANDRES AFANADOR ARMENTA
ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES
D&R S.A.S.

Calle 8 con Carrera 48 Esquina, Sala de Ventas
Teléfonos: 8775514-8774319 Celular: 3105553270
duquerengifo1@hotmail.com – asmoriel@hotmail.com
Neiva-Huila

ACTA FINAL DE OBRA

PROYECTO : PLAZOLETA PARA COMIDAS
UBICACIÓN: NEIVA - HUILA
CLIENTE: CONSTRUCTORA D&R

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.
Nit. 900.410.655-8

ITEM	DESCRIPCION	ALCANCE ESPECIFICO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	Localizacion, trazado y replanteo		M2	3.166,90	700	2.216.830,00
1.2	Descapote		M3	463,82	6.500	3.014.830,00
1.3	Excavacion	INCLUYE TRASCIEGO INTERNO < 300 M	M3	229,57	11.400	2.617.098,00
1.4	Relleno, con material de la excavacion	RESULTADO DE COMPACTACION LA MAXIMA PERMITIDA DEL MATERIAL INDICADO POR EL CLIENTE	M3	243,66	9.500	2.314.770,00
2	VIAS Y ANDENES					
2.1	Via en pavimentacion flexible y parqueadero E=0,07m. Incluye cajeo y estructura. (Sub-base 15cm, base 15 cm)	CARPETA (SUMINISTRO E INSTALACION) SEGÚN INDICACIONES Y DISEÑO DEL CLIENTE. SI SE REQUIERE ESTABILIZACION DEL TERRENO SE PROCEDERA SEGÚN INDICACIONES DEL CLIENTE (NO INCLUYE ESTABILIZACION). PARA BASE Y SUBBASE INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL.	M2	806,00	74.100	59.724.600,00
2.2	Plazoleta en adoquin. Inlcuye preparacion de la superficie de la subrasante	ADOQUIN TIPO TRAFICO MEDIANO	M2	1.141,00	56.400	64.352.400,00
2.3	Cinta en concreto 10 cm		ML	456,00	26.100	11.901.600,00
2.4	Andenes y senderos peatonales. Incluye preparacion del terreno, concreto de 3,000psi, E= 0,10m		M2	408,00	45.000	18.360.000,00
2.5	Sardineles y cunetas	ELEMENTOS PREFABRICADOS	ML	253,00	51.200	12.953.600,00
3	ESTRUCTURAS Y MAMPOSTERIA					
3.1	Placa de concreto para soporte de contenedores. E=10 cm. Incluye malla electrosoldada M-188, concreto de 3,000psi	ENSAYOS DE RESISTENCIA DE PLANTA	M2	456,00	70.520	32.157.120,00
3.2	Viga de confinamiento de placa de contenedores 10*10, concreto 3,000psi	ENSAYOS DE RESISTENCIA DE PLANTA	M3	2,42	600.000	1.452.000,00
3.3	Refuerzo para viga de confinamiento		KG	455,20	4.150	1.889.080,00
3.4	Placa para descarge de contenedores en concreto MR=39 kg/cm2, E=20 cm Incluye cajeo, estructura (Sub-base 10cm) y refuerzo con doble malla electrosoldada M-188	ENSAYOS DE RESISTENCIA DE PLANTA, DISEÑO ENTREGADO POR EL CLIENTE. SI SE REQUIERE ESTABILIZACION DEL TERRENO SE PROCEDERA SEGÚN INDICACIONES DEL CLIENTE (NO INCLUYE ESTABILIZACION)	M2	80,00	162.600	13.008.000,00
3.5	Muro en mamosteria estructural para cambio de nivel		M2	22,60	38.600	872.360,00
3.6	Grouting para mamposteria estructural		ML	165,00	56.590	9.337.350,00
3.7	Viga de cimentacion para mamposteria estructural 0,20x30 m		M3	1,50	600.000	900.000,00
3.8	Refuerzo para viga y dovelas		G	437,13	4.150	1.814.089,50
3.9	Pasos para escaleras ancho 3,5 mts, huella 0,35 mts y contrahuella 0,20 mts		UND	7,00	135.200	946.400,00
4	ARBOLES Y GRAMAS					-
4.1	Suministro e instalacion de grama	NO INCLUYE INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO	M2	385,00	11.920	4.589.200,00
4.2	Arbol ornamental tipo	BASICA NATIVA DE LA REGION	UND	77,00	29.800	2.294.600,00
4.3	Corte y retiro de arbol	INCLUYE DISPOSICON FINAL	GLO	1,00	680.000	680.000,00
5	ACUEDUCTO					-
5,1	Replanteo y localizacion.		ML	250,20	1.500	375.300,00
5,2	Excavación a todo factor con profundidad de 0,50 mts zona no vehicular y 0,7 m en vía a cota clave y ancho 0.4 m. Tiuberias de 2" a 1"		M3	4,50	13.100	58.950,00
5,3	Relleno de la brecha compactado a la densidad natural del terreno existente. Compactación mayor o igual al 95% de la densidad natural del terreno.		M3	4,50	9.500	42.750,00
5,4	Enmalle a red principal de 3" PVC. Incluye excavación, relleno, te, unión reparación.		UN	1,00	800.000	800.000,00
5,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS (Incluye anclajes de accesorios y cama de arena de 5 cm).					-
5,6	Tubería PVC RDE 21 de 2" UM		ML	12,37	3.800	47.006,00
5,7	Tubería PVC RDE 21 de 1.5" UM E.L.		ML	61,23	5.500	336.765,00
5,8	Tubería PVC RDE 21 de 1.25" UM E.L.		ML	8,75	4.000	35.000,00
5,9	Tubería PVC RDE 21 de 1" UM E.L.		ML	71,86	2.300	165.278,00
5,10	Tubería PVC RDE 21 o menor de 3/4" UM E.L.		ML	37,90	2.000	75.800,00
5,11	Tubería PVC RDE 21 o menor de 1/2" UM E.L RDE 13,5		ML	58,10	1.900	110.388,10

000238

5,12	Hidrante de 3". Incluye atraque, válvula de control, te, caja de válvula, construcción de cajillas para válvulas de control de sección libre de 0,80 X 0,80 y e = 0.12 m. En concreto simple de 3000 psi y tapa tipo chorote para trafico pesado.		UN	1,00	150.000	150.000,00
5,13	Valvula de control de 2" Red White para red. incluye caja y tapa valvulas en HF.		UN	2,00	80.000	160.000,00
5,14	Valvula de control de 1 1/2" Red White para red. incluye caja y tapa valvulas en HF.		UN	1,00	35.000	35.000,00
5,15	Valvula de control de 1 1/4" Red White para red. incluye caja y tapa valvulas en HF.		UN	1,00	25.000	25.000,00
5,16	Valvula de control de 1/2" Red White para red. incluye caja y tapa valvulas en HF.		UN	1,00	15.000	15.000,00
5,17	Pruebas hidráulicas conforme a lo expresado en normas.		UN	1,00	500.000	500.000,00
6,0	DOMICILIARIAS					-
6,1	Instalación de medidor volumétrico de 1". Incluye acoples, registro de corte, filtro yee, registro de bola, unión para desacople tipo dresser, soporte, caja de inspección y tapa.		UN	2,00	70.000	140.000,00
6,2	Instalación de medidor volumétrico de 1/2" para container. Incluye acoples, registro de corte, registro de bola, caja de inspección y tapa.		UN	21,00	70.000	1.470.000,00
6,2	Flotadores para control de nivel de 1" incluye te, codo, pasa muro con extremos roscados, llave de control de 1" red White y caja de inspección para llave de control de 1".		UN	1,00	85.000	85.000,00
6,4	Puntos Hidraulicos de 1/2" para lavaplatos de container va desde punto de conexin red externa hasta lavaplatos. Incluye accesorios.		UN	21,00	25.000	525.000,00
7,0	BATERIAS SANITARIA					-
7,1	Puntos Hidraulicos de 1"		UN	2,00	25.000	50.000,00
7,2	Puntos Hidraulicos de 1/2"		UN	10,00	25.000	250.000,00
7,3	Llaves de control de compuerta Red White o mejor. Incluye caja y tapa de 3/4"		UN	1,00	18.000	18.000,00
7,4	Llaves de control de compuerta Red White o mejor. Incluye caja y tapa de 1"		UN	1,00	18.000	18.000,00
7,5	Llaves de control de compuerta Red White o mejor. Incluye caja y tapas de 1 1/2"		UN	1,00	18.000	18.000,00
8,0	CUARTO DE MAQUINAS					-
8,1	EXCAVACION					
8,1,1	Excavacion manual en material común a 1,5m de profundidad		M3	12,66	35.440	448.670,40
8,1,2	retiro de material de excavación con cargue en volqueta a maquina en banco- de 10 a 20km. sin acarreo interno en obra. incluye disposición en botadero oficial		M3	7,60	44.879	341.080,40
8,2	RELLENOS					
8,2,1	relleno con material seleccionado compactado con equipo mecánico en capas de 0.20 m. al 95% del proctor modificado		M3	2,40	48.271	115.850,40
8,2,2	acarreo adicional de materiales		M3	2,40	33.209	79.701,60
8,3	CONCRETO					
8,3,1	concreto de 2000 psi - solado		M2	17,26	39.639	684.169,14
8,3,2	concreto de 4000 psi - zapatas		M3	2,40	670.857	1.610.056,80
8,3,3	concreto de 4000 psi - viga de cimentacion		M3	2,49	708.940	1.765.260,60
8,3,4	concreto de 4000 psi impermeabilizado- estructura		M3	2,52	988.483	2.490.977,16
8,3,5	concreto de 4000 psi - viga aerea		M3	2,32	837.823	1.943.749,36
8,3,6	concreto de 4000 psi - placa contrapiso		M2	4,10	128.420	526.522,00
8,3,7	poyo en concreto de 3000 psi		ML	0,85	49.826	42.352,10
8,3,8	caja de inspeccion de 0,60x0,60 con profundidad 0,80m en concreto de 3000 psi, según el diseño (incluye losa, tapa, excavación, relleno con material seleccionado, acarreos y retiros de sobrantes hasta 20 km.)		UND	1,00	750.216	750.216,00
8,4	ACERO					
8,4,1	acero de refuerzo- 60000 psi (incluye suministro, alambre negro, figuración, amarre, instalación y todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento)		KG	1.774,00	8.544	15.157.056,00

3'105.000
5'152.39?

8,4,2	malla electrosoldada para placa/muros f'y = 485 mpa (incluye suministro, alambre negro, figuración, amarre, instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento)		KG	172,44	9.226	1.590.931,44
8,5	CUBIERTA					
8,5,1	suministro e instalación teja arquitectonica e= 2,45mm, incluye todos los accesorios requeridos para su instalacion		M2	49,00	97.940	4.799.060,00
8,5,2	estructura metálica cubiertas/sub-estructuras (incluye suministro de cerchas, correas, perfiles, perlines, tubería, platinas, pernos, soldadura, fabricación, transporte, montaje, pintura anticorrosiva, esmalte, anclajes y demás elementos necesarios para garantizar su adecuado ejecución y funcionamiento)		KG	235,07	19.366	4.552.365,62
8,6	MAMPOSTERIA					
8,6,1	bloque no. 5		M2	91,80	71.243	6.540.107,40
8,7	PAÑETES					
8.7.1	pañete liso muros 1:3 impermeabilizado e=0.02m (incluye mortero en cemento 1:3, incluye dilataciones, ranuras y filetes, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)		M2	145,03	45.085	6.538.677,55
8,8	PISOS Y PAREDES					
8,8,1	alistado de piso en mortero 1:3 e=0,05m		M2	4,45	38.481	171.240,45
8,8,2	enchape muro y piso ceramica blanca 0,30x0,30m, incluye win de aluminio		M2	28,59	86.716	2.479.210,44
8,8,3	guardaescoba media caña h=0,10m en granito pulido, color a escoger, acabado al ras contra pisos y muros, incluye dilatacion plastica muro y piso		ML	152,96	52.534	8.035.600,64
8,8,4	suministro e instalacion de piso en tablon de grano marmol (grano fino no2) vibro orensado 0,33x0,33m, pulido, sellado y brillado, color a escoger, tipo alfa o similar		M2	245,64	112.879	27.727.597,56
8,8,5	estuco y pintura para muros vinilo tipo 1 (incluye dos manos)		M2	62,95	16.430	1.034.268,50
8,8,6	suministro e instalación de pintura antibacterial a base de agua, recubrimiento protector para muros y techos (cielorrasos superboard) interiores en zonas asépticas color blanco (muros)		M2	313,04	17.805	5.573.677,20
8,8,7	suministro e instalación de pintura texturizada hidrorepelente tipo graniplast para muros en fachada		M2	53,23	44.315	2.358.887,45
8,8,8	suministro e instalación de cielo raso en dry wall. incluye perfilería de soporte, cintas, tornillos, masilla,estuco, pintura tipo 1todos los materiales, accesorios y obras necesarias para su correcta instalación y funcionamiento.		M2	250,09	55.015	13.758.701,35
8,9	CARPINTERIA METALICA					
			M2	11,00	332.118	3.653.298,00
			M2	7,26	523.381	3.799.746,06
	TOTAL PRESUPUESTO URBANISMO INCLUYE AIU (U= 5%)					333.786.398,40
	IVA SOBRE UTILIDAD					63.578.361,60
	VALOR TOTAL CON IVA					397.364.760,00

OBSERVACIONES
TIEMPO DE EJECUCION Y FORMA DE PAGO A DEFINIR CON EL CLIENTE

DESCUENTO 3,67% SOBRE TOTAL OFERTADO URBANISMO. (ACUERDO FINAL)

GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ
EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS
CONTRATISTA

MAXIMILIANO DUQUE RENGIFO
CONSTRUCCIONES E INVESIONES D&R SAS
CONTRATANTE

PERSONAL REQUERIDO

CALLE 46 No. 16-24 ALAMOS NORTE / TEL. 8641641 / OF. 706
Cel 3214860684 / 3174292155 Neiva (H)
E-mail. equiserviciossas@equindustriales.com

icontec ISO 9001 SC-CER721551
icontec ISO 14001 SA-CER721553
icontec ISO 45001 SST-CER[illegible]

000241

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

NIT: 900.410.655-8

Alquiler de maquinaria pesada y herramientas para la construcción, movimientos de tierra y obras civiles (construcción de estructuras en concreto y obras de urbanismo)

DIRECTOR DE OBRA

ING. JAIRO HOYOS GRANADOS

CALLE 46 No. 16-24 ALAMOS NORTE / TEL. 8641641 / OF. 706
Cel 3214860684 / 3174292155 Neiva (H)
E-mail. equiserviciossas@equindustriales.com

000242

CARTA DE INTENCIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL

Señores
AGUAS DEL HUILA SA ESP
Ciudad

Referencia: **PROCESO No. AHSAOB02-023**

Mediante la Presente **JAIRO HOYOS GRANADOS** identificado con cedula de ciudadanía No. 7.521.455 de nacionalidad colombiana y MATRICULA PROFESIONAL No. 2520278766 CND, manifiesto que cuento con la intensión, disponibilidad y dedicación del 20%, en participar como **DIRECTOR DE OBRA** para el Proceso No. AHSAOB02-023, cuyo objeto es Obra ***"SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".***

Para constancia se firma en Neiva, a los 06 días del Mes de Marzo de 2023.

Atentamente,

FIRMA
NOMBRE **JAIRO HOYOS GRANADOS**
C.C. 7.521.455 de Neiva
M.P. 63202-13717 CND

HOJA DE VIDA

Datos Personales

Nombre:	Jairo
Apellidos:	Hoyos Granados
Cédula de Ciudadanía:	7'521.455 de Armenia Q.
Libreta Militar:	CD 355181 distrito No. 39
Fecha de Nacimiento:	13 junio de 1956
Nacionalidad:	Colombiano
Oficina:	CALLE 44 No 19-34
Teléfono:	4417688 Cali
Teléfono Celular:	3137218440
Correo electrónico:	jhoyosg@hotmail.com

Estudios realizados

Primaria:	Duración 5 años Colegio San Francisco Solano de Armenia Quindío
Secundaria:	Duración 6 años Colegio Rufino José Cuervo de Armenia Quindío
Universitarios:	Duración 5 años Universidad del Quindío
Titulo obtenido:	Ingeniero Civil
Fecha de grado:	Diciembre de 1983
Matricula Profesional:	No. 63202-13717 Seccional Quindío
Curso sobre Predimensionado de edificios altos:	Duración 30 horas, Universidad del Quindío
Excel Avanzado:	Duración 30 horas, Universidad Javeriana
Autocad 2D:	Duración 40 horas, SENA
Microsoft Project:	Duración 40 horas, SENA

Servicios que presta la firma Jairo Hoyos Granados

- Construcción de obras civiles
- Interventoría de obra
- Asesoría en obra
- Elaboración de presupuestos
- Remodelaciones
- Adecuaciones
- Mantenimientos
- Consultorías

Referencias Personales

Camilo Sarria	Cel. 3113401292
Arq. Rodrigo Copete Ortiz	Cel. 3155575155
Ing. Orlando Figueroa V.	Cel. 3137911054
Dr. Enrique Motoa	Cel. 3154856603

Cordialmente

JAIRO HOYOS GRANADOS
Ingeniero Contratista

CALLE 44 No 19-34 Cali Colombia
Telefax 4417688 correo electrónico j.hoyosg@hotmail.com

Jairo Hoyos G.

Ing. Civil

Misión

JAIRO HOYOS GRANADOS, empresa dedicada al servicio de la construcción de obras civiles que involucrando materia prima, recurso humano altamente calificado y tecnología logra obtener un producto compuesto, para satisfacer las necesidades de un mercado exigente con base en los principios de seguridad, funcionalidad y economía.


Visión

Ser una empresa reconocida regional y nacionalmente con proyección internacional por la calidad tanto en el servicio como en sus productos terminados, con una esmerada atención y garantía en la postventa de sus proyectos de obras civiles ofreciéndole al cliente beneficiario una completa tranquilidad en su inversión propendiendo por un adecuado manejo y conservación del medio ambiente.

Política de Calidad

Empresa dedicada a la construcción de obras civiles, que busca la mejora continua, con la participación del recurso humano idóneo, implementación de nuevos procesos y tecnologías, para cumplir adecuadamente con las necesidades y expectativas de nuestros clientes.

Mapa de Procesos

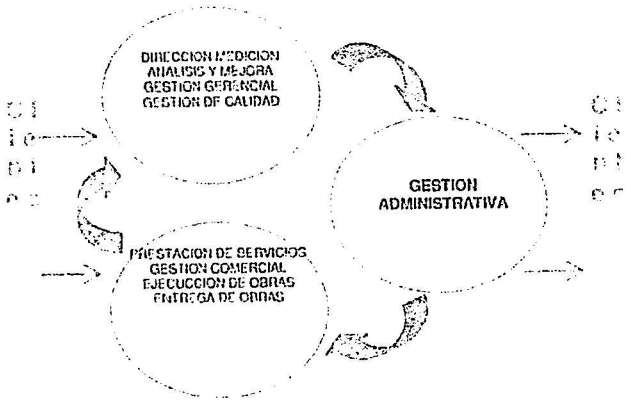

CALLE 44 No 19-34 Cali Colombia
Telefax 4417688 correo electrónico j.hoyosg@hotmail.com

Gestión Gerencial y de Calidad: Definir directrices, implementación y revisión sistema de gestión de calidad, para asegurar el sostenimiento y continuidad en los procesos, gestionar los recursos para satisfacción del cliente.

Gestión Comercial: Buscar oportunidades y cerrar negocios.


Gestión Gerencial y de Calidad: Definir directrices, implementación y revisión sistema de gestión de calidad, para asegurar el sostenimiento y continuidad en los procesos, gestionar los recursos para satisfacción del cliente.

Gestión Comercial: Buscar oportunidades y cerrar negocios.

Ejecución y Entrega de Obras: Evaluar materiales, ejecutar la obra con personal idóneo, de acuerdo a las especificaciones técnicas, controlar consumos y calidad de obra.

Gestión Administrativa: Garantizar el suministro oportuno, adecuado manejo de materiales y equipos, Seleccionar y conservar el Recurso humano.

Organigrama

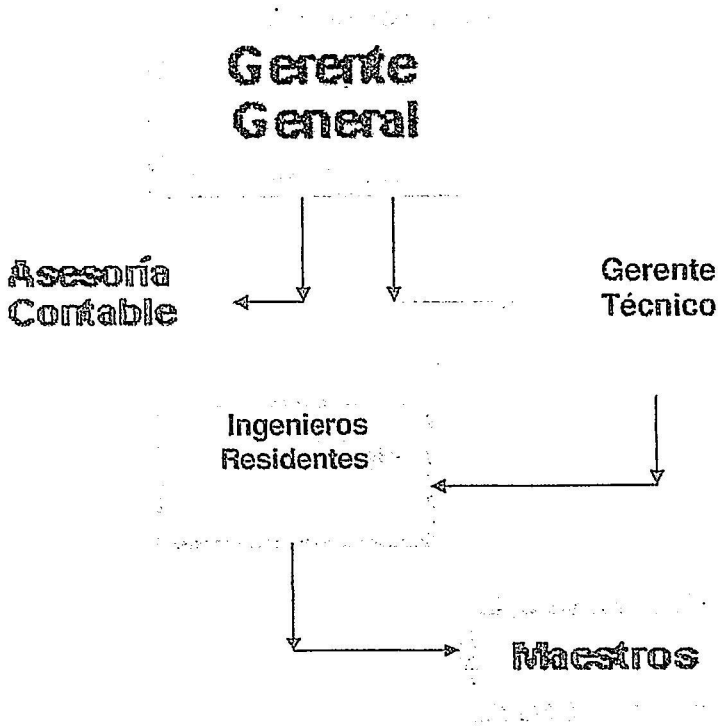

CALLE 44 No 19-34 Cali Colombia
Telefax 4417688 correo electrónico j.hoyosg@hotmail.com

Experiencia profesional

EJEUCION DE OBRAS CIVILES INTERVENTRORIAS Y CONSULTORIAS

OBJETO	CONTRATANTE	VALOR ($)	FECHA (DD-MM-AA)
Construcción de Edificaciones			
Construcción obras de infraestructura puesto de salud barrio 12 de octubre	Secretaria de Salud Pública Municipal	5'500.000	25-10-89
Construcción del puesto de salud del corregimiento de la Castilla	Secretaria de Salud Pública Municipal	3'000.000	26-05-90
Terminación del puesto de salud del corregimiento de la Castilla en el área rural del municipio de Cali	Secretaria de Salud Pública Municipal	6'500.000	10-08-90
Construcción puesto de salud Aguablanca fase I	Secretaria de Salud Pública Municipal	9'000.000	22-09-91
Terminación centro de salud Santiago Rengifo	Secretaria de Salud Pública Municipal	9'000.000	15-08-91
Terminación puesto de salud Aguablanca fase IV	Secretaria de Salud Pública Municipal	8'000.000	22-10-91
Terminación puesto de salud Chiminangos II	Secretaria de Salud Pública Municipal	2'000.000	15-10-91
Construcción puesto de salud Aguablanca	Secretaria de Salud Pública Municipal	3'000.000	28-01-92
Construcción terminación puesto de salud de Bellavista	Secretaria de Salud Pública Municipal	10'000.000	06-05-92
Construcción centro Hospital Carlos Carmona	Secretaria de Salud Pública Municipal	10'000.000	28-01-93
Construcción de contrapiso, escaleras, instalaciones sanitarias de la 2ª etapa del Hospital de Sevilla	Beneficencia del Valle del Cauca	24'857.526	
Construcción del centro de salud Cristóbal Colon Fase II	Secretaria de Salud Pública Municipal	88'571.428	31-03-98
Construcción del Cali No. 14	Secretaria de Programas Especiales	33'512.400	
Construcción puesto de salud Brisas de Mayo	Secretaria de Salud Pública Municipal	27'000.000	20-02-95
Terminación de la construcción del área de consultorio del puesto de salud Bellavista	Secretaria de Salud Pública Municipal	14'000.000	24-01-97
Construcción del centro de salud La Isla	Secretaria de Salud Pública Municipal	42'000.000	01-05-97
Terminación laboratorio – RX – Hospitalización – VA	Secretaria Departamental de Salud del Valle del Cauca	92'000.000	03-11-97

CALLE 44 No 19-34 Cali Colombia
Telefax 4417688 correo electrónico i.hoyosa@hotmail.com

Construcción del centro de salud Montebello	Secretaria de Salud Pública Municipal	70'000.000	18-05-98
Construcción centro de salud El Porvenir	Secretaria de Salud Pública Municipal	53'000.000	16-01-98
Terminación de la construcción del área de auditorio del puesto de salud Petecuy II	Secretaria de Salud Pública Municipal	10'000.000	26-04-98
Construcción del centro de salud Montebello	Secretaria de Salud Pública Municipal	100'000.000	19-06-98
Construcción y adecuación planta física del Colegio Técnico Industrial "Veinte de Julio"	Secretaria de Educación Departamental	42'738.015	19-11-99
Mejoramiento institucional parte física del Hospital Ancianato San Miguel	Secretaria de Salud Pública Municipal	161'550.001	15-10-00
Ejecución de obras civiles para la rehabilitación de los Centros de Salud de la Zona 13 de Armenia – Centro de Salud Quindos y Santa Rita	La Universidad Nacional de Colombia Gerencia Zona 13 de Armenia	48'605.137	26-11-01
Relocalización del Hogar Infantil del Municipio de Salento	Cámara de Comercio de Armenia	222'590.067	05-09-02
Construcción Centro de Nutrición San Vicente de Paul de la ciudad de Armenia	Cámara de Comercio de Armenia	223'849.888	27-01-03
Remodelaciones			
Remodelación y obras varias en la Escuela General Santander y Escuela Miguel Antonio Caro	Secretaria de Educación, Cultura y Recreación Municipal	4'699.917	30-01-89
Adecuación y terminación del laboratorio del centro hospital Primitivo Iglesias	Secretaria de Salud Pública Municipal	4'747.500	27-12-89
Remodelación puesto de salud del barrio el Rodeo	Secretaria de Salud Pública Municipal	6'239.00	28-09-90
Remodelación del puesto de salud del corregimiento de Pichinde	Secretaria de Salud Pública Municipal	6'000.000	02-08-90
Construcción remodelación centro de salud el Rodeo	Secretaria de Salud Pública Municipal	9'000.000	18-11-91
Remodelación centro de salud Alfonso Yung Valero	Secretaria de Salud Pública Municipal	2'500.000	25-09-91
Ampliación y adecuación del centro hospital Joaquín Paz Borrero	Secretaria de Salud Pública Municipal	10'000.000	04-12-92
Remodelación y terminación de U.E.S. silos 6	Secretaria de Salud Pública Municipal	9'000.000	15-02-92

Meléndez

Terminación nivel central San Fernando	Secretaria de Salud Pública Municipal	9'000.000	18-05-92
Adecuación del centro de salud Panamericano	Secretaria de Salud Pública Municipal	10'000.000	30-11-92
Continuación remodelación área de urgencias del centro hospital Joaquín Paz Borrero	Secretaria de Salud Pública Municipal	12'000.000	15-01-93
Ampliación y adecuación centro hospital Joaquín Paz Borrero	Secretaria de Salud Pública Municipal	10'000.000	14-09-92
Remodelación nivel central (Financiero)	Secretaria de Salud Pública Municipal	8'400.000	02-06-95
Remodelación nivel central (Epidemiología)	Secretaria de Salud Pública Municipal	10'800.000	02-06-95
Remodelación del puesto de salud del corregimiento del Saladito	Secretaria de Salud Pública Municipal	6'300.000	28-09-90
Remodelación centro de salud Calima	Secretaria de Salud Pública Municipal	3'000.000	20-08-91
Remodelación puesto de salud Villa Carmelo	Secretaria de Salud Pública Municipal	3'000.000	15-02-92
Remodelación de urgencias del centro de salud el Rodeo	Secretaria de Salud Pública Municipal	15'000.000	29-02-96
Remodelación centro de salud Cristóbal Colon	Secretaria de Salud Pública Municipal	50'000.000	08-02-96
Remodelación del centro de salud el Rodeo	Secretaria de Salud Pública Municipal	62'471.500	20-02-96
Mantenimiento planta física puesto de salud la Elvira	Secretaria de Salud Pública Municipal	15'000.000	20-02-97
Remodelación puesto de salud el Vergel	Secretaria de Salud Pública Municipal	9'728.000	14-02-97
Ampliación y adecuación puesto de salud Comuneros	Secretaria de Salud Pública Municipal	4'000.000	21-03-95
Construcción y mantenimiento Escuela General Anzoátegui	Secretaria de Educación Municipal	9'999.169	20-08-99
Reconstrucción de vivienda para el eje cafetero en el municipio de Sevilla Valle	Beneficiarios del FOREC	163'948.414	31-10-00
Reparación iglesia evangélica del Municipio de Bolívar Valle	Fondo de Solidaridad del Valle	21'068.25	10-04-01
Reparación matadero Municipal del Municipio de Bolívar Valle	Fondo de Solidaridad del Valle	55'776.758	29-06-01
Reparación Colegio Julio Caicedo y Téllez del Municipio de Bolívar Valle	Fondo de Solidaridad del Valle	92'604.386	12-04-01

CALLE 44 No 19-34 Cali Colombia
Telefax 4417688 correo electrónico j.hoyosg@hotmail.com

Acueductos			
Optimización de acueducto de Campo Alegre Fase I	Secretaria de Salud Pública Municipal	6'000.000	16-04-90
Optimización de acueducto de Campo Alegre Fase II	Secretaria de Salud Pública Municipal	4'000.000	20-03-90
Construcción acueducto Corregimiento La Buitrera	Secretaria de Salud Pública Municipal	9'000.000	30-09-91
Construcción acueducto corregimiento La Paz	Secretaria de Salud Pública Municipal	9'700.000	15-10-91
Continuación construcción acueducto El Diamante	Secretaria de Salud Pública Municipal	12'000.000	15-09-92
Adecuación construcción acueducto corregimiento de Golondrinas	Secretaria de Salud Pública Municipal	8'000.000	04-09-92
Mantenimiento y renovación de redes del acueducto regional La Leonera	Secretaria de Salud Pública Municipal	70'000.000	28-10-96
Alcantarillados y Canalizaciones			
Canalización Cajoncitos sector I Montenegro, canal en concreto desde el Box de la carretera Montenegro – Armenia hasta el final de la canalización existente	Secretaria de Obras Públicas Departamentales del Quindío	8'446.353	16-11-90
Construcción alcantarillado sector El Vale (Siloe) Fase I	Secretaria de Salud Pública Municipal	4'000.000	15-05-90
Construcción alcantarillado de Felidia	Secretaria de Salud Pública Municipal	9'000.000	15-11-91
Construcción del alcantarillado sanitario barrio Mozul y del colector final alcantarillado barrio Brasil	Acuavalle	79'422.567	02-05-94
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES			
CONSTRUCCIÓN PTAR ZONA PLANA LA BUITRERA (Consorciado)	Secretaria de Salud Pública Municipal	767'952.559	21-01-2007
Construcción fase I PTAR y alcantarillado Pueblo Nuevo (Corregimiento La Buitrera)	Secretaria de Infraestructura y Valorización de Cali	209'905.870	18-02-03
Construcción ptar pueblo Nuevo Sector 1 (consorciado)	Secretaria de Salud Pública Municipal	250'576.878	18-02-03
Construcción ptar fase II y alcantarillado	Secretaria de Salud Pública Municipal	240'819.712	18-02-03

CALLE 44 No 19-34 Cali Colombia
Telefax 4417688 correo electrónico j.hoyosa@hoimail.com

Pueblo Nuevo (Consorciado)			
Construcción alcantarillado y Ptar No 2,3 las Palmas – la Castilla (consorciado)	Secretaria de Salud Pública Municipal	241´668.101	18-02-03
Construcción ptar altos los mangos sector 1 (consorciado)	Secretaria de Salud Pública Municipal	574´200.592	18-02-03
Construcción alcantarillado y ptar cabecera Pance sector 1 y2	Secretaria de Salud Pública Municipal	247´880.018	21-01-2007
Terminación alcantarillado y ptar Vorágine	Secretaria de Salud Pública Municipal	253´050.644	21-01-2007
Instalación sistema de tratamiento individual de aguas residuales vereda el Futuro	Secretaria de Salud Pública Municipal	34´121.680	21-01-2007
Instalación sistema de tratamiento individual de aguas residuales vereda Las Brisas	Secretaria de Salud Pública Municipal	56´851.947	21-01-2007
Instalación sistema de tratamiento individual de aguas residuales vereda Las Granjas	Secretaria de Salud Pública Municipal	40´942.987	21-01-2007
Instalación sistema de tratamiento individual de aguas residuales vereda el Porvenir (consorciado)	Secretaria de Salud Pública Municipal	68´243.360	21-01-2007
Instalación sistema de tratamiento individual de aguas residuales vereda Lomitas (consorciado)	Secretaria de Salud Pública Municipal	34´119.195	21-01-2007
Terminación ptar cabecera Corregimiento Pance	Secretaria de Salud Pública Municipal	117´333.637	21-01-2007
Instalación sistema de tratamiento individual de aguas residuales vereda El Pinar (consorciado)	Secretaria de Salud Pública Municipal	52´281.670	21-01-2007
Instalación sistema de tratamiento individual de aguas residuales vereda El Otoño(consorciado)	Secretaria de Salud Pública Municipal	65´923.210	21-01-2007
Instalación sistema de tratamiento individual de aguas residuales vereda El Diamante (consorciado)	Secretaria de Salud Pública Municipal	52´282.413	21-01-2007
Instalación sistema de tratamiento individual de aguas residuales vereda El Minuto (consorciado)	Secretaria de Salud Pública Municipal	40´942.689	21-01-2007
Instalación sistema de tratamiento individual de aguas residuales vereda Villa del Rosario	Secretaria de Salud Pública Municipal	68´243.350	21-01-2007

CALLE 44 No 19-34 Cali Colombia
Telefax 4417688 correo electrónico i.hoyosa@hotmail.com

(consorciado)			
Instalación sistema de tratamiento individual de aguas residuales vereda El Palomar Y Montañuelas (consorciado)	Secretaria de Salud Pública Municipal	40´946.012	21-01-2007
Instalación sistema de tratamiento individual de aguas residuales vereda Alto Aguacatal (consorciado)	Secretaria de Salud Pública Municipal	56´851.913	21-01-2007
Construcción ptar y alcantarillado complementario Felidia	Secretaria de Salud Pública Municipal	637´586.083	30-12-2007
Construcción Fase II Alcantarillado y ptar Santa Helena Bajo	Secretaria de Salud Pública Municipal	170´173.653	30-12-2007
Construcción fase II ptar numero 1 las Palmas Castilla	Secretaria de Salud Pública Municipal	347´624.062	30-12-2007
Pavimentos			
Construcción de Sub-base, base y obras complementarias para pavimentación	Secretaria de Mantenimiento Vial y Construcción de Vías Rurales del Municipio de Cali	10´688.047	1993
Pavimentación vía de acceso a depósito de cal, Planta de Puerto Mallarino	EMCALI	92´980.507	1996
Pavimentación barrio El Brasil calle 59ª carreras 45 y 46	Municipio de Sevilla Valle	13´000.000	29-11-92
Continuación pavimentación vía de acceso a la vereda Manga Vieja Fase II	Alcaldía Municipal de yumbo	29´998.836	30-08-96
Pavimentación calle 7 entre carreras 4N y 7N Barrio Doña Emma Municipio de Roldadillo	CONALDE	73´594.553	2003
Obras Varias			
Construcción Muro de Contención Barrio San Luis	Municipio de Sevilla Valle	5´000.000	16-03-03
Construcción cerramiento puesto de salud Pichinde	Secretaria de Salud Pública Municipal	3´000.000	1994
Diseño sistema de recolección de aguas residuales sector Pueblo Nuevo La Buitrera	Secretaria de Salud Pública Municipal	6´000.000	1998
Prevención y atención de desastres dragado río desbaratado vereda San Andrés Miranda Cauca	Municipio de Miranda Cauca	8´000.000	18-11-91

Interventoría del proyecto diseño y construcción del Hospital Materno Infantil en su primera fase	Secretaria de Salud Pública Municipal	126´194.599	11-02-97
Construcción puente peatonal sobre el río Desbaratado en el punto Chocosito-La Lindosa	Municipio de Miranda Cauca	20´000.000	2000
Terminación construcción de Pre-Filtros del acueducto La Sirena fase III	Secretaria de Salud Pública Municipal	15´000.000	26-01-00
Diseño y construcción Pre-Filtros del acueducto La Sirena	Secretaria de Salud Pública Municipal	50´000.000	1997
Tanque almacenamiento agua-redes-cerramiento	Secretaria Departamental de Salud del Valle	39´984.000	10-11-97
Construcción del sistema de abasto de agua corregimiento del Hormiguero	Secretaria de Salud Pública Municipal	16´000.000	03-06-97
Construcción tanque de almacenamiento de agua corregimiento La Castilla	Secretaria Departamental de Salud del Valle	31´580.000	18-10-95
Construcción Pavimento en Adoquín y obras Complementarias cara 6N sector Patinchada. Municipio de Yumbo	Municipio de Yumbo	17'593.769	28-02-97
Obras De Acueducto Y Alcantarillado En La Zona Rural De Cali, contrato CO-SSPM-007-2004 (Consorcio Redes y Aguas, participación 10%)	Secretaria de Salud Pública Municipal	7.007'645.452	12-2004
Obras De Acueducto Y Alcantarillado En La Zona Rural De Cali, contrato CO-SSPM-008-2004 (Consorcio Redes y Aguas, participación 10%)	Secretaria de Salud Pública Municipal	5.085'819.388	24-12-03
Obras De Acueducto Y Alcantarillado En La Zona Rural De Cali, contrato COC-SSPM-4145.26.01326.2006 (Consorcio Acueductos y Alcantarillados, participación 20%)	Secretaria de Salud Pública Municipal	4'131.253.581	21-01-07
Obras De Acueducto Y Alcantarillado En La Zona Rural De Cali, contrato CO-SSPM-4145.26.01.134.2007 (Consorcio Aguas y Redes, participación 20%)	Secretaria de Salud Pública Municipal	4.500.474.124	21-01-07

CALLE 44 No 19-34 Cali Colombia
Telefax 4417688 correo electrónico j.hoyosq@hotmail.com

Construcción de la Segunda Fase del Modulo de Urgencias del Hospital Isaías Duarte Cancino (Consorcio H. I. D. C., participación 10%)	Hospital Isaías Duarte Cancino E.S.E	1.395.874.603	09-10-08
OBJETO: TERMINACION MODULO DE URGENCIAS Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO (consorcio H.I.D.C. DEL 10%)	Hospital Isaías Duarte Cancino E.S.E	$1.487'839.306	11-12-2009
OBJETO: Realizar el DIAGNOSTICO DISEÑO Y CONSTRUCCION DE DESARENADOR CANAL DEL BARRIO SAN JORGE EN LA ZONA DE LADERA DEL MUNICIPIO DE YUMBO	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO ESPY S.A. E.S.P.	44'964,664	11-06-11
DIRECTOR DE OBRA URBANIZACION CAÑAS GORDAS VIU EN CALI	ENRIQUE MOTOA Y CIA LTDA	COSTO DEL PROYECTO 4.500.000.000	AÑOS 2009-2010-2011-2012
DIRECTOR DE OBRA PAVIMENTO BODEGAS DE CARGUE INGENIO RIOPAILA CASTILLA	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO VICMAR LTDA	267'769.969	MAYO DE 2012
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE URBANISMO PARCELACION OCEANO VERDE JAMUNDI VALLE	FIEDEICOMISO OCEANO VERDE NATURAL AQUAPARK JAMUNDI V. (ALIANZA FIDUCIARA Y/O ENRIQUE MOTOA CONSTRUCTORA S.A.S	$70.000.000	NOVIEMBRE 1 DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DE 2014


Jairo Hoyos G.

JAIRO HOYOS GRANADOS
Ingeniero Civil

CALLE 44 No 19-34 Cali Colombia
Telefax 4417688 correo electrónico j.hoyosg@hotmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

JAIME




13-JUN-1956

SEVILLA
VALLE

1.64 A+ M

17 ENE-1976 ARMENIA


REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura

MATRICULA No.
Ingeniero Civil
APELLIDOS
Hoyos Granados
NOMBRES
Jairo
C.C.
UNIVERSIDAD
DEL QUINDIO

Firma del Matriculado

207
000251

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-1900324

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JAIRO HOYOS GRANADOS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 7521455, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 63202-13717 desde el 24 de Mayo de 1984, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1173.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los siete (07) días del mes de Marzo del año dos mil veintitres (2023).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.
