CERTIFICADO PARAFISCALES

Dirección: Calle 4 No. 10 -27, Neiva- Huila
Correo: marva.obrasemergencia@gmail.com
Tel. 312 521 24 97

DISSERTATION
PARAMETRIC

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

Yo, **LUZ AIDEE MOLINA SANCHEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 36.180.269 expedida en Neiva, con tarjeta profesional No. 261505-T, en mi calidad de contador, certifico que **MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S** con NIT No. 901.241.893-2, se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de sus obligaciones con los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Aportes parafiscales del personal que se encuentra laborando dentro de la misma.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la ley 789 del 2002, la Ley 797 de 2003, el Decreto 51 O de 203 y la ley 1562 de 2012.

La presente se expide a los veintinueve (29) días del mes de Diciembre de 2023.

LUZ AIDEE MOLINA SANCHEZ
M.P. No. 261505-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 36.180.269

MOLINA SANCHEZ
APELLIDOS

LUZ AIDEE
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-JUL-1965

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	A+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

07-JUN-1984 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1900100-50153364-F-0036180269-20070116 05007 07015B 02 210465452


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
261505-T
LUZ AIDEE
MOLINA SANCHEZ
C.C. 36180269
RES. INSCRIPCION 714 DEL 16/08/2019
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
273950
291132

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B706C924A7087

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUZ AIDEE MOLINA SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 36180269 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 261505-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

BALANCE FINAL

Dirección: Calle 4 No. 10 -27, Neiva- Huila
Correo: marva.obrasemergencia@gmail.com
Tel. 312 521 24 97

Powered by CamScanner

PAZ Y SALVO
FIC

Dirección: Calle 4 No. 10 -27, Neiva- Huila
Correo: marva.obrasemergencia@gmail.com
Tel. 312 521 24 97

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S identificado con el NIT 901241893, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
28 DE 2023	MUROS ULLOA	901241893	87,000	2023-10	16-ENE-2024	102997266
28 de 2023	MUROS ULLOA	901241893	116,000	2023-11	16-ENE-2024	102998325
28 de 2023	MUROS ULLOA	901241893	58,000	2023-09	16-ENE-2024	102994677
		Total	261,000			

Expedido por el SENA, a los dieciseis (16) dias del mes de Enero de 2024

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

SENA, MÁS TRABAJO

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2024-01-16

Generado por : Certificados En Linea

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 3473775544 - 255145

SENA, MÁS TRABAJO

Línea de atención al ciudadano: 018000 910270
Línea de atención al empresario: 018000 910682
@SENAcomunica
www.sena.edu.co
Certificado No. SC-CER339681-1

MARVA
CONSTRUCCIONES SAS

PAZ Y SALVO
COMFAMILIAR

Dirección: Calle 4 No. 10 -27, Neiva- Huila
Correo: marva.obrasemergencia@gmail.com
Tel. 312 521 24 97

138968-901241893-2

LA SUSCRITA JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDO DE APORTES DE COMFAMILIAR HUILA

CERTIFICA QUE:

La Empresa **MARVA CONSTRUCCIONES SAS** identificada con Nit No. **901.241.893,** se encuentra en estado **Activo** en nuestro sistema y cancela Aportes Parafiscales por los periodos de 202309 a 202311 **CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA**, así:

Anexo: Kardex de aportes

"La expedición de este documento no impide que Comfamiliar Huila pueda realizar visitas de verificación de la correcta y oportuna liquidación de los aportes, bases de liquidación y el pago oportuno de los mismos. (Decreto 562/9)

'ESTE CERTIFICADO NO ES VALIDO PARA AFILICIACIÓN A OTRAS CAJAS DE COMPENSACION NI COMO SOPORTE DE PAGO DE PARAFISCALES POR CONTRATOS'.

Dicha certificación se expide a los 16 días del mes de Enero del año 2024.

BRILLI YURANI CRUZ BARRETO

JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDO DE APORTES

Comfamiliar Huila
Por tu progreso, todo

LA SUSCRITA JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES
DE COMFAMILIAR HUILA

KARDEX DE APORTES

#	Comprobante	Recibo	Periodo	Nómina	Aporte	Mora	Indíce	Empleados	Fecha Pago
1	L4	2108682	202309	$ 465.000	$ 18.600	$ 0	4	3	2023-09-15
2	L4	2126680	202309	$ 5.855.000	$ 234.200	$ 0	4	5	2023-10-17
3	L4	2127627	202309	$ 16.110.000	$ 644.400	$ 0	4	27	2023-10-18
4	L4	2127628	202309	$ 2.407.500	$ 96.300	$ 0	4	7	2023-10-18
5	L4	2127629	202309	$ 5.762.500	$ 230.500	$ 0	4	5	2023-10-18
6	L4	2168432	202309	$ 1.237.500	$ 46.400	$ 3.100	4	1	2023-12-28
7	L4	2141188	202310	$ 24.455.000	$ 978.200	$ 0	4	29	2023-11-10
8	L4	2144994	202310	$ 6.507.500	$ 260.300	$ 0	4	5	2023-11-17
9	L4	2144995	202310	$ 3.612.500	$ 144.500	$ 0	4	10	2023-11-17
10	L4	2144996	202310	$ 5.262.500	$ 210.500	$ 0	4	8	2023-11-17
11	L4	2145278	202310	$ 2.985.000	$ 119.400	$ 0	4	5	2023-11-20
12	L4	2145279	202310	$ 3.955.000	$ 158.200	$ 0	4	9	2023-11-20
13	L4	2163481	202310	$ 1.032.500	$ 40.300	$ 1.000	4	1	2023-12-18
14	L4	2160455	202311	$ 8.235.000	$ 329.400	$ 0	4	6	2023-12-13
15	L4	2161924	202311	$ 5.542.500	$ 221.700	$ 0	4	9	2023-12-15
16	L4	2161925	202311	$ 21.165.000	$ 846.600	$ 0	4	27	2023-12-15
17	L4	2163261	202311	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	4	1	2023-12-18
18	L4	2163262	202311	$ 3.797.500	$ 151.900	$ 0	4	5	2023-12-18
19	L4	2163482	202311	$ 2.127.500	$ 85.100	$ 0	4	2	2023-12-18
20	L4	2163483	202311	$ 4.882.500	$ 195.300	$ 0	4	7	2023-12-18

BRILLI YURANI CRUZ BARRETO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDO DE APORTES

CONSTRUCCIONES SAS

PAZ Y SALVO MINISTERIO

Dirección: Calle 4 No. 10 -27, Neiva- Huila
Correo: marva.obrasemergencia@gmail.com
Tel. 312 521 24 97

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Trabajo

No. Radicado: 08SE2024904139600002926
Fecha: 2024-04-24 02:20:06 pm
Remitente: Sede: D. T. HUILA
Depen:INSPECCIÓN LA PLATA
Destinatario MARVA CONSTRUCCIONES SAS
Anexos: 0 Folios: 1
08SE2024904139600002926

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL DE HUILA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

HACE CONSTAR QUE:

Una vez verificado el sistema de información de reclamaciones, investigaciones administrativo-laborales y sanciones de la Dirección Territorial de Huila, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencio lo siguiente:

Radicado de la solicitud	05EE2024904139600001982
Nombre y/o Razón Social	MARVA CONSTRUCCIONES SAS
Identificación	901241893-2

En el periodo comprendido entre el 24/04/2023 al 23/04/2024 correspondiente al último año contado a partir de la fecha de expedición:

- **SANCIONES:** No. Registra
- **RECLAMACIONES:** NO Registra
- **INVESTIGACIONES**: No. Registra

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, para los fines legales pertinentes y tiene validez en los municipios de la Jurisdicción que le corresponden a la Dirección Territorial del Huila del Ministerio del Trabajo. De conformidad con lo estipulado en el artículo primero, numeral 20 de la Resolución 3455 del 16/11/2021 del Ministerio del Trabajo.

Neiva Huila, miércoles, 24 de abril de 2024

Camilo Chacue Collazos
CAMILO CHACUE COLLAZOS
Director Territorial del Huila

Elaboro: mandradel
Reviso/ Aprobó: cchacue

Para verificar la validez de este documento escaneé el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

Ministerio del Trabajo
Dirección Territorial Huila
Dirección: Calle 11 No. 5-62/64
Piso: 4 Edificio Plaza 11
Conmutador: (601) 3779999
Neiva- Huila

Atención presencial
Con cita previa en cada Dirección Territorial o Inspección Municipal del Trabajo.

Línea nacional gratuita, desde teléfono fijo:
018000 112518
www.mintrabajo.gov.co

CONSTRUCCIONES SAS

POLIZA DE ESTABILIDAD

Dirección: Calle 4 No. 10 -27, Neiva- Huila
Correo: marva.obrasemergencia@gmail.com
Tel. 312 521 24 97

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.05.17 10:51:06 -05:00

Código de Seguridad: M9RZr6oaA4bTAAcuhCn7xg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NV-100088807	No. ANEXO	9	No. CERTIFICADO	34295550	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA NEIVA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	25/03/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	MARVA CONSTRUCCIONES SAS	No. DOC. IDENTIDAD	901.241.893-2
DIRECCIÓN	CL 9 3 50	TELÉFONO	3125223367
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.913-4
DIRECCIÓN	CALLE 8 CARRERA 4 ESQUINA	TELÉFONO	8713281
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.913-4
DIRECCIÓN	CALLE 8 CARRERA 4 ESQUINA	TELÉFONO	8713281

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DEL ACTA DE RECIBO FINAL CON FECHA DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2023, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS. GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 30 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

REALIZAR OBRAS DE CONTENCION Y MITIGACION POR PERDIDA DE CALZADA Y SOCAVACION DE LA VIA 30HL01 PLANTANILLAL - SAN ANTONIO-VEGALARGA,DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL NO 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022,PRORROGADO A TRAVES DEL DECRETO 299 DE 2022.

*** NOTA ACLARATORIA ***

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 29/12/2023	24:00 Horas Del 30/06/2024	63.632.108,80	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 29/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	31.816.054,40	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 29/12/2023	24:00 Horas Del 29/12/2028	63.632.108,80	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 159.080.272,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ARCILA PERDOMO ASESORES D	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NV-100038807	No. ANEXO	9	No. CERTIFICADO	34295550	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA NEIVA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	25/03/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 05 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NV-100088807** y endoso, 9 cuyo afianzado es: **MARVA CONSTRUCCIONES SAS** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO DEL HUILA / DEPARTAMENTO DEL HUILA** , expedida por la Compañía en **17/05/2024**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA NEIVA a los **17** días del mes **MAYO** del año **2024**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

MARVA
CONSTRUCCIONES SAS

PLANOS
RECORDS

Dirección: Calle 4 No. 10 -27, Neiva- Huila
Correo: marva.obrasemergencia@gmail.com
Tel. 312 521 24 97

CONSTRUCCIONES SAS

ACTAS DEL CONTRATO

Dirección: Calle 4 No. 10 -27, Neiva- Huila
Correo: marva.obrasemergencia@gmail.com
Tel. 312 521 24 97

GOBERNACION DEL HUILA
SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO
UNIDAD DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES

GOBERNACIÓN DEL HUILA
Luis Enrique Dussán López
GOBERNADOR

HUILA CRECE

Neiva Huila
8 de Marzo de 2023

ORDEN DE SERVICIOS FDGRD No. 30 DE 2023 C:3061

OBJETO	REALIZAR OBRAS DE CONTENCION Y MITIGACION POR PERDIDA DE CALZADA Y SOCAVACION DE LA VIA 30HL01 PLATANILLAL - SAN ANTONIO-VEGALARGA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO A TRAVÉS DEL DECRETO 299 DE 2022.
PLAZO	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
VALOR	TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($ 318.160.544,oo) M/CTE – AIU INCLUIDO
ANTICIPO	NO APLICA.
FUENTE	FONDO DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
CONTRATANTE **DEPENDENCIA** **DIRECCIÓN** **TELÉFONO** **E-MAIL**	DEPARTAMENTO DEL HUILA Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario Calle 8 No. con Carrera 4 Esquina. 2° Piso 8671300 sgobierno@huila.gov.co
CONTRATISTA **CC** **DOMICILIO** **TELÉFONO** **E-MAIL**	**ANIBAL SALAZAR MONTENEGRO** No. 4.932.473 de Rivera Carrera 5 No. 6 -28 Oficina 803 Torre B 313 4414131 asalamonte@gmail.com

1. JUSTIFICACIÓN

Que de conformidad a las estipulaciones que integra en nuestro ordenamiento jurídico la Ley 1523 de 2012, *"Por la cual se adopta la política nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres"* que desde su artículo primero se establece que la gestión del riesgo es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento, la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.

Que el referido artículo en su parágrafo 1 constituyó la gestión del riesgo en una política de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la población.

Que el artículo 3 de la Ley 1523 de 2012, establece los principios reguladores de la Política de Gestión del Riesgo de Desastres, de los cuales se resaltan: 13. **Principio de concurrencia:** La concurrencia de competencias entre entidades nacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario que constituyen el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, tiene lugar cuando la eficacia en los procesos, acciones y tareas se logre mediante **la unión de esfuerzos y la colaboración** no jerárquica entre las autoridades y entidades involucradas. (...) 14. **Principio de subsidiariedad:** Se refiere al reconocimiento de la autonomía de las entidades territoriales para ejercer sus competencias. La

Powered by CamScanner

subsidiariedad puede ser de dos tipos: la subsidiariedad negativa, cuando la autoridad territorial de rango superior se abstiene de intervenir el riesgo y su materialización en el ámbito de las autoridades de rango inferior, si estas tienen los medios para hacerlo. La subsidiariedad positiva, impone a las autoridades de rango superior, el deber de acudir en ayuda de las autoridades de rango inferior, cuando estas últimas, no tengan los medios para enfrentar el riesgo y su materialización en desastre o cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien jurídico protegido relevante para la autoridad superior que acude en ayuda de la entidad afectada.

Que, la Gobernación del Huila, a través del decreto No. 059 del 9 de marzo de 2022 declaró la situación de Calamidad Publica en la Jurisdicción del Departamento del Huila, como consecuencia de las emergencias causadas por la temporada atípica de lluvias.

Que, mediante Decreto 299 de 2022, se dio prorroga por un término de seis (06) meses adicionales al inicialmente contemplado al Decreto No. 059 de 2022, acto que consagra la "situación de calamidad pública en la jurisdicción del Departamento del Huila, como consecuencia de las emergencias causadas por la temporada atípica de lluvias, y se dictan otras disposiciones".

Que con ocasión de la ampliación y prórroga de calamidad pública inicialmente decretada, y construido el plan de acción especifico PAE, se activa el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, por lo cual, puede la Nación, el Departamento del Huila y/o entidades públicas y privadas apoyar la ejecución de las acciones contenidas en el Plan de Acción Específico, para atender a la población afectada a través de la unión de esfuerzos, trabajo coordinado y la colaboración no jerárquica de los intervinientes.

Que una vez decretada la calamidad pública a nivel Departamental, y construido el plan de acción especifico PAE, se activa el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, por lo cual, puede la Nación, el Departamento del Huila y/o entidades públicas y privadas apoyar la ejecución de las acciones contenidas en el Plan de Acción Específico, para atender a la población afectada a través de la unión de esfuerzos, trabajo coordinado y la colaboración no jerárquica de los intervinientes.

Que el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, por unanimidad resolvió incluir en el PAE este proyecto denominado "REALIZAR OBRAS DE CONTENCION Y MITIGACION POR PERDIDA DE CALZADA Y SOCAVACION DE LA VIA 30HL01 PLATANILLAL - SAN ANTONIO- VEGALARGA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO A TRAVÉS DEL DECRETO 299 DE 2022".

Que el referido municipio, no cuenta con el presupuesto suficiente para atender las necesidades de la población afectada, por lo cual requiere de manera urgente la concurrencia de los demás actores del Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres, del que hace parte el Departamento del Huila a través del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Fondo Departamental para la Gestión del Riesgo del Huila.

Que de conformidad a lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1523 de 2016, se determina que el Consejos departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres, es una instancia de *"coordinación, asesoría, planeación y seguimiento, destinados a garantizar la efectividad y articulación de los procesos de conocimiento del riesgo, de reducción del riesgo y de manejo de desastres en la entidad territorial correspondiente."*

Que en virtud al principio de solidaridad que desarrolla el articulo 60 ibídem, de manera expresa indica que *"Los departamentos, corporaciones autónomas, distritos y municipios podrán colaborar con otras entidades territoriales de su mismo rango o de rango inferior o superior cuando tales entidades se encuentren en situaciones declaradas de desastre o de calamidad pública. La colaboración puede extenderse al envío de*

Powered by CamScanner

equipos humanos y materiales, recursos físicos a través de redes esenciales, elaboración conjunta de obras, manejo complementario del orden público, intercambio de información sobre el desastre o su inminente aparición y, en general, todo aquello que haga efectivos los principios de concurrencia y subsidiariedad positiva en situaciones de interés público acentuado." Que, en virtud del principio de subsidiaridad, el Departamento del Huila, concurre a efectos de apoyar la situación de emergencia presentada en el referido municipio.

Que el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, a su vez determinó que *"las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal."* Siendo imperativo dar aplicación a la norma especial de contratación, a efectos de atender la emergencia municipal.

Que, el artículo 66 de la Ley 1523 de 2016, establece que, salvo lo dispuesto para *"los contratos de empréstito interno y externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública, se someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares, con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993"*, como estatuto general de contratación estatal.

Que, en virtud de la ejecución de recursos del Fondo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, y ante la inminente necesidad de coadyuvar a los referidos municipios, son imperativas las acciones de manejo y respuesta determinadas en el Planes de Acción Específico, implementado para la atención de referida calamidad pública.

Que el artículo 1 de la Ordenanza Departamental No. 024 de 2014 creó el Fondo Departamental para la gestión del Riesgo de Desastres del Huila, como una cuenta especial del departamento con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística, sin personería jurídica ni planta de personal, con fines de interés público y asistencia social, con el propósito de invertir, ahorrar, destinar y ejecutar sus recursos en la adopción de medidas de conocimiento y reducción del riesgo y manejo de desastres o calamidades públicas declaradas o de naturaleza similar; que guarden coherencia con los niveles de riesgo de desastre que enfrenta el departamento Huila.

Que, de conformidad al artículo primero del Decreto Departamental No. 0167 de 2020, se delega a la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario del Huila, "el ejercicio de la ordenación del gasto, sin consideración a la cuantía, del Fondo Departamental para la Gestión de Riesgo de Desastres y el Fondo Departamental de Bomberos del Departamento del Huila, las cuentas y subcuentas que lo componen, de conformidad con el presupuesto dispuesto por su Junta de Administradora y su respectiva destinación y orden de prioridades determinado por su órgano máximo de administración".

Que, como indica la circular 018 del 24 de marzo de 2020 de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES *"Los recursos no están sujetos al principio de anualidad presupuestal: Esto significa que no procede la liquidación anual presupuestal y, en consecuencia, permanecerán en las cuentas hasta su ejecución. El término acumulativo del parágrafo 1° del artículo 54 de la Ley 1523 de 2012 se refiere a que los recursos, al estar en una cuenta especial, una vez finalizada la vigencia fiscal, no pueden ser liquidados para incluirse de nuevo en el presupuesto general, sino que aquellos que no se ejecuten en una vigencia se acumulan con los asignados para la siguiente, dándoles un carácter de recursos acumulados.*

Powered by CamScanner

Adicionalmente, este carácter acumulativo está orientado a que siendo la gestión del riesgo una política de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo, se debe contar con recursos necesarios, o al menos disponibles, para atender los procesos de conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres en sus fases de respuesta a las emergencias, garantizando un flujo continuo de los recursos."

2. OBJETO Y ALCANCE

OBJETO. REALIZAR OBRAS DE CONTENCION Y MITIGACION POR PERDIDA DE CALZADA Y SOCAVACION DE LA VIA 30HL01 PLATANILLAL - SAN ANTONIO- VEGALARGA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO A TRAVÉS DEL DECRETO 299 DE 2022.

ALCANCE DEL OBJETO. El Contratista, deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas, unidades y cantidades entregadas por EL DEPARTAMENTO al CONTRATISTA, el cual hace parte del presupuesto contenido en el numeral 4. Del presente Contrato. El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar el Contrato a los precios establecidos en el mencionado documento y con sus propios medios (materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal) en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación, aceptación y recibo a satisfacción.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA

PLAZO DEL CONTRATO. El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

4. VALOR DE LA OBRA

El valor del Contrato es de TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($ 318.160.544,oo) M/CTE – AIU INCLUIDO.

PARÁGRAFO 1: dentro del presente valor se entienden incluidos todos los costos directos e indirectos, impositivos o tributarios que afectan la obra contratada, conforme el presupuesto del proyecto realizado y aprobado por la Secretaria de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila.
PARÁGRAFO 2: De acuerdo a las especificaciones técnicas, ítems, cantidades y valores contenidos en el proyecto aprobado, el presupuesto de la presente Orden de Servicios tiene el siguiente detalle:

GOBERNACIÓN DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
E CONTENCION Y MITIGACION POR PERDIDA DE CALZADA Y SOCAVACION DE LA VIA 30HL01 PLATANILLAL - SAN ANTONIO- VEGALARGA"
CONSTRUCCION DE MUROS

Powered by CamScanner

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL 2020	PARTICULAR					
DISIPADOR DE ENERGÍA L = 20 m								
1	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	19,44	$ 38.072,00	$ 740.120,00
2	630.6	630-13		Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	m3	1,58	$ 685.719,00	$ 1.083.436,00
3	630.4	630-13		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	m3	6,20	$ 836.687,00	$ 5.187.459,00
4	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	Kg	436,90	$ 10.228,00	$ 4.468.613,00
5	610.2	610-13		Relleno para Estructuras con recebo	m3	2,72	$ 126.964,00	$ 345.342,00
							SUB-TOTAL	$ 11.824.970,00
MURO DE CONTENCION DE 16x6 m								
6	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	184,50	$ 38.072,00	$ 7.024.284,00
7	630,70	600-14		Concreto Resistencia 14 MPa (G) (Ciclopeo)	m3	36,00	$ 537.490,60	$ 19.349.662,00
8	630.6	630-13		Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	m3	2,70	$ 685.719,00	$ 1.851.441,00
9	630.4	630-13		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	m3	85,95	$ 836.687,00	$ 71.913.248,00
10	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	Kg	13.430,85	$ 10.228,00	$ 137.370.734,00
11	610.2	610-13		Relleno para Estructuras con recebo	m3	184,50	$ 126.964,00	$ 23.424.858,00
							SUB-TOTAL	$ 260.934.227,00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS								
12	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	9,00	$ 38.072,00	$ 342.648,00
13	4,05	681,1		Tubería en Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	m	6,00	$ 709.582,00	$ 4.257.492,00
14	630.6	630-13		Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	m3	0,80	$ 685.719,00	$ 548.575,00
15	630.4	630-13		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	m3	8,56	$ 836.687,00	$ 7.162.041,00

Powered by CamScanner

16	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	Kg	390,87	$ 10.228,00	$ 3.997.818,00
17	610.2	610-13		Relleno para Estructuras con recebo	m3	3,35	$ 126.964,00	$ 425.329,00
							SUB-TOTAL	$ 16.733.903,00
SECCIÓN 6 - ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA								
18	3P		3P	Revisión y/o ajuste a estudios y diseños base	Glb	1,00	$ 24.090.289,00	$ 24.090.289,00
							SUB-TOTAL	$ 24.090.289,00
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA:	$ 289.493.100,00
							VALOR BÁSICO ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA - SECCIÓN 5 = (D)	$ 24.090.289,00
							VALOR IVA ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA (19%*D) = (E)	$ 4.577.155,00
							VALOR OBRA=(C+D+E)	$ 318.160.544,00

PARAGRAFO 1: Se deja constancia que el presente presupuesto fue realizado en exclusividad por profesionales adscritos a la Secretaria de Vías e Infraestructura, conforme consta en el presupuesto firmado por el profesional y adjunto el cual hacen parte integral de la presente orden de servicios.

PARAGRAFO 2: Será responsabilidad exclusiva del contratista realizar la respectiva verificación del presente presupuesto, en cantidades, ítems, factor multiplicador, etc. En virtud del principio de responsabilidad, una vez suscrita la presente orden de servicios, el contratista renuncia a cualquier reclamación por cualquier error presentado en el presupuesto.

5. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Los recursos mediante los cuales se va a respaldar el pago de la presente orden de servicios corresponden a recursos del Fondo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres del Huila, según certificado de disponibilidad presupuestal que se imputarán en los siguientes términos:

Powered by CamScanner

DEPENDENCIA	CCPET	C. PROGRAM	PROYECTO	RECURSO	FUENTE	No. De Certificado de Disponibilidad Presupuestal
200-3	03-FONDO DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – MANEJO DE DESASTRES	99-GASTOS FONDO DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	0-UNIVERSAL	10 - Departamento	2 – superavit fiscal	2.527 vigencia de 310 dias contados a partir del 8 de marzo de 2023.

6. SISTEMA DE PAGO

El Sistema de pago del Contrato es por precios unitarios fijos. En consecuencia, el valor definitivo del Contrato será la suma de los resultados que se obtenga al multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por el CONTRATISTA y recibidas a satisfacción por EL DEPARTAMENTO por el valor de los precios unitarios fijos estipulados en el proyecto de inversión aprobado.

7. FORMA DE PAGO

El Departamento pagará al Contratista el valor del Contrato por el sistema de precios unitarios, mediante actas de recibo parcial de obra, aprobadas por el Interventor, de acuerdo al avance de obra hasta el noventa por ciento (90%), y el diez por ciento (10%) restante, a la terminación y liquidación de la obra contratada.

Parágrafo 1: Para efectos de los pagos, el Contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las Leyes 100 de 1993, 789 de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, y 1753 de 2015 y 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas; en el evento que el Contratista no haya realizado totalmente los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social, el Departamento podrá retener las sumas adeudadas y efectuará el giro directo de dichos recursos con prioridad a los regímenes de salud y pensiones.

Parágrafo 2: Para los pagos, el Contratista deberá aportar un informe, aprobado por el Interventor, que contenga como mínimo:

1. Tabla de contenido;
2. Valor del Contrato ejecutado y pendiente por ejecutar;
3. Porcentaje de ejecución física a la fecha;
4. Plazo del Contrato y el faltante por ejecutar;
5. Adicionales en valor y plazo, si aplica;
6. Suspensiones del Contrato realizadas mediante acta, si aplica;
7. Vigencia de las garantías del Contrato de obra;
8. Constancia de encontrarse a paz y salvo con los pagos al Sistema de Seguridad Social, y parafiscales, si estuviera obligado a ello;
9. Cumplimiento de las obligaciones del Contrato;
10. La descripción, cantidad y costos de los imprevistos que se causaron durante el periodo de la obra;
11. Equipo y personal utilizado durante el periodo de la obra;
12. Certificado del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental expedido por el Interventor; y
13. El valor a pagar con el acta de liquidación del Contrato de obra (informe final).
14. Y demás documentos que sean requeridos por el Interventor/Supervisor del contrato.

Parágrafo 3: Para el pago final, el Contratista deberá presentar los siguientes documentos:

Powered by CamScanner

1. Presentar un informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes parciales, aprobado por el Interventor;
2. El Acta de recibo final suscrita por el Interventor, el Contratista, y el Secretario de Vías e Infraestructura o quien se delegue para el efecto;
3. El acta de liquidación suscrita por las partes y el Interventor. En caso de liquidación unilateral, copia del acto administrativo con el cual se realizó, cuando se encuentre en firme;
4. Original de la bitácora de obra;
5. Los demás previstos en la Ley, en el Contrato de obra, o que requiera el Interventor.

Parágrafo 4: Los valores a pagar se efectuarán tomando como base el avance de las obras, certificado por el Interventor, cuyo valor corresponderá al resultado de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios pactados.
Parágrafo 5: Las demoras en los pagos originadas por la presentación incorrecta de los documentos requeridos para ello, serán responsabilidad del Contratista, y no tendrá derecho al reconocimiento de intereses o compensación de ninguna naturaleza.
Parágrafo 6: Los pagos estarán sujetos a las retenciones y deducciones legales a que hubiera lugar.
Parágrafo 7: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

8. ANTICIPO

No Aplica.

9. CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS.

Las cantidades de obra son aproximadas y por lo tanto podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra y tales variaciones no viciarán ni invalidarán el Contrato. EL CONTRATISTA está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecución del objeto contractual a los mismos precios contenidos en el presente documento, previa autorización del DEPARTAMENTO y el Interventor. En caso de presentarse mayores cantidades de obra estas podrán compensarse mediante acta suscrita entre el Interventor, el CONTRATISTA y EL DEPARTAMENTO.
Parágrafo 1: Cuando mayores cantidades de obra impliquen aumento del valor del Contrato, antes de iniciar su ejecución por parte del CONTRATISTA será necesario la suscripción del correspondiente adicional del Contrato, previa verificación dé la existencia de disponibilidad de recursos para cubrir el pago de las mayores cantidades de obra. En este caso, deberá procederse a la ampliación de las garantías exigidas de manera previa a la ejecución de las cantidades de obra que impliquen mayor valor.
Parágrafo 2: Se entiende por precio unitario fijo, el valor por unidad de recurso, obra, trabajo, servicio o bien requerido para la ejecución del Contrato aceptado por el CONTRATISTA el cual comprende todos los costos directos e indirectos impuestos y demás erogaciones de carácter tributarios derivados de la ejecución de la respectiva actividad y/o suministro y en general todo costo en que incurra EL CONTRATISTA para la ejecución objeto de este Contrato.

10. EJECUCIÓN DE ÍTEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS.

Si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar ítems o actividades de obras no previstas contractualmente, según criterio del Interventor, EL CONTRATISTA los deberá ejecutar, previa celebración del Contrato adicional correspondiente.

Powered by CamScanner

Parágrafo 1: Son ítems o actividades no previstas aquellas necesarias para el cumplimiento de las finalidades perseguidas con el Contrato, pero cuya ejecución no fue pactada. La necesidad de ejecutar lo nuevos ítems de obra será determinada por EL DEPARTAMENTO previo concepto del Interventor.
Parágrafo 2: Le está prohibido al CONTRATISTA ejecutar ítems o actividades de obra no previstas en el Contrato, sin que previamente se haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier ítem que ejecute sin la ejecución previa del documento contractual será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA de manera que EL DEPARTAMENTO no reconocerá valores por tal concepto. **Parágrafo 3:** Para la determinación del precio de los ítems o actividades no previstos y por lo tanto para la elaboración del análisis de precios unitarios por pate del CONTRATISTA se tendrá en cuenta el valor de los insumos, entendido como aquel que corresponde a las tarifas de los equipos, precios de los insumos y/o materiales básicos y las tarifas de personal, contenidos en los respectivos análisis de precios unitarios de los ítems o actividades previstas. En el evento en que el análisis de los precios unitarios de los ítems o actividades previstas de insumos haya consignado valores diferentes para un mismo insumo, se aplicará el menor valor. Si el precio de uno o algunos de los insumos necesarios para la determinación del valor del nuevo ítem o actividad no se encuentra en los análisis de precios unitarios, ni en la lista de los precios unitarios ni en la lista de los precios de insumos, será acordado entre EL CONTRATISTA y el Interventor y sometido a la aprobación del DEPARTAMENTO, previa verificación de los precios en el municipio. Los precios que se acuerden por los ítems o actividades no previstas, en ningún caso serán superiores a los del mercado al momento en que se celebre el contrato adicional. En caso que dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la comunicación en la que la Interventoría informe al CONTRATISTA sobre la necesidad de ejecutar el ítem o actividad no prevista, éste no convenga en llevarlo a cabo, El DEPARTAMENTO podrá contratar su ejecución con un tercero, en tal evento EL CONTRATISTA autoriza a EL DEPARTAMENTO para que sea descontada de las sumas a él adeudadas, la diferencia entre el valor acordado con el tercero por concepto de los insumos de los ítems o actividades no previstas y el menor valor de los mismos contenidos en los análisis de precios unitarios.

11. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones:

1. Conoce y acepta los documentos y los términos de la presente contratación.
2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos de la contratación y a recibir de la Gobernación del Huila respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.
3. Conoce a cabalidad el lugar de ejecución de la presente orden de servicios.
4. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.
5. Que no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad, o conflicto de interés establecido legalmente.
6. Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción.
7. Se encuentra a paz y salvo con las obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes, relacionados con las obligaciones laborales.
8. El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato.
9. El contratista durante la ejecución del presente contrato realizará todas las actividades necesarias para ejecución del contrato en debida forma y en cumplimiento al objeto del mismo.
10. Manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo del Contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

Powered by CamScanner

11. Se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución No. 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.

12. DERECHOS DEL CONTRATISTA.

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución en los términos pactados en el Contrato.
2. Acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de los derechos derivados del Contrato y la sanción para quienes los desconozcan o vulneren.
3. Garantía del derecho al debido proceso y contradicción en todas las actuaciones administrativas.
4. Objetar las órdenes impartidas por el Interventor cuando las considere injustas o que estén fuera de lo estipulado en el Contrato.
5. Recibir una remuneración equivalente a los derechos y obligaciones surgidas al momento de celebración del Contrato.
6. Realizar salvedades en todos los documentos contractuales y post contractuales.

13. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de 1991, de la Ley 1523 de 2012, Estatuto General de Contratación Pública, de las normas que regulan las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, el Contratista se obliga a:

A. OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL:

1. Cumplir el objeto del Contrato, ejecutar y entregar la obra contratada en el plazo estipulado, conforme a los criterios de calidad exigible, los diseños, los planos y las especificaciones de construcción, con sujeción a los precios unitarios estipulados.
2. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de conformidad con el proyecto de inversión aprobado.
3. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para evitar poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, durante la ejecución del Contrato.
4. Acreditar en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 adicionado mediante el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, la afiliación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF, y las cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
5. Mantener indemne al Departamento de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratistas y proveedores y demás servicios requeridos para la ejecución del Contrato.
6. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, como por los hechos u omisiones que le fueran imputables y que causen daño o perjuicio al Departamento o a un tercero, de conformidad con la Ley 80 de 1993.
7. Indemnizar y asumir todo daño que cause a terceros o al personal contratado para la ejecución del Contrato.
8. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
9. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Powered by CamScanner

10. Identificar las oportunidades e implementar las medidas para promover el empleo local durante la ejecución del Contrato
11. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el Contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero
12. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
14. Asumir el pago de los costos y gastos directos e indirectos que se causen o llegasen a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del Contrato.
15. Notificar al Departamento en caso de cesión, compra o venta de derechos económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el Contrato.
16. Notificar al Departamento cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
17. Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, conforme a los requisitos pactados en el Contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.
18. Presentar los documentos que le solicite el Interventor.
19. Asumir los riesgos previsibles de la ejecución del Contrato, y adoptar todas las medidas necesarias para mitigarlos.
20. Presentar todos los documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio ante el Interventor.

B. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL:

1. Suministrar y mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales exigidas. En todo caso, el Contratista deberá garantizar el tiempo de dedicación de los profesionales o técnicos requeridos para cumplir con el objeto contractual.
2. Mantener al frente de la obra al Director de Obra, el cual decidirá con el Interventor sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución del Contrato.
3. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra y, garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios también cumplan con sus obligaciones laborales.
4. Cumplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la

Powered by CamScanner

ejecución de la obra, y garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios también cumplan con sus obligaciones frente a estos sistemas.

5. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve al personal o los subcontratistas contra el Departamento, por causa o con ocasión del Contrato.
6. Ejecutar la totalidad de las obras en el plazo del Contrato, utilizando para ello los frentes de obra que sean necesarios de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1682 de 2013.

C. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios.
2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en el término señalado en la programación detallada del proyecto, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra.
3. Garantizar la calidad de los bienes, materiales y servicios prestados para el cumplimiento del objeto del Contrato. Los materiales que el Contratista emplee en la ejecución de los trabajos y que se encuentren deficientes podrán ser rechazados por el Interventor cuando no los encontrare convenientemente adecuados, en caso de estar en desacuerdo con la decisión de éste, la Secretaría de Vías e Infraestructura revisará la situación, y la respuesta será acatada por el Contratista.
4. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran y/o soliciten durante la obra, para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se requieran.
5. La seguridad de la maquinaria y materiales que emplee para la ejecución de la obra es de su responsabilidad exclusiva, por lo tanto, deberá disponer de todos los mecanismos que sean necesarios para evitar hurtos, pérdidas y daños; por lo mismo no podrá hacer reclamaciones al Departamento por estos hechos.

D. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

1. Entregar la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en el proyecto aprobado y entregado al contratista.
2. Poner en práctica procedimientos adecuados de construcción y protección de las obras contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Así mismo, deberá tomar las debidas precauciones a fin de conservar el estado de los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales y subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o instalaciones.
3. Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el Interventor, relacionadas con el cambio de procedimientos o equipos de construcción y la imposición de medidas que este considere necesaria para garantizar la buena calidad y correcta ejecución de las obras.
4. Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad, específicamente las relacionadas con el manejo de escombros, señalización de seguridad para el área de influencia de la obra y planes de manejo tráfico.

Powered by CamScanner

5. Cumplir con la normatividad vigente para la movilización de maquinaria y equipo pesado establecida en este tipo de obras por las entidades competentes.
6. Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicio cuentan con todas las licencias y permisos exigidos según la normatividad vigente, para lo cual el Contratista entregará al Departamento, antes de la suscripción del acta de inicio, copia de ellos, si aplica. Esta documentación deberá ser actualizada cuando lo requiera la Secretaría de Vías e Infraestructura o el Interventor.
7. Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para el desarrollo del Contrato.
8. Resolver dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo, los requerimientos relacionados con la ejecución del Contrato que le formule el Interventor, el Departamento o la comunidad.
9. Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los análisis de laboratorio antes de iniciar las obras y en el transcurso de ejecución de las mismas.
10. Adelantar todas las gestiones ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos por el Departamento, tales como cruce o cierre temporal de vías, accesos, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones o cualquier intervención del espacio público, entre otros.
11. Adelantar las gestiones pertinentes para la obtención de todas las Licencias o Permisos requeridos para la ejecución de la obra ante la entidad competente bajo su propia cuenta.
12. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.
13. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención donde se ejecute la obra.
14. Reparar las vías de acceso al sitio de la obra, cuando se deterioran como consecuencia de la ejecución de las obras contratadas.
15. Ejecutar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del término de la garantía de estabilidad de la obra.
16. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor o el Departamento, toda obra ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad exigidas en los documentos del proceso contractual.
17. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial, en especial en relación con los elementos de seguridad industrial necesarios para el personal que interviene en las actividades de obra, manipulación de equipos, herramientas, combustibles, así como la dotación de calzado y vestido de labor y, documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de objeto contractual.
18. Ceñirse a las especificaciones, planos y/o detalles previstos en los documentos del proceso contractual. Cuando a juicio del Contratista sea conveniente variar los planos o las especificaciones técnicas, someterá las modificaciones junto con los estudios correspondientes y justificaciones a revisión del Interventor, si éste no los aprueba, el Contratista se sujetará a las especificaciones pactadas. En caso de aprobarlos se procederá a realizar los ajustes técnicos, lo cual constará en acta, conforme al Acuerdo No. 0037 de 2016 expedido por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.
19. Ubicar la señalización preventiva necesaria para la circulación en condiciones de seguridad de los personales de obra, vecinos y terceros.
20. Cuando para la ejecución del Contrato, se requieran labores o desplazamientos a 1.5 metros o más sobre el nivel inferior, el contratista deberá cumplir con lo señalado en el Reglamento Técnico de

Powered by CamScanner

Trabajo Seguro en Alturas, establecido en las Resoluciones Nos. 3673 de 2008, 0736 de 2009 y la Circular 0070 de 2009 del Ministerio de Protección Social, las Resoluciones Nos. 1486 y 1938 de 2009 del SENA, y las Resoluciones Nos. 1409 de 2012 y 3368 de 2014 del Ministerio del Trabajo.

21. Entregar al Interventor dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del Contrato, como requisito previo para el inicio de los trabajos, la siguiente documentación: (i) Programa de Trabajo; (ii) Listado del personal que se empleará en la ejecución de la obra, y las correspondientes hojas de vida con los soportes; (iii) Las afiliaciones a la Seguridad Social y parafiscales de todo el personal que será empleado en la obra.
22. Presentar un programa detallado de la forma como se ejecutará la obra, sin perjuicio que el Departamento o el Interventor pueda objetarlo, de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en los documentos del proceso contractual.
23. Garantizar el libre y continuo uso de las vías a terceros en cuanto se relacione con la ejecución de sus trabajos. Sobre este aspecto, Contratista deberá notificar al interventor por lo menos con quince (15) días de anticipación sobre la iniciación de cualquier trabajo que pueda causar interferencia en el tránsito de vehículos y peatones. El Contratista deberá reducir a un mínimo tales interferencias, para l cual deberá notificar previamente a los usuarios de la vía las interrupciones y dificultades de movilidad que se puedan presentar durante la ejecución de las obras.

E. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN:

1. Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por el Departamento, el Interventor o de los organismos de control.
2. Presentar informes mensuales y final que contenga como mínimo la información requerida para los pagos parciales, según aplique, aprobado por el Interventor.
3. Llevar una bitácora de obra, donde se deberán consignar todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de manera que se logre la comprensión de la ejecución de la obra.
4. Desde el día que se inicien los trabajos, se deberá abrir un libro en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias que haga el Interventor, donde se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relación del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada anotación diaria deberá llevar la fecha y la firma del personal residente del Contratista y del Interventor. El responsable de mantener al día este diario será el residente de obra.
5. Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y el acta de liquidación.
6. Instalar una valla en el sitio de ejecución de la obra de acuerdo a las dimensione y especificaciones que serán suministradas por el Interventor, al momento de iniciar el Contrato, la cual se deberá desmontar dentro los quince (15) días después de haberse suscrito el acta de recibo final. En todo caso la valla debe estar desmontada previamente a la suscripción del acta de liquidación. El costo de la obligación será asumido por el Contratista.

F. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Powered by CamScanner

Verificar junto con el Interventor, el programa de flujo de fondos del Contrato, lo cual deberá constar en acta.
Parágrafo: La aprobación por parte del Departamento de algún procedimiento o método utilizado por el Contratista, no delega la responsabilidad ni implica la asunción de riesgos por parte del Departamento. El Contratista es el único responsable por el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

14. DERECHOS DEL DEPARTAMENTO

El Departamento tiene derecho a:

1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones requeridas.
2. Aplicar cuando corresponda las cláusulas excepcionales del Contrato que consagra la ley.
3. Aplicar cuando corresponda la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado al DEPARTAMENTO contratante de manera legal o contractual.

15. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO.

La Entidad está obligada a:

1. Pagar en los términos establecidos en la forma de pago del Contrato.
2. Suministrar oportunamente la información que se requiera para la ejecución de la obra.
3. Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.
4. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y pago de las sanciones pecuniarias a que hubiere lugar.
5. Ejercer el control del Contrato a través del Interventor o directamente.
6. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

16. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista, responderá a EL DEPARTAMENTO por los daños que le cause a los bienes del mismo y de terceros, ya sea por responsabilidad directa o de su personal subcontratistas, proveedores o personal de estos, resarciendo los perjuicios a satisfacción de EL DEPARTAMENTO, igualmente EL CONTRATISTA es responsable de la ejecución del objeto contractual hasta la entrega final y recibo definitivo por parte del DEPARTAMENTO y se obliga a tomar todas las medidas que sean necesarias para no poner en peligro a las personas ni a los bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por negligencia u omisión.
Parágrafo: Es obligación del CONTRATISTA llevar al día la bitácora de la obra; de igual manera, el CONTRATISTA deberá entregarla como requisito para la liquidación del Contrato, para que conste dentro del archivo del DEPARTAMENTO.

17. IDONEIDAD DEL CONTRATISTA

Con el propósito de dar aplicación a los principios constitucionales antes enunciados, como quiera que se ha propuesto como modalidad de contratación el Régimen Especial establecido en el Artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 y asegurar que el proponente seleccionado por la Gobernación del Huila Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario, Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, para la ejecución de este contrato, es decir, el profesional ANIBAL SALAZAR MONTENEGRO cumpla con los requisitos de idoneidad de orden jurídico, técnico y financiero, la Secretaría de Vías e Infraestructura procedió a revisar el cumplimiento de estos parámetros, ejercicio que permitió determinar que **ANIBAL SALZAR MONTENEGRO, identificado con CC No. 4.932.473 de Rivera** cuenta con el cumplimiento de los requisitos de idoneidad en los componentes jurídico, técnico, financiero y de organización, documento suscrito por los profesionales adscritos a la secretaria de Vías e Infraestructura Departamental, acta que hace parte integral del presente contrato, y la cual se adjunta

18. PERMISOS, LICENCIAS, DISEÑOS, PLANOS Y AUTORIZACIONES

El contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de las obras que respeten el entorno natural y social del área de

Powered by CamScanner

influencia en el cual se desarrolla, y a gestionar a cuenta propia las licencias y autorizaciones que fueren necesarios para el debido cumplimiento del objeto contractual.

19. CONSECUCIÓN DE MATERIALES.

EL contratista se obliga a acreditar la procedencia lícita de la fuente de materiales y el cumplimiento de la normatividad de carácter ambiental, así como el Código de Minas, la Ley 685 de 2001 y los Artículos 332 y 360 de la Constitución Política de Colombia o demás normas que adicionen o complemente dicha materia a efectos de que los materiales utilizados para la elaboración de la obra cuenten con las condiciones técnicas de calidad que determinan las normas frente a la materia.

20. INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a indemnizar al Departamento con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato, hasta por el monto del daño. El Contratista, mantendrá indemne al Departamento de los reclamos, demandas, acciones legales o costos que se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros, ocasionados por él, subcontratistas o proveedores durante la ejecución y vigencia del contrato.

21. MULTAS

En caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas por el CONTRATISTA con ocasión del Contrato, éste autoriza expresamente al DEPARTAMENTO para imponerle mediante resolución motivada, multas sucesivas por valor equivalente al uno por ciento (1%) del valor del Contrato, por cada día calendario de mora o retraso en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas y hasta cuando estas efectivamente se cumplan, las cuales sumadas no podrán exceder el diez por ciento (10%) del valor total del Contrato, sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal, si a ello hubiere lugar, o de reclamar la indemnización de los perjuicios causados con el incumplimiento que dio lugar a la aplicación de la multa. **Parágrafo 1:** En caso que el incumplimiento se vuelva a presentar, y ya hubiera sido sancionado con multa, será susceptible de una nueva sanción, sin embargo, en esta ocasión por la reiteración, el monto máximo previsto se entenderá incrementado en multas sucesivas por valor equivalente al dos por ciento (2%) del valor del Contrato, las cuales sumadas no podrán exceder el veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato. **Parágrafo 2**: Las multas impuestas no impiden el cobro de todos los perjuicios o daños adicionales que se causen. Será procedente sumar los valores de las demás sanciones o perjuicios contractuales o legales a las que haya lugar. **Parágrafo 3:** El valor de la multa se establecerá desde el día en que se debió cumplir con la obligación hasta la fecha en que termine el incumplimiento, independientemente que durante este interregno se esté tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. **Parágrafo 4:** El incumplimiento del cronograma de obra por parte del CONTRATISTA, ante la no respuesta al primer requerimiento que efectué el Interventor y/o el Supervisor, sin ejecutar la obra en los términos pactados, dentro de los cinco (5) días siguientes a su recibo, será causal para la aplicación de multas. En virtud de lo ordenado por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, en los documentos tipo, se deja constancia en el presente Contrato que, se causará multa equivalente a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que esta haya sido notificada a la Entidad.

22. CLÁUSULA PENAL.

En caso de declaratoria de caducidad o de presentarse por parte del Contratista incumplimiento parcial o total del Contrato o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, éste pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente hasta al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato. La tasación de la Cláusula Penal atenderá criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará

Powered by CamScanner

como una estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para demandar ante del juez del Contrato, la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal. El pago o deducción de la Cláusula Penal no exonerará al Contratista, del cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato incluyendo de la que se declara el incumplimiento. En caso de proceder a la aplicación de la Cláusula Penal, de conformidad con la normativa vigente, el Contratista, autoriza expresamente a la Entidad con la firma del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista o en su defecto se hará efectivo el amparo de cumplimiento de la garantía única de cumplimiento.

23. PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE LAS MULTAS, PENAL PECUNIARIA Y DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO

Las partes convienen aplicar el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales, el Decreto Departamental No. 1768 de 2013 o en las normas que las modifiquen, complementen o sustituyan. **Parágrafo 1**: El valor de los montos causados de las multas, la cláusula penal pecuniaria y la declaratoria de incumplimiento podrán ser descontados del valor de los desembolsos estipulados con ocasión del Contrato. **Parágrafo 2:** En caso de que EL CONTRATISTA no pague la suma correspondiente por este concepto dentro de los treinta (30) días siguientes a su notificación, EL DEPARTAMENTO podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento del Contrato o acudir a la jurisdicción coactiva. **Parágrafo 3:** La imposición de multas, penal-pecuniaria y/o declaratoria de incumplimiento no libera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones estipuladas, so pena de que se le inicie un nuevo procedimiento sancionatorio ante nuevos incumplimientos.

24. TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO.

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refieren los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

25. CADUCIDAD.

El Departamento, podrá declarar la caducidad de este contrato cuando a su juicio se presente hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargos del Contratista, que afecten de manera grave y directa la ejecución del Contrato y evidencie que pueda conducir a su paralización de conformidad con lo consagrado en el artículo 18 de la ley 80 de 1993. **Parágrafo:** En caso de declaración de caducidad del Contrato no habrá lugar a indemnización para el Contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley 80 de 1993.

26. GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO.

Para avalar las obligaciones que se contraen en virtud del presente contrato, el Contratista constituirá a su costa y a favor del Departamento, a través de cualquiera de las clases de garantías previstas en el artículo 2.2.1.2.3.1.2. de Decreto 1082 del 2015, los siguientes amparos:

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del Contrato	El veinte por ciento (20%) del valor del Contrato	Término de duración del contrato y seis (06) meses más, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio y en todo caso hasta su liquidación.
Responsabilidad Civil extracontractual	Doscientos (200) S.M.M.L.V.	Término de duración del Contrato contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio.
Pago de Salarios, Indemnizaciones y	El diez por ciento (10%) del valor del contrato	Término de duración del contrato y 3 años más, contados a partir

Powered by CamScanner

	Prestaciones Sociales		de la suscripción del Acta de Inicio.
	Garantía de estabilidad y calidad de la obra	El veinte por ciento (20%) del valor del Contrato	Por un término no inferior a cinco (5) años contados a partir de la fecha en cual la Entidad recibe a satisfacción la obra

Parágrafo 1: El Departamento aprobará la garantía, siempre y cuando reúna las condiciones legales y reglamentarias propias de cada instrumento y ampare los riesgos establecidos para cada caso. **Parágrafo 2**: El Contratista deberá restablecer el valor y/o vigencias de los amparos cuando se hayan reducido como consecuencia de las reclamaciones efectuadas por El Departamento.
Parágrafo 3: En el evento en que se adicione el valor y/o prorrogue el plazo de ejecución del Contrato, el contratista; deberá ampliar el valor y/o vigencia de los amparos, según el caso. **Parágrafo 4**: El amparo de responsabilidad civil extracontractual deberá cumplir con los requisitos previstos en el artículo 2.2.1.2.3.2.9 del decreto 1082 del 2015.

27. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA.

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo de la autoridad contratante.

28. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL.

El Departamento no tendrá relación laboral alguna con el CONTRATISTA, ni con el personal que éste utilice en la ejecución del Contrato. el Contratista deberá cumplir con sus obligaciones laborales, incluyendo el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y demás que correspondan según el caso, siendo de su exclusiva responsabilidad el pago de todos los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que emplee en la ejecución del Contrato, sobre lo cual deberá presentar un informe mensual al Interventor y al Departamento cuando éste lo requiera.

29. CESIÓN

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

30. SUBCONTRATACIÓN

El contratista puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del contrato; sin embargo, el Contratista debe comunicar de éstas contrataciones al Departamento y llevar el debido registro de este tipo de negocios jurídicos.
Parágrafo: El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las obligaciones emanadas del presente contrato, ni compromete la responsabilidad del Departamento.

31. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del Contrato cuando el incumplimiento sea imputable o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o

Powered by CamScanner

caso fortuito debidamente invocado y constatado de acuerdo con la ley colombiana, aunque en todo caso, se deberá velar por el cumplimiento del objeto contractual.

32. VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, se establece que la vigilancia a la correcta ejecución del Contrato se efectuará a través de un Interventor Contratado por el Departamento.

La Interventoría consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del Contrato; el Interventor está facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y serán responsables de mantener informados al Departamento de los hechos o circunstancias que pueda constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del Contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. Por lo anterior, y atendiendo al objeto del Contrato, el Interventor cumplirá las actividades establecidas en el artículo 84 de la Ley 1474. La interventoría ejercerá un control integral sobre el desarrollo del proyecto, para lo cual podrá en cualquier momento, exigir al Contratista la adopción de medidas para mantener, durante la ejecución del Contrato, las condiciones técnicas, administrativas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo. La Interventoría cumplirá las funciones establecidas en el artículo 84 de la Ley 1474, Decreto Departamental 007 de 2007 y particularmente las de:

a) Exigir el cumplimiento del Contrato en todas sus partes, para lo cual debe requerir el efectivo desarrollo de las actividades señaladas en la propuesta y en el presente Contrato.
b) Atender las consultas que realice el Departamento respecto a sus obligaciones convenidas;
c) Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes o necesarios para el logro de los objetivos del Contrato y presentarlos a consideración del Departamento;
d) Verificar la disponibilidad de recursos técnicos, administrativos, logísticos y humanos por parte del Contratista según lo establecido en el proyecto de inversión aprobado, al momento de su iniciación y durante la ejecución del Contrato;
e) Exigir al Contratista el empleo de personal técnico capacitado para la ejecución del objeto del Contrato, y el retiro de aquel que perjudique los intereses de El Departamento;
f) Solicitar al Contratista efectuar los correctivos pertinentes cuando considere que éste no está cumpliendo cabalmente con las obligaciones que le son exigibles;
g) Solicitar las adiciones cuando se requieran y justificarlas debidamente;
h) Revisar los informes presentados por el Contratista sobre el avance físico, administrativo y financiero del Contrato;
i) Autorizar, los pagos estipulados en el presente Contrato a favor del Contratista;
j) Todas las demás derivadas del Contrato.

33. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El Contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente Contrato, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar establecidas en la Constitución Política, en la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones legales, y que en el evento de sobrevenir alguna de ellas lo informará inmediatamente al Departamento, para los fines a que haya lugar, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993. Igualmente declara no estar reportado en el Boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República.

34. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Powered by CamScanner

Para ejecutar el Contrato de obra pública, se deberá tener en cuenta las especificaciones dispuestas en el anexo técnico y en el presente contrato. Parágrafo 1: El contratista tiene la obligación de proveer todas las medidas e implementar toda la señalización y medidas de control necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios. Parágrafo 2: El Contratista desarrollará la Obra a partir de una cuidadosa planeación de la misma, aplicando buenas prácticas de Ingeniería. Parágrafo 3: Serán a cargo del Contratista todos los costos requeridos para implementar la señalización y las vallas de Información en caso de aplicar. Parágrafo 4: El Contratista deberá mantener la señalización de Obra y demás dispositivos de seguridad y de comunicación.

35. CONTRIBUCIÓN ESPECIAL

El Contratista deberá pagar el 5% del valor del Contrato de acuerdo a la ley 782 de 2002, Ley 1106 del 2006, Ley 1421, 1430 de 2010 y demás leyes Reglamentarias.

36. OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

El Contratista se compromete a cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando corresponda, presentando en forma periódica ante el Interventor contratado por el Departamento la constancia de pago de los respectivos aportes. El incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas.

37. MODIFICACIONES Y/O ACLARACIONES AL CONTRATO

Cualquier modificación, adición, prórroga y/o aclaración del presente Contrato deberá efectuarse de mutuo acuerdo entre las partes que conste por escrito, conforme a los requisitos legales y presupuestales siempre y cuando ello no implique modificación del objeto.

38. SUSPENSIÓN TEMPORAL

La ejecución del presente Contrato se podrá suspender temporalmente por: **1.** Mutuo acuerdo entre las partes, siempre que de ello no se deriven mayores costos ni perjuicios para el Departamento. **2.** Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. La suspensión se hará constar en un acta en la que se señalarán los motivos que dieron lugar a la suspensión y la fecha en que se reiniciarán las actividades. El término de la suspensión no imputable al Contratista no se computará para todos los efectos del plazo extintivo del presente Contrato.

Parágrafo 1: Una vez cese el motivo generador de la suspensión, el Contrato deberá reiniciarse de manera inmediata por el Contratista, la no reiniciación será tomada como incumplimiento por parte de éste.

Parágrafo 2: En todo caso, por el tiempo de la suspensión no se alegará por parte del Contratista perjuicio alguno en contra del Departamento.

Parágrafo 3: En este caso el Contratista deberá reajustar la vigencia de la garantía única por un término igual al de la suspensión, una vez sea suscrita la correspondiente acta de reinicio.

39. LIQUIDACIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, el Contrato será objeto de liquidación. El término de liquidación iniciará a partir de la expiración del término previsto para la ejecución del Contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga, y el término para su liquidación será de seis (6) meses, el cual incluye cuatro (4) meses para su liquidación de mutuo acuerdo, y en caso de que el Contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga el Departamento, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, el Departamento tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes; en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, estipulando los acuerdos, conciliaciones y transacciones para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo, todo lo cual deberá constar en el acta de liquidación. **Parágrafo 1:** Para la liquidación se exigirá al Contratista la extensión o ampliación,

Powered by CamScanner

si es del caso, de las garantías del Contrato para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del vínculo. El acta de liquidación deberá incluir como mínimo:

a) La relación de los pagos o desembolsos efectuados al Contratista.
b) La constancia de paz y salvo del Contratista con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, si estuviera obligado a ello.
c) La constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

Parágrafo 2: Si el Contratista deja salvedades en el acta de liquidación de mutuo acuerdo, el Departamento podrá liquidar unilateralmente los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.

40. EXISTENCIA, VALIDEZ Y PERFECCIONAMIENTO

Al ser celebrado el presente contrato bajo el régimen especial de contratación que contempla el capítulo VII de la Ley 1523 de 2012, por estar relacionado directamente con actividades de respuesta, rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de calamidad pública, tiene validez desde el momento en que se imparta la orden verbal de servicio; y el mismo es suscrito. No obstante, se considera perfeccionado una vez realizado el registro presupuestal, que deberá estar acompañado del acta de inicio, recibo original del pago de impuestos, y la aprobación de pólizas, de ser el caso.

41. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el municipio de Vegalarga, Departamento del Huila y el domicilio contractual es la ciudad de Neiva Huila.

42. MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique en debida forma. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleado las instancias y procedimientos contemplados en los artículos 68 y siguientes de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.

43. NOTIFICACIONES

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del Contrato deberán constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas únicamente cuando sean entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas en el apartado instructora del presente contrato.

44. DOCUMENTOS DE LA ORDEN DE SERVICIOS

Son documentos de la presente orden de servicios y hacen parte integral de la misma, los siguientes:

1) Presupuesto oficial y APU elaborado por profesional de apoyo de la Secretaría de Vías e Infraestructura del Departamento.
2) Actas suscritas por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD
3) Documento de verificación de Idoneidad del Contratista de orden jurídico, técnico y financiero, la Secretaría de Vías e Infraestructura Departamental..
4) Decreto Departamental No. 059 de 2022 por medio del cual declaró la situación de Calamidad Publica en la Jurisdicción del Departamento del Huila, como consecuencia de las emergencias causadas por la temporada atípica de lluvias.
5) Decreto Departamental No. 299 de 2022, por medio del cual se dio prorroga por un término de seis (06) meses adicionales al inicialmente contemplado al Decreto No. 059 de 2022, acto que consagra la "situación de calamidad pública en la jurisdicción del Departamento del Huila, como consecuencia de las emergencias causadas por la temporada atípica de lluvias, y se dictan otras disposiciones".

Powered by CamScanner

6) Certificado de Disponibilidad Presupuestal
7) Propuesta del Contratista y demás documentos conforme al Check List adjunto en la primera hoja de la presente Orden de Servicios.
8) Documentos de legalización, Pólizas y pago de impuestos y/o estampillas a que hubiere lugar

ORDENADOR DEL GASTO	CONTRATISTA
TANIA BEATRIZ PEÑAFIEL ESPAÑA Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario	**ANIBAL SALAZAR MONTENEGRO** **CC. 4.932.473 de Rivera**

Proyectó: Angely Marcela Rojas Ramírez
Abogada Gestión del Riesgo de Desastres

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES SAS

CERTIFICADOPRESUPUESTAL

Dirección: Calle 4 No. 10 -27, Neiva- Huila
Correo: marva.obrasemergencia@gmail.com
Tel. 312 521 24 97

GOBERNACIÓN DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4
SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CÓDIGO SHA-P-705-F-01

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: SUBCUENTA: DE MANEJO DE DESASTRES

C E R T I F I C A

Que revisados los registros de Control Presupuestal de la Dependencia, en la vigencia fiscal del 2023 existe la siguiente Disponibilidad Presupuestal:

DESTINO: Realizar Obras de Contencion y Mitigacion por Perdida de Calzada y Socavacion de la Via 30hl01 Platanillal - San Antonio- Vegalarga, de Acuerdo con la Declaratoria de Calamidad Pública que Contiene el Decreto Departamental No. 059 del 9 de Marzo de 2022, Prorrogado a Través del Decreto 299 de 2022

DEPENDENCIA: 200-3 - Subcuenta: de Manejo de Desastres

CCPET: 03 - FONDO DEPARTAMENTAL PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - DE MANEJO DE DESASTRES

C. PROGRAM.: 99 - GASTOS FONDO DEPARTAMENTAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

PROYECTO: 0 - Universal

RECURSO: 10 - Departamento

FUENTE: 2 - SUPERÁVIT FISCAL - DEPARTAMENTO

C. C. PROD.: 00 - NO APLICA

META PROD.: 99-0-0 - Universal

VALOR: $318,160,544.00

Que el valor total de la Disponibilidad es de $318,160,544.00, la cual esta identificada con el número 2,527 y que tiene una vigencia de 298 días calendario a partir del 8 de marzo de 2023.

La presente Certificación se expide a solicitud de TANIA BEATRIZ PEÑAFIEL ESPAÑA-OFICIO 1450 DE MARZO 7 DE 2023.

Neiva, Miércoles 8 de Marzo de 2023

EBERT BARRERA ALVAREZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Funcionario que elaboró la Certificación: LILIANA POLANCO A

Powered by CamScanner

MARVA
CONSTRUCCIONES SAS

REGISTRO PRESUPUESTAL

Dirección: Calle 4 No. 10 -27, Neiva- Huila
Correo: marva.obrasemergencia@gmail.com
Tel. 312 521 24 97

GOBERNACIÓN DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4
SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG
CODIGO SHA-P-705-F-02

REGISTRO PRESUPUESTAL - COMPROMISO Nro. 3,061 DE 2023

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: SUBCUENTA: DE MANEJO DE DESASTRES

C E R T I F I C A

Que en el Sistema de Información Financiera y Administrativa - SIFA©, vigencia fiscal 2023, se efectuó el siguiente Compromiso Presupuestal:

BENEFICIARIO: ANIBAL SALAZAR MONTENEGRO

NIT: 4,932,473-4

OBJETO: Orden de Servicios Fdgrd 30/2023--realizar Obras de Contencion y Mitigacion por Perdida de Calzada y Socavacion de la Via 30hl01 Platanillal - San Antonio- Vegalarga, de Acuerdo con la Declaratoria de Calamidad Pública que Contiene el Decreto Departamental No. 059 del 9 de Marzo de 2022, Prorrogado a Través del Decreto 299 de 2022

DEPENDENCIA: 200-3 - Subcuenta: de Manejo de Desastres

CCPET: 03 - FONDO DEPARTAMENTAL PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - DE MANEJO DE DESASTRES

C. PROGRAM.: 99 - GASTOS FONDO DEPARTAMENTAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

PROYECTO: 0 - Universal

RECURSO: 10 - Departamento

FUENTE: 2 - SUPERÁVIT FISCAL - DEPARTAMENTO

C. C. PROD.: 00 - NO APLICA

META PROD.: 99-0-0 - Universal

VALOR: $318,160,544.00

Que el valor total del Compromiso es de $318,160,544.00, el cual esta identificado con el número 3,061, vigente a partir del 12 de abril de 2023, fundamentado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 2,527 de 2023.

El presente Registro Presupuestal se expide a solicitud de TANIA BEATRIZ PEÑAFIEL ESPAÑA-SECRETARIA DE GOBIERNO.

Neiva, Miércoles 12 de Abril de 2023

ANDRES MAURICIO MUÑOZ LEGUIZAMO
SECRETARIA DE HACIENDA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Funcionaria que elaboró el Registro Presupuestal: LILIANA DEL PILAR POLANCO ARAUJO

Powered by CamScanner

MARVA
CONSTRUCCIONES SAS

PAGO GACETA

Dirección: Calle 4 No. 10 -27, Neiva- Huila
Correo: marva.obrasemergencia@gmail.com
Tel. 312 521 24 97

TRAMITE

GOBERNACION DEL HUILA
HUILA CRECE
SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
RECIBO OFICIAL DE PAGO DE RENTAS VARIAS - CGUTIERREZ-20230526-092548-HDA-DT-CONT20

Contribuyente	N 901241893	MARVA CONSTRUCCIONES SAS	Fecha Expedicion	26-05-2023	No. Recibo Pago
Direccion	CARRERA 8 3 05	Telefono 3125223367	Fecha Limite Pago	31-05-2023	202300037097
Asociada CONTRATO	CON-30/23	Impuesto 27 CONTRATOS	Base Gravable	318,160,544	

Concepto	Descripcion Concepto	Tarifa	Total Concepto
013	CONTRATOS CON GACETA ORDENANZA 004 FEBRERO 17 DE 2021	2000/100	$255,000
015	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO DEPARTAMENTAL	2/100	$6,363,000
016	ESTAMPILLAS PRO CULTURA	1.5/100	$4,772,000
017	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4800/100	$1,800
267	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	5/100	$15,91,000
		Total a Pagar	$12,939,800

SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL CAJERO No. 8 H.N. 29 MAYO 2023 PROCESADO

TRAMITE

GOBERNACION DEL HUILA
HUILA CRECE
SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
RECIBO OFICIAL DE PAGO DE RENTAS VARIAS - CGUTIERREZ-20230526-092548-HDA-DT-CONT20

Contribuyente	N 901241893	MARVA CONSTRUCCIONES SAS	Fecha Expedicion	26-05-2023	No. Recibo Pago
Direccion	CARRERA 8 3 05	Telefono 3125223367	Fecha Limite Pago	31-05-2023	202300037097
Asociada CONTRATO	CON-30/23	Impuesto 27 CONTRATOS	Base Gravable	318,160,544	

Concepto	Descripcion Concepto	Tarifa	Total Concepto
013	CONTRATOS CON GACETA ORDENANZA 004 FEBRERO 17 DE 2021	2000/100	$255,000
015	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO DEPARTAMENTAL	2/100	$6,363,000
016	ESTAMPILLAS PRO CULTURA	1.5/100	$4,772,000
017	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4800/100	$1,800
267	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	5/100	$15,91,000
		Total a Pagar	$12,939,800

SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL CAJERO No. 8 H.N. 29 MAYO 2023 PROCESADO

Powered by CamScanner

ACTA DE INICIO

_X__ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	ORDEN DE SERVICIOS FGRD	Nº:	030	AÑO:	2023

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL, (Unión temporal o Consorcio)	MARVA CONSTRUCCIONES SAS		
	NIT O CC:	901241893-2		
	DIRECCIÒN:	Calle 4 No. 10-27 Barrio Altico	TEL:	3125212497
	CIUDAD:	NEIVA		
	REPRESENTATANTE LEGAL y o cada uno de los integrantes	MARILUZ VARGAS GONZALEZ		
	CC:	26.593.081 de Teruel		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE CONTENCION Y MITIGACION POR PERDIDA DE CALZADA Y SOCAVACION DE LA VIA 30HL01 PLATANILLAL - SAN ANTONIO- VEGALARGA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO A TRAVÉS DEL DECRETO 299 DE 2022.			
VALOR DE CONTRATO:	($ 318.160.544,oo) M/CTE.			
	Valor en Letras: TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE AIU INCLUIDO			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
PLAZO DE EJECUCIÒN:	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO			
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	31/05/2023			
FECHA APROBACIÒN DE	31/05/2023	Nº Póliza:	NV 100088807 NV 100016696	

Powered by CamScanner

PÓLIZA: (dd/mm/aa)		Aseguradora:	Seguros Mundial
FECHA DE PAGO PUBLICACIÓN GACETA Y/O ESTAMPILLAS DEPTAL: (dd/mm/aa)	29/05/2023		

En la ciudad de Neiva, el día 31 de mayo de 2023 en el Despacho de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario de la Gobernación del Huila, se reunieron la Doctora Tania Beatriz Peñafiel España en calidad de supervisora, Anibal Salazar Montenegro en calidad de contratista, Adrian Rodrigo Cabezas Peña en su condición de representante legal del Consorcio INTERVIAS MSM e interventor, , con el fin de dar inicio a la ejecución del mencionado contrato.

Se inicia la ejecución contractual el día de hoy 31 de mayo de 2023, a efectos de brindar respuesta, rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública por el municipio de San Antonio Vegalarga, dando aplicabilidad a las medidas especiales de contratación que establece el art. 65, 66 y ss. de la Ley 1523 de 2012. En virtud a las estipulaciones que consagra la Ordenanza Departamental No. 024 de 2014, por medio de la cual se creó el Fondo Departamental para la gestión del Riesgo de Desastres del Huila, con el objetivo específico de: *"2.4. Asignar los recursos que permitan el control de los efectos de los desastres y calamidades públicas declaras o de naturaleza similar."* Así mismo, por las características del fondo según la Circular 018 del 24/03/2020 de la UNGRD.

TANIA BEATRIZ PEÑAFIEL ESPAÑA
Sec. De Gobierno y Desarrollo Comunitario
Ordenadora del Gasto

MARILUZ VARGAS GONZALEZ
RL. MARVA CONSTRUCCIONES SAS
NIT No. 901241893-2
Contratista

ADRIAN RODRIGO CABEZAS PEÑA
RL.– CONSORCIO INTERVIAS MSM – Nit. No. 901.689.909-5
CC. No. 79.781.886 de Bogotá
Interventor OS 30 de 2023

Powered by CamScanner

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1

_X_ CONTRATO DE:	ORDEN DE SERVICIOS	Nº:	30	AÑO:	2023
___ CONVENIO DE:					

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO.

CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S		
	NIT O CC:	901.241.893-2		
	DIRECCIÒN:	CLL 4 10-27	**TEL:**	3125212497
	CIUDAD:	NEIVA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	MARILUZ VARGAS GONZALEZ		
	CC:	26.593.081		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN POR PERDIDA DE CALZADA Y SOCAVACIÓN DE LA VIA 30HL01 PLATANILLAL-SAN ANTONIO-VEGALARGA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO A TRAVÉS DEL DECRETO 299 DE 2022			
VALOR DE CONTRATO:	**$318,160,544.oo**			
	Valor en Letras: TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE – AIU INCLUIDO			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO			
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**			
	Nº2			
	Nº3			
FECHA DE INICIO:	31/05/2023			
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	2/06/2023	
		REINICIACIÓN	DD MM AÑO	
	Nº2	**SUSPENSIÓN**	DD MM AÑO	

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre			
Cargo			

Powered by CamScanner

		REINICIACIÓN	DD MM AÑO
	Nº3	SUSPENSIÓN	DD MM AÑO
		REINICIACIÓN	DD MM AÑO
	Nº4	SUSPENSIÓN	DD MM AÑO
		REINICIACIÓN	DD MM AÑO
FECHA DE ACTA (SUSPENSIÓN, REINICIACIÓN O JUSTIFICACIÓN):	2/06/2023		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	ANDRÉS MAURICIO MUÑOZ LEGUIZAMO	
	EN CALIDAD DE:	Secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario	
	NOMBRE:	MARILUZ VARGAS GONZALEZ	
	EN CALIDAD DE:	R/L. MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S - Contratista de Obra	
	NOMBRE:	ADRIAN RODRIGO CABEZAS PEÑA	
	EN CALIDAD DE:	R/L. CONSORCIO INTERVIAS MSM – Contratista de Interventoría	

En la ciudad de Neiva, en el despacho de la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario del Departamento del Huila, siendo las 2 PM de hoy 2 de junio de 2023, se reunieron el Doctor ANDRÉS MAURICIO MUÑOZ LEGUIZAMO, Secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario, MARILUZ VARGAS GONZALEZ, Representante Legal MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S, Contratista de Obra y ADRIAN RODRIGO CABEZAS PEÑA, Representante Legal CONSORCIO INTERVIAS MSM, Contratista de Interventoría, con el fin de suscribir la presente Acta de Suspensión No. 1 de la Orden de Servicios No. 30 de 2023, teniendo en cuenta:

1. Dentro de los ítems contractuales a desarrollar en la Orden de Servicios, se deben elaborar los estudios y diseños de las Obras propuestas en los puntos referenciados en la Orden de Servicio No. 30 de 2023, que deben ser entregados a la entidad contratante para su respectiva revisión y aprobación, estudios y diseños necesarios para establecer los trabajos de obras a ejecutar.

2. Que los estudios de suelos, hidrológicos, topografía del terreno y diseño estructural requiere de un mínimo estimado de tres (3) meses, incluyendo el posible imprevisto de ser requerido algún tipo de ajuste y subsanación a los trabajos de consultoría inicialmente presentados a la entidad.

3. Que el plazo de ejecución del contrato es de dos (2) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, con el objeto de REALIZAR OBRAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN POR PERDIDA DE CALZADA Y SOCAVACIÓN DE LA VIA 30HL01

Powered by CamScanner

PLATANILLAL-SAN ANTONIO-VEGALARGA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO A TRAVÉS DEL DECRETO 299 DE 2022, PRORROGADO A TRAVES DEL DECRETO 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022." contrato que tuvo inicio el día 26 de abril del 2023,

Basado en lo anterior, se consideró necesaria la suspensión de la Orden de Servicios, para de esta manera garantizar el cumplimiento del plazo contractual y satisfacer la necesidad que dio lugar a la contratación.

Por lo anteriormente mencionado, las partes consideran viable la Suspensión No.1, de la Orden de Servicio No. 30 de 2023. por un plazo de tres (3) meses o hasta que se subsanen las situaciones presentadas, en pro de solucionar los inconvenientes presentados y que una vez vencido el plazo de suspensión se pueda reiniciar el contrato y la etapa de construcción sin problema alguno.

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva (Huila), por quien en ella intervinieron, hoy 2 de junio de 2023.

CIUDAD:	Neiva	FECHA:	2/06/2023

ANDRÉS MAURICIO MUÑOZ LEGUIZAMO
Secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario

MARILUZ VARGAS GONZALEZ
Representante Legal
MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

ADRIAN RODRIGO CABEZAS PEÑA
Representante Legal
CONSORCIO INTERVIAS MSM
Contratista de Interventoría

Revisión documento:
Ing. NELSON ARIAS VILLARREAL
Profesional Universitario
Secretaria de Vías e Infraestructura
Supervisor Contrato de Interventoría

Proyecto: Angely Marcela Rojas Ramírez
Profesional Gestión del Riesgo

Powered by CamScanner

ACTA DE PRORROGA No1 DE LA SUSPENSIÓN No 1

_X_ CONTRATO DE :	ORDEN DE SERVICIOS	Nº:	30	AÑO:	2023
___ CONVENIO DE:					

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO.

CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S		
	NIT O CC:	901.241.893-2		
	DIRECCIÒN:	CLL 4 10-27	**TEL:**	3125212497
	CIUDAD:	NEIVA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	MARILUZ VARGAS GONZALES		
	CC:	26.593.081		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN POR PERDIDA DE CALZADA Y SOCAVACIÓN DE LA VIA 30HL01 PLATANILLAL-SAN ANTONIO-VEGALARGA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO A TRAVÉS DEL DECRETO 299 DE 2022			
VALOR DE CONTRATO:	**$318,160,544.oo**			
	Valor en Letras: TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE – AIU INCLUIDO			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO			
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**			
	Nº2			
	Nº3			
FECHA DE INICIO:	31/05/2023			
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	02/06/2023	
		REINICIACIÓN	DD__MM__AÑO___	
	Nº2	**SUSPENSIÓN**	DD__MM__AÑO___	

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre			
Cargo			

Powered by CamScanner

		REINICIACIÓN	DD MM AÑO
	Nº3	SUSPENSIÓN	DD MM AÑO
		REINICIACIÓN	DD MM AÑO
	Nº4	SUSPENSIÓN	DD MM AÑO
		REINICIACIÓN	DD MM AÑO
FECHA DE ACTA (SUSPENSIÓN, REINICIACIÓN O JUSTIFICACIÓN):	02/06/2023		

PRESENTES HOY:	NOMBRE:	ANDRÉS MAURICIO MUÑOZ LEGUIZAMO
	EN CALIDAD DE:	Secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario
	NOMBRE:	MARILUZ VARGAS GONZALES
	EN CALIDAD DE:	R/L. MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S - Contratista de Obra
	NOMBRE:	ADRIAN RODRIGO CABEZAS PEÑA
	EN CALIDAD DE:	R/L. CONSORCIO INTERVIAS MSM – Contratista de Interventoría

En la ciudad de Neiva, en el despacho de la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario del Departamento del Huila, siendo las 2 PM de hoy 31 de agosto de 2023, se reunieron el Doctor ANDRÉS MAURICIO MUÑOZ LEGUIZAMO, Secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario, MARILUZ VARGAS GONZALES, Representante Legal MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S, Contratista de Obra y ADRIAN RODRIGO CABEZAS PEÑA, Representante Legal CONSORCIO INTERVIAS MSM, Contratista de Interventoría, con el fin de suscribir la presente Acta de Prorroga No1 de la Suspensión No1, de la Orden de Servicios No. 30 de 2023, teniendo en cuenta:

1. Dentro de los ítems contractuales a desarrollar en la Orden de Servicios, se debe realizar la elaboración, revisión y/o ajuste de los estudios y diseños de las Obras propuestas en los puntos referenciados en la Orden de Servicio No. 30 de 2023, que deben ser entregados a la entidad contratante para su respectiva revisión y aprobación, estudios y diseños necesarios para establecer los trabajos de obras a ejecutar.
2. En la suspensión No 1 se estableció para la elaboración, revisión y/o ajuste de los estudios de suelos, hidrológico, topografía del terreno y diseño estructural requieren de un mínimo estimado de tres meses, lo cual hasta la presente no se ha cumplido, por lo tanto, se requiere de una prórroga de la suspensión de once días para realizar los ajustes y/o subsanaciones de los estudios y diseños de los trabajos de consultoría inicialmente presentados a la entidad.
3. Que el plazo de ejecución del contrato es de dos (2) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, con el objeto de REALIZAR OBRAS DE CONTENCIÓN

Powered by CamScanner

Y MITIGACIÓN POR PERDIDA DE CALZADA Y SOCAVACIÓN DE LA VIA 30HL01 PLATANILLAL-SAN ANTONIO-VEGALARGA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO A TRAVÉS DEL DECRETO 299 DE 2022, PRORROGADO A TRAVES DEL DECRETO 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022." contrato que tuvo inicio el día 26 de abril del 2023,

Basado en lo anterior, fue necesaria la suspensión de la Orden de Servicios, para de esta manera garantizar el cumplimiento del plazo contractual y satisfacer la necesidad que dio lugar a la contratación.

Por lo anteriormente mencionado, las partes consideran viable Prorroga No.1 de la Suspensión No.1, de la Orden de Servicio No. 30 de 2023. por un plazo de once (11) días más o hasta que se subsanen las situaciones presentadas, en pro de solucionar los inconvenientes presentados y que una vez vencido el plazo de suspensión se pueda reiniciar el contrato y la etapa de construcción sin problema alguno.

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva (Huila), por quien en ella intervinieron, hoy 31 de agosto de 2023.

CIUDAD:	Neiva	FECHA:	31/08/2023

ANDRÉS MAURICIO MUÑOZ LEGUIZAMO
Secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario

MARILUZ VARGAS GONZALEZ
Representante Legal
MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

ADRIAN RODRIGO CABEZAS PEÑA
Representante Legal
CONSORCIO INTERVIAS MSM
Contratista de Interventoría

Revisión documento:
Ing. NELSON ARIAS VILLARREAL
Profesional Universitario
Secretaria de Vías e Infraestructura
Supervisor Contrato de Interventoría

Proyecto: Angely Marcela Rojas Ramírez
Profesional Gestión del Riesgo

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-P-1110-F06
Fecha Aprobación: 04 de Octubre de 2021	ACTA DE SUSPENSIÓN, REINICIACIÓN O JUSTIFICACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	Versión: 2
		Página 1 de 3

ACTA DE REINICIO No 1

_X_ CONTRATO DE :	ORDEN DE SERVICIOS	Nº:	30	AÑO:	2023
___ CONVENIO DE:					

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO.

CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S		
	NIT O CC:	901.241.893-2		
	DIRECCIÒN:	CLL 4 10-27	**TEL:**	3125212497
	CIUDAD:	NEIVA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	MARILUZ VARGAS GONZALES		
	CC:	26.593.081 DE TERUEL – HUILA		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN POR PERDIDA DE CALZADA Y SOCAVACIÓN DE LA VIA 30HL01 PLATANILLAL-SAN ANTONIO-VEGALARGA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO A TRAVÉS DEL DECRETO 299 DE 2022			
VALOR DE CONTRATO:	**$318,160,544.oo**			
	Valor en Letras: TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE – AIU INCLUIDO			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO			

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre			
Cargo			

Powered by CamScanner

PLAZO ADICIONAL:	Nº1		
	Nº2		
	Nº3		
FECHA DE INICIO:	31/05/2023		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	Nº1	SUSPENSIÓN	02/06/2023
		REINICIACIÓN	11/09/2023
	Nº2	SUSPENSIÓN	DD MM AÑO
		REINICIACIÓN	DD MM AÑO
	Nº3	SUSPENSIÓN	DD MM AÑO
		REINICIACIÓN	DD MM AÑO
	Nº4	SUSPENSIÓN	DD MM AÑO
		REINICIACIÓN	DD MM AÑO
FECHA DE ACTA (SUSPENSIÓN, REINICIACIÓN O JUSTIFICACIÓN) :	11/09/2023		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:		ANDRÉS MAURICIO MUÑOZ LEGUIZAMO
	EN CALIDAD DE:		Secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario
	NOMBRE:		MARILUZ VARGAS GONZALES
	EN CALIDAD DE:		R/L. MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S -Contratista de Obra
	NOMBRE:		ADRIAN RODRIGO CABEZAS PEÑA
	EN CALIDAD DE:		R/L. CONSORCIO INTERVIAS MSM -Contratista de Interventoría

En la ciudad de Neiva, en el despacho de la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario del Departamento del Huila, siendo las 2 PM de hoy 11 de septiembre de 2023, se reunieron el Doctor ANDRÉS MAURICIO MUÑOZ LEGUIZAMO, Secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario, MARILUZ VARGAS GONZALES, Representante Legal MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S, -Contratista de Obra- y ADRIAN RODRIGO CABEZAS PEÑA, Representante Legal CONSORCIO INTERVIAS MSM, -Contratista de Interventoría-, con el fin de suscribir la presente Acta de Reinicio No. 1, teniendo en cuenta que se superaron los hechos generadores de la suspensión y de la Prorroga de la Suspensión. Por lo anterior mencionado, el Secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario del Departamento del Huila, el Contratista de Interventoría y el contratista de

Powered by CamScanner

Obra consideran viable la Reiniciación de la Orden de Servicios No. 30 de 2023.

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva (Huila), por quien en ella intervinieron, hoy 11 de septiembre de 2023.

CIUDAD:	Neiva	FECHA:	11/09/2023

ANDRÉS MAURICIO MUÑOZ LEGUIZAMO
Secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario

MARILUZ VARGAS GONZALES
Representante Legal
MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

ADRIAN RODRIGO CABEZAS PEÑA
Representante Legal
CONSORCIO INTERVIAS MSM
Contratista de Interventoría

Revisión documento:
Ing. NELSON ARIAS VILLARREAL
Profesional Universitario
Secretaria de Vías e Infraestructura

Proyecto: Angely Marcela Rojas Ramírez
Profesional Gestión del Riesgo

Powered by CamScanner

OTROSI MODIFICATORIO No. 1 A LA ORDEN DE SERVICIOS No. 030 de 2023 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR OBRAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN POR PERDIDA DE CALZADA Y SOCAVACIÓN DE LA VIA 30HL01 PLATANILLAL-SAN ANTONIO-VEGALARGA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO A TRAVÉS DEL DECRETO 299 DE 2022"

APROBADO CON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NUEVOS

CONTRATO	**ORDEN DE SERVICIOS No. 30 de 2023**
CONTRATISTA **NIT** **REPRESENTANTE LEGAL** **CEDULA** **DOMICILIO** **TELÉFONO** **E-MAIL**	MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S 901.241.893-2 MARILUZ VARGAS GONZALEZ 26.593.081 de Teruel Huila Carrera 4 No. 4-41 6088643475 marva.obrasemergencia@gmail.com
FECHA DE INICIO	31/05/2023
VALOR INICIAL	**($318,160,544.oo)** TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE – AIU INCLUIDO
VALOR ADICIONAL	**N.A.**
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES CALENDARIO SEGÚN ACTA DE INICIO.
PLAZO ADICIONAL	**N.A..**

Entre los suscritos a saber **ANDRES MAURICIO MUÑOZ LEGUIZAMO**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 80.082.983 expedida en Bogotá D.C., en su calidad de Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario de conformidad con el Decreto Departamental No. 282 de 2022 y Acta de Posesión No. 209 del 26 de agosto de 2022, y en ejercicio de la facultad de administrador y ordenador del gasto de los recursos del Fondo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres del Huila, delegada por el Gobernador mediante el Decreto Departamental No. 259 de 2022, actuando en nombre y representación del Departamento del Huila, entidad identificada con NIT. 800.103.913-4, en adelante denominado **EL DEPARTAMENTO**, por una parte; y por la otra, **MARILUZ VARGAS GONZALEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 26.593.081, representante legal de **MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S** , quien para efectos del presente Otrosí se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente Otrosí No.01 a la **ORDEN DE SERVICIOS No. 030 de 2023**; previas las siguientes consideraciones:

1) Que, Mediante Decreto No. 059 del 09 de marzo de 2022 el señor Gobernador del Departamento, declaró la situación de calamidad pública en jurisdicción del Departamento del Huila, por el término de seis (6) meses contados a partir de su fecha de expedición, en razón a las emergencias que se presentan con ocasión a la temporada atípica de lluvias, y a la variabilidad climática que afectan la integridad del territorio, los bienes jurídicos protegidos de la comunidad, las instituciones y el orden público.

2) Que, mediante el Decreto Departamental 299 del 07 de septiembre de 2022 se prorroga por el término de seis (6) meses el Decreto Departamental 059 del 09 de marzo de 2022.

Powered by CamScanner

3) Que, Conforme a lo señalado en el Artículo 61 de la Ley 1523 de 2012, el Departamento del Huila elaboró el Plan de Acción Específico para la atención de eventos adversos, a causa de la emergencia presentada y que conllevó a la declaratoria de calamidad pública

4) Que, en desarrollo del Plan de Acción Específico, el día 8 de marzo de 2023, el **DEPARTAMENTO DEL HUILA suscribió la Orden de Servicios No. 30 de 2023 cuyo objeto es REALIZAR OBRAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN POR PERDIDA DE CALZADA Y SOCAVACIÓN DE LA VIA 30HL01 PLATANILLAL-SAN ANTONIO-VEGALARGA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO A TRAVÉS DEL DECRETO 299 DE 2022,** por un valor de TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE – AIU INCLUIDO

5) Que el plazo de ejecución de la Orden de Servicios No. 30 de 2023 se estableció en Dos (02) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, suscrita el 31 de Mayo de 2023.

6) Que la interventoría de obra mediante oficio de fecha 6 de Octubre del año en curso remitido a la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario de La Gobernación del Huila, procedió formalmente a elevar solicitud de aprobación de las modificaciones surgidas dentro del desarrollo del objeto contractual de la Orden de Servicios No. 30 de 2023 en los términos que se transcriben textualmente:

"(....)

ASUNTO: SOLICITUD APROBACION DE MODIFICACIONES, BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y CREACION DE ITEM´S NO PREVISTOS EN LA ORDEN DE SERVICIOS No. 30 de 2023.

(....)

1. *En el presupuesto oficial definido en la Orden de Servicios No.39 de 2023, se necesitó tener en cuenta los siguientes item's no previstos para los diferentes puntos de ejecución:*

- *DEMOLICION EN ROCA se requirió crear este ítem teniendo en cuenta, que en los estudios de suelos se encontró un terreno rocoso.*
- *DEMOLICION EN CONCRETO se necesitó tener teniendo en cuenta, que para la construcción de la alcantarilla que se planeta, se debe retirar el concreto de la alcantarilla existente.*
- *LIMPIEZA EN SUPERFICIE ALTA CON CONCRETO ARMADO se requirió crear este ítem teniendo en cuenta, que en los estudios, se evidencio el deterioro del puente colindante con el muro de contención proyectado*
- *REVESTIMIENTO PROTECTOR DEL CONCRETO ARMADO FRENTE A LA CORROSIÓN. se requirió crear este ítem teniendo en cuenta, que en los estudios, se evidencio el deterioro del puente colindante con el muro de contención proyectado.*
- *REPARACIÓN DE LA PLACA DEL PUENTE (MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXIC). se necesitó tener en cuenta, que en los estudios y visita*

Powered by CamScanner

en campo se evidencio un vacío en la placa del puente que debe ser intervenido para no generar más daño a la estructura actual

- *CONCRETO CLASE (280 KG/CM2 Ó 4000 PSI) se necesitó tener en cuenta, que en los diseños se especifica un concreto de mayor resistencia por su cercanía a aguas.*
- *CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE. se requirió crear este ítem teniendo en cuenta, que en los diseños se especifica y recomienda la instalación de un pavimento rígido , por ende se debe mejorar las condiciones de base, que mejorara las condiciones de acceso para la comunidad*
- *PAVIMENTO RÍGIDO MR-40, , JUNTAS DE DILATACIÓN SELLADAS, TEXTURIZADO, PASADORES TRANSVERSALES EN HIERRO LISO, ESPACIADOS CADA 0,30 M Y LONGITUDINALES EN HIERRO CORRUGADO DE 1/2" DE DIÁMETRO, LONGITUD 0,85, CURADO CON ANTISOL. se requirió crear este ítem teniendo en cuenta, que en los diseños se especifica y recomienda la instalación de un pavimento rígido, por ende se debe mejorar las condiciones de base, que mejorara las condiciones de acceso para la comunidad.*
- *SUMINISTRO, INSTALACIÓN, EXTENDIDA, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO O AIREACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB BASE GRANULAR.. se requirió crear este ítem teniendo en cuenta, que en los diseños se especifica y recomienda la instalación de un pavimento rígido, por ende se debe mejorar las condiciones de base, que mejorara las condiciones de acceso para la comunidad.*
- *SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO (MEDIDAS 1,0X0,45X0,17M), INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. se requirió crear este ítem teniendo en cuenta, que se plantea la realización de un pavimento y en él se debe da unas condiciones óptimas mínimas, para la conducción de aguas lluvias e indicación de la vía.*

Que, en atención a las modificaciones propuestas, se ha elaborado para estudio y aprobación, ACTA DE: MODIFICACION Y BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y CREACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS N.P. A LA ORDEN DE SERVICIOS No. 30 de 2023, la cual se adjunta al presente documento formando parte integral del mismo y que da como resultado un valor del contrato de TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE – AIU INCLUIDO *($318.160.544).*

Es preciso recalcar que las obras se encuentran enmarcadas dentro del objeto contractual definido en la Orden de Servicios No. 30 de 2023, además que las modificaciones propuestas no requieren adición alguna de recursos, cumpliéndose así con la meta física propuesta y que las actividades inherentes a la citada orden de servicios, se han desarrollado y se desarrollaran en cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones contractuales de carácter técnico, administrativo, jurídico y ambiental, en atención a las directrices impartidas por la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario - Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del departamento del Huila, a las impartidas por la supervisión a cargo del Ingeniera Diana Milena Tovar Palomo - Profesional Universitario de la Secretaria General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - y atendiendo las sugerencias de la comunidad beneficiada con esta intervención.

Powered by CamScanner

Por todo lo anteriormente expuesto, no sobra reiterar que teniendo en cuenta el principio de responsabilidad de que trata el artículo 26 de la ley 80 de 1993, que obliga a los servidores públicos a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto del contrato y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato y, al encontrar justificado la parte motiva esbozada en este documento, esta interventoría considera la procedencia de que la entidad contratante apruebe el ACTA DE MODIFICACION Y BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y CREACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS N.P., que permita elevar a otrosí los citados cambios y poder así perfeccionar las modificaciones surgidas en el desarrollo de la Orden de Servicios No.30 de 2023, de tal forma que jurídica y técnicamente permita dar continuidad a las obras y por ende alcanzar la meta física enmarcada dentro del objeto contractual de la Orden de Servicio No.30-2023….(…)"

7) Que el día 16 de Octubre de 2023 se suscribe ACTA DE JUSTIFICACION PARA LA APROBACION DE MODIFICACIONES, BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y CREACION DE ITEM´S NO PREVISTOS No. 30/2023.

8) Que por medio de Otrosí Modificatorio se perfecciona el ACTA DE JUSTIFICACION PARA LA APROBACION DE MODIFICACIONES, BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y CREACION DE ITEM´S NO PREVISTOS No. 30/2023.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se hace necesario suscribir el presente Otrosí Modificatorio, el cual se rige por las siguientes Clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: Modificar la Clausula Novena de la orden de servicio No. 30 de 2023, la cual quedará así: **CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS.** Se adicionan nuevos ítem o actividades no previstas, las cuales no se encontraban contractualmente, tiene el siguiente detalle:

Powered by CamScanner

ACTA DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

CONTRATO DE:	ORDEN DE SERVICIO		Nº	30	AÑO: 2023	2023	VALOR CONTRATO		$ 318.100.544,00		
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA		ACTA Nº:	BALANCE INICIAL			PLAZO	PLAZO ADICIONAL	ADICIONAL No 1	0,00	
CONTRATISTA:	MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S		FECHA DE ACTA		6/10/2023				ADICIONAL No 2	0,00	
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS M.S.M						DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	N/A	V.R. TOTAL	$ 318.100.544,00	
INICIACIÓN	Nº	SUSPENSIÓN	RENICIO	OBJETO	"OBRAS DE CONTENCION Y MITIGACION POR PERDIDA DE CALZADA Y SOCAVACION DE LA VIA 3001 01 PLATANILAL - SAN ANTONIO VI CAUCA"						
31/may/2023	Nº 1	02/jun/2023	11/sep/2023								
	Nº 2	N/A	N/A								
	Nº 3	N/A	N/A								

								Mayores y menores cantidades			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
CONDICIONES ORIGINALES												
ITEM	CLASIFICACION GRAL PART	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		+/-	?	VRTOTAL	CANT.	VRTOTAL
MUROS DE CONTENCION												
600 1.1		Excavaciones varias sin clasificar	m3	184,50	$ 38.072,00	$ 7.024.284,00			-142,50	-$ 5.425.155,00	42,00	$ 1.599.129,00
630,70		Concreto Resistencia 14 MPa (G) (Ciclópeo)	m3	36,00	$ 537.400,00	$ 19.346.662,00			-32,00	-$ 17.199.699,00	4,00	$ 2.146.962,00
630.6		Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	m3	2,70	$ 685.719,00	$ 1.851.441,00			1,65	$ 1.131.430,00	4,35	$ 2.982.870,00
630.4		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	m3	85,95	$ 836.687,00	$ 71.913.248,00			-85,95	-$ 71.913.248,00	0,00	$ -
640.1		Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	Kg	13.430,85	$ 10.228,00	$ 137.370.734,00			-9499,12	-$ 97.150.999,00	3931,73	$ 40.213.734,00
610.2		Relleno para Estructuras con recebo	m3	184,50	$ 126.964,00	$ 23.424.858,00			-1,99	-$ 251.389,00	182,52	$ 23.173.469,00
		SUB TOTAL				$ 260.834.227,00				$ 190.815.054,00		$ 70.119.172,00
DISIPADOR DE ENERGÍA												
600 1.1		Excavaciones varias sin clasificar	m3	19,44	$ 38.072,00	$ 740.120,00			-13,97	-$ 531.866,00	5,47	$ 208.254,00
630.6		Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	m3	1,58	$ 685.719,00	$ 1.083.436,00			0,42	$ 288.002,00	2,00	$ 1.371.438,00
630.4		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	m3	6,20	$ 836.687,00	$ 5.187.459,00			-2,45	-$ 2.049.883,00	3,75	$ 3.137.576,00
640.1		Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	Kg	436,90	$ 10.228,00	$ 4.468.613,00			-32,74	-$ 334.865,00	404,16	$ 4.133.748,00
610.2		Relleno para Estructuras con recebo	m3	2,72	$ 126.964,00	$ 345.342,00			-0,32	-$ 40.628,00	2,40	$ 304.714,00
		SUB TOTAL				$ 11.824.970,00				-$ 2.669.240,00		$ 9.155.730,00

DISIPADOR DE ENERGÍA L = 20 m												
600 1.1		Excavaciones varias sin clasificar	m3	19,44	$ 38.072,00	$ 740.120,00		-13,97	-$ 531.866,00	5,47	$ 208.254,00
630.6		Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	m3	1,58	$ 685.719,00	$ 1.083.436,00		0,42	$ 288.002,00	2,00	$ 1.371.438,00
630.4		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	m3	6,20	$ 836.687,00	$ 5.187.459,00		-2,45	-$ 2.049.883,00	3,75	$ 3.137.576,00
640.1		Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	Kg	436,90	$ 10.228,00	$ 4.468.613,00		-32,74	-$ 334.865,00	404,16	$ 4.133.748,00
610.2		Relleno para Estructuras con recebo	m3	2,72	$ 126.964,00	$ 345.342,00		-0,32	-$ 40.628,00	2,40	$ 304.714,00
		SUB TOTAL				$ 11.824.970,00			-$ 2.669.240,00		$ 9.155.730,00

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS												
600 1.1		Excavaciones varias sin clasificar	m3	9,00	$ 38.072,00	$ 342.648,00		0,00	$ -	9,00	$ 342.648,00
405		Tubería en Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	m3	6,00	$ 709.582,00	$ 4.257.492,00		0,00	$ -	6,00	$ 4.257.492,00
630.6		Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	m3	0,80	$ 685.719,00	$ 548.575,00		0,56	$ 384.003,00	1,36	$ 932.578,00
630.4		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	m3	8,56	$ 836.687,00	$ 7.162.041,00		1,77	$ 1.480.936,00	10,33	$ 8.642.977,00
640.1		Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	Kg	390,87	$ 10.228,00	$ 3.997.818,00		13,56	$ 138.692,00	404,43	$ 4.136.510,00
610.2		Relleno para Estructuras con recebo	m3	3,35	$ 126.964,00	$ 425.329,00		-0,33	-$ 41.898,00	3,02	$ 383.431,00
		SUB TOTAL				$ 16.733.903,00			$ 1.961.733,00		$ 18.695.636,00
SECCIÓN 3 - ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA												
30		Revisión y/o ajuste a estudios y diseños base	Glb	1,00	$ 24.090.289,00	$ 24.090.289,00		0,00	$ -	1,00	$ 24.090.289,00
		SUB TOTAL				$ 24.090.289,00			$ -		$ 24.090.289,00

Powered by CamScanner

ITEM	NO PREVISTOS													
NP1			Demolición en roca	m3		$ 181.686,00			202,50	$ 36.791.415,00	202,50	$ 36.791.415,00		
NP2			Demolición en concreto	m3		$ 194.657,00			21,00	$ 4.087.797,00	21,00	$ 4.087.797,00		
NP3			Limpieza en superficie alta con concreto armado	M2		$ 69.460,00			97,28	$ 6.757.069,00	97,28	$ 6.757.069,00		
NP4			Revestimiento protector del concreto armado frente a la corrosión	M2		$ 377.676,00			97,16	$ 36.695.000,00	97,16	$ 36.695.000,00		
NP5			Reparación de la placa del puente (mortero de reparación estructural de concreto, a base de resina epoxic)	m2		$ 535.808,00			1,00	$ 535.808,00	1,00	$ 535.808,00		
NP6			Concreto clase (280 kg/cm2 ó 4000 PSI)	m3		$ 939.377,00			44,36	$ 41.670.764,00	44,36	$ 41.670.764,00		
NP7			Conformación de la calzada existente	m2		$ 2.991,00			324,00	$ 969.084,00	324,00	$ 969.084,00		
NP8			Pavimento rígido MR-40, , juntas de dilatación selladas texturizado, pasadores transversales en Nerro liso espaciados cada 0,30 m y longitudinales en Nerro corrugado de 1/2" de diámetro, longitud 0,65, curado con antisol	m3		$ 860.414,00			53,46	$ 45.997.732,00	53,46	$ 45.997.732,00		
NP9			Suministro, instalación, extendida, nivelación, humedecimiento o aireación y compactación de sub base granular	m3		$ 187.019,00			64,80	$ 12.118.831,00	64,80	$ 12.118.831,00		
NP10			Suministro e instalación sardinel prefabricado en concreto (medidas 1,0x0,45x0,17m) incluye la preparación de la superficie de apoyo	ml		$ 75.629,00			78,00	$ 5.899.062,00	78,00	$ 5.899.062,00		
SUB TOTAL						$ -				$ 191.522.562,00		$ 191.522.562,00		
VALOR TOTAL						$ 289.493.100,00			$ -		$	289.493.100,00		
VALOR BÁSICO ACTIVIDADES DE CONSULTORIA						$ 24.090.289,00			$ -			$ 24.090.289,00		
VALOR IVA ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA (19%)				19%		$ 4.577.155,00			$ -			$ 4.577.155,00		
VALOR OBRA						$ 318.160.544,00			-$ 0,00			$ 318.160.544,00		
VALOR TOTAL INCLUYE A.I.U						$ 318.160.544,00			-$ 0,00		$	318.160.544,00		

CLAUSULA SEGUNDA: Hace parte integral del presente OTRO SI No. 01 el ACTA DE JUSTIFICACION No. 30/2023 del contrato **ORDEN DE SERVICIO No. 30 DE 2023** de fecha de 16 dieciséis de Octubre de 2023.

CLAUSULA TERCERA: Para el perfeccionamiento y legalización el presente OTRO SI No. 01, se requiere de las firmas de las partes.

CLAUSULA CUARTA: las demás clausulas o estipulaciones que no hayan sido modificadas o adicionadas por el presente Otro sí No. 01, quedan incólumes, por lo cual se conservan en su integridad.

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva Huila, el Diecisiete (17) de Octubre de 2023.

POR EL DEPARTAMENTO:

ANDRES MAURICIO MUÑOZ LEGUIZAMO
Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario

CONTRATISTA:

MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S.
R.L. MARILUZ VARGAS GONZALEZ
CONTRATISTA DE OBRA

Angely Marcela Rojas Ramirez
Apoyo Juridico

Powered by CamScanner

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2

X CONTRATO DE :	ORDEN DE SERVICIOS	Nº:	30	AÑO:	2023
___ CONVENIO DE:					

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO.

CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S		
	NIT O CC:	901.241.893-2		
	DIRECCIÒN:	CLL 4 10-27	TEL:	3125212497
	CIUDAD:	NEIVA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	MARILUZ VARGAS GONZALEZ		
	CC:	26.593.081		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN POR PERDIDA DE CALZADA Y SOCAVACIÓN DE LA VIA 30HL01 PLATANILLAL-SAN ANTONIO-VEGALARGA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO A TRAVÉS DEL DECRETO 299 DE 2022			
VALOR DE CONTRATO:	**$318,160,544.oo**			
	Valor en Letras: TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE – AIU INCLUIDO			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO			
PLAZO ADICIONAL:	Nº1			
	Nº2			
	Nº3			
FECHA DE INICIO:	31/05/2023			
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	Nº1	SUSPENSIÓN	2/06/2023	
		PRORROGA SUSPENSION	31/08/2023	
		REINICIACIÓN	11/09/2023	
	Nº2	SUSPENSIÓN	18/10/2023	
		REINICIACIÓN	DD MM AÑO	
	Nº3	SUSPENSIÓN	DD MM AÑO	
		REINICIACIÓN	DD MM AÑO	

Powered by CamScanner

FECHA DE ACTA(SUSPENSIÒN, REINICIACION O JUSTIFICACION)	18/10/2023	
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	ANDRÉS MAURICIO MUÑOZ LEGUIZAMO
	EN CALIDAD DE:	Secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	MARILUZ VARGAS GONZALEZ
	EN CALIDAD DE:	R/L. MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S - Contratista de Obra
	NOMBRE:	ADRIAN RODRIGO CABEZAS PEÑA
	EN CALIDAD DE:	R/L. CONSORCIO INTERVIAS MSM – Contratista de Interventoría

En la ciudad de Neiva, en el despacho de la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario del Departamento del Huila, siendo las 10: a.m. de hoy 18 de Octubre de 2023, se reunieron el Doctor ANDRÉS MAURICIO MUÑOZ LEGUIZAMO, Secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario, MARILUZ VARGAS GONZALEZ, Representante Legal MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S, Contratista de Obra y ADRIAN RODRIGO CABEZAS PEÑA, Representante Legal CONSORCIO INTERVIAS MSM, Contratista de Interventoría, con el fin de suscribir la presente Acta de Suspensión No. 2 de la Orden de Servicios No. 30 de 2023, teniendo en cuenta:

1. Que la ejecución de las actividades de obra se han visto entorpecidas por los hostigamientos de grupos subversivos, generando incertidumbre en los trabajadores al sentirse inseguros, atemorizados y perseguidos. Además de examinar que en las diferentes regiones del departamento, también se vienen presentando la alteración del orden público. Por lo cual no se cuenta con garantías para poder continuar con la ejecución de las actividades de obra establecidas en la orden de servicio 030 de 2023.

Powered by CamScanner

ACUERDAN:

1. Suspender los trabajos correspondientes al objeto del contrato en mención hasta nueva orden.

2. El Contratista renuncia a reclamar al DEPARTAMENTO DEL HUILA el reconocimiento de cualquier sobrecosto o gasto adicional generado, única y exclusivamente, con ocasión o durante esta suspensión del contrato.

3. El Contratista se compromete a prorrogar la garantía de cumplimiento del contrato por un término igual al de la suspensión y en todo caso a mantener vigentes las garantías durante el plazo de ejecución y la liquidación del contrato.

En consecuencia, se procede a suspender la ejecución del contrato, a partir de 18 de Octubre de 2023.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la ciudad de Neiva (Huila), por quienes en ella intervinieron, hoy 18 de Octubre de 2023.

CIUDAD:	Neiva	FECHA:	18/10/2023

ANDRÉS MAURICIO MUÑOZ LEGUIZAMO
Secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario

MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S.
R.L. MARILUZ VARGAS GONZALEZ
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERVIAS MSM
R.L. ADRIAN RODRIGO CABEZAS PEÑA
INTERVENTORÍA

Revisó:
Angel Harvey Cabrera Leal
Apoyo Técnico

Revisó:
Angely Marcela Rojas Ramírez
Apoyo Jurídico

Powered by CamScanner

ACTA DE REINICIO No 2

_X_ CONTRATO DE : ___ CONVENIO DE:	ORDEN DE SERVICIOS	Nº:	30	AÑO:	2023

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO.

CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S		
	NIT O CC:	901.241.893-2		
	DIRECCIÒN:	CLL 4 10-27	TEL:	3125212497
	CIUDAD:	NEIVA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	MARILUZ VARGAS GONZALES		
	CC:	26.593.081 DE TERUEL – HUILA		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN POR PERDIDA DE CALZADA Y SOCAVACIÓN DE LA VIA 30HL01 PLATANILLAL-SAN ANTONIO-VEGALARGA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO A TRAVÉS DEL DECRETO 299 DE 2022			
VALOR DE CONTRATO:	**$318,160,544.oo**			
	Valor en Letras: TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE – AIU INCLUIDO			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO			
PLAZO ADICIONAL:	Nº1			
	Nº2			
	Nº3			

Powered by CamScanner

FECHA DE INICIO:	31/05/2023		
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	Nº1	SUSPENSIÓN	2/06/2023
		PRORROGA SUSPENSION	31/08/2023
		REINICIACIÓN	11/09/2023
	Nº2	SUSPENSIÓN	18/10/2023
		REINICIACIÓN	11/12/2023
	Nº3	SUSPENSIÓN	DD__MM__AÑO__
		REINICIACIÓN	DD__MM__AÑO__
	Nº4	SUSPENSIÓN	DD__MM__AÑO__
		REINICIACIÓN	DD__MM__AÑO__
FECHA DE ACTA (SUSPENSIÓN, REINICIACIÓN O JUSTIFICACIÓN) :	11/12/2023		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:		ANDRÉS MAURICIO MUÑOZ LEGUIZAMO
	EN CALIDAD DE:		Secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario
	NOMBRE:		MARILUZ VARGAS GONZALES
	EN CALIDAD DE:		R/L. MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S -Contratista de Obra
	NOMBRE:		ADRIAN RODRIGO CABEZAS PEÑA
	EN CALIDAD DE:		R/L. CONSORCIO INTERVIAS MSM -Contratista de Interventoría

En la ciudad de Neiva, en el despacho de la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario del Departamento del Huila, siendo las 2 PM de hoy 11 de Diciembre de 2023, se reunieron el Doctor ANDRÉS MAURICIO MUÑOZ LEGUIZAMO, Secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario, MARILUZ VARGAS GONZALES, Representante Legal MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S, -Contratista de Obra- y ADRIAN RODRIGO CABEZAS PEÑA, Representante Legal CONSORCIO INTERVIAS MSM, -Contratista de Interventoría-, con el fin de suscribir la presente Acta de Reinicio No. 2, teniendo en cuenta que se superaron los hechos generadores de la suspensión 2.

Powered by CamScanner

Por lo anterior mencionado, el Secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario del Departamento del Huila, el Contratista de Interventoría y el contratista de Obra consideran viable la Reiniciación de la Orden de Servicios No. 30 de 2023.

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva (Huila), por quien en ella intervinieron. hoy 11 de Diciembre de 2023.

CIUDAD:	Neiva	FECHA:	11/12/2023

ANDRÉS MAURICIO MUÑOZ LEGUIZAMO
Secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario

MARILUZ VARGAS GONZALES
Representante Legal
MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

ADRIAN RODRIGO CABEZAS PEÑA
Representante Legal
CONSORCIO INTERVIAS MSM
Contratista de Interventoría

Revisó:
Angel Harvey Cabrera Leal
Apoyo Tecnico

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES SAS

POLIZAS DEL CONTRATO

Dirección: Calle 4 No. 10 -27, Neiva- Huila
Correo: marva.obrasemergencia@gmail.com
Tel. 312 521 24 97

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.04.24 18:34:02 -05:00

Código de Seguridad: XS1SPYpu1qLxdut0+KV5MQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 11N 6B - 28 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1517-P-85-PPSU0100000000059-D001

No. PÓLIZA	NV-100088887	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	34285294	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/04/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA NEIVA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	25/03/2023	24:00 Horas Del	25/05/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	MONTENEGRO SALAZAR, ANIBAL	No. DOC. IDENTIDAD	4.912.473
DIRECCIÓN	CR 8B 11 32	TELÉFONO	3197799380
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.913-4
DIRECCIÓN	CR 4 CL 8 PISO 2	TELÉFONO	8713281
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.913-4
DIRECCIÓN	CR 4 CL 8 PISO 2	TELÉFONO	8713281

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE SERVICIOS FOGRO NO. 30 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

REALIZAR OBRAS DE CONTENCION Y MITIGACION POR PERDIDA DE CALZADA Y SOCAVACION DE LA VIA 30HL01 PLANTANILLAL - SAN ANTONIO-VEGALARGA,DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL NO 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022,PRORROGADO A TRAVES DEL DECRETO 299 DE 2022.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 05 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 25/03/2023	24:00 Horas Del 25/11/2023	63.632.108,80	76.882,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 25/03/2023	24:00 Horas Del 25/05/2026	31.816.054,40	151.279,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 25/05/2023	24:00 Horas Del 25/05/2028	63.632.108,80	573.317,00
			TOTAL ASEGURADO $	159.080.272,00

Gobernación del Huila
Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario
APROBACIÓN POLIZA
Fecha: 21 May 2023
Aprobado

INTERMEDIARIOS			PARTICIPACIÓN
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS		100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO			PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	801.478,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	801.478,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	153.231,00
TOTAL A PAGAR	$	959.709,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 24/04/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCONTRARÁS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada -Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

Powered by CamScanner

seguros mundial

tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ

TELÉFONO: 2855600 FAX: 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSUS[illegible]-0082

No. POLIZA	[illegible]	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	562951394	No. RADICADO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/04/2023	SUC. EXPEDIDORA	[illegible]

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
[illegible]	25/05/2023	[illegible]	25/05/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL.

Cumplimos los sueños de nuestro planeta teniendo responsabilidad social.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de esta documento.

Powered by CamScanner

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2023.05.24 15:48:58 -05:00

Código de Seguridad: [illegible]

[illegible]

No. PÓLIZA	[illegible]	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	1420[illegible]	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/05/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA NEIVA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	25/05/2023	24:00 Horas Del	25/05/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	MONTENEGRO SALAZAR, ANIBAL	No. DOC. IDENTIDAD	C 922.473
DIRECCIÓN	CR 8E 33 32	TELÉFONO	3187730388
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. DOC. IDENTIDAD	800.505.953-4
DIRECCIÓN	CALLE 8 CRA 4 ESQUINA	TELÉFONO	8711000
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. DOC. IDENTIDAD	800 505 953-4
DIRECCIÓN	CALLE 8 CRA 4 ESQUINA	TELÉFONO	8711000

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE SE CONOCE LA CESIÓN DEL CONTRATO CON FECHA DEL 23 DE MAYO DEL 2023, SE MODIFICA EL TOMADOR DE LA PRESENTE PÓLIZA.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE SERVICIOS PORO NO. 10 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

REALIZAR OBRAS DE CONTENCION Y MITIGACION POR PERDIDA DE CALZADA Y SOCAVACION DE LA VIA SIMILAR PLANTANILLAL - SAN ANTONIO-VEGALARGA,DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL NO 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022,PRORROGADO A TRAVES DEL DECRETO 299 DE 2022.

*** NOTA ACLARATORIA ***

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 15/05/2023	24:00 Horas Del 25/05/2028	-68.032.368,00	$ 0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 15/05/2023	24:00 Horas Del 25/05/2028	-27.150.854,00	$ 0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 25/05/2023	24:00 Horas Del 25/05/2028	-68.032.368,00	$ 0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ -255.869.272,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 24/05/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A [illegible] DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCONTRARÁS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. También puedes llamar a la línea nacional 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS ARRIBA INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguros S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

36

34

seguros mundial

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855609 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

CANCELACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	NV-100088867	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	34288386	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/05/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA NEIVA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	25/03/2023	24:00 Horas Del	25/05/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 05 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

· tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA: RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza NV-100088887 y endoso, 1 cuyo afianzado es: **MONTENEGRO SALAZAR, ANIBAL** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO DEL HUILA / DEPARTAMENTO DEL HUILA** , expedida por la Compañía en **24/05/2023**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA NEIVA a los 24 días del mes MAYO del año 2023.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Powered by CamScanner

seguros mundial

RECIBO ELECTRONICO No. 123001288

NIT: 860.037.613-6 **CIUDAD Y FECHA:** NEIVA 23/05/2023 4:45:31 p.m.

VALOR TOTAL: $2.256.293,00

RECIBO DE: MONTENEGRO SALAZAR ANIBAL

NUMERO DE IDENTIFICACION: 4932473

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. Autorización	Entidad	Valor
P.S.E.	2023990057093	2095766765	BANCOLOMBIA	2.256.293,00

OBSERVACIONES: Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100088807-100087188 Certificado(s): 34285294-34281738; Ramo: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Póliza(s): 100016695-100016349 Certificado(s): 34285311-34281793

FIRMA AUTORIZADA

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 CORREO:

TES-08N-05/2019

HOJA No.

Powered by CamScanner

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.05.24 16:01:34 -05:00

Código de Seguridad: UC4XL1u0Zz4vpopGHhIqg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-04-PPSUS0000000027-0001

No. PÓLIZA	AV-100016696	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	34288388	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/05/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA NETVA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	25/03/2023	24:00 Horas Del	25/05/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	MONTENEGRO SALAZAR, ANIBAL	No. DOC. IDENTIDAD	4.932.473
DIRECCIÓN	CR 8B 11 12	TELÉFONO	3107799300
ASEGURADO	MONTENEGRO SALAZAR, ANIBAL	No. DOC. IDENTIDAD	4.932.473
DIRECCIÓN	CR 8B 11 12	TELÉFONO	3107799300
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE SE CONOCE LA CESIÓN DEL CONTRATO CON FECHA DEL 19 DE MAYO DEL 2023, SE MODIFICA EL TOMADOR DE LA PRESENTE PÓLIZA.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN ORDEN ED SERVICIOS FDGRD NO .30 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

REALIZAR OBRAS DE CONTENCION Y MITIGACION POR PERDIDA DE CALZADA Y SOCAVACION DE LA VIA 38HL01 PLANTANILLAL - SAN ANTONIO-VEGALARGA,DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL NO 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022,PRORROGADO A TRAVES DEL DECRETO 299 DE 2022

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DEL HUILA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	-116000000.00	-232000000.00	-232.000.000,00	0,00
PATRONAL	-69600000.00	-69600000.00	-69.600.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	-69600000.00	-69600000.00	-69.600.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	-69600000.00	-69600000.00	-69.600.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ -232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 24/05/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR0000000027-0001

No. POLIZA	NV-100816696	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	34288388	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/05/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA NEIVA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
08:00 Horas Del	25/03/2023	24:00 Horas Del	25/05/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA ANIBAL MONTENEGRO SALAZAR, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DEL HUILA

-BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DEL HUILA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO
Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.
APLICADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFF

Powered by CamScanner

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2023.05.24 16:00:34 -05:00

Código de Seguridad: h1PRqZk1DX+vIGXMGa4Abg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 No. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
RESOLUCIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2022-1217-F-05-PP[illegible]

No. PÓLIZA	NV-100088807	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	342288398	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/05/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA NEIVA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	25/03/2023	24:00 Horas Del	25/05/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	MARVA CONSTRUCCIONES SAS	No. DOC. IDENTIDAD	901.241.893-2
DIRECCIÓN	CL 9 3 58	TELÉFONO	3125223367
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.913-4
DIRECCIÓN	CALLE 8 CRA 4 ESQUINA	TELÉFONO	8713281
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.913-4
DIRECCIÓN	CALLE 8 CRA 4 ESQUINA	TELÉFONO	8713281

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE SE CONOCE LA CESIÓN DEL CONTRATO CON FECHA DEL 19 DE MAYO DEL 2023, SE MODIFICA EL TOMADOR DE LA PRESENTE PÓLIZA.

NUEVO TOMADOR: MARVA CONSTRUCCIONES SAS - NIT. 901.241.893-2
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE SERVICIOS FOGRD NO. 30 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

REALIZAR OBRAS DE CONTENCION Y MITIGACION POR PERDIDA DE CALZADA Y SOCAVACION DE LA VIA 38ML01 PLANTANILLAL - SAN ANTONIO-VEGALARGA,DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL NO 055 DEL 9 DE MARZO DE 2022,PRORROGADO A TRAVES DEL DECRETO 299 DE 2022.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 19/05/2023	24:00 Horas Del 25/11/2023	63.632.188,89	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 19/05/2023	24:00 Horas Del 25/05/2026	31.816.054,44	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 25/05/2023	24:00 Horas Del 25/05/2028	63.632.188,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$	159.080.272,00

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 24/05/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOSYSERVICIOS.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 13/13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

APROBADO A LAS FUERZAS CONSTITUCIONALES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

REHABILITACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2000000059-D00I

No. PÓLIZA	NV-100068867	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	34288390	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/05/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA NEIVA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	25/03/2023	24:00 Horas Del	25/05/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 05 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APF

seguros mundial

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE [illegible] BOGOTA
TELEFONO [illegible] WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

seguros mundial

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza NV-100000007 y endoso, 2 cuyo afianzado es: **MARVA CONSTRUCCIONES SAS** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO DEL HUILA / DEPARTAMENTO DEL HUILA ,** expedida por la Compañía en 24/05/2023, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA NEIVA a los 24 días del mes **MAYO** del año 2023.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Powered by CamScanner

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2023.05.24 16:02:30 -05:00

Código de Seguridad: Vdx5ACzxX/phT36oFQbbsA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSU[illegible]

No. PÓLIZA	MV-100056696	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	34288389	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/05/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA NEIVA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	25/05/2023	24:00 Horas Del	25/05/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	MARVA CONSTRUCCIONES SAS	No. DOC. IDENTIDAD	901.241.893-2
DIRECCIÓN	CL 9 3 58	TELÉFONO	3125223367
ASEGURADO	MONTENEGRO SALAZAR, ANIBAL	No. DOC. IDENTIDAD	4.932.473
DIRECCIÓN	CR 88 11 12	TELÉFONO	3187799308
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	-	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE SE CONOCE LA CESIÓN DEL CONTRATO CON FECHA DEL 19 DE MAYO DEL 2023, SE MODIFICA EL TOMADOR DE LA PRESENTE PÓLIZA.

NUEVO TOMADOR: MARVA CONSTRUCCIONES SAS - NIT. 901.241.893-2
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN ORDEN ED SERVICIOS FDGRD NO .30 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

REALIZAR OBRAS DE CONTENCION Y MITIGACION POR PERDIDA DE CALZADA Y SOCAVACION DE LA VIA 38HL01 PLANTANILLAL - SAN ANTONIO-VEGALARGA,DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL NO 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022,PRORROGADO A TRAVES DEL DECRETO 299 DE 2022

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	[illegible]	[illegible]	232.000.000,00	0,00
PATRONAL	[illegible]	[illegible]	69.600.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	[illegible]	[illegible]	69.600.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	[illegible]	[illegible]	69.600.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.800.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 24/05/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

[illegible] DE ESTA PÓLIZA [illegible] AL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VER LA EXISTENCIA DE ESTAS AUTORIZADO CON EL REGISTRO DE SEGUROS PRIVADOS, TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PELA - ACPI

HOJA No.

Powered by CamScanner

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX: 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 33-03-2021-1317-P-06-PPSU000000000027-D00I

No. PÓLIZA	RV-100016696	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	34288309	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/05/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA NEIVA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	25/03/2023	24:00 Horas Del	25/05/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DEL HUILA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA MARVA CONSTRUCCIONES SAS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DEL HUILA

-BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DEL HUILA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

APROBADO ANTE CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA APP

Powered by CamScanner

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA-REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.08.15 11:39:44 -05:00

Código de Seguridad: 21Y4x81EQ17Etyhn6ES90A==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N° 6B - 24 PISOS 1 Y 3 BOGOTÁ
TELÉFONO 2855603 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 10-03-2021-1317-P-06-FPSUS37000000027-0001

No. PÓLIZA	NV-100016696	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	34290995	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/08/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA NEIVA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	25/03/2023	24:00 Horas Del	31/07/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	MARVA CONSTRUCCIONES SAS	No. DOC. IDENTIDAD	901.241.893-2
DIRECCIÓN	CL 9 3 50	TELÉFONO	3125223367
ASEGURADO	MONTENEGRO SALAZAR, ANIBAL	No. DOC. IDENTIDAD	4.932.473
DIRECCIÓN	CR 8B 11 12	TELÉFONO	3107799300
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DEL ACTA DE INICIO CON FECHA DEL 31 DE MAYO DEL 2023, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE PÓLIZA.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232000000.00	232000000.00	232.000.000,00	0,00
PATRONAL	69600000.00	69600000.00	69.600.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	69600000.00	69600000.00	69.600.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	69600000.00	69600000.00	69.600.000,00	0,00
			$ 232.000.000,00	

Gobernación del Huila
Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario
APROBACIÓN POLIZA
Fecha: 14/03/2023
Aprobado
Secretario(a) de Gobierno y Desarrollo Comunitario

INTERMEDIARIOS		% PARTICIPACIÓN
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 14/08/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

Powered by CamScanner

seguros mundial®

Tu compañía siempre

NIT 860 037 013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN CENTRAL CALLE 33 N.6B- 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSER000000027-D00I

No. PÓLIZA	NV-1000164656	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	14298995	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	19/03/2021	SUC. EXPEDICIÓN	AGENCIA NEIVA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	25/03/2021	24:00 Horas Del	31/07/2021		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

Powered by CamScanner

seguros mundial®
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.10.26 10:40:23 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA-REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: eGQb6TBeT3PI/S3Ur+F1jQA==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N° 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTA
TELÉFONO: [illegible] - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO [illegible]

No. PÓLIZA	NV-1000186/06	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	342927.30	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	26/10/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA NEIVA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	25/03/2023	24:00 Horas Del	09/11/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	MARVA CONSTRUCCIONES SAS	No. DOC. IDENTIDAD	901..241..893-2
DIRECCIÓN	CL 9 3 50	TELÉFONO	3125223367
ASEGURADO	MONTENEGRO SALAZAR, ANIBAL	No. DOC. IDENTIDAD	4..932..473
DIRECCIÓN	CR 80 11 12	TELÉFONO	3187799389
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DEL ACTA DE SUSPENSIÓN NO 01 DE FECHA 02/08/2023, ACTA DE PRORROGA NO 1 DE LA SUSPENSION NO 01 DE FECHA 31/08/2023 Y ACTA DE REINICIO NO 01 DE FECHA 11/09/2023, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE PÓLIZA.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION 'ORDEN ED SERVICIOS FDGRD NO .38 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

REALIZAR OBRAS DE CONTENCION Y MITIGACION POR PERDIDA DE CALZADA Y SOCAVACION DE LA VIA 38HL01 PLANTAMILLAL - SAN ANTONIO-VEGALARGA,DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL NO 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022,PRORROGADO A TRAVES DEL DECRETO 299 DE 2022

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DEL HUILA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232..000..000,00	232..000..000,00	232..000..000,00	128..394,52
PATRONAL	69..600..000,00	69..600..000,00	69..600..000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	69..600..000,00	69..600..000,00	69..600..000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	69..600..000,00	69..600..000,00	69..600..000,00	0,00

Gobernación del Huila
Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario
APROBACIÓN POLIZA
Fecha: 2880
Aprobado
Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario

VALOR ASEGURADO $ 232..000..000,00

INTERMEDIARIOS		% PARTICIPACION
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS		100,00

DISTRIBUCION COASEGURO			
COMPAÑIA	[illegible]	POLIZA (%)	CEDIDO (%)

PRIMA BRUTA	$	128..394,52
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	128..394,52
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	24..394,96
TOTAL A PAGAR	$	152..789,48

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 25/10/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 029 DE 2208 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTA 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESPALDO A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - APP

HOJA No.

Powered by CamScanner

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 830.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO RECIBIMOS COMISIÓN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. POLIZA	[illegible]	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	34202730	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	26/10/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA NEIVA

VIGENCIA DE POLIZA		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	25/03/2023	24:00 Horas Del	06/11/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA ANIBAL MONTENEGRO SALAZAR, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DEL HUILA

-BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRA A DEPARTAMENTO DEL HUILA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO, EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

APLICADOS A LA CANARIA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA ARF

Powered by CamScanner

seguros mundial
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2023.08.15 11:38:36 -05:00

Código de Seguridad: [illegible]

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
[illegible]
WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
[illegible]

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
[illegible]	3	3429872	

TIPO DE DOCUMENTO | FECHA DE EXPEDICIÓN: 14/08/2023 | SUC. EXPEDIDORA: AGENCIA NEIVA

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del 25/05/2023	24:00 Horas Del 31/07/2028		N/A	N/A

TOMADOR	MARVA CONSTRUCCIONES SAS	No. DOC. IDENTIDAD	901.241.993-2
DIRECCIÓN	CL 9 3 50	TELÉFONO	3103221367
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. DOC. IDENTIDAD	899.101.913-4
DIRECCIÓN	CRA. 4 CON CALLE 8 ESQUINA PISO 2	TELÉFONO	8713281
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. DOC. IDENTIDAD	899.101.913-4
DIRECCIÓN	CRA. 4 CON CALLE 8 ESQUINA PISO 2	TELÉFONO	8713281

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DEL ACTA DE INICIO CON FECHA DEL 31 DE MAYO DEL 2023, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE SERVICIOS [illegible] DE 2023 CUYO OBJETO ES

REALIZAR OBRAS DE CONTENCION Y MITIGACION POR PERDIDA DE CALZADA Y SOCAVACION DE LA VIA 3BMLB1 PLANTANILLAL - SAN ANTONIO-VEGALARGA,DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL NO 959 DEL 9 DE MARZO DE 2022,PRORROGADO A TRAVES DEL DECRETO 299 DE 2022.

*** NOTA ACLARATORIA ***

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 31/05/2023	24:00 Horas Del 31/07/2024	63.632.108,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 31/05/2023	24:00 Horas Del 31/07/2028	31.816.054,40	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/07/2023	24:00 Horas Del 31/07/2028	63.632.108,00	0,00
			159.080.270,00	

Gobernación del Huila
Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario
APROBACIÓN POLIZA
Fecha: [illegible]
Aprobado
Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario

INTERMEDIARIOS		% PARTICIPACIÓN
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 14/08/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PROTECCIÓN MUNDIAL SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MURIAS - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.970

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

Powered by CamScanner

seguros mundial

Tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2806000059-0001

No POLIZA	8V 100068861	No. ANEXO	5	No CERTIFICADO	5230572	No RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/08/2021	SUC EXPEDIDORA	AGENCIA NEIVA

VIGENCIA DE SDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	25/01/2021	24:00 Horas Del	11/07/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 05 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL.

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protegemos el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

Powered by CamScanner

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASARELAP

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza NV-100088807 y endoso, 5 cuyo afianzado es: **MARVA CONSTRUCCIONES SAS** Asegurado o Beneficiario: DEPARTAMENTO DEL HUILA / **DEPARTAMENTO DEL HUILA** , expedida por la Compañía en **14/08/2023**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA NEIVA a los **15** días del mes **AGOSTO** del año **2023**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASARELAP

Powered by CamScanner

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.10.25 09:46:20 -05:00

Código de Seguridad: T3H5Fz9+fCt+4VpFpn5yxA==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTA
TELEFONO 2855600 FAX 2841230 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO [illegible]

No. PÓLIZA	NV-100088807	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	34292682	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICION	25/10/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA NEIVA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	25/03/2023	24:00 Horas Del	09/11/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	MARVA CONSTRUCCIONES SAS	No. DOC. IDENTIDAD	901.241.893-2
DIRECCIÓN	CL 9 3 50	TELEFONO	3125223367
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.913-4
DIRECCIÓN	CALLE 8 CARRERA 4 ESQUINA	TELÉFONO	8713281
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.913-4
DIRECCIÓN	CALLE 8 CARRERA 4 ESQUINA	TELÉFONO	8713281

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DEL ACTA DE SUSPENSION NO 01 DE FECHA 02/06/2023, ACTA DE PRORROGA NO 1 DE LA SUSPENSION NO 01 DE FECHA 31/08/2023 Y ACTA DE REINICIO NO 01 DE FECHA 11/09/2023, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE PÓLIZA.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE SERVICIOS FOPRO NO. 30 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

REALIZAR OBRAS DE CONTENCION Y MITIGACION POR PERDIDA DE CALZADA Y SOCAVACION DE LA VIA 3804L01 PLANTANILLAL - SAN ANTONIO-VEGALARGA,DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL NO 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022,PRORROGADO A TRAVES DEL DECRETO 299 DE 2022.

*** NOTA ACLARATORIA ***

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 11/09/2023	24:00 Horas Del 09/11/2024	63.632.108,80	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 11/09/2023	24:00 Horas Del 09/11/2026	31.816.054,40	13.205,64
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 09/11/2023	24:00 Horas Del 09/11/2028	63.632.108,80	0,00
			VALOR ASEGURADO $	159.080.272,00

Gobernación del Huila
Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario
APROBACIÓN POLIZA
Fecha: 25/10/2023
Secretario(a) de Gobierno y Desarrollo Comunitario

INTERMEDIARIOS
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	13.205,64
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	13.205,64
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	2.509,11
TOTAL A PAGAR	$	15.714,95

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 25/10/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS ARCILA PERDOMO INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA. ASI COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA POLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

Powered by CamScanner

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NV-100088807	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	34292682	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	25/10/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA NEIVA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	25/03/2023	24:00 Horas Del	09/11/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 05 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA ART

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

Powered by CamScanner

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza NV-100088807 y endoso, 6 cuyo afianzado es: MARVA CONSTRUCCIONES SAS Asegurado o Beneficiario: DEPARTAMENTO DEL HUILA / DEPARTAMENTO DEL HUILA , expedida por la Compañía en 25/10/2023, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA NEIVA a los 25 días del mes OCTUBRE del año 2023.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Powered by CamScanner

ARMADURA LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL
MURO DE CONTENCION SAN ANTONIO TRAMO 1 L=5.00m
ESCALA 1 : 50

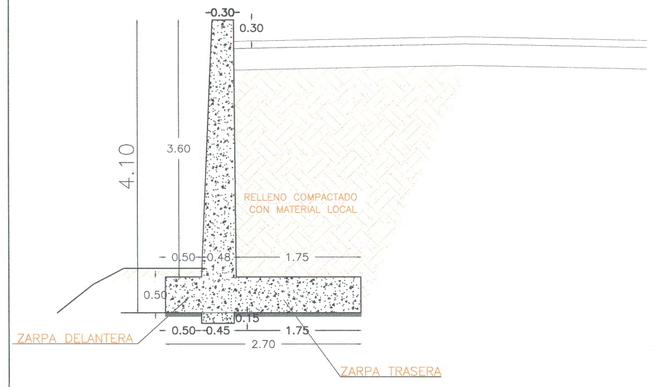


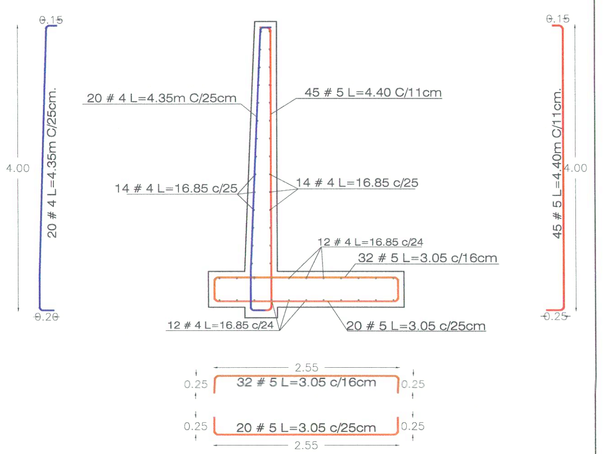


CONCRETO Fc = 280 kg/cm2
ACERO PRINCIPAL Fy = 4200 kg/cm2

GEOMETRIA DEL MURO
ESCALA 1 : 50

ARMADURA LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL
MURO DE CONTENCION SAN ANTONIO TRAMO 2 L=5.00m
ESCALA 1 : 50

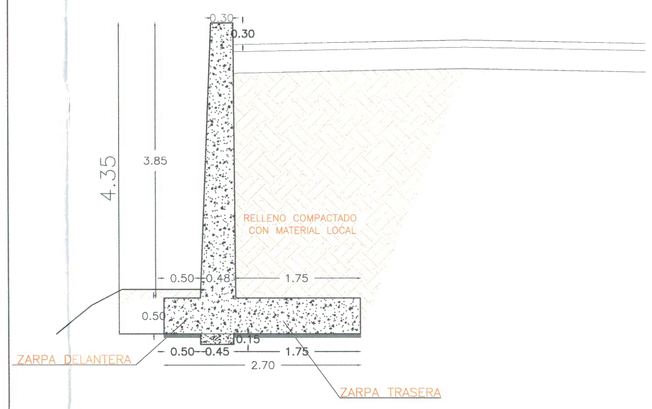


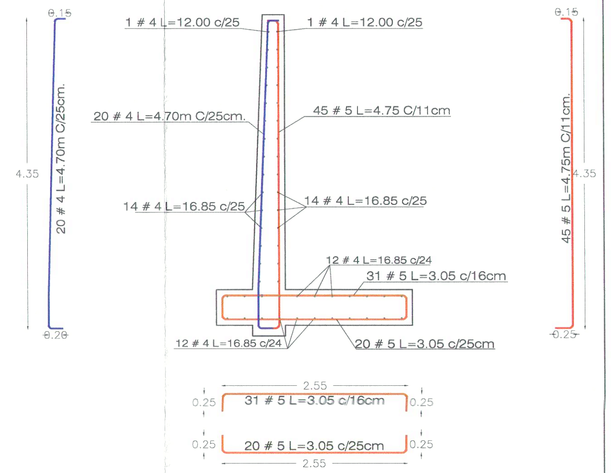


CONCRETO Fc = 280 kg/cm2
ACERO PRINCIPAL Fy = 4200 kg/cm2


GEOMETRIA DEL MURO
ESCALA 1 : 50

ARMADURA LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL
MURO DE CONTENCION SAN ANTONIO TRAMO 3 L=5.00m
ESCALA 1 : 50

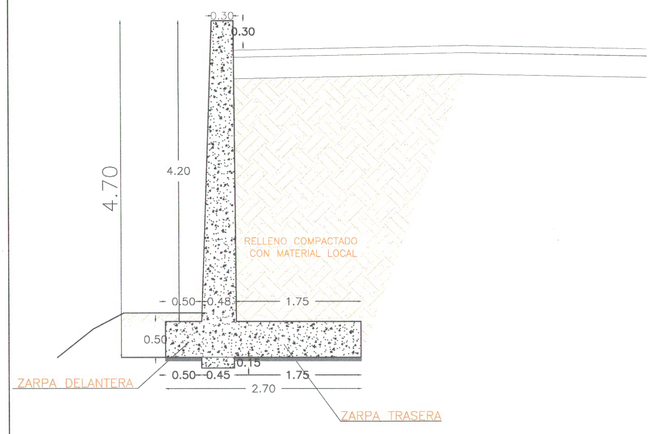

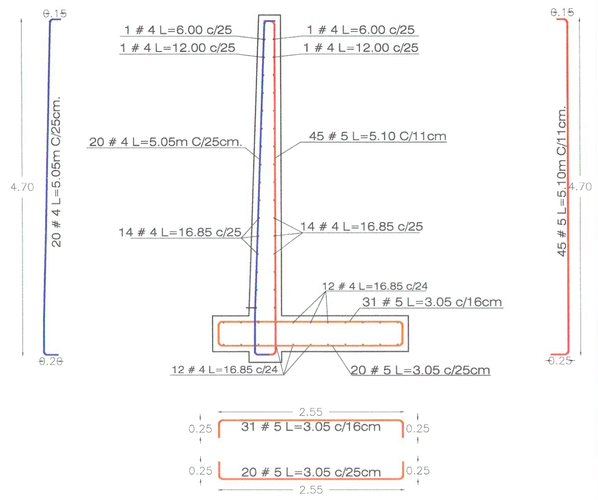

CONCRETO Fc = 280 kg/cm2
ACERO PRINCIPAL Fy = 4200 kg/cm2

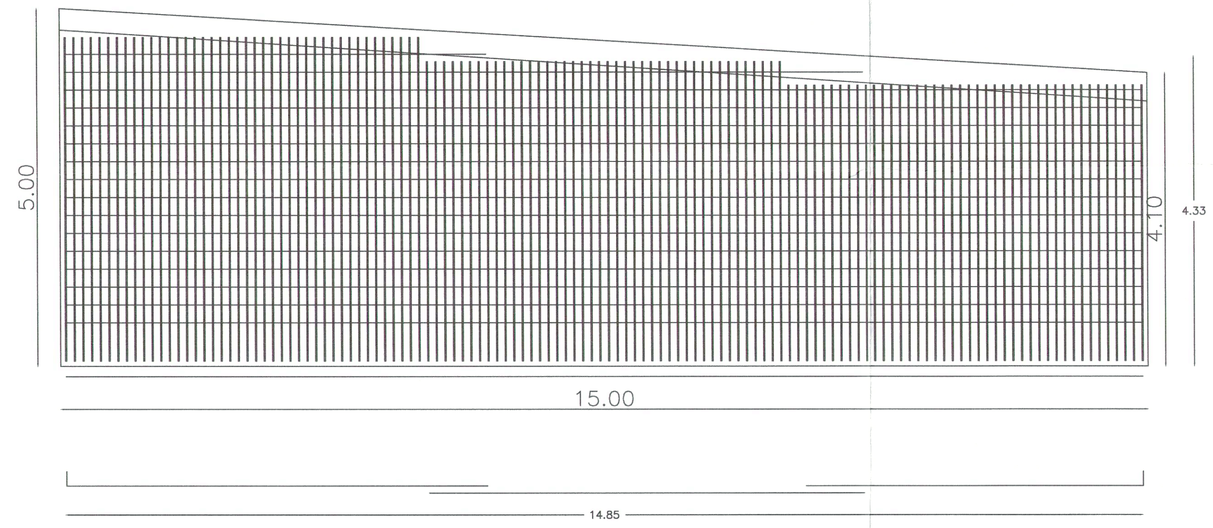

Jaime Eduardo Moreno
Residente de Interventoria

CONTRATANTE:

GOBERNACION DEL HUILA

CONTRATISTA:

MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S

GOBERNADOR:

ING. LUIS ENRIQUE DUSSAN LOPEZ

INTERVENTORIA:

CONSORCIO INTERVIAS MSM
RL ING. ADRIAN RODRIGO CABEZAS PEÑA

CONTRATISTA:

MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S
RL ING. MARILUZ VARGAS GONZALEZ

DIBUJO:

ING. JUAN CARLOS DIAZ CHARRY
M.P. 25202-191915 CND

CONTROL DE CAMBIOS :


VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA
1	Planos records	Dic de 2023

CONVENCIONES:

CONTIENE:

PLANOS RECORDS
MURO DE CONTENCIÓN MURO
NEIVA - SAN ANTONIO - VEGALARGA

LOCALIZACION:



UBICACIÓN:
VIA PLATANILLAL–SAN ANTONIO–VEGALARGA
VÍA 3OHL01
DEPARTAMENTO DEL HUILA

ESCALA:	FECHA:
1 : 100	Diciembre de 2023
ARCHIVO:	FECHA COPIA:
PLANOS RECORD MURO SAN ANTONIO	Diciembre/2023
DIBUJÓ:	VERSIÓN ROTULO:
JUAN CARLOS DIAZ CHARRY	A–001

VERSION PLANO:	PLANO No:	DE:
	2	2


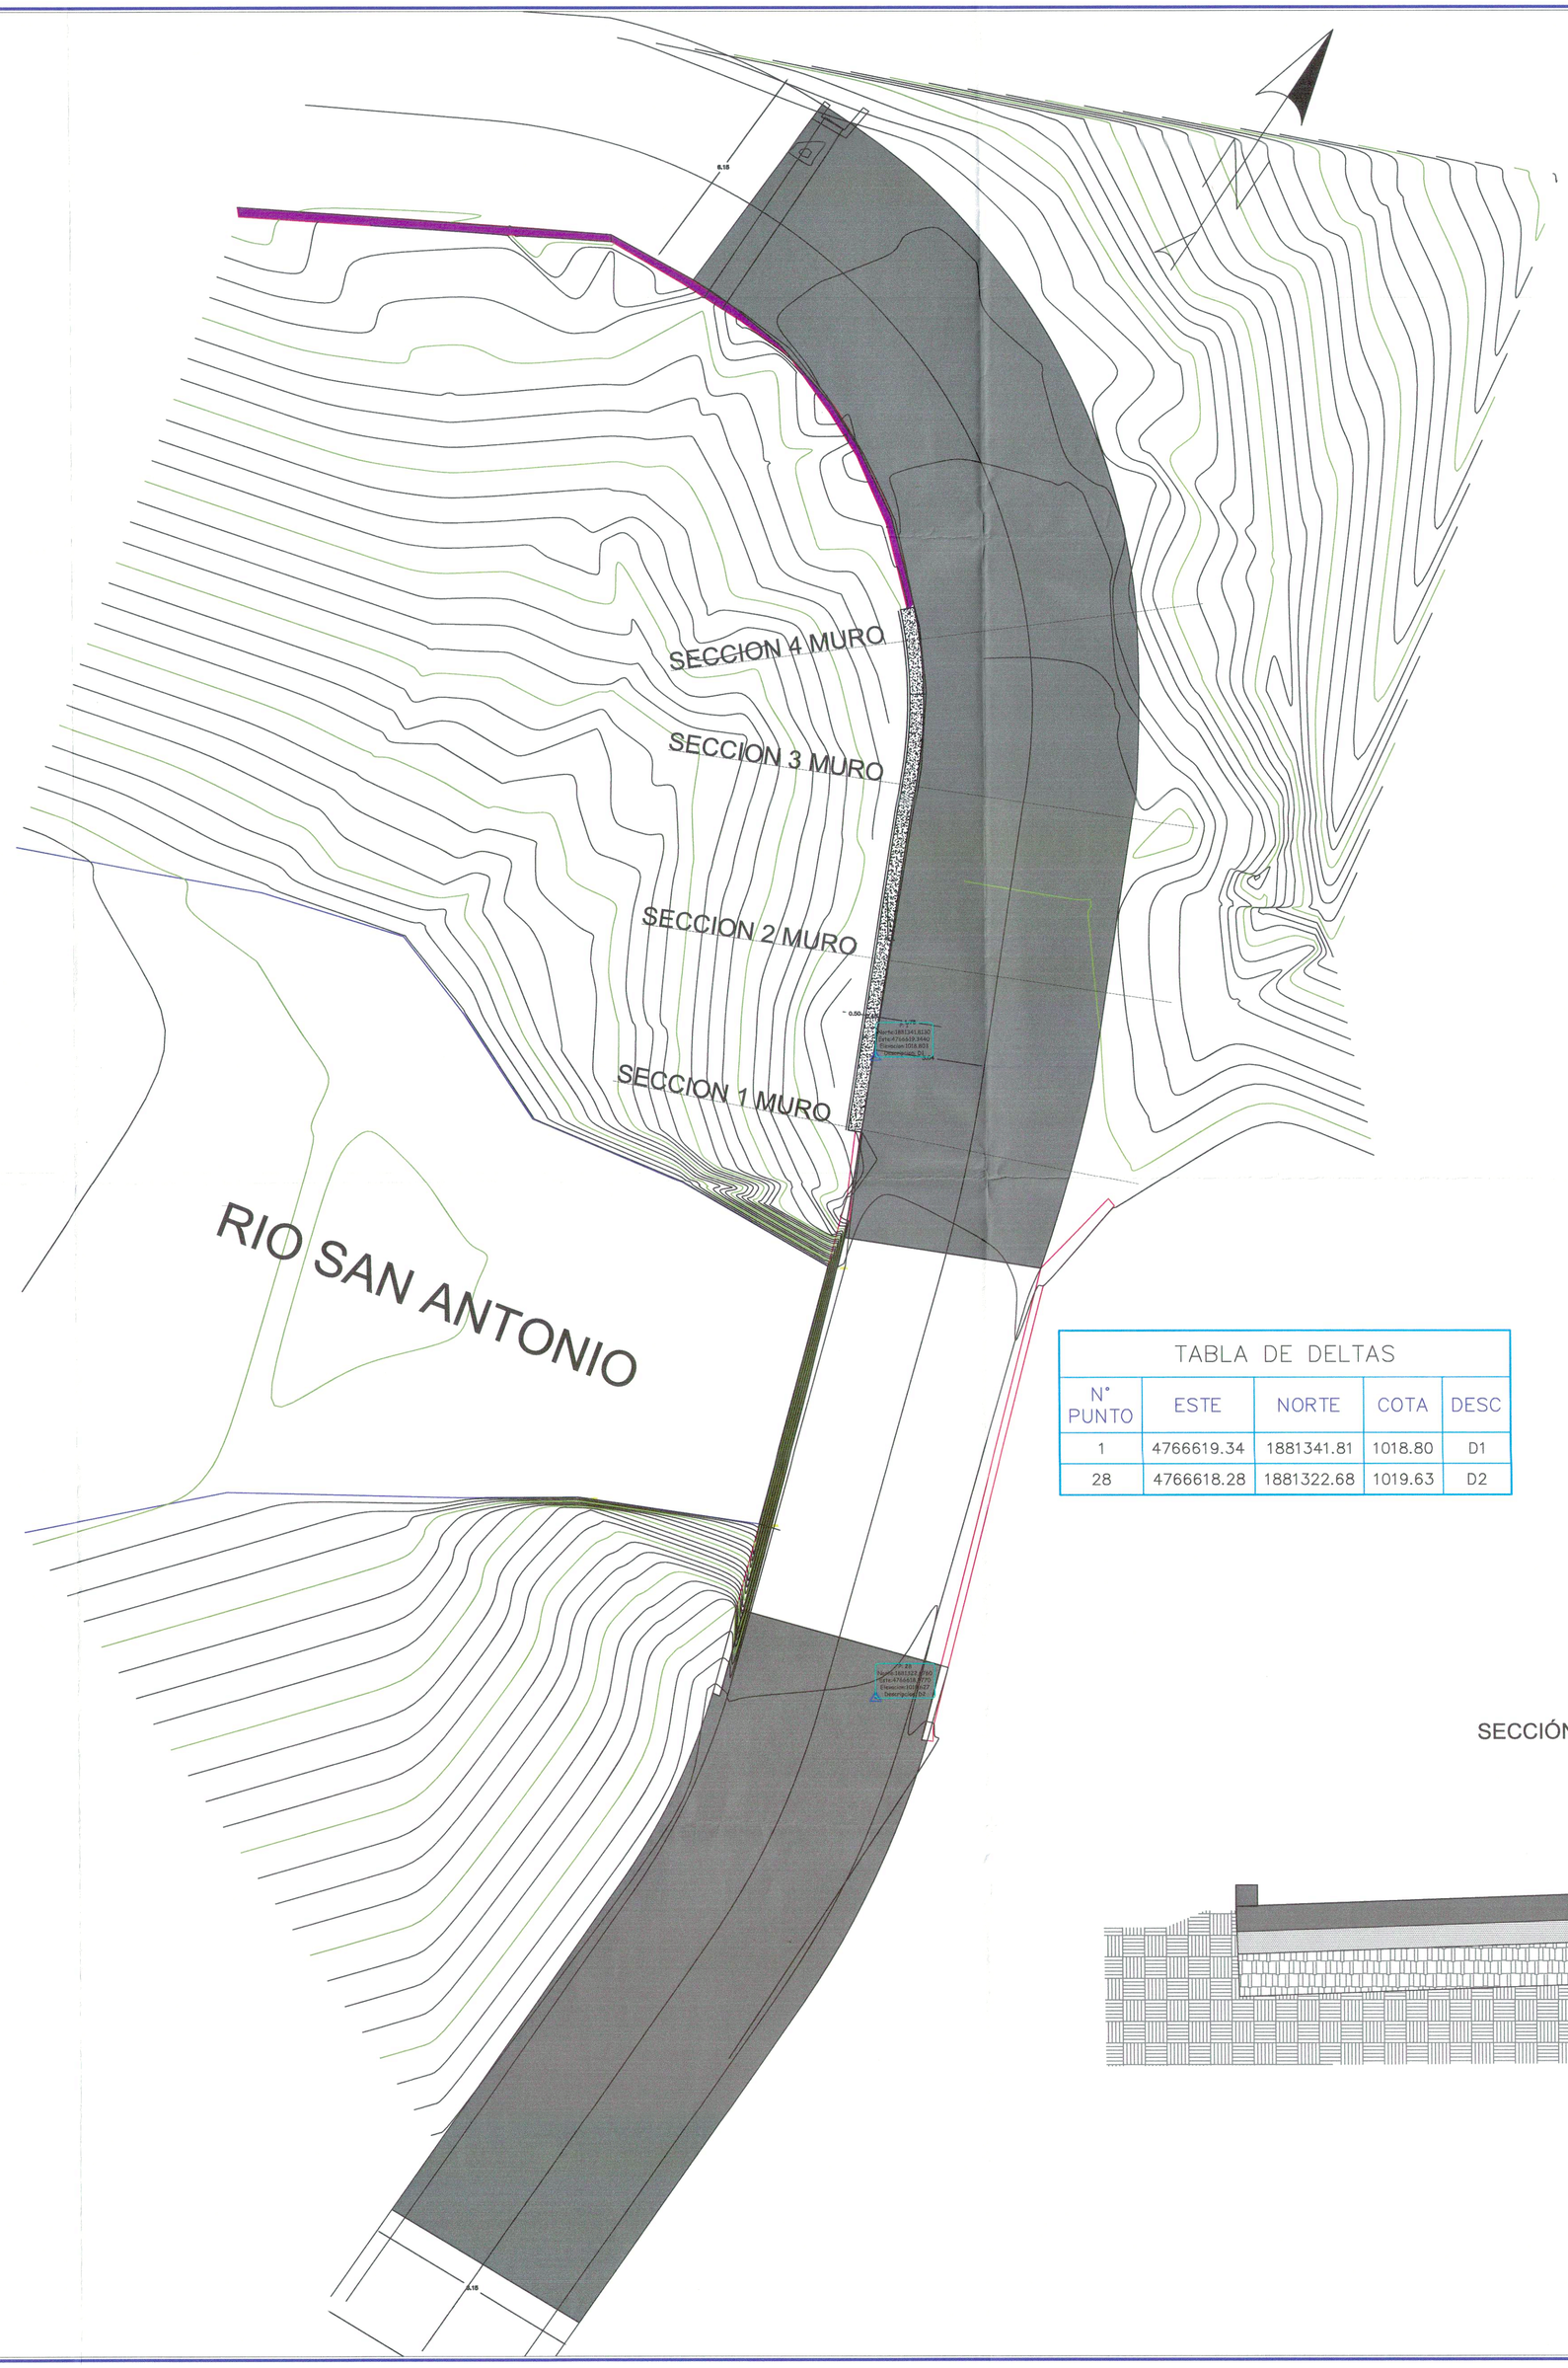


TABLA DE DELTAS				
N° PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESC
1	4766619.34	1881341.81	1018.80	D1
28	4766618.28	1881322.68	1019.63	D2

SECCIÓN TRANSVERSAL PAVIMENTO MR - 40



CONTRATANTE:

GOBERNACION DEL HUILA

CONTRATISTA:

MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S

GOBERNADOR:

ING. LUIS ENRIQUE DUSSAN LOPEZ

INTERVENTORIA:

CONSORCIO INTERVIAS MSM
RL ING. ADRIAN RODRIGO CABEZAS PEÑA

CONTRATISTA:

MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S
RL ING. MARILUZ VARGAS GONZALEZ

DIBUJO:

ING. JUAN CARLOS DIAZ CHARRY
M.P. 25202-345915 CND

CONTROL DE CAMBIOS :


VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA
1	Planos records	Dic de 2023

CONVENCIONES:

CONTIENE:

PLANOS RECORDS
MURO DE CONTENCIÓN MURO
NEIVA - SAN ANTONIO - VEGALARGA

LOCALIZACION:



UBICACIÓN:
VIA PLATANILLAL – SAN ANTONIO – VEGALARGA
VIA 30HL01
DEPARTAMENTO DEL HUILA

ESCALA:	FECHA:
1 : 100	Diciembre de 2023
ARCHIVO: PLANOS RECORD MURO SAN ANTONIO	FECHA COPIA: Diciembre/2023
DIBUJÓ: JUAN CARLOS DIAZ CHARRY	VERSIÓN ROTULO: A-001

VERSION PLANO:	PLANO No:	DE:
	1	2
