CONTRATO No 696 DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA PLATA Y CONSORCIO INFRAHUILA

OBJETO	ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO EL POMO EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONTRATISTA	**NOMBRE: CONSORCIO INFRAHUILA** **C.C. NIT: 901892917-3** **Rep. Legal: JULIO CESAR FIERRO CEDIEL** **CEDULA: 76.690.978** DE Bogotá D.C **DIRECCIÓN**: Carrera 10 A No 2-58 Garzón Huila **CORREO**: consorcioinfrahuila@gmail.com **TELÉFONO**: 3114408497 **CIUDAD**: Garzón Huila
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS. ($ 1.352.445.297,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL No 1	NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHETA Y CINCO MIL PESOS ($93.985.900) M/CTE.
VALOR TOTAL	MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS. ($ 1.446.431.194,00) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	CINCO (05) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar la presente vigencia fiscal.
PLAZO ADICIONAL No 1	UN (01) MES
PLAZO TOTAL	SEIS (06) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar la presente vigencia fiscal.
FECHA ACTA DE INICIO	VEINTITRES (23) de DICIEMBRE de 2024
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN	DIECINUEVE (19) de JUNIO de 2025.

En La Plata Huila, a los DIECINUEVE (19) días del mes de JUNIO de 2025, se reunieron la Ingeniera **DIANA ALEJANDRA JIMENEZ CEDIEL**, en calidad de supervisora, el ingeniero **MIGUEL EDUARDO JOVEN GRAFE**, en representación del AVGR ingeniería s.a.s, en calidad de contratista Interventor y el Ingeniero **JULIO CESAR FIERRO CEDIEL**, en representación del consorcio INFRAHUILA, en calidad de contratista de obra, con la finalidad de firmar EL ACTA DE SUSPENSIÓN No.1, del contrato en mención, con base en las siguientes consideraciones:

Que mediante oficio POMO-LA PLATA-066, calendado el 17 de junio de 2025, ***MIGUEL EDUARDO JOVEN GRAFE****, representante legal de* ***AVGR ingeniería s.a.s****, presentó oficio de Aprobación de solicitud de suspensión No. 1, en los siguientes términos:*

"(…) En vista que la situación es compleja y no es viable la ejecución del proyecto en las condiciones presentadas, con la finalidad de evitar la continuación de la afectación al proyecto, esta interventoría avala la solicitud del contratista y solicita a ustedes la suspensión del contrato de obra a partir del diecinueve (19) de junio de 2025 y hasta el siete (7) de julio de 2025, tiempo en el cual se espera que los motivos que dan origen a la suspensión hayan sido superados y se pueda retomar las actividades de obra. (…).

Que mediante oficio de fecha 17 de junio de 2025**, JULIO CESAR FIERRO CEDIEL**, representante legal del consorcio INFRAHUILA, contratista de obra, presentó la solicitud correspondiente a la interventoría así:

"En calidad de contratista en mención, me permito solicitar formalmente la suspensión temporal del contrato, con base en hechos de fuerza mayor que imposibilitan la ejecución adecuada de las actividades pendientes."

1. *En los municipios del sur del Huila se han presentado lluvias torrenciales continuas por más de cincuenta (50) horas, situación que ha causado afectaciones severas en las vías, puentes y alcantarillas, generando un colapso vial en toda la región, lo cual limita tanto el acceso como el transporte de materiales y personal.*

2. *La Oficina de Gestión del Riesgo del Huila ha reportado un total de 447 emergencias durante la primera temporada de lluvias del 2025, siendo los deslizamientos de tierra el evento más recurrente, con 310 reportes. Además, se han presentado 48 crecientes súbitas de afluentes.*

3. *El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), mediante el boletín 426, ha emitido alerta roja por riesgo de deslizamientos en los municipios de Aipe, La Argentina y Acevedo. Asimismo, se encuentran en alerta naranja otros 12 municipios, entre ellos Isnos, San Agustín, Saladoblanco y Pitalito, zonas de influencia directa del proyecto en ejecución.*

4. *Estas condiciones climatológicas extremas han afectado de forma directa los frentes de trabajo, particularmente aquellos relacionados con la conformación de losetas en cama de arena, demarcación de zonas de juego sobre placas de polideportivo, mantenimiento y mejoramiento de graderías, pintura sobre carpintería metálica del cerramiento, ampliación de graniplast sobre muros, actividades que requiere condiciones climáticas secas y estables para garantizar su adecuada ejecución, calidad y durabilidad.*

5. *En virtud de lo anterior y con el fin de proteger la integridad del proceso constructivo y los recursos públicos invertidos, solicito la suspensión temporal del contrato y la interventoría lo avala, hasta tanto se superen las condiciones climáticas adversas y se restablezcan las condiciones técnicas mínimas necesarias para continuar con la ejecución de la obra.*

Por lo anterior, la supervisión encuentra acertada la solicitud, y aprueba la suscripción de la suspensión del **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 696 -2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA PLATA Y CONSORCIO INFRAHUILA,** hasta tanto sean superadas las causas que dieron origen a la presente suspensión.

En virtud de las anteriores consideraciones, y una vez realizado el respectivo análisis técnico por parte de la supervisión, se logra establecer la necesidad de realizar la suspensión No. 1 al **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 696 -2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA PLATA Y CONSORCIO INFRAHUILA**, de conformidad con lo establecido en la parte considerativa de la presente acta.

Para constancia se firma en La Plata, por las partes intervinientes hoy DIECINUEVE (19) de JUNIO de 2025.

Firma:
MIGUEL EDUARDO JOVEN GRAFE
AVGR ingeniería s.a.s
Contratista Interventor

Firma:
JULIO CESAR FIERRO CEDIEL
Consorcio INFRAHUILA
Contratista de Obra

Firma:
DIANA ALEJANDRA JIMENEZ CEDIEL
Directora del Departamento Administrativo de Planeación
Supervisora

Firma:
Nombre: Mauricio Bonilla Tiaffi (Apoyo D.A.P)
Proyectó

La Plata, Huila 17 de junio 2025.

Señores,
AVR INGENIERIA SAS
MIGUEL EDUARDO JOVEN GRAFE
Neiva, Huila
interventoriaelpomo@gmail.com

Referencia: CONTRATO DE OBRA No 696 DE 2024 Cuyo objeto es "ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO EL POMO EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA"

Asunto: Solicitud de suspensión.

En calidad de contratista en mención, me permito solicitar formalmente la suspensión temporal del contrato, con base en hechos de fuerza mayor que imposibilitan la ejecución adecuada de las actividades pendientes.

Dicha solicitud se fundamenta en las siguientes consideraciones:

- En los municipios del sur del Huila se han presentado lluvias torrenciales continuas por más de cincuenta (50) horas, situación que ha causado afectaciones severas en las vías, puentes y alcantarillas, generando un colapso vial en toda la región, lo cual limita tanto el acceso como el transporte de materiales y personal.
- La Oficina de Gestión del Riesgo del Huila ha reportado un total de 447 emergencias durante la primera temporada de lluvias del 2025, siendo los deslizamientos de tierra el evento más recurrente, con 310 reportes. Además, se han presentado 48 crecientes súbitas de afluentes.
- El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), mediante el boletín 426, ha emitido alerta roja por riesgo de deslizamientos en los municipios de Aipe, La Argentina y Acevedo. Asimismo, se encuentran en alerta naranja otros 12 municipios, entre ellos Isnos, San Agustín, Saladoblanco y Pitalito, zonas de influencia directa del proyecto en ejecución.
- Estas condiciones climatológicas extremas han afectado de forma directa los frentes de trabajo, particularmente aquellos relacionados con la conformación de losetas en cama de arena, actividad que requiere condiciones climáticas secas y estables para garantizar su adecuada ejecución, calidad y durabilidad.

- En virtud de lo anterior, y con el fin de proteger la integridad del proceso constructivo y los recursos públicos invertidos, solicito la suspensión temporal del contrato a partir del día 18 de junio de 2025, hasta tanto se superen las condiciones climáticas adversas y se restablezcan las condiciones técnicas mínimas necesarias para continuar con la ejecución de la obra.

Hecho técnico	Evidencia
Temporada de lluvias intensas (mar–jun)	IDEAM confirma ciclo activo y acumulados elevados (caracol.com.co, ideam.gov.co)
Anomalía en mayo	Incremento ≥ 20 % sobre promedio histórico
Huila como foco de emergencias	123 eventos en mayo – más alto entre 26 departamentos
Aumento diario de precipitación	+29 % en 24 h y 75 % municipios en alerta

Conforme a lo anterior, se solicita de manera respetuosa la suspensión temporal del contrato a partir del 18 de junio de 2025, y hasta tanto se restablezcan las condiciones técnicas mínimas necesarias para garantizar la continuidad segura y eficiente de los trabajos, en aras de salvaguardar tanto la calidad del proceso constructivo como los recursos públicos invertidos.

Adjunto a la presente se entrega la siguiente documentación de soporte:

Control diario del clima correspondiente al mes de junio.

Informe técnico de predicción climática vigente.

Registro fotográfico actualizado de las condiciones del sitio de obra.

Sin otro particular, agradezco su atención y quedo atento a la respectiva respuesta.

Cordialmente,

JULIO CESAR FIERRO CEDIEL
Representante Legal
CONSORCIO INFRAHUILA

ANEXO 1



Ilustración 1. Evidencia fotográfica

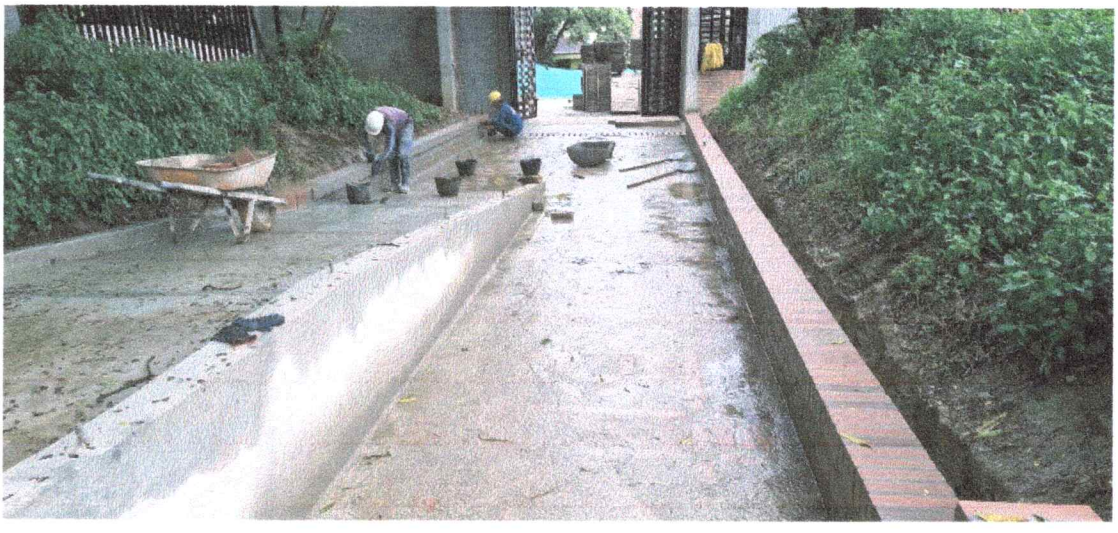


Ilustración 2. Evidencia fotográfica



Ilustración 3. Evidencia fotográfica

ANEXO 2

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –Ideam, informa al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y al Sistema Nacional Ambiental (SINA)
17/03/2025

COMUNICADO ESPECIAL No. 025
PRIMERA TEMPORADA DE MÁS LLUVIAS EN EL PAÍS

- *Transición hacia la primera temporada de más lluvias, que se establece en la mayor parte de la región Andina y en el oriente de la región Caribe.*

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informa que, desde mediados de marzo hasta mediados de junio, se establece la primera temporada de más lluvias en la mayor parte de la región Andina y el oriente de la región Caribe. Este periodo se caracteriza por un incremento significativo en los acumulados mensuales de precipitación en comparación con los valores registrados a comienzos y mediados de año (Figura 1). Durante marzo inicia la transición gradual hacia un aumento estacional de las lluvias en varias zonas del territorio nacional.

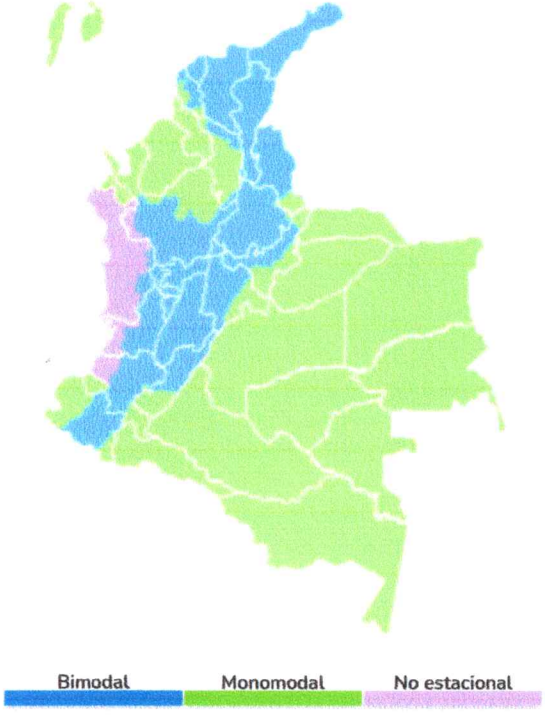


Figura 1. Regionalización de la precipitación. Fuente: Ideam, 2014.

PREDICCIÓN CLIMÁTICA

Primera temporada de más lluvias

El modelo probabilístico del Ideam estima que las precipitaciones estarán por encima de lo normal en gran parte del país durante el mes de marzo. Sin embargo, se espera que, en el sur de la región Pacífica y en áreas puntuales de la Amazonía, las lluvias se mantengan dentro de los rangos normales. A nivel trimestral (figura 2), el período comprendido entre marzo, abril y mayo muestra una tendencia hacia la categoría por encima de lo normal en la mayor parte de las regiones Andina, Caribe y Orinoquía, situación que podría acentuar esta primera temporada de más lluvias.

De acuerdo con la salida de los modelos de predicción, los posibles incrementos en los niveles de lluvia se registrarían sobre el 20% - *con referencia al promedio* - en marzo y mayo, y alrededor del 50% durante abril. En el resto del país, se esperan precipitaciones cercanas a los valores climatológicos habituales. Cabe anotar que, para la región Amazónica, se prevén condiciones por debajo de lo normal, con disminuciones estimadas entre un 10% y un 30%.

Esta proyección indica que, en los próximos tres meses, los niveles de humedad en los suelos de gran parte del país podrían aumentar de manera progresiva, debido a la intensificación de las lluvias en varias regiones. En particular, en el norte de la región Caribe, es común que las precipitaciones se tornen más frecuentes y abundantes a partir de mediados de mayo.

El aumento sostenido en la humedad del suelo, sumado con la predicción de lluvias, podría detonar fenómenos asociados a condiciones meteorológicas extremas. Entre estos eventos se incluyen deslizamientos de tierra, inundaciones, crecientes súbitas, avenidas torrenciales, descargas eléctricas y vendavales, los cuales pueden generar impactos en la infraestructura, los ecosistemas y las comunidades.

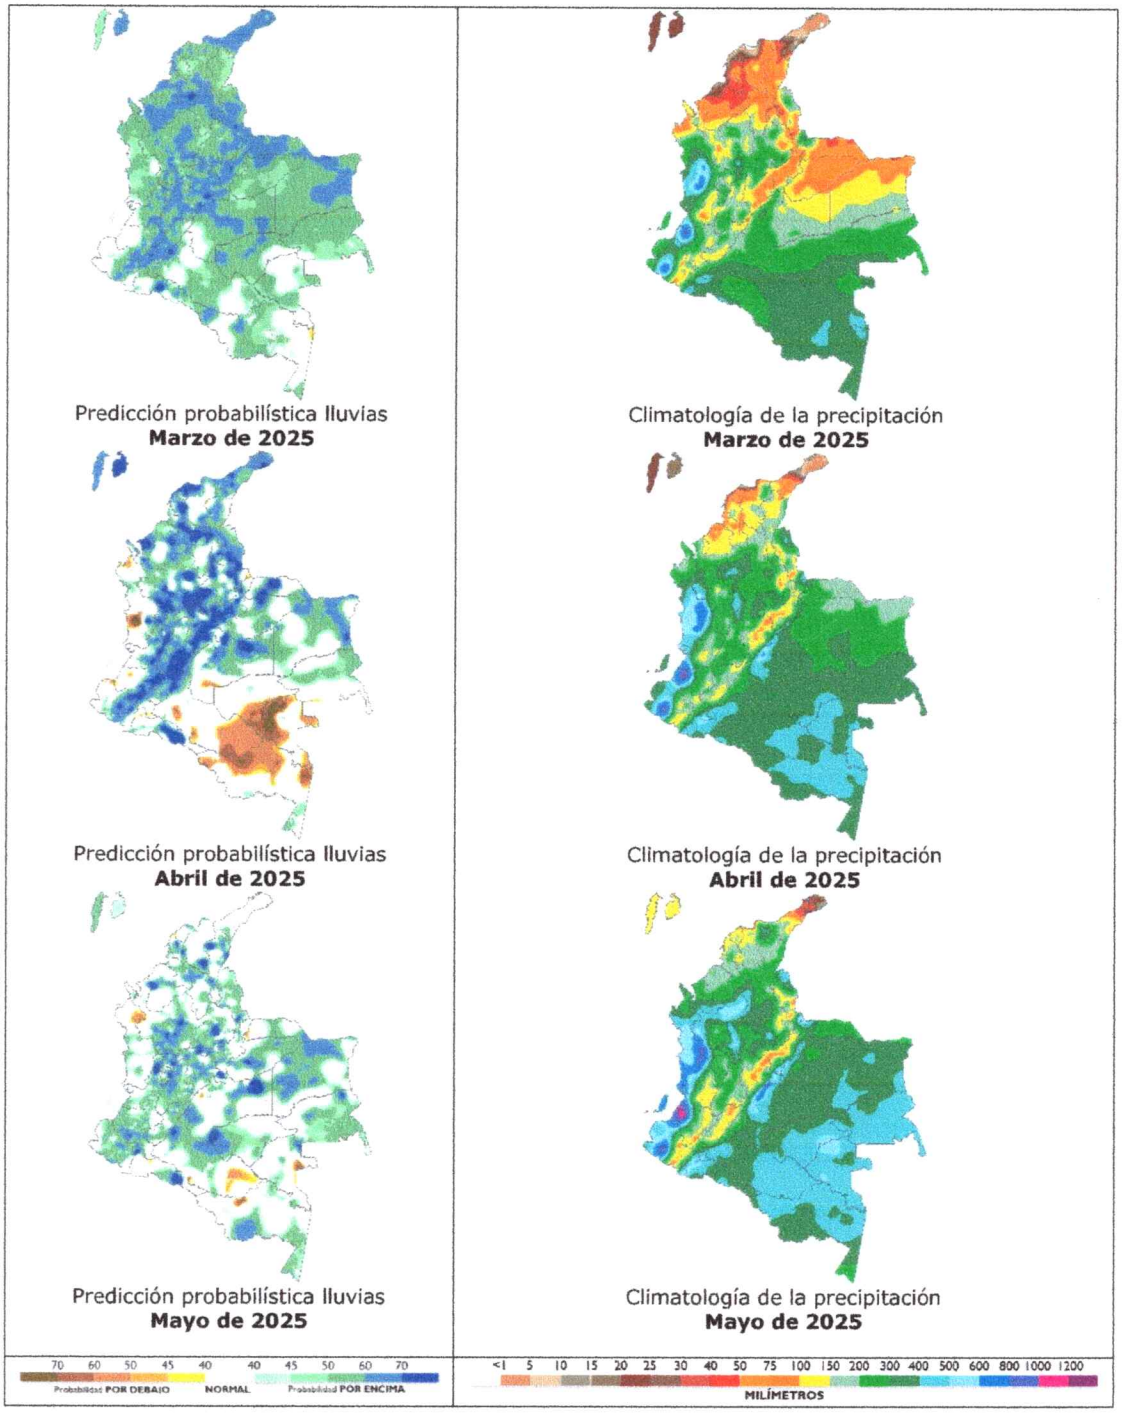

Predicción probabilística lluvias
Marzo de 2025
Climatología de la precipitación
Marzo de 2025
Predicción probabilística lluvias
Abril de 2025
Climatología de la precipitación
Abril de 2025
Predicción probabilística lluvias
Mayo de 2025
Climatología de la precipitación
Mayo de 2025
70 60 50 45 40
Probabilidad POR DEBAJO
NORMAL
40 45 50 60 70
Probabilidad POR ENCIMA
<1 5 10 15 20 25 30 40 50 75 100 150 200 300 400 500 600 800 1000 1200
MILÍMETROS

Figura 2. Predicción de la precipitación y climatología mensual.

SUGERENCIAS PARA LA COMUNIDAD ANTE LAS ALERTAS POR DESLIZAMIENTOS

- Importante estar atentos al estado de las vías, principalmente en áreas de los departamentos con alerta roja, donde la amenaza es alta a causa de la orografía. Así mismo, se aconseja realizar recorridos preferiblemente en el día e identificar las áreas con amenazas por deslizamientos o derrumbes.
- Se sugiere a la comunidad un monitoreo permanente en días muy lluviosos y buscar refugio en zonas seguras.
- Si el deslizamiento es en una carretera, es necesario informar a las autoridades y conductores para ponerles en alerta.
- También es importante evitar el tránsito en zonas de alta pendiente. Conforme a lo anterior, les invitamos a consultar la información disponible en las herramientas interactivas como: **VI@JERO SEGURO, #767**, X **@numeral767** y la **página web www.invias.gov.co** para conocer cómo se están comportando los diferentes corredores del país.

ANTE LA POSIBILIDAD DE TORMENTAS ELÉCTRICAS, VIENTOS FUERTES O VENDAVALES

- Buscar un refugio seguro. No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas, ya que podrían ser objeto de descargas.
- Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.
- Asegurar y revisar el estado de los tejados, y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.
- Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumideros.

El Ideam continuará monitoreando de manera permanente las condiciones atmosféricas y climáticas del país. Se recomienda a las entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) mantenerse atento a la información y pronósticos emitidos por el Instituto. Esto permitirá activar, de ser necesario, los planes de contingencia y adoptar medidas oportunas para la reducción de riesgos

asociados a eventos climáticos extremos, como lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos de tierra etc.

Adicionalmente, se sugiere consultar el enlace:
https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Circulares.aspx
de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para obtener información detallada y actualizada sobre las orientaciones en materia de preparación y alistamiento ante la primera temporada de más lluvias en el país. Allí se pueden encontrar lineamientos, sugerencias y medidas preventivas para fortalecer la capacidad de respuesta de las comunidades y las entidades responsables de la gestión del riesgo en el país.


Ir a GovCo

IDEAM

Visita nuestro anterior sitio web para acceder a contenido histórico y recursos anteriores del Ideam.

Ir a archivo.ideam.gov.co

Primera temporada de más lluvias en el país 2025



Primera temporada de más lluvias en el país 2025

Publicado:17 Marzo, 2025

Subdirección Meteorología | LLuvias | Ideam Colombia

Lee antes de compartir



- *Transición hacia la primera temporada de más lluvias que se establece en la mayor parte de la región Andina y en el oriente de la región Caribe.*

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informa que, desde mediados de marzo hasta mediados de junio, se establece la primera temporada de más lluvias en la mayor

Ir a GovCo

acumulados mensuales de precipitación en comparación con los valores registrados a comienzos y mediados de año. Durante marzo inicia la transición gradual hacia un aumento estacional de las lluvias en varias zonas del territorio nacional

PREDICCIÓN CLIMÁTICA: Primera temporada de más lluvias.

El modelo probabilístico del Ideam estima que las precipitaciones estarán por encima de lo normal en gran parte del país durante marzo. Sin embargo, se espera que, en el sur de la región Pacífica y en áreas puntuales de la Amazonía, las lluvias se mantengan dentro de los rangos normales. A nivel trimestral (Figura 2), el período comprendido entre marzo, abril y mayo muestra una tendencia hacia la categoría por encima de lo normal en la mayor parte de las regiones Andina, Caribe y Orinoquía, situación que podría acentuar esta primera temporada de más lluvias.

De acuerdo con la salida de los modelos de predicción, los posibles incrementos en los niveles de lluvia se registrarían sobre el 20% - con referencia al promedio - en marzo y mayo, y alrededor del 50% durante abril. En el resto del país, se esperan precipitaciones cercanas a los valores climatológicos habituales. Cabe anotar que, para la región Amazónica, se prevén condiciones por debajo de lo normal, con disminuciones estimadas entre un 10% y un 30%.

Esta proyección indica que, en los próximos tres meses, los niveles de humedad en los suelos de gran parte del país podrían aumentar de manera progresiva, debido a la intensificación de las lluvias en varias regiones. En particular, en el norte de la región Caribe, es común que las precipitaciones se tornen más frecuentes y abundantes a partir de mediados de mayo.



El aumento sostenido en la humedad del suelo, sumado con la predicción de lluvias, podría detonar fenómenos asociados a condiciones meteorológicas extremas. Entre estos eventos se incluyen deslizamientos de tierra, inundaciones, crecientes súbitas, avenidas torrenciales, descargas eléctricas y vendavales, los cuales pueden generar impactos en la infraestructura, los ecosistemas y las comunidades.

Ir a GovCo

¡Conoce otras noticias de interés!



La lucha contra la desertificación y la sequía exige mayor acción sobre el cuidado del suelo

18 Junio, 2025



Temporada de Ciclones Tropicales 2025

13 Junio, 2025



¡Llegó el turno para la inscripción al Registro Único Ambiental (RUA) de los "Demás Sectores"!

10 Junio, 2025

Ir a GovCo

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

Sede principal

Dirección ventanilla única de radicación: Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C.

Código Postal: 110911

Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 am - 5:00 pm

PBX: +57 (601) 352 7160

Pronóstico y Alertas: +57 (601) 307 5625

Línea anticorrupción: denunciacorrupcion@ideam.gov.co

Dirección electrónica exclusiva para notificaciones judiciales al IDEAM: notificacionesjudiciales@ideam.gov.co

Radicación de comunicaciones oficiales vía web: contacto@ideam.gov.co

Ambiente

@IDEAM.INSTITUTO @IDEAMCOLOMBIA @IDEAMCOLOMBIA INSTITUTO IDEAM

Políticas Mapa del sitio Términos y condiciones Accesibilidad

	CONTROL DIARIO DE LLUVIAS GC-PC150-DC-F49	REVISION:00 FECHA APROBACIÒN: 13-11-2021

MAYO

Hora			Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
0: 00	0:30	a.m.												b																		
0:30	1:00	a.m.												b																		
1:00	1:30	a.m.												b																		
1:30	2:00	a.m.												b																		
2:00	2:30	a.m.																	b													
2:30	3:00	a.m.					b								m				b		m	b										
3:00	3:30	a.m.					b								m				b		m	b										
3:30	4:00	a.m.					m							m	m			m			m	b	m	f								
4:00	4:30	a.m.			f									m	m			m			m	b	f	f								
4:30	5:00	a.m.			f									m	m			m				b	f	f								
5:00	5:30	a.m.			f		m							m	f							b	f	f		m						
5:30	6:00	a.m.			f		m					m			f						f			f		m						
6:00	6:30	a.m.					m					m			f						f			f		m						
6:30	7:00	a.m.					m					m		f	f						f			f								
7:00	7:30	a.m.					m					m		f	f						f			f		f		m	f			
7:30	8:00	a.m.					b										b											m	f			
8:00	8:30	a.m.					m										b											m	f			
8:30	9:00	a.m.					m										b															
9:00	9:30	a.m.					f																									
9:30	10:00	a.m.					f																									
10:00	10:30	a.m.					f																									
10:30	11:00	a.m.					f																									
11:00	11:30	a.m.					f																									
11:30	12:00	a.m.					f																									
12:00	12:30	p.m.					f																									
12:30	1:00	p.m.					f																									
1:00	1:30	p.m.																														
1:30	2:00	p.m.																														
2:00	2:30	p.m.																														
2:30	3:00	p.m.																														
3:00	3:30	p.m.																														
3:30	4:00	p.m.																														
4:00	4:30	p.m.																														
4:30	5:00	p.m.																														
5:00	5:30	p.m.																														
5:30	6:00	p.m.																														
6:00	6:30	p.m.																														
6:30	7:00	p.m.																														
7:00	7:30	p.m.																														
7:30	8:00	p.m.																														
8:00	8:30	p.m.																														
8:30	9:00	p.m.																														
9:00	9:30	p.m.																														
9:30	10:00	p.m.																														
10:00	10:30	p.m.																														
10:30	11:00	p.m.																														
11:00	11:30	p.m.																														
11:30	12:00	p.m.																														
INTENSIDAD							TOTAL SEMANA																									TOTAL MES
(b) Baja							2							1,5	1		1				1,5	3				1,5							**11,5**
(m) Media							3,5		1			2		2	2		1,5	1,5			2	1	0,5	1		1,5			1,5				**21**
(f) Fuerte					2		1		1					1,5	2,5						2,5		2	4,5		2			1	3			**23**
TOTAL DIA					2		6,5		2			2		5	5,5		2,5	1,5			6	4	2,5	5,5		5			2,5	3			**55,5**

Nuestra Política de Calidad se fundamenta en satisfacer los clientes ejecutando proyectos rentables y de optima calidad, contando con el apoyo del Recurso Humano capacitado y cumpliendo estándares de Seguridad y Salud Ocupacional

CONTROL DIARIO DE LLUVIAS
GC-PC150-DC-F49

REVISIÓN:00
FECHA APROBACIÓN: 13-11-2021

JUNIO

Hora			Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	
0: 00	0:30	a.m.																														
0:30	1:00	a.m.																														
1:00	1:30	a.m.																														
1:30	2:00	a.m.																														
2:00	2:30	a.m.																														
2:30	3:00	a.m.																														
3:00	3:30	a.m.																														
3:30	4:00	a.m.																														
4:00	4:30	a.m.																														
4:30	5:00	a.m.																														
5:00	5:30	a.m.						m																								
5:30	6:00	a.m.						m																								
6:00	6:30	a.m.						m																								
6:30	7:00	a.m.						f																								
7:00	7:30	a.m.			b			f																								
7:30	8:00	a.m.			b			f																								
8:00	8:30	a.m.						f											m													
8:30	9:00	a.m.						m			b							b	m													
9:00	9:30	a.m.						b										b														
9:30	10:00	a.m.			m			b																								
10:00	10:30	a.m.			m			b																								
10:30	11:00	a.m.			m			b			m																					
11:00	11:30	a.m.			f	m		f			m																					
11:30	12:00	a.m.			f	f		f																								
12:00	12:30	p.m.		m		b		f																								
12:30	1:00	p.m.		m				m			m																					
1:00	1:30	p.m.		m				m			m							b	b	f												
1:30	2:00	p.m.		m				f										b	b	f												
2:00	2:30	p.m.		m			m	f										b	b													
2:30	3:00	p.m.					f	b																								
3:00	3:30	p.m.					b	b			b																					
3:30	4:00	p.m.				f	b																									
4:00	4:30	p.m.				f									m																	
4:30	5:00	p.m.	m												m																	
5:00	5:30	p.m.	m					b																								
5:30	6:00	p.m.	m					b																								
6:00	6:30	p.m.	m																													
6:30	7:00	p.m.																														
7:00	7:30	p.m.	b								m																					
7:30	8:00	p.m.	b																													
8:00	8:30	p.m.	b																													
8:30	9:00	p.m.	b																													
9:00	9:30	p.m.																														
9:30	10:00	p.m.																														
10:00	10:30	p.m.																														
10:30	11:00	p.m.																														
11:00	11:30	p.m.																														
11:30	12:00	p.m.																														
INTENSIDAD								TOTAL SEMANA																							TOTAL MES	
(b) Baja			2		1	0,5	1	4			1							2,5	1,5												13,5	
(m) Media			2	2,5	1,5	0,5	0,5	3			2,5				1				1												14,5	
(f) Fuerte					1	1,5	0,5	4,5												1											8,5	
TOTAL DIA			4	2,5	3,5	2,5	2	12			3,5				1			2,5	2,5	1											36,5	

Nuestra Política de Calidad se fundamenta en satisfacer los clientes ejecutando proyectos rentables y de optima calidad, contando con el apoyo del Recurso Humano capacitado y cumpliendo estándares de Seguridad y Salud Ocupacional

AVGR
INGENIERÍA S.A.S.

La Plata (H), 17 de Junio de 2025

POMO-LA PLATA-066

Ingeniera
DIANA ALEJANDRA JIMENEZ CEDIEL
Directora Departamento Administrativo de Planeación
Alcaldía de La Plata Huila

REFERENCIA: CONTRATO INTERVENTORÍA No. 623 DEL 2024 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURÍDICA CONTABLE Y AMBIENTAL A LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO EL POMO EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ASUNTO: SOLICITUD SUSPENSION CONTRATO DE OBRA No. 696 DE 2024.

Estimada ingeniera reciba un cordial saludo,

Se ha recibido la comunicación de fecha 17 de junio de 2025 del Consorcio Infrahuila en la cual se solicita la suspensión del contrato de obra, argumentando que durante el periodo contractual del proyecto han presentado condiciones climáticas adversas, siendo las constantes lluvias que han impactado negativamente la capacidad de llevar a cabo las actividades de construcción de manera eficiente y segura. El Consorcio Infrahuila, manifiesta que esta condiciones ha afectado la programación prevista y han creado desafíos logísticos que han retrasado la finalización del proyecto, situación que se viene presentando desde el 23 de diciembre de 2024 hasta la fecha. Los argumentos anteriormente mencionados han sido reportados por el contratista en la comunicación, la cual se anexa al presente oficio.

La situación reportada por el contratista de obra ha sido verificada por esta interventoría, puesto que es de conocimiento para la entidad contratante, ya que dentro de los informes mensuales de interventoría se han reportado el Estado General del Tiempo con datos tomados directamente del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Durante el periodo del 23 de diciembre de 2024 hasta la fecha, se registró condiciones periódicas de lluvia, lo que ocasionó en las áreas de trabajo dificultad para la movilización y empozamientos de agua, ya que las lluvias sobre el terreno provocaron la formación de surcos y aludes de lodo, lo que afectó la movilidad del personal, equipos y materiales. Este fenómeno, además, ocasionó el empozamiento de agua sobre las excavaciones realizadas, lo que obligó a implementar actividades de drenaje para continuar con las labores programadas.

Telefax: 8673099, Celular: 3208360025
E-mail: interventoriaelpomo@gmail.com
Carrera 7 No. 16 A -29, Neiva - Huila

El empozamiento de agua en las zonas de trabajo dificultan las actividades al aire libre, como la excavación, la colocación de hormigón y la instalación de estructuras, lo que puede llevar a retrasos en el cronograma y costos adicionales; adicionalmente, las superficies mojadas aumentan el riesgo para la seguridad de los trabajadores.



En ocasiones, el contratista de obra tuvo que incurrir a cubrir estructuras sensibles a la humedad con lonas impermeables, para no afectar la calidad de los materiales.




Las lluvias sobre el terreno provocaron la formación de surcos y aludes de lodo, lo que afectó la movilidad del personal, equipos y materiales.


Telefax: 8673099, Celular: 3208360025
E-mail: interventoriaelpomo@gmail.com
Carrera 7 No. 16 A -29, Neiva - Huila





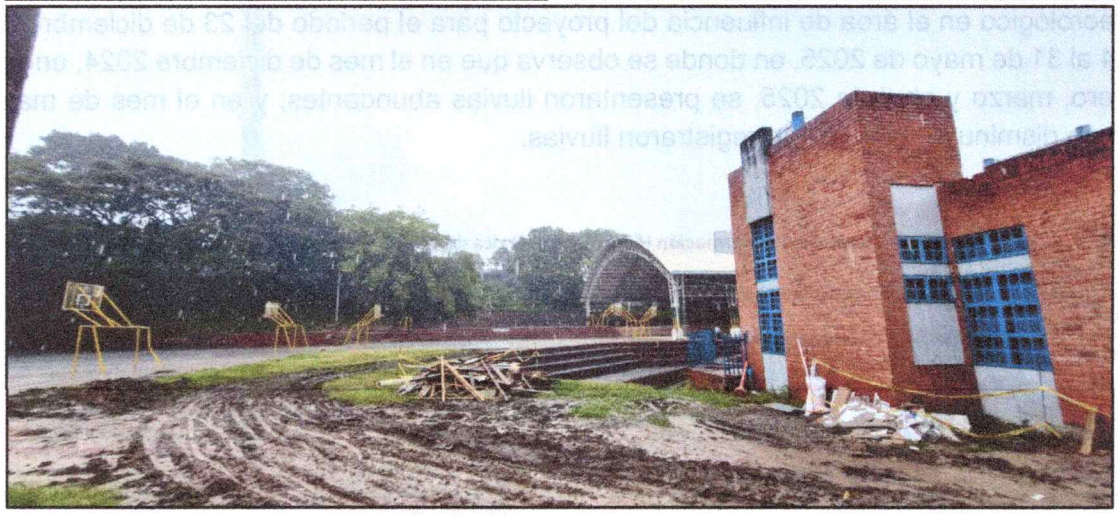

Estas condiciones climáticas extremas imposibilitan la ejecución de las actividades constructivas pendientes, particularmente aquellas relacionadas con la conformación de losetas sobre cama de arena, por ser procesos que requieren condiciones de clima seco y estable para garantizar su correcta ejecución y durabilidad.

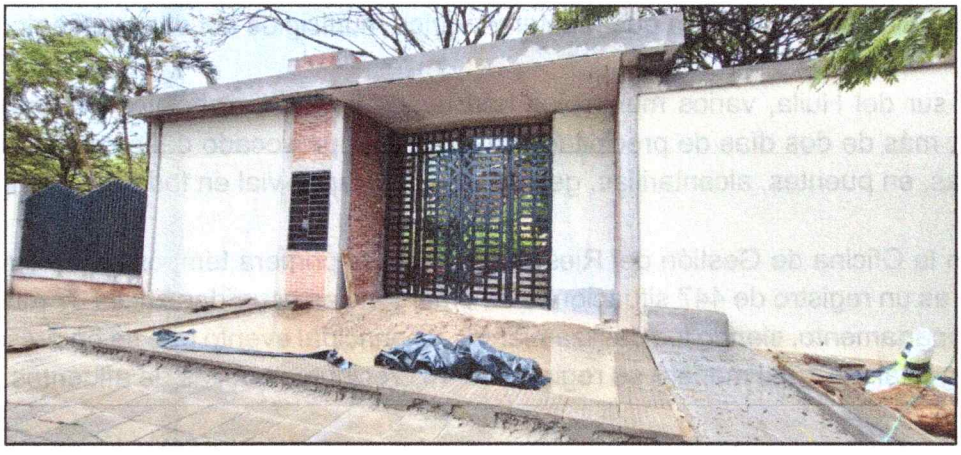

Telefax: 8673099, Celular: 3208360025
E-mail: interventoriaelpomo@gmail.com
Carrera 7 No. 16 A -29, Neiva - Huila

Aunque la clasificación principal se basa en la intensidad por hora, también se pueden considerar los valores mensuales para evaluar la cantidad total de lluvia en un mes. La ***clasificación mensual de lluvias***, a pesar de no ser tan común como la clasificación por intensidad se puede considerar de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN MENSUAL DE LLUVIAS	
CLASIFICACIÓN	**VALOR (mm)**
Lluvias moderadas	< 50
Lluvias normales	50.1 – 150
Lluvias abundantes	150.1 – 300
Lluvias muy abundantes	> 300.1

A continuación, en las siguientes tablas se grafica el comportamiento mensual meteorológico en el área de influencia del proyecto para el periodo del 23 de diciembre de 2024 al 31 de mayo de 2025, en donde se observa que en el mes de diciembre 2024, enero, febrero, marzo y abril de 2025, se presentaron lluvias abundantes; y en el mes de mayo aunque disminuyó, también se registraron lluvias.

IDEAM

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (12/06/2025 11:58)

Nombre estacion:	ESCUELA AGRICOLA LA PLATA [21055020]	**Corriente:**		**Categoría de estación:**	Climática Principal
Latitud:	2.38	**Longitud:**	-75.89	**Elevación:**	1070
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	**Area Operativa:**	Area Operativa 04 - Huila-Caquetá	**Departamento:**	Huila
Municipio:	La Plata	**Fecha instalacion:**	15/12/1969 00:00	**Fecha suspensión:**	
Variable:	PRECIPITACION	**Frecuencia:**	Mensual	**Fecha consulta:**	23/12/2024 00:00-31/05/2025 00:00
Parametro:	Precipitación total mensual	**Unidad medida:**	mm		

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación
2025-01-01 00:00	160.6	Preliminar
2025-02-01 00:00	206.6	Preliminar
2025-03-01 00:00	263.1	Preliminar
2025-04-01 00:00	254.1	Preliminar
2025-05-01 00:00	88.7	Preliminar

Fuente. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)

Aunado a lo anterior, el Consorcio infrahuila presenta documentos que soportan las condiciones climáticas adversas que afectaron varios municipios del departamento:

- En el sur del Huila, varios municipios han tenido lluvias torrenciales por más de 50 horas, más de dos días de precipitaciones, que han provocado daños en la banca de las vías, en puentes, alcantarillas, generando un colapso vial en toda la región.

- Según la Oficina de Gestión del Riesgo del Huila, la primera temporada de lluvias del 2025, es un registro de 447 situaciones de emergencias ocurridas en los 37 municipios del Departamento, siendo los deslizamientos, el principal evento que se ha presentado, 310 en total, de igual manera se registraron 48 crecientes súbitas de afluentes.

Telefax: 8673099, Celular: 3208360025
E-mail: interventoriaelpomo@gmail.com
Carrera 7 No. 16 A -29, Neiva - Huila

- El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), mediante el boletín 426, ha emitido alerta roja por riesgo de deslizamientos en los municipios de Aipe, La Argentina y Acevedo. Asimismo, se encuentran en alerta naranja otros 12 municipios, entre ellos Isnos, San Agustín, Saladoblanco y Pitalito, zonas de influencia directa del proyecto en ejecución.

En vista que la situación es compleja y no es viable la ejecución del proyecto en las condiciones presentadas, con la finalidad de evitar la continuación de la afectación el proyecto, esta interventoría avala la solicitud del contratista y solicita a ustedes la suspensión del contrato de obra a partir del diecinueve (19) de junio de 2025 y hasta el siete (7) de julio de 2025, tiempo en el cual se espera que los motivos que dan origen a la suspensión hayan sido superados y se pueda retomar las actividades de obra.

Quedamos atentos a la revisión y aprobación por parte de la entidad.

Cordialmente;

MIGUEL EDUARDO JOVEN GRAFE
R.L INTERVENTORÍA

Anexo: CONS-INFRAHUILA_RESPUESTA_OFCIO_POMO-LA-PLATA-SOLICITUD DE SUSPENSIÓN.pdf; CONTROL DE LLUVIAS MAYO.pdf; CONTROL DE LLUVIAS JUNIO.pdf.
Copia: Consorcio Infrahuila. Correo: consorcioinfrahuila@gmail.com

Telefax: 8673099, Celular: 3208360025
E-mail: interventoriaelpomo@gmail.com
Carrera 7 No. 16 A –29, Neiva - Huila

	CONTROL DIARIO DE LLUVIAS GC-PC150-DC-F49	REVISION:00 FECHA APROBACIÒN: 13-11-2021

MAYO

Hora			1-may	2-may	3-may	4-may	5-may	6-may	7-may	8-may	9-may	10-may	11-may	12-may	13-may	14-may	15-may	16-may	17-may	18-may	19-may	20-may	21-may	22-may	23-may	24-may	25-may	26-may	27-may	28-may	29-may	30-may	31-may	
			Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	
0: 00	0:30	a.m.																															
0:30	1:00	a.m.																															
1:00	1:30	a.m.																															
1:30	2:00	a.m.																															
2:00	2:30	a.m.																															
2:30	3:00	a.m.																															
3:00	3:30	a.m.																															
3:30	4:00	a.m.																															
4:00	4:30	a.m.																															
4:30	5:00	a.m.																															
5:00	5:30	a.m.																															
5:30	6:00	a.m.																															
6:00	6:30	a.m.												b																			
6:30	7:00	a.m.												b	b																		
7:00	7:30	a.m.												b	b																		
7:30	8:00	a.m.																								b							
8:00	8:30	a.m.					b														m	b				b							
8:30	9:00	a.m.					b								m						m	b				b							
9:00	9:30	a.m.					m							m	m			m			m	b	m	f									
9:30	10:00	a.m.			f									m	m			m			m	b	f	f									
10:00	10:30	a.m.			f									m	m			m				b	f	f									
10:30	11:00	a.m.			f		m							m	f							b	f	f		m							
11:00	11:30	a.m.			f		m					m			f						f		f	f		m							
11:30	12:00	a.m.					m					m			f						f			f		m							
12:00	12:30	p.m.					m					m		f	f						f			f									
12:30	1:00	p.m.										m		f	f						f			f		f				f			
1:00	1:30	p.m.												f			b				f			f		f		m	f				
1:30	2:00	p.m.															b									f		m			f		
2:00	2:30	p.m.					b										m									f					f		
2:30	3:00	p.m.					m		m								m					m		m				f	f		f		
3:00	3:30	p.m.					f		m								m					m		m				f	f				
3:30	4:00	p.m.					f		f																				f				
4:00	4:30	p.m.							f												b								f				
4:30	5:00	p.m.					m														b												
5:00	5:30	p.m.					b														b												
5:30	6:00	p.m.																															
6:00	6:30	p.m.																															
6:30	7:00	p.m.																															
7:00	7:30	p.m.																										m					
7:30	8:00	p.m.																															
8:00	8:30	p.m.																															
8:30	9:00	p.m.																															
9:00	9:30	p.m.																															
9:30	10:00	p.m.																															
10:00	10:30	p.m.																															
10:30	11:00	p.m.																															
11:00	11:30	p.m.																															
11:30	12:00	p.m.																															
INTENSIDAD							TOTAL SEMANA																										TOTAL MES
(b) Baja							2							1,5	1		1				1,5	3				1,5							**11,5**
(m) Media							3,5		1			2		2	2		1,5	1,5			2	1	0,5	1		1,5			1,5				**21**
(f) Fuerte					2		1		1					1,5	2,5						2,5		2	4,5		2			1	3		1,5		**23**
TOTAL DIA					2		6,5		2			2		5	5,5		2,5	1,5			6	4	2,5	5,5		5			2,5	3		1,5		**55,5**

Nuestra Política de Calidad se fundamenta en satisfacer los clientes ejecutando proyectos rentables y de optima calidad, contando con el apoyo del Recurso Humano capacitado y cumpliendo estándares de Seguridad y Salud Ocupacional

	CONTROL DIARIO DE LLUVIAS GC-PC150-DC-F49	REVISION:00 FECHA APROBACIÒN: 13-11-2021

JUNIO

Hora			1-jun	2-jun	3-jun	4-jun	5-jun	6-jun	7-jun	8-jun	9-jun	10-jun	11-jun	12-jun	13-jun	14-jun	15-jun	16-jun	17-jun	18-jun	19-jun	20-jun	21-jun	22-jun	23-jun	24-jun	25-jun	26-jun	27-jun	28-jun	29-jun	30-jun
			Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes
0: 00	0:30	a.m.																														
0:30	1:00	a.m.																														
1:00	1:30	a.m.																														
1:30	2:00	a.m.																														
2:00	2:30	a.m.																														
2:30	3:00	a.m.																														
3:00	3:30	a.m.																														
3:30	4:00	a.m.																														
4:00	4:30	a.m.																														
4:30	5:00	a.m.																														
5:00	5:30	a.m.						m																								
5:30	6:00	a.m.						m																								
6:00	6:30	a.m.						m																								
6:30	7:00	a.m.						f																								
7:00	7:30	a.m.			b			f																								
7:30	8:00	a.m.			b			f																								
8:00	8:30	a.m.						f											m													
8:30	9:00	a.m.						m			b							b	m													
9:00	9:30	a.m.						b										b														
9:30	10:00	a.m.			m			b																								
10:00	10:30	a.m.			m			b																								
10:30	11:00	a.m.			m			b			m																					
11:00	11:30	a.m.			f	m		f			m																					
11:30	12:00	a.m.			f	f		f																								
12:00	12:30	p.m.		m		b		f																								
12:30	1:00	p.m.		m				m			m																					
1:00	1:30	p.m.		m				m			m							b	b	f												
1:30	2:00	p.m.		m				f										b	b	f												
2:00	2:30	p.m.		m			m	f										b	b													
2:30	3:00	p.m.					f	b																								
3:00	3:30	p.m.					b	b			b																					
3:30	4:00	p.m.				f	b																									
4:00	4:30	p.m.				f									m																	
4:30	5:00	p.m.	m												m																	
5:00	5:30	p.m.	m					b																								
5:30	6:00	p.m.	m					b																								
6:00	6:30	p.m.	m																													
6:30	7:00	p.m.																														
7:00	7:30	p.m.	b								m																					
7:30	8:00	p.m.	b																													
8:00	8:30	p.m.	b																													
8:30	9:00	p.m.	b																													
9:00	9:30	p.m.																														
9:30	10:00	p.m.																														
10:00	10:30	p.m.																														
10:30	11:00	p.m.																														
11:00	11:30	p.m.																														
11:30	12:00	p.m.																														

INTENSIDAD		TOTAL SEMANA																													TOTAL MES
(b) Baja		2		1	0,5	1	4			1								2,5	1,5												**13,5**
(m) Media		2	2,5	1,5	0,5	0,5	3			2,5				1					1												**14,5**
(f) Fuerte				1	1,5	0,5	4,5													1												**8,5**
TOTAL DIA		4	2,5	3,5	2,5	2	12			3,5				1				2,5	2,5	1											**36,5**

Nuestra Política de Calidad se fundamenta en satisfacer los clientes ejecutando proyectos rentables y de optima calidad, contando con el apoyo del Recurso Humano capacitado y cumpliendo estándares de Seguridad y Salud Ocupacional

CONTRATO No 623 DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA PLATA Y AVGR INGENIERIA S.A.S

OBJETO	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO EL POMO EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONTRATISTA	**NOMBRE: AVGR INGENIERIA S.A.S** **C.C. NIT: 901.715.571-1** **Rep. Legal: MIGUEL EDUARDO JOVEN GRAFE** **CEDULA:** 7.713.442 de Neiva **DIRECCIÓN**: Carrera 7 No. 16A-29 Neiva Huila **CORREO**: interventoriaelpomo@gmail.com **TELÉFONO**: 3208360025 **CIUDAD**: Neiva Huila
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO DOS MILLONES TREINTA MIL SETENTA Y SEIS PESOS ($102.030.076) M/CTE IVA INCLUIDO
VALOR ADICIONAL No 1	SEIS MILLONES QUINENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRECE ($6.579.013) M/CTE IVA INCLUIDO
VALOR TOTAL	CIENTO OCHO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS ($108.609.089) M/CTE IVA INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	El plazo de ejecución del contrato será cinco (05) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
PLAZO ADICIONAL	Un (01) mes.
PLAZO TOTAL	El plazo de ejecución del contrato será seis (06) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, incluyendo el plazo adicional.
FECHA ACTA DE INICIO	VEINTITRES (23) de DICIEMBRE de 2024
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN	DIECINUEVE (19) de JUNIO de 2025.

En La Plata Huila, a los DIECINUEVE (19) días del mes de JUNIO de 2025, se reunieron la ingeniera **DIANA ALEJANDRA JIMENEZ CEDIEL**, en calidad de supervisora y el Ingeniero **MIGUEL EDUARDO JOVEN GRAFE**, en representación de AVGR ingeniería s.a.s, en calidad de contratista interventor, con la finalidad de firmar EL ACTA DE SUSPENSIÓN No.1, del contrato en mención, con base en las siguientes consideraciones expuestas por el contratista.

Mediante oficio POMO-LA PLATA-066, calendado el diecisiete (17) de junio de 2025, **MIGUEL EDUARDO JOVEN GRAFE**, representante legal de AVGR ingeniería s.a.s, presentó oficio de Aprobación de solicitud de suspensión No. 1, en los siguientes términos:

"(…) En vista que la situación es compleja y no es viable la ejecución del proyecto en las condiciones presentadas, con la finalidad de evitar la continuación de la afectación al proyecto, esta interventoría avala la solicitud del contratista y solicita a ustedes la suspensión del contrato de obra a partir del diecinueve (19) de junio de 2025 y hasta el siete (7) de julio de 2025, tiempo en el cual se espera que los motivos que dan origen a la suspensión hayan sido superados y se pueda retomar las actividades de obra. (…).

Que mediante oficio de fecha 17 de junio de 2025, **JULIO CESAR FIERRO CEDIEL**, representante legal del **CONSORCIO INFRAHUILA**, contratista de obra presentó la solicitud correspondiente a la interventoría, de la siguiente manera:

"En calidad de contratista en mención, me permito solicitar formalmente la suspensión temporal del contrato, con base en hechos de fuerza mayor que imposibilitan la ejecución adecuada de las actividades pendientes."

1. *En los municipios del sur del Huila se han presentado lluvias torrenciales continuas por más de cincuenta (50) horas, situación que ha causado afectaciones severas en las vías, puentes y alcantarillas, generando un colapso vial en toda la región, lo cual limita tanto el acceso como el transporte de materiales y personal.*

2. *La Oficina de Gestión del Riesgo del Huila ha reportado un total de 447 emergencias durante la primera temporada de lluvias del 2025, siendo los deslizamientos de tierra el evento más recurrente, con 310 reportes. Además, se han presentado 48 crecientes súbitas de afluentes.*

3. *El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), mediante el boletín 426, ha emitido alerta roja por riesgo de deslizamientos en los municipios de Aipe, La Argentina y Acevedo. Asimismo, se encuentran en alerta naranja otros 12 municipios, entre ellos Isnos, San Agustín, Saladoblanco y Pitalito, zonas de influencia directa del proyecto en ejecución.*

4. *Estas condiciones climatológicas extremas han afectado de forma directa los frentes de trabajo, particularmente aquellos relacionados con la conformación de losetas en cama de arena, demarcación de zonas de juego sobre placas de polideportivo, mantenimiento y mejoramiento de graderías, pintura sobre carpintería metálica del cerramiento, ampliación de graniplast sobre muros, actividades que requiere condiciones climáticas secas y estables para garantizar su adecuada ejecución, calidad y durabilidad.*

5. *En virtud de lo anterior y con el fin de proteger la integridad del proceso constructivo y los recursos públicos invertidos, solicito la suspensión temporal del contrato y la interventoría lo avala, hasta tanto se superen las condiciones climáticas adversas y se restablezcan las condiciones técnicas mínimas necesarias para continuar con la ejecución de la obra.*

Que mediante oficio POMO-LA PLATA-067 del 17 de junio de 2025, MIGUEL EDUARDO JOVEN GRAFE, representante legal del contratista de interventoría AVGR ingeniería s.a.s, solicitó la suspensión del contrato de interventoría No 623 de 2024, manifestando lo siguiente:

"Se ha recibido la comunicación de fecha 17 de junio de 2025 del Consorcio Infrahuila en la cual se solicita la suspensión del contrato de obra, argumentando que durante el periodo contractual del proyecto han presentado condiciones climáticas adversas, siendo las constantes lluvias que han impactado negativamente la capacidad de llevar a cabo las actividades de construcción de manera eficiente y segura. El Consorcio Infrahuila, manifiesta que esta condiciones ha afectado la programación prevista y han creado desafíos logísticos que han retrasado la finalización del proyecto, situación que se viene presentando desde el 23 de diciembre de 2024 hasta la fecha. Los argumentos anteriormente mencionados han sido reportados por el contratista en la comunicación, la cual se anexa al presente oficio.
(…)

En vista que la situación es compleja y no es viable la ejecución del proyecto en las condiciones presentadas, con la finalidad de evitar la continuación de la afectación el proyecto, esta interventoría avala la solicitud del contratista y solicita a ustedes la suspensión del contrato de obra a partir del diecinueve (19) de junio de 2025 y hasta el siete (7) de julio de 2025, tiempo en el cual se espera que los motivos que dan origen a la suspensión hayan sido superados y se pueda retomar las actividades de obra.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, esta interventoría solicita la suspensión del contrato de interventoría No. 623 de 2024, a partir del diecinueve (19) de junio de 2025 y hasta el siete (7) de julio de 2025, y/o hasta que se superen las causales que dan origen a la suspensión del proyecto."

Así las cosas, la supervisión estima necesaria la suspensión, por lo cual es aceptada y se procede a suscribir la misma hasta que se superen las causales que dan origen a la suspensión del contrato.

En virtud de las anteriores consideraciones, y una vez realizado el respectivo análisis técnico por parte de la supervisión, se logra establecer la necesidad de realizar la suspensión No. 1 al CONTRATO DE INVERVENTORIA No. 623 -2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA PLATA Y AVGR ingeniería, de conformidad con lo establecido en la parte considerativa de la presente acta

Para constancia se firma en la Plata – Huila, por las partes intervinientes a los diecinueve (19) días del mes de junio de 2025.

Firma:
DIANA ALEJANDRA JIMENEZ CEDIEL
Directora del Departamento Administrativo de Planeación
Supervisora

Firma:
Nombre: **MIGUEL EDUARDO JOVEN GRAFE**
Cargo: Contratista – Interventor
AVGR ingeniería s.a.s

Firma:
Nombre: **Mauricio Bonilla Tiaffi (Apoyo D.A.P)**
Proyectó

AVGR
INGENIERÍA S.A.S.

La Plata (H), 17 de Junio de 2025

POMO-LA PLATA-067

Ingeniera
DIANA ALEJANDRA JIMENEZ CEDIEL
Directora Departamento Administrativo de Planeación
Alcaldía de La Plata Huila

REFERENCIA: CONTRATO INTERVENTORÍA No. 623 DEL 2024 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURÍDICA CONTABLE Y AMBIENTAL A LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO EL POMO EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ASUNTO: SOLICITUD SUSPENSION CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 623 DE 2024.

Cordial saludo,

Que, mediante oficio POMO-LA PLATA-066 del 17 de junio de 2025 el interventor AVGR INGENIERIA SAS, emite concepto favorable y aval para la suspensión del contrato de obra No. 696 de 2024:

> *"Se ha recibido la comunicación de fecha 17 de junio de 2025 del Consorcio Infrahuila en la cual se solicita la suspensión del contrato de obra, argumentando que durante el periodo contractual del proyecto han presentado condiciones climáticas adversas, siendo las constantes lluvias que han impactado negativamente la capacidad de llevar a cabo las actividades de construcción de manera eficiente y segura. El Consorcio Infrahuila, manifiesta que esta condiciones ha afectado la programación prevista y han creado desafíos logísticos que han retrasado la finalización del proyecto, situación que se viene presentando desde el 23 de diciembre de 2024 hasta la fecha. Los argumentos anteriormente mencionados han sido reportados por el contratista en la comunicación, la cual se anexa al presente oficio.*
> *(...)*
> *En vista que la situación es compleja y no es viable la ejecución del proyecto en las condiciones presentadas, con la finalidad de evitar la continuación de la afectación el proyecto, esta interventoría avala la solicitud del contratista y solicita a ustedes la suspensión del contrato de obra a partir del diecinueve (19) de junio de 2025 y hasta el siete (7) de julio de 2025, tiempo en el cual se espera que los motivos que dan origen a la suspensión hayan sido superados y se pueda retomar las actividades de obra."*

Telefax: 8673099, Celular: 3208360025
E-mail: interventoriaelpomo@gmail.com
Carrera 7 No. 16 A -29, Neiva - Huila

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, esta interventoría solicita la suspensión del contrato de interventoría No. 623 de 2024, a partir del diecinueve (19) de junio de 2025 y hasta el siete (7) de julio de 2025, y/o hasta que se superen las causales que dan origen a la suspensión del proyecto.

Quedamos atentos a la revisión y aprobación por parte de la entidad.

Cordialmente;

MIGUEL EDUARDO JOVEN GRAFE
R.L INTERVENTORÍA

Anexo: N.A.
Copia: N.A.

Telefax: 8673099, Celular: 3208360025
E-mail: interventoriaelpomo@gmail.com
Carrera 7 No. 16 A -29, Neiva - Huila
