PACOT S.A.S
PROFESIONALES EN ASESORIAS, CAPACITACIONES, OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES INTEGRALES S.A.S
NIT 900.693.242-3

NIVEL 1 "ORDEN DE OBRA":
PROCESO No. OB-006-2026

OBJETO:

"CONSTRUCCION DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURAS METALICAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO HUILA"

PROPONENTE:

PROFESIONALES EN ASESORIAS CAPACITACIONES OBRAS CIVILES Y TRANSPORTE INTEGRALES S.A.S
NIT: 900.693.242-3

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal
Dirección: Carrera 5 No. 10-36 Oficina 503
Email: pacotingn2020@gmail.com

PACOT S.A.S
PROFESIONALES EN ASESORIAS, CAPACITACIONES, OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES INTEGRALES S.A.S
NIT 900.693.242-3

TABLA DE CONTENIDO

PROCESO No. OB-006-2026 PROFESIONALES EN ASESORIAS CAPACITACIONES OBRAS CIVILES Y TRANSPORTE INTEGRALES S.A.S

Remisión de la Propuesta (Anexo 1)	03
Carta presentación de la Propuesta (Anexo 2)	04
Tarjeta Profesional	07
Vigencia Ingeniero Civil	08
Seriedad de la Oferta	20
Certificado de pago de Parafiscales (Anexo 8)	39
Antecedentes Disciplinarios	47
Compromiso Anticorrupción (Anexo 4)	54
Certificado de Inscripción al Banco de Asociados técnicos de FONPACIFICO	57
Certificación Capacidad Financiera (Anexo 11)	59
Balance General y Estado de Resultados corte al 31 de diciembre de 2022.	60
Información sobre la experiencia del Asociado Técnico (Anexo 5)	68
Director de Obra (Anexo 10)	146
Ingeniero Residente (Anexo 10)	156
Profesional SST (Anexo 10)	173
Presupuesto detallado (anexo 9)	197
Análisis de Precios Unitarios (anexo 9)	166
Flujo de Inversión (Anexo 6)	200
Cronograma de Obra	202
Manifestación clara y expresa (Anexo 12)	205
Apoyo a la Industria Nacional	207
Declaración de Multas y Sanciones (Anexo 3)	209

PACOT S.A.S
PROFESIONALES EN ASESORIAS, CAPACITACIONES, OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES INTEGRALES S.A.S
NIT 900.693.242-3

Capacidad Jurídica

Dirección: carrera 5 N° 10 – 36 oficina 503 – Tel: 320 801 7654
Email: pacotingn2020@gmail.com

PACOT S.A.S
PROFESIONALES EN ASESORIAS, CAPACITACIONES, OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES INTEGRALES S.A.S
NIT 900.693.242-3

Carta De Presentación De La Propuesta

Dirección: carrera 5 N° 10 – 36 oficina 503 – Tel: 320 801 7654
Email: pacotingn2020@gmail.com

PACOT S.A.S
PROFESIONALES EN ASESORIAS, CAPACITACIONES, OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES INTEGRALES S.A.S
NIT 900.693.242-3

ANEXO No. 1

CARTA MODELO DE REMISIÓN DE LA PROPUESTA

Neiva, 25 de febrero de 2026

Señores
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL "FONPACÍFICO"
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Director Ejecutivo FONPACÍFICO.
E.S.D

Respetado doctor,

Adjunto la propuesta en original y copia en medio físico, debidamente foliada, en sobre sellados y rotulados, para participar en **PROCESO No. OB-006-2026, NIVEL 1 "ORDEN DE OBRA" DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA DE FONPACÍFICO**, cuyo objeto es seleccionar la propuesta más conveniente para **"CONSTRUCCION DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO – HUILA"** por un valor de **TRES MIL MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS ($3.000.510.580.00) M/CTE.**

Atentamente,

Diego Mauricio Calderon Obando.

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
C.C. No. 1.075.298.785 de Neiva
Representante Legal
PACOT INTEGRALES S.A.S.
Nit. 900.693.242-3

PACOT S.A.S
PROFESIONALES EN ASESORIAS, CAPACITACIONES, OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES INTEGRALES S.A.S
NIT 900.693.242-3

ANEXO No. 2
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Propuesta presentada a
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO
PROCESO No. OB-006-2026.

OBJETO
"CONSTRUCCION DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO – HUILA"

Neiva, 25 de Febrero de 2026

Nosotros los suscritos: PROFESIONALES EN ASESORIAS CAPACITACIONES OBRAS CIVILES Y TRANSPORTE INTEGRALES S.A.S de acuerdo con el Término de Referencia, presentamos propuesta y en caso de que nos sea aceptada por **FONPACÍFICO**, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente. Declaramos así mismo:

1. Que conocemos la información general y los Término de Referencia y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.

2. Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato en el plazo máximo establecido en los Término de Referencia.

3. Que, si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas, y a suscribir el contrato dentro de los términos señalados para ello.

4. Que hemos recibido los siguientes Adendas: _____ (indicar el número y la fecha de cada uno) y manifestamos que aceptamos su contenido.

5. Que la presente propuesta consta de trescientos (302) folios debidamente numerados.

6. Que el valor de la propuesta, se ajustan a los ítems y cantidades que aparecen en el ANEXO 9.

7. Así mismo, declaramos **BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO,** sujeto a las sanciones establecidas en el Artículo 442 del Código Penal (Ley 599 de 2000).

7.1. Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos total responsabilidad frente a **FONPACÍFICO** cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.

7.2. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.
7.3. Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de contratos estatales ni se nos ha hecho efectivo ninguno de los amparos de la garantía única, mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre de este proceso, ni hemos sido sancionados dentro de dicho término por incumplimiento de nuestras obligaciones contractuales por ningún contratante particular ni por autoridades administrativas en condición de terceros.

Atentamente,

ASOCIADO TÉCNICO – PERSONA JURIDICA
Nombre o razón social: PROFESIONALES EN ASESORIAS CAPACITACIONES OBRAS CIVILES Y TRANSPORTE INTEGRALES S.A.S

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
C.C. No. 1.075.298.785 de Neiva
Representante Legal
PACOT INTEGRALES S.A.S.
Tel o Cel. **3124745047**

Firma Diego Mauricio Calderon Obando



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.075.298.785

CALDERON OBANDO
APELLIDOS

DIEGO MAURICIO
NOMBRES

Diego Mauricio Calderon Obando
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 18-AGO-1996

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA
B+ G.S. RH
M SEXO

03-SEP-2014 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-1900100-00650733-M-1075298785-20141206 0041760303A 1 42154589

MATRICULA PROFESIONAL

161037-0629428 TLM

R2022029083

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

INGENIERIA CIVIL

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
ID: 1075298785
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4329971

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1075298785, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 161037-0629428 TLM desde el 11 de Agosto de 2022, otorgado(a) mediante Resolución Nacional R2022029083.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de Febrero del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Diego Mauricio Calderon Obando
Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 20/02/2026 - 18:56:53
Recibo No. S001901156, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN NHGZJpDVpQ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=23 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : PROFESIONALES EN ASESORIAS CAPACITACIONES OBRAS CIVILES Y TRANSPORTE INTEGRALES S.A.S
Sigla : PACOT INTEGRALES S.A.S.
Nit : 900693242-3
Domicilio: Neiva, Huila

MATRÍCULA

Matrícula No: 251951
Fecha de matrícula: 23 de enero de 2014
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CARRERA 5 NO. 10 - 38 OF 503 ED. CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
Barrio : EL CENTRO
Municipio : Neiva, Huila
Correo electrónico : pacotingn2020@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3208017654
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CARRERA 5 NO. 10 - 38 OF 503 ED. CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
Barrio : EL CENTRO
Municipio : Neiva, Huila
Correo electrónico de notificación : pacotingn2020@gmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Acta No. 1 del 20 de enero de 2014 de la Asamblea Constitutiva de Neiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de enero de 2014, con el No. 37282 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada PROFESIONALES EN ASESORIAS CAPACITACIONES OBRAS CIVILES Y TRANSPORTE INTEGRALES S.A.S, Sigla PACOT INTEGRALES S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 20 de enero de 2034.

Cámara de Comercio del Huila

CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 20/02/2026 - 18:56:53
Recibo No. S001901156, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN NHGZJpDVpQ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=23 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

OBJETO SOCIAL

objeto social- 1. La sociedad tendrá como objeto principal, la construcción, consultoría, proveeduría, ¡interventoría, asesoría, diseño, estudios técnicos, de obras civiles en general, en todas las ingenierías, en el área dela construcción: Podrá trabajar en obras civiles en general, diseños, estudios, planeación, planificación, construcción, gestión, demolición, modificación, mantenimiento y desmonte de obras civiles, hidráulicas, eléctricas, electrónicas, de vías, forestales, de medio ambiente, minería, de petróleos, mecánicas, obras sanitarias y ambientales, sistemas de comunicación y obras complementarias, edificaciones y obras de urbanismo, montajes electromecánicos y obras complementarias, sistemas y servicios industriales, obras para minería e hidrocarburos, obras de transporte y complementarias, obras urbanas, suburbanas y rurales. 2. Podrá trabajar en lecturas de medidores y entrega de facturación de empresas de servicio público, como también en mensajería en general suministro, alquiler o venta de cualquier tipo de bienes servicios y servicios propios o de terceros requeridos para la industria del petróleo, ingenierías civil, eléctrica, mecánica, hidráulica, electrónica, petroquímica, industrial, agrícola, forestal, agropecuaria, de vías y similares que se estén desarrollando y que se encuentren relacionadas con su objeto social según las necesidades del cliente y que la empresa este en capacidad de cubrir y ofrecer. Podrá ofrecer bienes y servicios de los cuales se puede resaltar el personal calificado y no calificado, equipos software, hardware, maquinaria, alimentación, químicos, vehículos livianos y pesados. Podrá ejecutar actividades dentro y fuera del país, podrá construir, tornar en arriendo bienes muebles e inmuebles; actividades para el cumplimiento y logro del objeto social, la empresa podrá ejecutar convenios, contratos, actos, operaciones, negocios y acuerdos que fueren necesarios, en las siguientes actividades – Prestar servicios profesionales, técnicos, tecnológicos, operativos y de asesoría en aspectos de la ingeniería y la arquitectura. ; En el área de consultoría adelantar estudios e investigaciones en todas las ramas de las ingenierías, con respecto a la parte de la agricultura y el desarrollo urbano, podrá trabajar en las regiones climáticas estudios macroeconómicos aprovechamiento y uso de la tierra, aprovechamiento y usos de los recursos hídricos, infraestructura física en todos los sistemas de riego por gravedad, embalses por desviación, construcción de gaviones y su mantenimiento sistemas de riego por bombeo, ríos, lagos, pozos , redes de drenaje y riego, sistemas de riegos por regaderas, por goteo, administración de campos de riego, control de ríos y todo lo relacionado con riego natural y mecanizado; podrá comprar, vender o alquilar software y equipos; compra, venta y compraventa de todo tipo de dotación para instituciones de salud, artículos de ferretería, materiales y equipos para la construcción, materiales y equipos eléctricos y electrónicos; compra y venta de toda clase de torres metálicas; insumos y productos agropecuarios, insumos y productos forestales, artículos para la oficina, equipos de computación, equipos de video y sonido equipos y muebles para oficina, artículos de vestuario y seguridad industrial, productos para la canasta familiar, insumo y equipos para el manejo de residuos sólidos, insumo y equipos para el tratamiento de aguas residuales, insumos y equipos para el tratamiento de agua potable, maquinaria y herramienta para la construcción y minería, maquinaria y herramienta para la agroindustria, maquinaria y herramienta para el sector agropecuario y minero, maquinaria y herramienta para el sector forestal, vehículos automotores y sus repuestos. Importación y exportación de toda clase de maquinaria, repuestos, vehículos y materiales que sean requeridos para llevar a cabo el objeto social de la empresa; compra, venta, administración, mantenimiento, arriendo, alquiler y gravámenes de bienes muebles e inmuebles, vehículos automotores, tractores, compactadores de basura, maquinaria liviana y pesada para el comercio, obras de infraestructura y la industria, sus partes y accesorios y demás vehículos terrestres, fluviales, y en general todo aquello que sea susceptible de serlo teniendo en cuenta el objeto de la empresa: Compra, venta, suministro de minerales de la industria química y conexas, materiales

---

plásticos y manufacturas de estas materias plásticas y manufacturas de estas materias, madera, carbón mineral, vegetal, manufactura de madera, materias textiles y sus manufacturas, máquinas y aparatos para la reproducción de sonidos, aparatos para la reproducción o grabación de imágenes y sonido en televisión y sus partes y accesorios, material de transporte, y accesorios y mercancías y productos diversos. - En el área de la construcción efectuar obras civiles en general, diseños, estudios, planeación, planificación, construcción, gestión, demolición, modificación, mantenimiento y desmonte de obras civiles, obras civiles hidráulicas, eléctricas, electrónicas, de vías forestales, de medio ambiente, mecánicas, obras sanitarias y ambientales, sistemas de comunicación y obras complementarias, edificaciones y obras de urbanismo, montajes electromecánicos y obras complementarias, sistemas y servicios industriales, obras para minería e hidrocarburos, obras de transporte y complementarias, obras urbanas, suburbanas y rurales, ejecución de programas de reforestación, manejo de cuencas hidrográficas, recuperación de tierras, agricultura sostenible, construcción de acueductos alcantarillados, producción de material vegetal y de saneamiento básico; - Prestar servicios de reparación y mantenimiento de vehículos, maquinaria, equipos de toda índole y en instalaciones locativas; adelantar o ejecutar planes de vivienda de interés social; prestación y operación de servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios, conforme a las leyes vigentes que regulan esta materia; realizar campañas de divulgación por medios audio visuales e impresos: Ejecutar proyectos de comunicación, de promoción y divulgación que sistematicen experiencias y metodologías en el campo tecnológico organizativo y administrativo que contribuyan a dinamizar los procesos comunitarios dirigidos a ellas mismas, a organizaciones sociales, entidades públicas y privadas que actúen de acuerdo con su objetivo; asesorar en la elaboración, formulación y ajustes de planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial de las entidades territoriales, asesorar en la elaboración formulación y/o gestión de proyectos para ser inscritos en los bancos de proyectos de inversión nacional, departamental y municipal y en los planes de desarrollo de los entes territoriales; producción, transformación, comercialización, venta, distribución e intermediación de toda clase de productos, insumos y materias primas para el sector agropecuario, agroindustrial, forestal y minero; facilitar y coordinar la producción y la comercialización de bienes primarios producidos por los campesinos y por las organizaciones campesinas y de productores agropecuarios, así como establecer relaciones entre estos y la empresa; construir operar y administrar plantas de procesamiento industrial y agroindustrial; asociarse con otras entidades para lograr asistencia técnica para sí o para sus asociados; agenciar, representar y promover las entidades vinculadas a los diferentes sectores de la economía como el sector de la producción agropecuaria, el sector del medio ambiente, el sector del agroturismo, el sector de la economía solidaria, el sector de comercio de productos agropecuarios, etc.; En el ámbito nacional e internacional, establecidas o no en colombia; firmar celebrar contratos y convenios con ong nacionales e internacionales y con entidades del sector público y privado en todo lo relacionado con el presente artículo, igualmente se podrá recibir ayudas económicas y en especie de organizaciones como ong nacionales e internacionales para el desarrollo del presente objeto social. ; La empresa en desarrollo del objeto social y para el cumplimiento de las actividades que lo constituye, la empresa podrá celebrar y ejecutar en su propio nombre o por cuenta de terceros o en participación con ellos todos los actos, contratos y operaciones comerciales, industriales, financieras, sobre bienes muebles e inmuebles, que sean necesarios para el buen funcionamiento de la empresa, como construir, adquirir, enajenar bienes muebles e inmuebles, darlos o tomarlos en arrendamiento, pignorarlos e hipotecarios según el caso, podrá además girar, aceptar, endosar, ceder, protestar y general toda clase de efectos de comercio o civiles. Podrá prestar toda clase de servicios a personas naturales o jurídicas, tanto del orden municipal, departamental y nacional, ya sean empresariales o estatales del orden gubernamental. Podrá trabajar en sistemas de control y supervisión de avalúos de estudios de títulos de: Viviendas, establecimientos comerciales,

construcción y mejoras, podrá realizar estudios y planes estratégicos de automatización, formulación de propuestas para gestión de proyectos, asistencia técnica, y asesorar en servicios y seguimiento de proyectos planeación y gestión pública, finanzas públicas, podrá trabajar en contratos con empresas y podrá asesorar a personas o empresas particulares o privadas o de orden gubernamental en estudios técnicos para su constitución legal, funcionamiento y logro de sus objetivos, planeación y desarrollo de métodos dirigidos a lograr un rendimiento óptimo en el menor tiempo posible, elaboración de proyectos y supervisión de los mismos. En desarrollo del objeto social para cumplimiento de las actividades que lo constituyen, la sociedad podrá celebrar y ejecutar en su propio nombre o por cuenta de terceros o en participación con ellos, todos los actos, contratos y operaciones comerciales industriales, financieras, sobre bienes muebles e inmuebles, que sean necesarios para el buen funcionamiento de la empresa para construir, adquirir, enajenar bienes muebles e inmuebles, darlos o tomarlos en arrendamiento, pignorarlos e hipotecarios según el caso, podrá además girar, aptar, endosar, ceder, protestar y en general toda clase de efectos de comercio o civiles. Podrá prestar toda clase de servicios jurídicos a personas naturales o jurídicas, asesoramiento en litigios, procesos de derecho civil, penal, administrativo, laboral y demás ramas del derecho. Podrá representar a otras sociedades o consorciarse con ellas para licitar todo lo que tenga que ver con el objeto social. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lisita tanto en colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto encionado así como cualquier actividad similar conexa o complementaria o que permitan desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. 3. Tierras, agricultura sostenible, construcción de acueductos y alcantarillados, construcción, interventoría, asesoría, asistencia técnica, revisión, ejecución de obras relacionadas con la conservación, recuperación, descontaminación del medio ambiente, purificación de aguas o áreas que estén relacionadas con los recursos naturales renovables y no renovables, producción de material vegetal y de saneamiento básico, la realización directa o indirectamente de actividades de exploración, explotación, operación transporte y comercialización de hidrocarburos y/o gaseosos, con recursos propios o de terceros diseños, estudios de factibilidad, construcción y montaje, interventoría, asesoría, consultoría, asistencia técnica, revisión, operación y mantenimiento preventivo o correctivo de campos petroleros, oleoductos, acueductos, redes de agua, de petróleo o de gas, soldadas o roscadas, montajes industriales de obras civiles y eléctricas, mecánicas, sanitarias, hidráulicas, petroquímicas, industriales, agroindustriales y similares que se estén desarrollando y que se encuentren relacionadas con su objeto social según las necesidades del cliente y que la empresa este en capacidad de cubrir y ofrecer. Trabajará en diseño, estudio de factibilidad, construcción, interventoría, asesoría, asistencia técnica, revisión, ejecución de obras relacionadas con soldaduras api, asme, mig tic, soldaduras especiales y de mantenimiento. La empresa en consultoría podrá trabajar en todo lo referente a la minería, a lo forestal, en los ramos de transporte y telecomunicaciones, energéticos, industriales, agroindustriales, ambientales y de ordenamiento territorial, diseño estudios e interventorías para obras civiles, eléctricas, formulación y evaluación de programas, planes y proyectos de toda índole para entidades públicas y privadas, levantamientos topográficos y elaboración de planos y cartografía. ; Podrá trabajar en pavimentos rígidos y flexibles, podrá producir, comercializar, suministrar y transportar mezcla asfáltica; compra y venta de material de playa; producción de triturados , base y sub-Base para pavimentos, podrá extraer material de arrastre de ríos, como gravillas, arenas, etc. ; Laborará en la explotación de recursos naturales, manejo y control ambiental; se dedicará al estudio de suelos, sistemas de drenaje, clasificación de tierras, sus usos, estudios de aptitud, pruebas de campo, pruebas de laboratorio, control de calidad a cualquier trabajo de obras de ingeniería y sus similares, planeación de uso de la tierra, manejo de cuencas hidrográficas; podrá dedicarse a la fabricación

---

y comercialización de prefabricados para la construcción; podrá ejecutar planes de vivienda de interés social, gerencia integral en proyectos de vivienda de interés social, proyectos y estudios arquitectónicos, podrá realizar montajes hidráulicos, térmicos, mecánicos,sanitarios, forestales, de petróleos, del medio ambiente y otros, en la parte de ingeniería de sistemas podrá realizar estudios y análisis de sistemas de información comercial como también diagnosticar los mismos, actualizará bases de datos que logren el objetivo de cambio veraz y eficiente, además llevara control de seguridad informática; podrá trabajaren vías de comunicación en superficie, túneles, puentes; como también podrá comprar, vender, suministrar y transportar materiales y productos que tengan relación con todas las ingenierías, podrá dedicarse al comercio de las partes, implementos, artículos para la construcción y partes eléctricas, para complementar lo anterior podrá crear almacenes, podrá trabajar en todo lo referente a las comunicaciones y telefonía, la empresa en su labor trabajará en estaciones y subestaciones de energía, líneas de transmisión y súbtransmisión de energía, diseño y construcción de redes de baja media y alta tensión aéreas y subterráneas, redes lógicas; cercas eléctricas, gestión energética, energía eléctrica, telefonía en general, montajes de tubería a presión, cableado estructural, cableado en general, postería; podrá comercializar productos, máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; podrá crear talleres de mecánica y pintura; trabajará en la elaboración de proyectos y supervisión de los mismos. 4. Realizar todo tipo de suministro de papelería. Así mismo podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en colombia como el extranjero; la sociedad podrá llevar acabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza, que ellas fuere relacionadas con el objeto mencionado, así como cualquier actividad similar, conexa complementaria o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

	* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor	$ 3.000.000,00
No. Acciones	30,00
Valor Nominal Acciones	$ 100.000,00
	* CAPITAL SUSCRITO *
Valor	$ 3.000.000,00
No. Acciones	30,00
Valor Nominal Acciones	$ 100.000,00
	* CAPITAL PAGADO *
Valor	$ 3.000.000,00
No. Acciones	30,00
Valor Nominal Acciones	$ 100.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Del representante legal: actuara como representante legal de la sociedad el gerente general en ejercicio del cargo. El gerente general será reemplazado en sus faltas absolutas, temporales, ocasionales o accidentales por el suplente del gerente, quien actuara con las mismas facultades que aquel, pero con las limitaciones establecidas en los estatutos. Los representantes legales tendrán la administración y gestión de los negocios sociales con sujeción a la ley, los estatutos sociales, los reglamentos y resoluciones de la asamblea general de accionistas

---

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

funciones del representante legal: La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. El representante legal está facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto de la sociedad, sin límite de cuantía. Serán funciones específicas del cargo, las siguientes: A) constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. B) cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales. C) organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. D) velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. E) certificar conjuntamente con el contador de la compañía los estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. F) designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones correspondientes, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. G) celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. H) cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales y en estos estatutos.Parágrafo.- El representante legal queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, son entidades públicas, privadas y mixtas.

LIMITACIONES A LA REPRESENTACIÓN LEGAL

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores dela sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 010 del 28 de junio de 2023 de la Asamblea General De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 05 de julio de 2023 con el No. 68877 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION

CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 20/02/2026 - 18:56:54
Recibo No. S001901156, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN NHGZJpDVpQ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=23 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

REPRESENTANTE LEGAL DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO C.C. No. 1.075.298.785

Por Acta No. 008 del 07 de noviembre de 2022 de la Reunion Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 13 de diciembre de 2022 con el No. 66388 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	FRANCISCO JAVIER SALAS DEVIA	C.C. No. 12.196.776

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 3 del 14 de enero de 2020 de la Asamblea General Extraordinaria De Accionistas	55789 del 23 de enero de 2020 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4290
Actividad secundaria Código CIIU: N7730
Otras actividades Código CIIU: N8299 G4761

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 20/02/2026 - 18:56:54
Recibo No. S001901156, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN NHGZJpDVpQ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=23 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $2.439.032.938,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



Yira Marcela Chilatra Sánchez
Secretaria Jurídica

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

PACOT S.A.S
PROFESIONALES EN ASESORIAS, CAPACITACIONES, OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES INTEGRALES S.A.S
NIT 900.693.242-3

Garantía Seriedad de la Oferta

Dirección: carrera 5 N° 10 – 36 oficina 503 – Tel: 320 801 7654
Email: pacotingn2020@gmail.com

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN - PATRICLSUSP02V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5608541313

PÓLIZA No: 560 - 47 - 994000198517 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **NEIVA** COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN	DIA	MES	AÑO
	25	02	2026

FECHA DE IMPRESIÓN	DIA	MES	AÑO
	25	02	2026

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **PROFESIONALES EN ASESORIAS CAPACITACIONES OBRAS CIVILES Y TRANSPORTE INTEGRALES S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.693.242-3**

DIRECCIÓN: CARRERA 5 10 38 OF 503 ED CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA CIUDAD: NEIVA, HUILA TELÉFONO: 6088621217

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL -FONPACIFICO** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.039.684-5**

BENEFICIARIO: **FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL -FONPACIFICO** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.039.684-5**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PLIEGO DE CONDICIONES			
SERIEDAD DE LA OFERTA	25/02/2026	02/05/2026	300,051,292.00

BENEFICIARIOS
NIT 901039684 - FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL -FONPACIFICO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE PARA LA SERIEDAD DE LA OFERTA SEGUN TERMINO DE REFERENCIA DEFINITIVO PROCESO No. OB-006-2026, RELACIONADA CON CONSTRUCCION DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA, CONTRA EL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL PROPONENTE, ESPECIALMENTE LA DE CELEBRAR EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES DE ADJUDICACION.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***300,051,292.00	$ **********450,077	$****11,000.00	$ *******87,605	$ **********548,682

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
AGENCIA JYJ SEGUROS LTDA	8915	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000560854131

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBDE20700A0BFD7D5E

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - **Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22 - **Celular:** 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m **Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:**
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento
Compañía de Seguros
GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONDICIONES GENERALES PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN

ASEGURADORA SOLIDARIA, EN ADELANTE DENOMINADA LA ASEGURADORA, EXPIDE EL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, SUJETO A ESTAS CONDICIONES GENERALES, LAS CUALES ESTÁN DEBIDAMENTE DEPOSITADAS EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Y A LAS CONDICIONES PARTICULARES QUE SE DELIMITAN EN SU ALCANCE Y VIGENCIA SEGÚN LOS AMPAROS OTORGADOS EN FORMA EXPRESA EN LA CARÁTULA DEL SEGURO, CONFORME A LO NORMADO EN EL ARTÍCULO 1047 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

1. AMPAROS

1.1 SERIEDAD DE LOS OFRECIMIENTOS.

LA ASEGURADORA CUBRE A LA ENTIDAD DE LAS SANCIONES IMPUTABLES AL PROPONENTE DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, EL ESTUDIO PREVIO Y/ O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS: (I) LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO. (II) LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, EL ESTUDIO PREVIO Y/O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN, SE PRORROGUE O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES. (III) EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. IV) LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

1.2 BUEN MANEJO DE ANTICIPO.
CUBRE CONTRA LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DERIVADOS DE LA NO INVERSIÓN, USO INDEBIDO, APROPIACIÓN INDEBIDA DE LAS SUMAS EN DINERO O ESPECIE QUE SEAN ENTREGADAS EN CALIDAD DE ANTICIPO. SE ENTIENDE QUE ELLO HA OCURRIDO CUANDO LOS BIENES O DINERO NO SE HAN APLICADO O UTILIZADO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O EN LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. CUANDO SE TRATE DE BIENES ENTREGADOS EN CALIDAD DE ANTICIPO, ÉSTOS DEBERÁN TASARSE EN DINERO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO.

1.3. PAGO ANTICIPADO CUBRE CONTRA LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DERIVADOS DEL NO REINTEGRO DE LAS SUMAS EN DINERO O ESPECIE QUE SEAN ENTREGADAS EN CALIDAD DE PAGO ANTICIPADO Y QUE EL CONTRATISTA NO DEVUELVA A LA ENTIDAD CONTRATANTE. EN CASO DE CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES, SE ESTIMARÁ LA PROPORCIÓN DE LA PARTE CUMPLIDA DEL CONTRATO, PARA DESCONTARLA DE LA INDEMNIZACIÓN.

1.4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CUBRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL CONTRATISTA CON LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, Y CONTEMPLA TAMBIÉN EL CUMPLIMIENTO TARDÍO, DEFECTUOSO O IMPERFECTO DE LAS MISMAS, ASÍ COMO MULTAS Y CLÁUSULA PENAL, SEGÚN SE PACTEN EN EL CONTRATO.

1.5. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, BIENES Y EQUIPOS QUE ENTREGUE EL CONTRATISTA CUBRE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA CAUSADOS POR LA MALA CALIDAD, LA CALIDAD DEFICIENTE O DESEMPEÑO DEFECTUOSO DE LOS ELEMENTOS, BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA, FRENTE A LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA LEY 1480 DE 2011 Y LAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN, Y AQUELLAS ADICIONALES PROPIAS DEL BIEN, EQUIPO Y ELEMENTO, ASÍ COMO AQUELLAS QUE SE PACTEN EN EL CONTRATO.

1.6. CALIDAD DE LOS SERVICIOS CUBRE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA CAUSADOS POR LA MALA CALIDAD, CALIDAD DEFICIENTE O DESEMPEÑO DEFECTUOSO, FRENTE A LAS ESPECIFICACIONES QUE SE PACTEN EN EL CONTRATO, TODOS ELLOS SIEMPRE QUE SEAN EXIGIBLES EN LA ETAPA POST-CONTRACTUAL, UNA VEZ FINALICE EL PLAZO DE EJECUCIÓN.

1.7. PROVISIÓN DE REPUESTOS CUBRE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO POR NO SUMINISTRAR LOS REPUESTOS, PARTES, MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA, FRENTE A LAS ESPECIFICACIONES QUE SE PACTEN EN EL CONTRATO O PREVISTAS EN LA LEY EN LA ETAPA POSTCONTRACTUAL.

1.8. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES CUBRE A LA ENTIDAD EN SU CALIDAD DE CONTRATANTE, CONTRA LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, DERIVADAS DE CONTRATOS LABORALES A QUE ESTÁ OBLIGADO, EN SU CALIDAD DE EMPLEADOR, INCLUIDAS LAS DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES, LIQUIDACIÓN DE

CONTRATOS DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES DE LEY ASUMIDAS POR EL EMPLEADOR Y QUE GUARDAN RELACIÓN DIRECTA CON EL PERSONAL UTILIZADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

1.9. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRIRÁ A LA ENTIDAD EN CALIDAD DE CONTRATANTE, CON MOTIVO DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, INDEPENDIENTEMENTE DE SU CAUSA, SUFRIDOS POR LA OBRA ENTREGADA, IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO.

1.10. OTROS AMPAROS LA PRESENTE PÓLIZA TAMBIÉN CUBRE A LA ENTIDAD EN SU CALIDAD DE CONTRATANTE, POR LOS AMPAROS ADICIONALES QUE SE DETERMINEN Y DEFINAN ESPECÍFICAMENTE EN EL CONTRATO Y QUE SE ANOTAN EXPRESAMENTE EN LA CARÁTULA O EN ANEXOS QUE SE EXPIDAN EN AMPLIACIÓN A LA PRESENTE PÓLIZA.

2. EXCLUSIONES.

2.1. CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

2.2. MODIFICACIONES NO INFORMADAS.
EN CASO DE PACTARSE O IMPONERSE CONDICIONES, QUE CAMBIEN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, QUE NO SEAN REPORTADAS DEBIDAMENTE AL ASEGURADOR, Y QUE NO SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR ÉL, ÉSTE QUEDARÁ RELEVADO DEL PAGO DE LA PRESTACIÓN ASEGURADA, DERIVADA DE TALES CAMBIOS, PACTOS O MODIFICACIONES.

2.3. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.
ESTE SEGURO NO CUBRE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS RECLAMOS DE TERCEROS AJENOS AL CONTRATO, CON OCASIÓN DE EVENTUALES RESPONSABILIDADES DE CARÁCTER CIVIL EXTRACONTRACTUAL. TAMPOCO SE CUBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE CARÁCTER PATRONAL, DERIVADA DE ACCIDENTE LABORAL.

2.4. VICIOS POR TRANSCURSO DEL TIEMPO.
LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL SIMPLE TRANSCURSO DEL TIEMPO SOBRE BIENES Y OBJETOS.

2.5. USO INDEBIDO.
CUBRE EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADA LA ENTIDAD CONTRATANTE

3. TÉRMINO DEL AMPARO.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SE REGISTRA EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA. CUANDO EL CONTRATISTA O LA ENTIDAD REQUIERAN AL ASEGURADOR PARA AMPLIAR LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA, EL ASEGURADOR PODRÁ HACERLO, MEDIANTE ANEXO A LA PÓLIZA, LAS VIGENCIAS PODRÁN SER MODIFICADAS DE COMÚN ACUERDO CON EL ASEGURADOR.

4. VALOR ASEGURADO.

EL VALOR ASEGURADO PARA CADA UNO DE LOS AMPAROS OTORGADOS SE REGISTRA EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA. CUANDO EL CONTRATISTA O LA ENTIDAD REQUIERAN AL ASEGURADOR PARA AMPLIAR EL VALOR ASEGURADO DE LA GARANTÍA, EL ASEGURADOR PODRÁ HACERLO, MEDIANTE ANEXO A LA PÓLIZA, LAS SUMAS ASEGURADAS PODRÁN SER MODIFICADAS DE COMÚN ACUERDO CON EL ASEGURADOR. EN TODO CASO, LAS SUMAS ASEGURADAS PARA CADA AMPARO CONSTITUYEN EL LÍMITE MÁXIMO Y NO SE ACUMULAN ENTRE SÍ, PARA AUMENTAR EL VALOR ASEGURADO TOTAL DE LA GARANTÍA. LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN EL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 1074 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

5. SINIESTROS.

5.1. AVISO LA ENTIDAD ESTARÁ OBLIGADA A DAR NOTICIA AL ASEGURADOR DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LO HAYAN CONOCIDO O DEBIDO CONOCER. ESTE TÉRMINO PODRÁ AMPLIARSE, MAS NO REDUCIRSE POR LAS PARTES. EL ASEGURADOR NO PODRÁ ALEGAR EL RETARDO O LA OMISIÓN SI, DENTRO DEL MISMO PLAZO, INTERVIENE EN LAS OPERACIONES DE SALVAMENTO O DE COMPROBACIÓN DEL SINIESTRO.

5.2. CUANTÍA Y OCURRENCIA EN CONCORDANCIA CON LO NORMADO EN EL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA ENTIDAD DEBERÁ ACREDITAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA CUANTÍA DE LA RECLAMACIÓN.

SIN PERJUICIO DE LA LIBERTAD QUE TIENE LA ENTIDAD PARA DEMOSTRAR LA OCURRENCIA Y LA CUANTÍA DEL SINIESTRO, ESTA SE PODRÁ ACREDITAR CON LA COMUNICACIÓN EN LA QUE CONSTA EL INCUMPLIMIENTO QUE RESULTE DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA TAL FIN EN EL CONTRATO Y QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y PARA EXIGIR EL PAGO DE LA CLÁUSULA PENAL DE APREMIO Y/O CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.

5.3. OPORTUNIDAD PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN ASEGURADA EL ASEGURADOR ESTARÁ OBLIGADO A EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE LA ENTIDAD ACREDITE SU DERECHO EN LA FORMA PREVISTA EN EL NUMERAL 5.2. ANTERIOR. VENCIDO ESTE PLAZO, EL ASEGURADOR RECONOCERÁ Y PAGARÁ A LA ENTIDAD, ADEMÁS DE LA OBLIGACIÓN A SU CARGO Y SOBRE EL IMPORTE DE ELLA, UN INTERÉS MORATORIO IGUAL AL CERTIFICADO COMO BANCARIO CORRIENTE POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, AUMENTADO EN LA MITAD.

5.4. COMPENSACIONES SI LA ENTIDAD AL MOMENTO DE TENER CONOCIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO O EN CUALQUIER MOMENTO POSTERIOR A ESTE Y ANTERIOR AL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA GARANTIZADO POR CUALQUIER CONCEPTO, LA INDEMNIZACIÓN SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE LAS ACREENCIAS SIEMPRE Y CUANDO ESTAS SEAN OBJETO DE COMPENSACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY, DE CONFORMIDAD CON LO REGLADO EN LOS ARTÍCULOS 1714 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO CIVIL. LOS MONTOS COMPENSADOS SE DISMINUIRÁN DEL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN. EN AQUELLOS CASOS EN QUE LA ASEGURADORA HAYA PAGADO INDEMNIZACIONES EN VIRTUD DE DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO, UNA VEZ SE INICIE LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN DEL RESPECTIVO CONTRATO LA ENTIDAD DEBERÁ COMUNICAR AL ASEGURADOR SI HAY SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA, PARA LOS FINES QUE EL ASEGURADOR ESTIME PERTINENTES.

5.5. NO PROPORCIONALIDAD.
DE PRESENTARSE INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES, LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS A CARGO DEL ASEGURADOR NO SE TASARÁ EN PROPORCIÓN DEL VALOR ASEGURADO EQUIVALENTE AL PORCENTAJE INCUMPLIDO DE LA OBLIGACIÓN.

5.6. PROPORCIONALIDAD DE LA CLÁUSULA PENAL EN VIRTUD DE LO PREVISTO EN EL ART. 1596 DEL CÓDIGO CIVIL SI EL CONTRATISTA CUMPLE SOLAMENTE UNA PARTE DE LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL, Y LA ENTIDAD ACEPTA ESTA PARTE, EL PRIMERO TENDRÁ DERECHO A QUE SE REBAJE PROPORCIONALMENTE LA PENA ESTIPULADA EN LA CLÁUSULA PENAL.

6. INOPONIBILIDAD A LA ENTIDAD NO LE SERÁN OPONIBLES POR PARTE DEL ASEGURADOR LAS EXCEPCIONES O DEFENSAS PROVENIENTES DE LA CONDUCTA DEL TOMADOR DEL SEGURO, EN ESPECIAL LAS DERIVADAS DE LAS INEXACTITUDES O RETICENCIAS EN QUE ÉSTE HUBIERE INCURRIDO CON OCASIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO NI EN GENERAL, CUALESQUIERA OTRAS EXCEPCIONES QUE POSEA EL ASEGURADOR EN CONTRA DE LA PERSONA GARANTIZADA.

7. CESIÓN SI POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, LA ASEGURADORA RESOLVIERA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ASÍ LO CONVENGA CON LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA ASEGURADORA O DE QUIEN ELLA DESIGNE, SEGÚN EL OBJETO CONTRACTUAL.

6. PRESCRIPCIÓN.

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, SE REGIRÁ CONFORME LO DISPONE EL ARTÍCULO 1081 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

7. DOMICILIO.

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA EL DOMICILIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

Transacción Aprobada

Si presenta algún inconveniente al realizar la transacción comuníquese con la línea: 3152254421

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	Aseguradora Solidaria de Colombia
Dirección:	Cll 100 # 9a - 45, Piso 12 - Bogotá - Colombia
Teléfono:	#789 opción 4
Nit:	8605246546

DATOS DEL CLIENTE	
Tipo de Identificación:	5608541313
Identificación:	192.230.104.6
Nombre:	PROFESIONALES EN ASESORIAS CAPACITACIONES OBRAS CIVILES Y TR
Email:	yinasuarez58@gmail.com
IP:	192.230.104.6

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	56085413130
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	25/02/2026
Ticket ID:	56085413130
Transacción/CUS:	90491665
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada

DATOS DEL PAGO	
Concepto:	POLIZAS
Ciclo Transacción:	5
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1001
Total:	548682
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÃ□GINA

RETORNAR AL COMERCIO

PACOT S.A.S
PROFESIONALES EN ASESORIAS, CAPACITACIONES, OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES INTEGRALES S.A.S
NIT 900.693.242-3

Certificado Parafiscales
Anexo 7

Dirección: carrera 5 N° 10 – 36 oficina 503 – Tel: 320 801 7654
Email: pacotingn2020@gmail.com

PACOT S.A.S
PROFESIONALES EN ASESORIAS, CAPACITACIONES, OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES INTEGRALES S.A.S
NIT 900.693.242-3

ANEXO No. 7

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO**, identificado con 1.075.298.785, en mi condición de Representante Legal de PROFESIONALES EN ASESORIAS CAPACITACIONES OBRAS CIVILES Y TRANSPORTE INTEGRALES S.A.S identificada con NIT 900.693.242-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Neiva certifico el pago de los siguientes aportes, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto por el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 del 10 de Mayo de 2005.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

Dada en Neiva a los (25) días del mes de febrero de 2026.



FIRMA ----------
DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
C.C. No. 1.075.298.785 de Neiva
Representante Legal
PACOT INTEGRALES S.A.S.
Nit. 900.693.242-3

NOTA: Debe adjuntar las planillas de pago de los últimos seis (6) meses.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PACOT INTEGRALES SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900693242
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	pacot ii
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-02-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-24
FECHA DE PAGO:	2026-02-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36462149
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36462149
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 700	$ 70.100	$ 70.800
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 700	$ 70.100	$ 70.800
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 280.200	$ 282.700
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 280.200	$ 282.700
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 9.200	$ 9.300
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 9.200	$ 9.300
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 0	$ 0	$ 700	$ 70.100	$ 70.800
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 700	$ 70.100	$ 70.800
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 4.000	$ 429.600	$ 433.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/03/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900693242	3	PACOT INTEGRALES SAS	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CARRERA 5 NO 13 19		8719264			VISALTA0141@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36462149	E	2026-02-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	433.600	4.000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36462149	2026-02-10	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 1075298785	CALDERON OBANDO DIEGO MAURICIO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	5422001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900693242	3	PACOT INTEGRALES SAS	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CARRERA 5 NO 13 19		8719264			VISALTA0141@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36462149	E	2026-02-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	433.600	4.000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36462149	2026-02-10	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	1.750.905	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	2.500	0	282.700
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	2.500	0	282.700
EPS(Administradoras: 1)				1	70.100	0	700	0	70.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	70.100	0	700	0	70.800
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	100	0	9.300
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	9.200	0	100	0	9.300
CCF(Administradoras: 1)				1	70.100	0	700	0	70.800
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	1	70.100	0	700	0	70.800
Gran Total					429.600	0	4.000	0	433.600

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PACOT INTEGRALES SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900693242
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	pacot ii
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-02-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-09
FECHA DE PAGO:	2026-02-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34794835
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34794835
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 6.000	$ 57.000	$ 63.000
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 6.000	$ 57.000	$ 63.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 23.900	$ 227.800	$ 251.700
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 23.900	$ 227.800	$ 251.700
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 800	$ 7.500	$ 8.300
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 800	$ 7.500	$ 8.300
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 0	$ 0	$ 6.000	$ 57.000	$ 63.000
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 6.000	$ 57.000	$ 63.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 36.700	$ 349.300	$ 386.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/10/2025

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900693242	3	PACOT INTEGRALES SAS	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CARRERA 5 NO 13 19		8719264			VISALTA0141@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-09	34794835	E	2026-02-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	386.000	36.700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34794835	2025-09-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1075298785	CALDERON OBANDO DIEGO MAURICIO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	5422001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900693242	3	PACOT INTEGRALES SAS	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CARRERA 5 NO 13 19		8719264			VISALTA0141@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-09	34794835	E	2026-02-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	386.000	36.700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34794835	2025-09-09	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	23.900	0	251.700
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	23.900	0	251.700
EPS(Administradoras: 1)				1	57.000	0	6.000	0	63.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	57.000	0	6.000	0	63.000
ARP(Administradoras: 1)				1	7.500	0	800	0	8.300
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	7.500	0	800	0	8.300
CCF(Administradoras: 1)				1	57.000	0	6.000	0	63.000
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	1	57.000	0	6.000	0	63.000
Gran Total					349.300	0	36.700	0	386.000

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PACOT INTEGRALES SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900693242
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	pacot ii
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-02-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-24
FECHA DE PAGO:	2026-02-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	36461227
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36461227
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 4.900	$ 57.000	$ 61.900
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 4.900	$ 57.000	$ 61.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 19.600	$ 227.800	$ 247.400
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 19.600	$ 227.800	$ 247.400
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 700	$ 7.500	$ 8.200
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 700	$ 7.500	$ 8.200
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 0	$ 0	$ 4.900	$ 57.000	$ 61.900
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 4.900	$ 57.000	$ 61.900
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 30.100	$ 349.300	$ 379.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/11/2025

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900693242	3	PACOT INTEGRALES SAS	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CARRERA 5 NO 13 19		8719264			VISALTA0141@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	36461227	E	2026-02-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	379.400	30.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36461227	2025-10-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 1075298785	CALDERON OBANDO DIEGO MAURICIO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	5422001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900693242	3	PACOT INTEGRALES SAS	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CARRERA 5 NO 13 19		8719264			VISALTA0141@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	36461227	E	2026-02-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	379.400	30.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36461227	2025-10-09	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	19.600	0	247.400
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	19.600	0	247.400
EPS(Administradoras: 1)				1	57.000	0	4.900	0	61.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	57.000	0	4.900	0	61.900
ARP(Administradoras: 1)				1	7.500	0	700	0	8.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	7.500	0	700	0	8.200
CCF(Administradoras: 1)				1	57.000	0	4.900	0	61.900
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	1	57.000	0	4.900	0	61.900
Gran Total					349.300	0	30.100	0	379.400

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PACOT INTEGRALES SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900693242
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	pacot ii
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-02-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-24
FECHA DE PAGO:	2026-02-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	36462138
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36462138
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 3.800	$ 57.000	$ 60.800
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 3.800	$ 57.000	$ 60.800
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 227.800	$ 242.700
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 227.800	$ 242.700
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 500	$ 7.500	$ 8.000
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 500	$ 7.500	$ 8.000
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 0	$ 0	$ 3.800	$ 57.000	$ 60.800
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 3.800	$ 57.000	$ 60.800
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 23.000	$ 349.300	$ 372.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/12/2025

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900693242	3	PACOT INTEGRALES SAS	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CARRERA 5 NO 13 19		8719264			VISALTA0141@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	36462138	E	2026-02-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	372.300	23.000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36462138	2025-11-12	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 1075298785	CALDERON OBANDO DIEGO MAURICIO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	5422001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900693242	3	PACOT INTEGRALES SAS	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CARRERA 5 NO 13 19		8719264			VISALTA0141@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	36462138	E	2026-02-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	372.300	23.000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36462138	2025-11-12	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	14.900	0	242.700
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	14.900	0	242.700
EPS(Administradoras: 1)				1	57.000	0	3.800	0	60.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	57.000	0	3.800	0	60.800
ARP(Administradoras: 1)				1	7.500	0	500	0	8.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	7.500	0	500	0	8.000
CCF(Administradoras: 1)				1	57.000	0	3.800	0	60.800
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	1	57.000	0	3.800	0	60.800
Gran Total					349.300	0	23.000	0	372.300

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PACOT INTEGRALES SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900693242
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	pacot ii
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-02-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-24
FECHA DE PAGO:	2026-02-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	36462140
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36462140
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 57.000	$ 59.700
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 57.000	$ 59.700
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 10.800	$ 227.800	$ 238.600
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 10.800	$ 227.800	$ 238.600
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 7.500	$ 7.900
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 7.500	$ 7.900
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 57.000	$ 59.700
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 57.000	$ 59.700
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 16.600	$ 349.300	$ 365.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/01/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900693242	3	PACOT INTEGRALES SAS	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CARRERA 5 NO 13 19		8719264			VISALTA0141@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	36462140	E	2026-02-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	365.900	16.600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36462140	2025-12-10	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 1075298785	CALDERON OBANDO DIEGO MAURICIO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	5422001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900693242	3	PACOT INTEGRALES SAS	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CARRERA 5 NO 13 19		8719264			VISALTA0141@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	36462140	E	2026-02-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	365.900	16.600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36462140	2025-12-10	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	10.800	0	238.600
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	10.800	0	238.600
EPS(Administradoras: 1)				1	57.000	0	2.700	0	59.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	57.000	0	2.700	0	59.700
ARP(Administradoras: 1)				1	7.500	0	400	0	7.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	7.500	0	400	0	7.900
CCF(Administradoras: 1)				1	57.000	0	2.700	0	59.700
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	1	57.000	0	2.700	0	59.700
Gran Total					349.300	0	16.600	0	365.900

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PACOT INTEGRALES SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900693242
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	pacot ii
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-02-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-24
FECHA DE PAGO:	2026-02-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	36462144
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36462144
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 57.000	$ 58.500
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 57.000	$ 58.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 6.000	$ 227.800	$ 233.800
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 6.000	$ 227.800	$ 233.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 7.500	$ 7.700
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 7.500	$ 7.700
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 57.000	$ 58.500
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 57.000	$ 58.500
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 349.300	$ 358.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/02/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900693242	3	PACOT INTEGRALES SAS	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CARRERA 5 NO 13 19		8719264			VISALTA0141@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	36462144	E	2026-02-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	358.500	9.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36462144	2026-01-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 1075298785	CALDERON OBANDO DIEGO MAURICIO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	5422001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900693242	3	PACOT INTEGRALES SAS	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CARRERA 5 NO 13 19		8719264			VISALTA0141@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	36462144	E	2026-02-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	358.500	9.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36462144	2026-01-13	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	6.000	0	233.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	6.000	0	233.800
EPS(Administradoras: 1)				1	57.000	0	1.500	0	58.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	57.000	0	1.500	0	58.500
ARP(Administradoras: 1)				1	7.500	0	200	0	7.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	7.500	0	200	0	7.700
CCF(Administradoras: 1)				1	57.000	0	1.500	0	58.500
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	1	57.000	0	1.500	0	58.500
Gran Total					349.300	0	9.200	0	358.500

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.075.298.785

CALDERON OBANDO
APELLIDOS

DIEGO MAURICIO
NOMBRES

Diego Mauricio Calderon Obando
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-AGO-1996

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

B+
G.S. RH

M
SEXO

03-SEP-2014 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1900100-00650733-M-1075298785-20141206 0041760303A 1 42154589

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141225502672

(415)7707212489984(8020) 000014122550267 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 9 3 2 4 2	3	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
PROFESIONALES EN ASESORIAS CAPACITACIONES OBRAS CIVILES Y TRANSPORTE INTEGRALES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	PACOT INTEGRALES S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CR 5 10 38 OF 503 ED CAMARA DE COMERCIO

42. Correo electrónico pacotingn2020@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 8 0 1 7 6 5 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 4 0 1 2 3	4 2 2 0	2 0 1 4 0 1 2 3		7 1 1 2	4 7 6 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CALDERON OBANDO DIEGO MAURICIO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141225502672

(415)7707212489984(8020) **000014122550267 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 9 3 2 4 2	3	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	0 1
72. Número	0 0 0 0 1	0 0 3
73. Fecha	2 0 1 4 0 1 2 0	2 0 2 0 0 1 1 4
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 4 0 1 2 3	2 0 2 0 0 1 2 3
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 5 1 9 5 1	2 5 1 9 5 1
78. Departamento	4 1	4 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	2 3
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 4 0 1 2 0	
81. Hasta	2 0 3 4 0 1 2 0	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 7 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141225502672

(415)7707212489984(8020) **000014122550267 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 6 9 3 2 4 2	3	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 7 0 7		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 7 5 2 9 8 7 8 5		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CALDERON	OBANDO	DIEGO	MAURICIO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 1 2 0 3		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 2 1 9 6 7 7 6		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SALAS	DEVIA	FRANCISCO	JAVIER
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141225502672

(415)7707212489984(8020) **000014122550267 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 9 3 2 4 2	3	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 5 1 3 1 6 6 2		T 2 0 6 4 2 5

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GOMEZ	SALAZAR	SANDRA	LILIANA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 1 1 0 9

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Estado de la Empresa o Persona

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141225502672

(415)7707212489984(8020) **000014122550267 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 4 0 1 2 3		-
2		AAAA MM DD		-
3		AAAA MM DD		-
4		AAAA MM DD		-
5		AAAA MM DD		-
6		AAAA MM DD		-
7		AAAA MM DD		-
8		AAAA MM DD		-
9		AAAA MM DD		-
10		AAAA MM DD		-
11		AAAA MM DD		-
12		AAAA MM DD		-
13		AAAA MM DD		-
14		AAAA MM DD		-
15		AAAA MM DD		-
16		AAAA MM DD		-
17		AAAA MM DD		-
18		AAAA MM DD		-
19		AAAA MM DD		-
20		AAAA MM DD		-
21		AAAA MM DD		-
22		AAAA MM DD		-

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Antecedentes

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 291473815

PIB
18:49:54
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 17 de febrero del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1075298785:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 17 de febrero de 2026, a las 18:47:28, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1075298785
Código de Verificación	1075298785260217184728

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 291473871

PIB
18:50:55
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 17 de febrero del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona PROFESIONALES EN ASESORIAS CAPACITACIONES OBRAS CIVILES Y TRANSPORTE INTEGRALES S.A.S. identificado(a) con NIT número 9006932423:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 06:52:20 PM horas del 17/02/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1075298785**
Apellidos y Nombres: **CALDERON OBANDO DIEGO MAURICIO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 17 de febrero de 2026, a las 18:49:15, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9006932423
Código de Verificación	9006932423260217184915

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 17/02/2026 06:54:00 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1075298785** y Nombre: **DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **134968821** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda Imprimir

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 18:59:52 horas del 17/02/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **1075298785,** Apellidos y Nombres **CALDERON OBANDO DIEGO MAURICIO**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL** , con NIT **901039684-5** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 1075298785 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 20/02/2026 05:05 AM

Código Verificación: **N2LJUG3REC**

Válida hasta: **21/05/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CONSULTA AL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO
BDME

El documento de identificación CEDULA DE CIUDADANÍA número 1075298785 **NO** está incluido en el BDME que publica la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 901 del 2004.

La información suministrada en esta página Web corresponde a la consolidación de los BDME presentados por las entidades públicas. Por tanto, la Contaduría General de la Nación no tiene responsabilidad alguna por las posibles acciones legales que se puedan derivar del reporte indebido o inconsistencias de la misma, por cuanto toda la información contenida en el BDME es la que hayan suministrado los entes públicos, bajo su responsabilidad exclusiva.

La sentencia C-1083 del 24 de octubre de 2005 de la Honorable Corte Constitucional declaró inexequibles los incisos 2 y 4 del parágrafo tercero del artículo 2° de la Ley 901 de 2004, dejando así de tener vigencia la inhabilidad para contratar con el Estado o tomar posesión de cargos públicos, de las personas naturales o jurídicas que aparezcan reportadas en el Boletín de Deudores Morosos del Estado.

En tal sentido no se requiere presentar el certificado del Boletín de Deudores Morosos del Estado para efectos de contratar con entidades públicas.

Este documento se generó en la página www.contaduría.gov.co

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CONSULTA AL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO
INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE PAGO

El documento de identificación CEDULA DE CIUDADANÍA número 1075298785 **NO** ha incumplido acuerdos de pago de conformidad con lo establecido en el numeral 5° del artículo 2º de la Ley 1066 de 2006.

Recuerde que la información suministrada en esta página Web CONSTITUYE CERTIFICADO BDME para efectos de celebrar nuevos acuerdos de pago con otras entidades públicas y goza de valor probatorio según lo establecido en la Ley 527 de 1999, por lo cual la Contaduría General de la Nación no lo expide en forma física.

La información suministrada en esta página Web corresponde a la consolidación de los BDME presentados por las entidades públicas. Por tanto, la Contaduría General de la Nación no tiene responsabilidad alguna por las posibles acciones legales que se puedan derivar del reporte indebido o inconsistencias de la misma, por cuanto toda la información contenida en el BDME es la que hayan suministrado los entes públicos, bajo su responsabilidad exclusiva.

Este documento se generó en la página www.contaduría.gov.co

PACOT S.A.S
PROFESIONALES EN ASESORIAS, CAPACITACIONES, OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES INTEGRALES S.A.S
NIT 900.693.242-3

Compromiso Anticorrupción (Anexo 4)

Dirección: carrera 5 N° 10 – 36 oficina 503 – Tel: 320 801 7654
Email: pacotingn2020@gmail.com

PACOT S.A.S
PROFESIONALES EN ASESORIAS, CAPACITACIONES, OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES INTEGRALES S.A.S
NIT 900.693.242-3

ANEXO No. 4
COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN

Neiva, 25 de febrero de 2026

Señores
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL "FONPACÍFICO"
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Director Ejecutivo FONPACÍFICO
E.S.D

REFERENCIA: COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN PROCESO No. OB-006-2026.

Por medio de este documento **PROFESIONALES EN ASESORIAS CAPACITACIONES OBRAS CIVILES Y TRANSPORTE INTEGRALES S.A.S** suscribo el Compromiso Anticorrupción con **FONPACÍFICO** en los siguientes términos.

Me comprometo a apoyar la acción del Estado Colombiano y particularmente a **FONPACÍFICO** para fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas y, en este contexto, asumo explícitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de mi obligación de cumplir con las leyes y normas de Colombia:

A. Me comprometo a no ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con mi Propuesta, con el proceso de selección o de contratación, ni con la ejecución del Contrato que pueda celebrarse como resultado de la Propuesta.
B. Me comprometo a no permitir que nadie, bien sea mi empleado o un agente comisionista independiente lo haga en mi nombre.
C. Me comprometo a revelar de manera clara y en forma total en mi Propuesta, los nombres de todos los beneficiarios reales de los pagos efectuados en mi nombre, relacionados con cualquier concepto de la selección, incluyendo tanto los pagos ordinarios ya realizados y por realizar, como los que se proponga hacer si mi Propuesta resulta favorecida, e incluyendo también los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a mis propios empleados o a empleados de otras empresas cualquiera que estas sean, independientemente de que tengan carácter público o privado.
D. Me comprometo formalmente a impartir instrucciones a todos mis empleados y agentes y a cualquiera otros representantes, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia y, especialmente, de aquellas que regirán la selección

que a efecto se convoque y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondré la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de **FONPACÍFICO** ni a cualquier otro funcionario público que pueda influir en la Adjudicación, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre los funcionarios públicos, puedan influir sobre la Adjudicación, ni de ofrecer pagos o halagos a los funcionarios que durante el desarrollo del Contrato de que se suscribirá de ser Adjudicatario.

E. Me comprometo formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en la selección, o como efecto la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que es objeto de la presente selección o la fijación de los términos de la Propuesta.

F. El compromiso que según el presente documento contraigo, lo efectúo bajo la gravedad del juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripción del presente Compromiso Anticorrupción.

G. Si se conociera mi incumplimiento, el de mis representantes o mis empleados o agentes, a los compromisos antes enunciados, **FONPACÍFICO** pondrá en conocimiento de tal hecho ante la Fiscalía General de la Nación para su investigación en el evento en que el incumplimiento identificado constituya delito sancionado por la ley penal colombiana.

FIRMA Diego Mauricio Calderon Obando.
DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
C.C. No. 1.075.298.785 de Neiva
Representante Legal
PACOT INTEGRALES S.A.S.
Nit. 900.693.242-3

PACOT S.A.S
PROFESIONALES EN ASESORIAS, CAPACITACIONES, OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES INTEGRALES S.A.S
NIT 900.693.242-3

Certificado Inscripción Asociado Técnico

Dirección: carrera 5 N° 10 – 36 oficina 503 – Tel: 320 801 7654
Email: pacotingn2020@gmail.com

CERTIFICADO COMO ASOCIADO TECNICO

N° 1353

NIT: 901.039.684-5

DESCRIPCION

Nombre	PROFESIONALES EN ASESORIAS, CAPACITACIONES, OBRAS CIVILES
Nit	900693242
Direccion	CARRERA 5 No. 10-38
Ciudad:	Neiva
Departamento:	Huila
Telefonos:	3208017654
Correo Electronico:	pacotingn2020@gmail.com
Respesentante Legal:	
Actividad Principal	166 Industria De La Construcción

Aprobado Por



JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR

Gerente

PACOT S.A.S
PROFESIONALES EN ASESORIAS, CAPACITACIONES, OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES INTEGRALES S.A.S
NIT 900.693.242-3

Capacidad Financiera

Dirección: carrera 5 N° 10 – 36 oficina 503 – Tel: 320 801 7654
Email: pacotingn2020@gmail.com

PACOT S.A.S
PROFESIONALES EN ASESORIAS, CAPACITACIONES, OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES INTEGRALES S.A.S
NIT 900.693.242-3

ANEXO No. 11
MODELO DE CERTIFICACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL /O CONTADOR PÚBLICO DE PROFESIONALES EN ASESORIAS CAPACITACIONES OBRAS CIVILES Y TRANSPORTE INTEGRALES CON NIT 900.693.242-3

CERTIFICA:


De manera discriminada y detallada cada uno de los valores de los indicadores que integran la capacidad financiera, que fueron tomados de los Estados Financieros del Asociado Técnico:

PROFESIONALES EN ASESORIAS CAPACITACIONES OBRAS CIVILES Y TRANSPORTE INTEGRALES
NIT 900.693.242-3
Persona Jurídica

Fecha de corte de la información financiera: 31 de diciembre de 2024.

INDICADORES FINANCIEROS:

LIQUIDEZ:	**151.81**
ENDEUDAMIENTO:	**0.00**



Firma del Revisor Fiscal y/o Contador Público:_____
Nombre del Revisor Fiscal y/o Contador Público: DIEGO ARMANDO ROJAS MEDINA
TP No. 164666-T

Nota: Se anexa copia de la tarjeta profesional y antecedentes de la junta central de contadores vigente.

PROFESIONALES EN ASESORIAS CAPACITACIONES OBRAS CIVILES Y TRANSPORTE INTEGRALES S.A.S.

NIT: 900.693.242-3

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ACTIVO		
CORRIENTE		
Caja	20.759.657,00	
Bancos Cuentas corrientes	0,00	
Bancos Cuentas de ahorro	15.974.841,00	
Clientes	765.980.232,00	
Anticipos y Avances	804.698.456,00	
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	52.708.403,00	
Reclamaciones	0,00	
TOTAL CORRIENTE		**1.660.121.589,00**
ACTIVO FIJO		
Maquinaria y Equipo en montaje	0,00	
Maquinaria y Equipo	721.134.500,00	
Equipo de oficina	98.756.000,00	
Equipo de computacion y comunicación	34.695.000,00	
Flota y equipo de transporte	685.000.000,00	
Depreciaciones y Amortizaciones	0,00	
Diferidos - Gastos pagados por anticipado	0,00	
TOTAL ACTIVO FIJO		**1.539.585.500,00**
Otros Activos	0,00	
		0,00
TOTAL ACTIVO		**3.199.707.089,00**

PASIVO		
CORRIENTE		
Obligaciones Financieras	0,00	
Proveedores	8.815.999,00	
Costos y Gastos Por Pagar	-	
Retencion en la fuente	504.246,00	
Impuesto a las ventas	-	
Impuesto de industria y comercio	-	
Retencion y aportes de nomina	-	
Acreedores varios		
Impuestos a las ventas por pagar	1.614.897,00	
Obligaciones Laborales	-	
Pasivos Estimados y Provisiones	-	
Otras Cuentas por Pagar	-	
Otros Pasivos	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**10.935.142,00**
NO CORRIENTE		
Obligaciones a Largo Plazo	-	-
TOTAL PASIVO		**10.935.142,00**
PATRIMONIO		
Capital Social Efectivamente pagado	3.000.000,00	
Reservas Constituidas	-	
Resultados Acumulados por Adopcion NIIF	581.482.881,00	
Utilidad del ejercicio	624.077.034,00	
Utilidades acumuladas	1.980.212.032,00	
TOTAL PATRIMONIO		**3.188.771.947,00**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**3.199.707.089,00**

Diego Mauricio Calderon Obando

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Gerente

DIEGO ARMANDO ROJAS LAGUNA
Contador Publico
T.P. 164666-T

PROFESIONALES EN ASESORIAS CAPACITACIONES OBRAS CIVILES Y TRANSPORTE INTEGRALES S.A.S.

NIT: 900.693.242-3

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TOTAL INGRESOS	**1.816.286.654,00**
Total ventas	2.439.032.938,00
Devolucion en Ventas	622.746.284,00
COSTOS DE VENTAS	**1.075.121.200,00**
Costos de ventas	1.075.121.200,00
UTILIDAD BRUTA	**741.165.454,00**
GASTOS OPERACIONALES	**111.858.363,00**
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	**111.858.363,00**
GASTOS DE PERSONAL	64.772.754,00
HONORARIOS	13.929.912,00
IMPUESTOS	5.344.462,00
ARRENDAMIENTOS	5.576.637,00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	5.840.567,00
SEGUROS	5.422.950,00
SERVICIOS	4.789.652,00
GASTOS LEGALES	4.879.502,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ADECUACIONES E INSTALACIONES	452.772,00
GASTOS DE VIAJE	849.155,00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-
DIVERSOS	-
GASTOS DE OPERACIONALES DE VENTAS	-
GASTOS DE PERSONAL	-
HONORARIOS	-
GASTOS LEGALES	-
GASTOS DE VIAJE	-
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-
DIVERSOS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS VENTAS	-
FINANCIEROS	-
RECUPERACIONES	-
DIVERSOS	-
GASTOS NO OPERACIONALES	**5.230.057,00**
GASTOS BANCARIOS	3.632.573,00
INTERESES	1.597.484,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
DIVERSOS	-
UTILIDAD OPERACIONAL	**624.077.034,00**

Diego Mauricio Calderon Obando.

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Gerente

DIEGO ARMANDO ROJAS LAGUNA
Contador Publico
T.P. 164666-T

PROFESIONALES EN ASESORIAS CAPACITACIONES OBRAS CIVILES Y TRANSPORTE INTEGRALES S.A.S.

NIT: 900.693.242-3

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

SALDO DE CAJA Y BANCO A 01/01/2023		**19.764.729,00**
INGRESOS		
Ingresos por Actividades Propias	1.816.286.654,00	
Otras Transferencias e Incrementos Patrimonio	0,00	
Venta de Activos Reales/Desincorporaciones	0,00	
Venta de Activos Financieros	0,00	
Títulos Valores	0,00	
Acciones y Participaciones de Capital	0,00	
Otros Ingresos (Act.Exig./Realiz./O.A.Circul./Ctas.Pag./R.A	0,00	**1.816.286.654,00**
SALDO INICIAL + INGRESOS		**1.836.051.383,00**
EGRESOS		
Gastos de Ventas	0,00	
Gastos Administrativos	256.147.890,00	
Gastos Financieros	5.230.057,00	
Otros Gastos	0,00	
Compras	1.075.121.200,00	
Pagos Deudas	248.537.738,00	
Materiales y Suministros	0,00	
Servicios No Personales	0,00	
Activos Reales (Fijo/Intangible)	0,00	
Gastos Capitalizables y Otros No Circulantes	0,00	
Inversiones Financieras	0,00	
Otras Inversiones	0,00	**1.585.036.885,00**
SALDO DE CAJA Y BANCO A 31/12/2024		**251.014.498,00**

Diego Mauricio Calderon Obando

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Gerente

DIEGO ARMANDO ROJAS LAGUNA
Contador Publico
T.P. 164666-T

PROFESIONALES EN ASESORIAS CAPACITACIONES OBRAS CIVILES Y TRANSPORTE INTEGRALES S.A.S.

NIT: 901.612.248-4

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PATRIMONIO	AÑO 2023	AUMENTO	DISMINUCION	AÑO 2024
CAPITAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOP	581.482.881,00	0,00	0,00	581.482.881,00
EXCEDENTES DE EJERCCIOS ANTERIOR	1.737.823.032,00	242.389.000,00	0,00	1.980.212.032,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	242.389.000,00	624.077.034,00	242.389.000,00	624.077.034,00
RESERVA LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	2.564.694.913,00	866.466.034,00	242.389.000,00	3.188.771.947,00

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Gerente

DIEGO ARMANDO ROJAS LAGUNA
Contador Publico
T.P. 164666-T


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
7.688.899
NUMERO
ROJAS LAGUNA
APELLIDOS
DIEGO ARMANDO
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO
07-JUN-1971
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
11-DIC-1989 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
A-1900100-50155942-M-0007688899-20070507
05087 07127A 02 210601952

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

164666-T



DIEGO ARMANDO
ROJAS LAGUNA
C.C. 7688899
RES. INSCRIPCION 12 DEL 16/02/2012
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN

285070

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

175373

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1B096B6F4C3D8B6123

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIEGO ARMANDO ROJAS LAGUNA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7688899 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 164666-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PACOT S.A.S
PROFESIONALES EN ASESORIAS, CAPACITACIONES, OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES INTEGRALES S.A.S
NIT 900.693.242-3

Condiciones De Experiencia

Dirección: carrera 5 N° 10 – 36 oficina 503 – Tel: 320 801 7654
Email: pacotingn2020@gmail.com

PACOT S.A.S
PROFESIONALES EN ASESORIAS, CAPACITACIONES, OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES INTEGRALES S.A.S
NIT 900.693.242-3

ANEXO No. 5
INFORMACIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA DEL ASOCIADO TÉCNICO
PROCESO No. OB-006-2026.

Señores
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL "FONPACÍFICO"
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Director Ejecutivo FONPACÍFICO
E.S.D

CONTRATANTE	CONTRATISTA (% de participación si es consorcio o unión temporal)	VALOR FINAL DEL CONTRATO EN SMMLV Y EN PESOS	FECHA INICIACIÓN	FECHA TERMINACIÓN	OBJETO
MUNICIPIO DE NEIVA	90%	$1.399.748.528.00	17/12/2020	15/08/2021	CONSTRUCCION DE OBRAS URBANISMO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO CLARETIANO
MUNICIPIO DE NEIVA	95%	$931.373.823	06/05/2022	21/05/2023	ADECUACION Y MANTENIEMTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AGUSTIN CODAZZI SEDE ROSARIAO DE LA CIUDAD DE NEIVA

Atentamente,

Diego Mauricio Calderon Obando.

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
C.C. No. 1.075.298.785 de Neiva
Representante Legal
PACOT INTEGRALES S.A.S.
Nit. 900.693.242-3

MUNICIPIO DE NEIVA NIT 891180084-1	**ACTA DE LIQUIDACIÓN**	FOR-GDCO-13 Versión: 01 Vigente desde: Marzo 19 del 2021	Primero Neiva

CONTRATO DE OBRA EN MODALIDAD DE LICITACIÓN PUBLICA N° 1913 DE 2020 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE NEIVA Y EL CONSORCIO FPS

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO EN LA INSTITUCIÓN EDDUCATIVA COLEGIO CLARETIANO
CONTRATISTA:	**CONSORCIO FPS** **NIT. 901.437.805-7** Integrado por. **PACOT INTEGRALES S.A.S.** con un 90% de participación. **FIDECOM S.A.S** con un 5% de participación. **SEINGECOL S.A.S.** con un 5%. Representante Legal **DIEGO ADNRES REYES VARGAS** con cedula de ciudadanía No. 7.704.116 de Neiva
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 1.399.748.528,00** incluidos los impuestos a que haya lugar.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Ciento treinta y cinco (135) días a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA ACTA DE INICIO:	17 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE AGOSTO DE 2021

En Neiva, a los 11 días del mes de noviembre de 2021, se reunieron el ingeniero **DIEGO ANDRES REYES VARGAS** identificado con cedula de ciudadanía No. 7.704.116 de Neiva en representación del **CONSORCIO FPS** con NIT. 901.437.805-7, en calidad de Contratista en calidad de supervisor del contrato y el ingeniero **JOHN ALEXANDER ARTUNDUAGA CLEVES** identificado con cedula de ciudadanía No. 12.262.598 de Pitalito (H), en calidad de Interventor; con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1.0 VALORES:

DESCRIPCIÓN	VALOR
1. Valor Inicial del Contrato y/o convenio	$ 937.529.903,oo
2. Adición - Otro Sí No. 01	$ 462.218.625,oo
3. Valor Final Contratado	$ 1.399.748.528,oo
4. Valor Final Ejecutado	$ 1.399.698.357,oo
5. Saldo a Favor del Municipio de Neiva	$ 50.171,90
6. Saldo a Favor del Contratista	N/A

2.0 ACTAS:

DESCRIPCIÓN	FECHA
1. Acta de Iniciación	17 de diciembre de 2020
2. Acta de Justificación No. 1	9 de marzo de 2021
3. Acta de Suspensión No. 1	11 de marzo de 2021
4. Acta de Reinicio No. 1	4 de mayo de 2021

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SO www.alcaldianeiva.gov.co
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

5. Acta de suspensión No. 2	11 de junio de 2021
6. Acta de Reinicio No. 2	2 de agosto de 2021
7. Acta de Justificación No. 2	2 de agosto de 2021
8. Acta de terminación	15 de agosto de 2021

3.0 POLIZAS:

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de Cumplimiento No. NV – 100034827 y de Responsabilidad Civil Extracontractual No. NV-100005598, con los amparos de Cumplimiento, buen manejo del anticipo, prestaciones sociales, calidad de los elementos, estabilidad de la obra, amparo básico-predios, labores y operaciones, patronal, contratistas y subcontratistas, vehículos propios y no propios expedida por "SEGUROS MUNDIAL", aprobadas por la Secretaria de Educación del Municipio de Neiva así:

SEGUROS MUNDIAL						
Documento	Garantía No.	Riesgos asegurados	Valores Amparados ($)	Vigencia de los amparos		Fecha Aprobación (dd/mm/aaaa)
				Inicio (dd/mm/aaaa)	Final (dd/mm/aaaa	
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	NV-100034827	CUMPLIMIENTO	$187.505.980,60	10/12/2020	10/09/2021	12/12/2020
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	NV-100034827	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$281.258.970,90	10/12/2020	10/09/2021	12/12/2020
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	NV-100034827	PRESTAACIONES SOCIALES	$187.505.980,60	10/12/2020	10/03/2024	12/12/2020
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	NV-100034827	CALIDA DE LOS ELEMENTOS	$187.505.980,60	10/12/2020	10/03/2022	12/12/2020
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	NV-100034827	ESTABILIDAD DE LA OBRA	$187.505.980,60	10/03/2021	10/03/2026	12/12/2020
POLIZA DE RCE	NV-100005598	AMPARO BASICO – PREDIO, LABORES Y OPERACIONES	$175.560.600,00	10/12/2021	10/09/2021	12/12/2020
POLIZA DE RCE	NV-100005598	PATRONAL	$52.668.180,00	10/12/2021	10/09/2021	12/12/2020
POLIZA DE RCE	NV-100005598	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$52.668.180,00	10/12/2021	10/09/2021	12/12/2020
POLIZA DE RCE	NV-100005598	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$52.668.180,00	10/12/2021	10/09/2021	12/12/2020

SEGUROS MUNDIAL						
Documento	Garantía No.	Riesgos asegurados	Valores Amparados ($)	Vigencia de los amparos		Fecha Aprobación (dd/mm/aaaa)
				Inicio (dd/mm/aaaa)	Final (dd/mm/aaaa	
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	NV-100034827	CUMPLIMIENTO	$187.505.980,60	10/12/2020	25/12/2021	21/05/2021
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	NV-100034827	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$281.258.970,90	10/12/2020	25/12/2021	21/05/2021
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	NV-100034827	PRESTAACIONES SOCIALES	$187.505.980,60	10/12/2020	25/06/2024	21/05/2021
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	NV-100034827	CALIDA DE LOS ELEMENTOS	$187.505.980,60	10/12/2020	25/06/2022	21/05/2021
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	NV-100034827	ESTABILIDAD DE LA OBRA	$187.505.980,60	10/03/2021	25/06/2026	21/05/2021
POLIZA DE RCE	NV-100005598	AMPARO BASICO – PREDIO, LABORES Y OPERACIONES	$175.560.600,00	10/12/2021	25/12/2021	21/05/2021
POLIZA DE RCE	NV-100005598	PATRONAL	$52.668.180,00	10/12/2021	25/12/2021	21/05/2021
POLIZA DE RCE	NV-100005598	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$52.668.180,00	10/12/2021	25/12/2021	21/05/2021
POLIZA DE RCE	NV-100005598	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$52.668.180,00	10/12/2021	25/12/2021	21/05/2021

4.0 BALANCE FINAL LIQUIDACIÓN:

4.1. Estado Financiero del Contrato				
RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
ANTICIPO Comprobante de egreso N° 000000000374740	23/12/2020	$281.258.970,90	0	$937.529.903,00
ACTA PARCIAL 1 Comprobante de egreso N° 000000000381061 - 000000000381062	05/03/2021	$401.798.532,00	$401.798.532,00	$535.731.371,00
ADICIONAL 1	05/05/2021	$462.218.625,00	0	$997.949.996,00
ACTA PARCIAL 2	11/06/2021	$706.534.620,00	$1.108.333.152,00	$291.415.376,00

Comprobante de egreso N° 000000000390183				
ACTA FINAL	EN TRAMITE	$140.454.269,00	$1.399.698.356,10	$ 50.171,90
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 937.529.903,00	$462.218.625,00	$1.399.748.528,00	$1.399.698.356,10	$ 50.171,90

VALOR A PAGAR: CIENTO CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($140.454.269,00) M/Legal.

5.0 RECIBO A SATISFACCIÓN. El Interventor del Contrato certifica que el objeto se recibió mediante acta de terminación de fecha 15 de agosto de 2021.

6.0 INFORME

Que, según el acta de terminación e informe suscrito por el supervisor, que reposa cronológicamente en el archivo, se dejó constancia expresa que el contratista cumplió con las obligaciones contractuales, según los informes de actividades ejecutadas por el mismo, y *"ha cumplido a cabalidad el objeto del contrato, en los términos y el tiempo establecido y conforme a lo preceptuado en el contrato de prestación de servicios".*

De igual manera se dejó constancia por parte del supervisor, de la verificación y cumplimiento de las obligaciones del Contratista, en tratándose de los aportes al sistema general de seguridad social integral, dentro del tracto del contrato, acorde con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y normas atinentes.

El contratista manifiesta clara y taxativamente que, durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones o coyunturas que pudieran generar desequilibrios económicos y ruptura de la ecuación contractual.

7.0 CONSTANCIAS

(Ninguna)

8.0 LIQUIDACIÓN: Que en cumplimiento del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, señala que en el acta de liquidación las partes harán constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

MUNICIPIO DE NEIVA NIT. 891180003-1	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FOR-GDCO-13 Versión: 01 Vigente desde: Marzo 19 del 2021	Primero Neiva

En consideración a lo anterior; El Municipio de NEIVA cancelará al Contratista la suma de CIENTO CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($140.454.269,00) M/Legal. Se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron:

JOSE PAUL AZUERO BERNAL
Secretario de Educación Municipal

CONSORCIO FPS
NIT. 901.437.805-7
R.L. DIEGO ANDRES REYES VARGAS
C.C. No. 7.704.116 de Neiva
Contratista

JOHN ALEXANDER ARTUNDUAGA CLEVES
C.C. No. 12.262.596 de Pitalito (H)
Interventor

Proyectó:
CARLOS CORREDOR Q
Apoyo Jurídico SEM

CONTRATO DE OBRA EN MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA N° 1913 DE 2020, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE NEIVA Y EL CONSORCIO FPS.

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO CLARETIANO"
CONTRATISTA:	**CONSORCIO FPS** Nit: 901.437.805-7 Integrado por: PACOT INTEGRALES S.A.S. con un 90% de participación. FIDECOM S.A.S. con un 5% de participación. SEINGECOL S.A.S. con un 5% de participación. Representante legal del consorcio **DIEGO ANDRES REYES VARGAS** C.C. No. 7.704.116 de Neiva
VALOR DEL CONTRATO:	**NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS ($937.529.903,00) M/CTE.**, incluido los impuestos a que haya lugar
VALOR ADICIONAL:	**CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($462.218.625,00) M/CTE**, incluido los impuestos a que haya lugar.
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO:	**CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y DOS ($ 50.172.00)**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEICIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($1.399.698.356,00) M/CTE**, incluido los impuestos a que haya lugar.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Noventa (90) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio
PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIONAL:	Cuarenta y cinco (45) días calendario.
PLAZO TOTAL:	Ciento treinta y cinco (135) días a partir de la suscripción del acta de inicio.

FECHA ACTA DE INICIO:	17 de diciembre de 2020
FECHA ACTA JUSTIFICACION NO. 1:	9 de marzo de 2021.

MUNICIPIO DE NEIVA NIT. 891180009-1	ACTA DE RECIBO FINAL	FOR-GDCO-12 Versión: 01 Vigente desde: Marzo 19 del 2021	Primero Neiva mipg

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 1:	11 de marzo de 2021
FECHA ACTA DE REINICIO 1:	4 de mayo de 2021
FECHA OTRO SI No 1:	5 de mayo de 2021
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 2:	11 de junio de 2021
FECHA REINICIO No 2:	2 de agosto de 2021
FECHA ACTA JUSTIFICACION No 2:	2 de agosto de 2021
FECHA OTRO SI No 1:	3 de agosto de 2021

VALOR PRESENTE ACTA: **$ 140.454.269.00.oo**

FECHA ACTA DE RECIBO FINAL: 15 de agosto de 2021

En Neiva, a los quince (15) días del mes de agosto de 2021, se reunieron el **Dr. GIOVANNY CÓRDOBA RODRÍGUEZ**, Secretario de Educación Municipal en calidad de Supervisor del contrato de interventoría **No.1927 de 2020**, el Ingeniero **VLADIMIR IVAN LOSADA CONDE** en calidad de apoyo a la Supervisión contrato de interventoría 1927 de 2020, el Ingeniero **JOHN ALEXANDER ARTUNDUAGA CLEVES** identificado con cedula de ciudadanía No. 12.262.598 de Pitalito en calidad de interventor del contrato de obra 1913 de 2020 y **DIEGO ANDRES REYES VARGAS** identificado con cédula de ciudadanía No 7.704.116 de Neiva, en representación legal del **CONSORCIO FPS** identificado con el Nit: 901.437.805-7 en calidad de contratista, con la finalidad de firmar la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** teniendo en cuenta que se ha cumplido a cabalidad el objeto contractual.

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes hoy 15 de agosto de 2021.

GIOVANNY CÓRDOBA RODRÍGUEZ
secretario de Educación Municipal
Supervisor contrato de Interventoría
No.1927 de 2020

CONSORCIO FPS
Representante legal
DIEGO ANDRES REYES VARGAS
C.C. No. 7.704.116 de Neiva
Contratista de Obra

VLADIMIR IVAN LOSADA CONDE
Apoyo a la Supervisión contrato de
Interventoría No. 1927 de 2020

JOHN ALEXANDER ARTUNDUAGA CLEVES
C.C. No. 12.262.598 de Pitalito
Interventoría Externa

Proyectó:
CARLOS CORREDOR QUEZADA
Apoyo Jurídico SEM

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co.
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

ACTA DE RECIBO DE OBRA

FOR-GDCO-15

Versión: 01

Vigente desde: Noviembre 21 de 2017

MUNICIPIO DE NEIVA

DEPARTAMENTO DEL HUILA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO CLARETIANO			ACTA DE RECIBO DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO FPS	CONTRATO No. :	1913 2020	ACTA No. 4	Parcial / Final X
INTERVENTOR:	JOHN ALEXANDER ARTUNDUAGA C.	VR CONTRATO INICIAL:	$ 937.829.993,00		
SUPERVISOR :	VLADIMIR LOSADA CONDE	VR. ANTICIPO (30%) :	$ 281.358.970,00		
FECHA DE INICIO :	17/12/2020	VR.MODIFICACION :	$ 462.218.635,00	Hoja 1	de 1
PLAZO INICIAL :	Noventa (90) días	VR. VIGENTE:	$ 1.399.748.628,00		
PLAZO FINAL :	CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS	VR. EJECUTADO :	$ 1.399.698.356,28	Fecha Acta	Día / Mes / Año
FECHA TERMINACION:	15/ago/2021	VR. PRESENTE ACTA :	$ 140.454.269,28		15/ago/2021

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRATADAS CONDICIONES VIGENTES				EJECUTADAS PRESENTE ACTA		ACUMULADAS	
		UNIDAD	CANT	Vr.UNIT	V. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANT	VALOR
1	Movimiento de tierras terrazas								
1.1	Excavación a máquina en material común de 0 a 2 mt en seco	m3	709,68	$ 23.455,46	$ 16.645.874	0,00	$ -	709,68	$ 16.645.874
1.2	Trasiego de material de excavación interno	m3/comp.	0,00	$ 12.653,16	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS TERRAZAS :				*$ 16.645.874*		*$ -*		*$ 16.645.874*
2	Acceso Peatonal								
2.1	Excavación a máquina en material común de 0 a 2 mt en seco	m3	0,00	$ 23.455,46	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.2	Trasiego de material de excavación interno	m3/comp.	0,00	$ 12.653,16	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.3	Relleno con Recebo compactado mecánicamente, incluye material y transporte a obra	m3	0,00	$ 58.239,69	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.4	Suministro e instalación de geotextil T 2100	m2	0,00	$ 10.279,74	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.5	Piso en concreto de 2500 PSI estampado de e= 0,08 mts. Incluye herramientas, moldes y transportes	m2	17,00	$ 55.748,03	$ 947.717	0,00	$ -	17,00	$ 947.717
2.6	Refuerzo malla electrosoldada Ø 6.5mm - 0.15x0.15	kg	57,80	$ 7.192,42	$ 415.722	0,00	$ -	57,80	$ 415.722
2.7	Suministro e instalacion de bordillo prefabricado de 10x20	ml	23,80	$ 34.769,06	$ 827.504	0,00	$ -	23,80	$ 827.504
	TOTAL ACCESO PEATONAL :				*$ 2.190.943*		*$ -*		*$ 2.190.943*
3	Plazoleta 1								
3.1	Excavación a máquina en material común de 0 a 2 mt en seco	m3	0,00	$ 23.455,46	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.2	Trasiego de material de excavación interno	m3/comp.	0,00	$ 12.653,16	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.3	Relleno con Recebo compactado mecánicamente, incluye material y transporte a obra	m3	0,00	$ 58.239,69	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.4	Suministro e instalación de geotextil T 2100	m2	148,43	$ 10.279,74	$ 1.505.262	0,00	$ -	148,43	$ 1.505.262
3.5	Placa en concreto estampado espesor 10 cm, incluye sello acrilico	m2	57,87	$ 120.958,97	$ 7.002.095	0,00	$ -	57,87	$ 7.002.095
3.6	Suministro y construcción placa maciza e=.10 en concreto 3000 psi. curado, incluye formaleta	m2	88,56	$ 60.207,22	$ 5.331.951	0,00	$ -	88,56	$ 5.331.951
3.7	Refuerzo malla electrosoldada Ø6.5mm - 0.15x0.15	kg	497,86	$ 7.192,42	$ 3.580.833	0,00	$ -	497,86	$ 3.580.833
3.8	Suministro e instalacion de bordillo prefabricado de 10x20	ml	105,30	$ 34.769,06	$ 3.661.184	0,00	$ -	105,30	$ 3.661.184
	TOTAL PLAZOLETA 1:				*$ 21.081.325*		*$ -*		*$ 21.081.325*

4	Circulaciones								
4.1	Excavación a máquina en material común de 0 a 2 mt en seco	m3	0,00	$ 23.455,46	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.2	Traslago de material de excavación interno	m3/comp	0,00	$ 12.653,16	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.3	Relleno con Recebo compactado mecánicamente, incluye material y transporte a obra	m3	0,00	$ 58.239,69	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.4	Suministro e instalación de geotextil T 2100	m2	0,00	$ 10.279,74	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.5	Piso en concreto de 2500 PSI estampado de e= 0,08 mts. Incluye herramientas, moldes y transportes para estampado	m2	86,60	$ 55.748,03	$ 4.826.630	0,00	$ -	86,40	$ 4.826.630
4.6	Refuerzo malla electrosoldada Ø6.5mm - 0.15x0.15	kg	0,00	$ 7.192,42	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.7	Suministro de sumidero incluye concreto 3000 y marco rejilla y tapa ángulo 1 1/2"x3/16", platina 1 1/4"x3/16"	ml	228,56	$ 193.809,64	$ 44.315.416	36,75	$ 7.125.444	228,56	$ 44.315.416
4.8	Suministro e instalacion de bordillo prefabricado de 10x20	ml	56,50	$ 34.769,08	$ 1.964.453	0,00	$ -	56,50	$ 1.964.453
4.9	Escalera maiza 3500 PSI	m3	0,00	$ 945.014,02	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.10	Acero de refuerzo figurado	kg	0,00	$ 3.720,73	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.11	Suministro e instalación de baranda construida en tubo redondo de cerramiento de 2" modulo de 1x1 enmarcada en ángulo de 1"x1/8 malla grabada cal 10, Lanche en lamina cla 1/16 de 0.20x0.25 (incluye pintura) Peatonal	ml	0,00	$ 213.337,50	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.12	Rampa en concreto estampado de 3000 PSI para personas en condición de discapacidad e= 10cm (incluye alistado y nivelación)	m2	31,94	$ 58.351,64	$ 1.863.751	0,00	$ -	31,94	$ 1.863.751
4.13	Refuerzo malla electrosoldada Ø6.5mm - 0.15x0.15	kg	402,36	$ 7.192,42	$ 2.893.913	0,00	$ -	402,36	$ 2.893.913
	TOTAL CIRCULACIONES:				*$ 55.854.163*		*$ 7.125.444*		*$ 55.854.164*
5	Área de extensión preescolar (Incluye acabado en caucho)								
5.1	Excavación a máquina en material común de 0 a 2 mt en seco	m3	37,66	$ 23.455,46	$ 883.394	0,00	$ -	37,66	$ 883.394
5.2	Traslago de material de excavación interno	m3/comp.	0,00	$ 12.653,16	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.3	Relleno con Recebo compactado mecánicamente, incluye material y transporte a obra	m3	40,60	$ 58.239,69	$ 2.364.429	0,00	$ -	40,60	$ 2.364.429
5.4	Suministro e instalación de geotextil T 2100	m2	0,00	$ 10.279,74	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.5	Suministro e instalación de piso en caucho para parque infantil, acabados en diferentes colores; incluye alistado en concreto de 2500 psi.	m2	122,33	$ 75.226,76	$ 9.202.113	0,00	$ -	122,33	$ 9.202.113
5.6	Refuerzo malla electrosoldada Ø 6.5mm - 0.15x0.15	kg	2207,23	$ 7.192,42	$ 15.875.318	0,00	$ -	2.207,23	$ 15.875.318
5.7	Suministro e instalacion de bordillo prefabricado de 10x20	ml	41,75	$ 34.769,08	$ 1.451.609	0,00	$ -	41,75	$ 1.451.609
	TOTAL AREA DE EXTENCION PREESCOLAR (INCLUYE ACABADO EN CAUCHO):				*$ 29.776.863*		*$ -*		*$ 29.776.863*
6	Cancha Múltiple								
6.1	Excavación en material común de 0 a 2 mt en seco	m3	259,47	$ 23.356,06	$ 6.060.121	0,00	$ -	259,47	$ 6.060.121

6.2	[illegible]	m3/comp	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	0,00	$ -	[illegible]	$ [illegible]
6.3	[illegible]	m3	79,83	$ 111.732,00	$ 8.920.071	0,00	$ -	79,83	$ 8.920.071
6.4	[illegible]	m3	105,37	$ 110.278,76	$ 11.620.083	0,00	$ -	105,37	$ 11.620.083
6.5	[illegible]	m2	593,57	$ 10.279,74	$ 6.103.453	0,00	$ -	593,57	$ 6.103.453
6.6	Placa en concreto de 3000 PSI, reforzado en espesor de 10 cms, con dosificación de fibra de 3 kg/m3 de fibra Lvf Strand, cuantía mínima de 2 x 2 mt, juntas de construcción con dovelas lisas de 3/8" cada 30 cms de longitud 35 cms, en juntas de contracción corte indicado al 40% de profundidad, debe llevar polietileno negro cal. 6 perforado entre la base y el la placa para mejorar coeficiente de fricción, acabado superficial sin endurecedor con plato con dos pasadas de aspa, corta y sello de juntas con sellante elastomérico.	m2	526,86	$ 115.290,55	$ 60.745.194	0,00	$ -	526,86	$ 60.745.194
6.7	Construcción cunieta de aguas lluvias en concreto de 3000 psi grava común incluye rejilla prefabricada (carcamo)	ml	58,68	$ 180.658,78	$ 10.532.087	0,00	$ -	58,68	$ 10.582.087
6.8	Cancha múltiple A H, incluye tablero en acrílico con rodachines y cilindro para movilizar (PAR)	un	1,00	$ 12.305.185,23	$ 12.305.185	0,00	$ -	1,00	$ 12.305.185
	TOTAL CANCHA MULTIPLE :				$ 198.330.408		$ -		$ 198.330.408
7	Parqueadero								
7.1	Excavación a máquina en material común de 0 a 2 mt en seco	m3	1790,00	$ 23.455,48	$ 41.985.281	0,00	$ -	1.790,00	$ 41.985.281
7.2	Trasiego de material de excavación interno	m3/comp	355,39	$ 12.853,16	$ 4.567.885	0,00	$ -	355,39	$ 4.567.885
7.3	Relleno con Recebo compactado mecánicamente, incluye material y transporte a obra	m3	0,00	$ 55.951,28	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.4	Cargue, suministro, extendida y compactación de Base Granular	m3	0,00	$ 58.239,69	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.5	Cargue, suministro, extendida y compactación de Sub-Base Granular	m3	252,35	$ 110.276,76	$ 27.828.340	0,00	$ -	252,35	$ 27.828.340
7.6	Suministro e instalación de geotextil T 2100	m2	942,01	$ 10.279,74	$ 9.683.626	0,00	$ -	942,01	$ 9.683.626
7.7	Suministro de sumidero incluye concreto 3000 y marco rejilla y tapa ángulo 1 1/2"x3/16", platina 1 1/4"x3/16"	ml	0,00	$ 193.839,64	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.8	Placa en concreto e=12cm (incluye alistado y nivelación)	m2	82,50	$ 102.763,68	$ 8.478.004	0,00	$ -	82,50	$ 8.478.004
7.9	Refuerzo malla electrosoldada Ø5.5mm - 0.15x0.15	kg	82,50	$ 7.192,42	$ 593.375	0,00	$ -	82,50	$ 593.375
7.10	Suministro e instalación de baranda construida en tubo redondo de cerramiento de 2" modulo de 1x1 enmarcada en ángulo de 1"x1/8 malla grabada cal.10, fanche en lamina cla 1/16 de 0.20x0.25 (incluye pintura) Peatonal	ml	0,00	$ 210.683,16	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.11	Suministro e instalación de bordillo prefabricado de 10x20	ml	159,37	$ 34.769,00	$ 5.541.148	0,00	$ -	159,37	$ 5.541.148
7.12	Acabado en gravilla de río	m3	94,37	$ 88.742,53	$ 8.374.582	0,00	$ -	94,37	$ 8.374.582

7.13	Suministro, transporte e instalación de tubo tubería PVC pentratado de 200 mm, incluye pegante y grapa para tubo de 1/2" a 1", espesor de 0.4 \ 0.4 m	ml	75,94	$ 87.378,70	$ 6.639.034	0,00	$ -	75,94	$ 6.639.034
7.14	Cuneta en concreto de 2500 psi, fundida en el lugar, e=0.10m, alisada con llana metálica, incluye formaleta	ml	0,00	$ 20.183,02	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	TOTAL PARQUEADERO:				$ 113.691.373		$ -		$ 113.691.373
8	Cerramiento								
8.1	Excavación a máquina en material común de 0 a 2 mt en seco	m3	237,62	$ 23.455,46	$ 5.573.371	0,00	$ -	237,62	$ 5.573.371
8.2	Trasiego de material de excavación interno	m3/comp.	0,00	$ 12.653,16	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.3	Concreto pobre concreto 1:3:5 e=0,05m	m2	228,58	$ 28.719,83	$ 6.564.651	0,00	$ -	228,58	$ 6.564.651
NP 1	CONCRETO CICLOPEO 40% PIEDRA 60% CONCRETO DE 2500 PSI	M3	24,43	$ 468.000,00	$ 11.434.176	0,00	$ -	24,43	$ 11.434.176
Sin incl	Viga de amarre cimentación concreto 3000 PSI	m3	107,55	$ 548.809,98	$ 59.024.250	0,00	$ -	107,55	$ 59.024.250
8.5	Acero de refuerzo figurado	kg	22610,52	$ 3.720,73	$ 84.127.652	0,00	$ -	22.610,52	$ 84.127.652
8.6	Relleno con Recebo compactado mecánicamente, incluye material y transporte a obra	m3	0,00	$ 55.951,28	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.7	Relleno tipo 6 Rajón-Piedra	m3	0,00	$ 92.374,61	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.8	Relleno tipo 7 Arena de peña	m3	0,00	$ 78.061,54	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.9	Cuneta en concreto de 2500 psi, fundida en el lugar, e=0.10m, alisada con llana metálica, incluye formaleta	ml	221,00	$ 20.183,02	$ 4.460.447	0,00	$ -	221,00	$ 4.460.447
8.10	cerramiento perimetral en mamposteria, columnas de 0,25 * 0,20, bloque No 5, viga aerea de 0 ,15 * 0,15, pañetado por ambas caras, acabado en pintura. Color a definir.	M2	864,11	$ 173.898,53	$ 150.268.056	0,00	$ -	864,11	$ 150.268.056
NP 2	cerramiento perimetral en mamposteria, columnas de 0,25 * 0,25, bloque No 5 LISO, viga aerea de 0 ,15 * 0,15, pañetado por UNA cara, acabado en pintura por el lado pañetado, pintura en aceite lado ladrillo liso, Color a definir.	M2	539,22	$ 193.000,00	$ 104.068.853	0,00	$ -	539,22	$ 104.068.853
Retiro NP 3	MURO EN LADRILLO TOLETE PEGADOS EN TIZON Y SOGA , RECUBIERTO EN pañetano negro cal. 6 por una cara	M2	154,13	$ 180.000,00	$ 27.742.590	0,00	$ -	154,13	$ 27.742.590
NP 4	COLUMNAS 0,25*0,25 EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	7,32	$ 548.809,98	$ 4.017.632	0,00	$ -	7,32	$ 4.017.632
8.11	Puertas de acceso batiente marco en cold rolled perfileria 10x4 Cal16 + reja compuesta de pares verticales en tubo cuadrado de 1-1/2" + cerradura tipo sladge o similar con pasador interior + perfil metalico de soporte + anticorrosivo + pintura color a definir.	ml	16,90	$ 1.409.372,65	$ 23.818.401	0,00	$ -	16,90	$ 23.818.401
	TOTAL CERRAMIENTO :				$ 481.100.219		$ -		$ 481.100.219
9	Instalaciones Hidrosanitarias								
9.1	Excavación a máquina en material común de 0 a 2 mt en seco	m3	3,00	$ 23.455,46	$ 70.366	3,0000	$ 70.366	3,00	$ 70.366
9.2	Trasiego de material de excavación interno	m3/comp.	0,00	$ 12.653,16	$ -	0,0000	$ -	0,00	$ -
9.3	Suministro e instalación lecho en arena para tubería	m3	0,00	$ 68.768,42	$ -	0,0000	$ -	0,00	$ -

9.4	Relleno en material seleccionado de la misma excavación compactado con medios para almohadillado	m3	0,01	$ 17.155,83	$ 155	0,0000	$ -	0,01	$ -
9.5	Suministro y construcción de red subterránea en tubería de PVC sanitaria 6" Inc. Accesorios	ml	0,00	$ 58.405,83	$ -	0,0000	$ -	0,00	$ -
9.6	Caja inspección (UNO)	un	2,00	$ 379.042,66	$ 758.085	0,0000	$ -	2,00	$ 758.085
	TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS:				$ 838.607		$ 79.314		$ 838.607
10	Red media de tensión definitiva								
10.1	Canalización vía pública dos (2) ductos tipo eb 60 65° epm norma rsl 002, incluye excavación relleno en arena de peña y en sub base granular tipo b-400) y transporte y disposición final de escombros. No incluye demolición ni reconstrucción de andén o pavimento, entibados	ml	63,00	$ 400.000	$ 25.200.000	0,00	$ -	63,00	$ 25.200.000
10.2	Suministro e instalación de Cable 3x120 mm2-Al-XLPE (incluye bucles de 2m en cada caja)	ml	150,00	$ 265.000	$ 39.950.000	0,00	$ -	150,00	$ 39.950.000
10.3	Suministro e instalación de estructura NC 701, incluye poste bajante de MT, 6 " galvanizada en poste de 12m (incluye accesorios, entradas, uniones, curvas y elementos de fijación crucetas, seccionadores, y lo que aplique según norma	un	0,00	$ 5.550.000	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.4	Construcción de caja CS 276 según norma (nclue excavación, Banos acabados y tapa) (anexo detalle caja)	un	2,00	$ 3.750.000	$ 7.500.000	0,00	$ -	2,00	$ 7.500.000
NP 5	Suministro e instalación de estructura en poste de 12m TUBO de MT, 6 " galvanizada en poste de 12m (nclure accesorios, entradas, uniones, curvas y elementos de fijación crucetas, seccionadores, y lo que aplique según norma), Incluye cable completo de 3/8, tubería galvanizada de 3/4 y cable desnudo para puesta a tierra, conector linea viva, pararay polimerico de de 12 kv. no incluye el poste	un	1,00	$ 7.800.000	$ 7.800.000	0,00	$ -	1,00	$ 7.800.000
NP 6	suministro e instalacion de Mesas de aislamiento para cajitas. (pasticas o madera plastica)	un	5,00	$ 420.000	$ 2.100.000	0,00	$ -	5,00	$ 2.100.000
NP 7	Remodelacion de cajas para dar cumplimiento a la Norma (incluye retiros de cajas, demolicion de fondos, excavacion, suministro de material filtrante tipo gravilla y concretos)	un	3,00	$ 468.000	$ 1.404.000	0,00	$ -	3,00	$ 1.404.000
NP 8	Terminal premoldeado	un	6,00	$ 350.000	$ 2.100.000	0,00	$ -	6,00	$ 2.100.000
10.5	Tramites ante operador por entrega de red	gb	1,00	$ 4.984.139	$ 4.984.139	0,00	$ -	1,00	$ 4.984.139
10.6	Certificado RETIE	un	1,00	$ 2.913.337	$ 2.913.337	0,00	$ -	1,00	$ 2.913.337
10.7	Pruebas VLF a cable de MEDIA TENSION	gl	1,00	$ 2.140.023	$ 2.140.023	0,00	$ -	1,00	$ 2.140.023
	TOTAL RED MEDIA DE TENCION DEFINITIVA :				$ 93.091.499		$ -		$ 93.091.499

	ITEMS NUEVOS	UNIDAD	CANT	Vr.UNIT	V. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANT	VALOR
NP 9	PINTURA SOBRE MURO VUELO 3 MANOS GRIS BASALTO	M2	114,8299	$ 13.714	$ 1.574.723	114,83	$ 1.574.723	114,83	$ 1.574.723

NP 10	PINTURA Y DEMARCADO CANCHA EN COLORES INDICADOS DE LA CANCHA MULTIPLE EN PINTURA TRAFICO CANCHA ANTIDESLIZANTE PARA EXTERIORES (COLORES A DEFINIR)	M2	531	$ 42.821	$ 22.737.791	531,00	$ 22.737.791	531,00	$ 22.737.791
NP 11	Construccion de cerramiento en malla eslabonada cal 10 h=sco 2 1/2" * 2 1/2" h=2,0 m, con parales en tubo de 3" de 5 mm de espesor, horizontales en tuberia de 1 1/2" calibre 16, pisa malla 5/8"x1/8, angulo hierro de 1 1/4" * 1/8 para marco malla, altura 4,00m. Incluye anticorrosivo y pintura (Incluye brazo soporte cada 3 mts) los en Liberia de 3" estructural anclada a dados de concreto ciclopeo de 0,60*0,60*0,60m)	M2	101,7	$ 263.904	$ 50.550.400	101,70	$ 50.590.400	101,70	$ 50.590.400
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO PARA CONFINAMIENTO DE ANDENES (0,17*0,40*1)	ML	92,8	$ 46.094	$ 4.277.479	92,80	$ 4.277.479	92,80	$ 4.277.479
NP 13	MOVIMIETO DE HORANTES, (INCLUYE TUBERIA, COOPLING, NIPLES, EXCAVACIONES, RELLENOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	2	$ 1.189.284	$ 2.378.569	2,00	$ 2.378.569	2,00	$ 2.378.569
NP 14	ANDENES EXTERIORES EN CONCRETO DE 3000 PSI ESPESOR DE 0,08 MTS	M2	143,43	$ 52.708	$ 7.559.915	143,43	$ 7.559.915	143,43	$ 7.559.915
NP15	CONFORMACION MECANICA DE AREAS COMUNES, ACCESOS Y VIAS	M2	1989,94532	$ 8.085	$ 16.088.709	1.985,00	$ 16.048.725	1.985,00	$ 16.048.725
	TOTAL ITEMS NUEVOS:				$ 105.201.597		$ 105.187.604		$ 105.187.604

COSTOS DIRECTOS	$ 1.119.798.823		$ 112.363.416		$ 1.119.758.685
ADMINISTRACION 18%	$ 201.563.788		$ 20.225.415		$ 201.556.563
IMPREVISTOS 2%	$ 22.395.976		$ 2.247.268		$ 22.395.174
UTILIDADES 5%	$ 55.989.941		$ 5.618.171		$ 55.987.934
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 1.399.748.528		$ 140.454.269		$ 1.399.698.356

MENOS A MORTIZACION DE ANTICIPO VR. TOTAL:		$ -
VALOR A GIRAR:		$ 140.454.269

VALOR A GIRAR: CIENTO CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

DIEGO ANDRES REYES VARGAS
Represententante Legal CONSORCIO FPS
Contratista

VLADIMIR LOSADA CONDE
Apoyo a la Supervisión - Municipio de Neiva

JOHN ALEXANDER ARTUNDUAGA C.
Interventor

CONSORCIO FPS

Anexo 1 – Acta de conformación de Consorcio

Señores:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
MUNICIPIO DE NEIVA
Carrera 5 No. 9-74 – Piso 2
Neiva

Referencia: PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. **MNSELPOB-1480-2020**

Los suscritos **DIEGO ANDRES REYES VARGAS** identificado con c.c. No. 7.704.116 de Neiva, **CARLOS ANDRÉS GORRON AVENDAÑO** identificado con c.c. No. 1.075.276.063 de Neiva y **WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA** identificado con c.c. No. 7.711.612 de Neiva, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **PACOT INTEGRALES S.A.S.** con NIT. 900.693.242-3, **FIDECOM S.A.S.** con NIT. 813.001.104-1 y **SEINGECOL S.A.S.** con NIT. 900.072.667-5, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el proceso de la referencia cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLARETIANO, y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será de la duración del plazo del contrato y un (1) año más.

2. El Consorcio está integrado por:

Nombre	% Participación *
PACOT INTEGRALES S.A.S	90 %
FIDECOM S.A.S	5 %
SEINGECOL S.A.S.	5 %

** El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los miembros, debe ser igual al 100%.*

3. El Consorcio se denomina **CONSORCIO FPS**

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

5. El representante del Consorcio es **DIEGO ANDRES REYES VARGAS**, identificado con C. C. No. 7.704.116 de Neiva, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Actuará como suplente **CARLOS ANDRÉS GORRON AVENDAÑO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.075.276.063 de Neiva.

6. La sede del Consorcio es:

Dirección de correo: **Calle 14 No. 43A -90**
Correo Electrónico: **pacotingn2020@gmail.com**
Teléfono: **320 801 7654**
Ciudad: **Neiva – Huila**

CONSORCIO FPS

En constancia, se firma en Neiva, a los **veinte (20)** días del mes de **noviembre de 2020**.

DIEGO ANDRES REYES VARGAS
Representante Legal de PACOT INTEGRALES S.A.S
C.C. No. 7.704.116 de Neiva

CARLOS ANDRÉS GORRON AVENDAÑO
Representante Legal de FIDECOM S.A.S.
C.C. No. 1.075.276.063 de Neiva

WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA
Representante Legal de SEINGECOL S.A.S.
C.C. No. 7.711.612 de Neiva

DIEGO ANDRES REYES VARGAS
Representante Legal del CONSORCIO FPS
C.C. No. 7.704.116 de Neiva

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EN MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° 2512 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y CONSORCIO EL ROSARIO

OBJETO:	"ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUSTIN CODAZZI SEDE EL ROSARIO DE LA CIUDAD DE NEIVA"
CONTRATISTA:	**CONSORCIO EL ROSARIO** **Nit. 901.588.278-2** **R.L. DIEGO MAURICIO CALDERON O.** **C.C. No. 1.075.298.785 de Neiva.**
VALOR DEL CONTRATO:	**SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TRES PESOS ($625.083.103,00) M/CTE., incluido los impuestos a que haya lugar.**
VALOR ADICIONAL:	**TRECIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ($306.290.720) M/CTE**
VALOR TOTAL:	**NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTI TRES PESOS ($931.373.823) M/CTE**
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	TRES (03) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIONAL:	TRES (03) MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:	SEIS (06) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA ACTA DE INICIO:	06 DE MAYO DE 2022
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 1:	17 DE MAYO DE 2022
FECHA ACTA DE REINICIO 1:	01 DE AGOSTO DE 2022
FECHA ACTA DE SUSPENSÓN 2:	11 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA ACTA DE REINICIO 2:	05 DE MAYO DE 2023
FECHA ACTA DE SUSPENSÓN 3:	21 DE JUNIO DE 2022
FECHA ACTA DE REINICIO 3:	02 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE NOVIEMBRE DE 2023

MUNICIPIO DE NEIVA NIT. 891180009-1	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FOR-GDCO-13 Versión: 01 Vigente desde: Marzo 19 del 2021	Primero Neiva mipg

En Neiva, a los 12 días del mes de diciembre de 2023, se reunieron **LEVID BERMEO QUINTERO**, en calidad de Secretaria de Educación Municipal y Supervisora del contrato de obra, **VLADIMIR IVAN LOSADA CONDE**, en calidad de Apoyo a la Supervisión del contrato de obra y el ingeniero **DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.075.298.785 de Neiva como Representante Legal del **CONSORCIO EL ROSARIO** con **Nit.**901.588.278-2, en calidad de Contratista, con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1.0 VALORES:

DESCRIPCIÓN	VALOR
1. Valor Inicial del Contrato y/o convenio	$625.083.103,00
2. Valor adicional del contrato	$306.290.720,00
3. Valor Final Ejecutado	$931.373.823,00
4. Saldo a Favor del Municipio de Neiva	N/A
5. Saldo a Favor del Contratista	N/A

2.0 ACTAS:

DESCRIPCIÓN	FECHA
1. Acta de Iniciación	06 DE MAYO DE 2022
2. Acta de Suspensión No. 1	17 DE MAYO DE 2022
3. Acta de Reinicio No. 1	01 DE AGOSTO DE 2022
4. Acta Otrosí No. 001	24 DE AGOSTO DE 2022
5. Acta de suspensión No. 2	11 DE OCTUBRE DE 2022
6. Acta de Reinicio No. 2	05 DE MAYO DE 2023
7. Acta Otrosí No. 002	05 DE MAYO DE 2023
8. Acta de suspensión No. 3	21 DE JUNIO DE 2022
9. Acta de Reinicio No. 3	02 DE NOVIEMBRE DE 2023
10. Acta de terminación	30 DE NOVIEMBRE DE 2023

3.0 POLIZAS:

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de Cumplimiento No. 61-44-101043117y de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 61-40-101016155, con los amparos de Cumplimiento, buen manejo del anticipo, prestaciones sociales, calidad de los elementos, estabilidad de la obra, amparo básico-predios, labores y operaciones, expedida por "SEGUROS MUNDIAL", aprobadas por la Secretaria de Educación del Municipio de Neiva así:

SEGUROS MUNDIAL						
Documento	Garantía No.	Riesgos asegurados	Valores Amparados ($)	Vigencia de los amparos		Fecha Aprobación (dd/mm/aaaa)
				Inicio (dd/mm/aaaa)	Final (dd/mm/aaaa	
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	No. POLIZA-	CUMPLIMIENTO	$125.016.620,60	27/04/2022	05/06/2023	02/05/2022

	61-44-101043117					
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	No. POLIZA-61-44-101043117	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$197.524.930,90	27/04/2022	05/06/2023	02/05/2022
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	No. POLIZA-61-44-101043117	PRESTACIONES SOCIALES	$125.016.620,60	27/04/2022	05/12/2025	02/05/2022
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	No. POLIZA-61-44-101045017	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$125.016.620,60	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS.		02/05/2022
POLIZA DE RCE	No. POLIZA 61-40-101016155	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$200.000.000	27/04/2022	05/06/2023	02/05/2022

AMPLIACIÓN PÓLIZA POR ADICIÓN EN TIEMPO ANEXO TRASLADO DE VIGENCIA

SEGUROS MUNDIAL						
Documento	Garantía No.	Riesgos asegurados	Valores Amparados ($)	Vigencia de los amparos		Fecha Aprobación (dd/mm/aaaa)
				Inicio (dd/mm/aaaa)	Final (dd/mm/aaaa	
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	No. POLIZA-61-44-101043117	CUMPLIMIENTO	$125.016.620,60	06/05/2022	14/06/2023	13/05/2022
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	No. POLIZA-61-44-101043117	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$197.524.930,90	06/05/2022	14/06/2023	13/05/2022
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	No. POLIZA-61-44-101043117	PRESTACIONES SOCIALES	$125.016.620,60	06/05/2022	14/12/2025	13/05/2022
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	No. POLIZA-61-44-101043117	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$125.016.620,60	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS.		13/05/2022
POLIZA DE RCE	No. POLIZA 61-40-101016155	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$200.000.000	06/05/2022	14/06/2023	13/05/2022

ANEXO PRORROGA

SEGUROS MUNDIAL						
Documento	Garantía No.	Riesgos asegurados	Valores Amparados ($)	Vigencia de los amparos		Fecha Aprobación (dd/mm/aaaa)
				Inicio (dd/mm/aaaa)	Final (dd/mm/aaaa	
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	No. POLIZA-	CUMPLIMIENTO	$125.016.620,60	06/05/2022	03/09/2023	12/08/2022

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co.
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

	61-44-101043117					
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	No. POLIZA-61-44-101043117	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$197.524.930,90	06/05/2022	03/09/2023	12/08/2022
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	No. POLIZA-61-44-101043117	PRESTACIONES SOCIALES	$125.016.620,60	06/05/2022	03/09/2023	12/08/2022
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	No. POLIZA-61-44-101043117	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$125.016.620,60	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS.		12/08/2022
POLIZA DE RCE	No. POLIZA 1-61-40-101016155	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$200.000.000	06/05/2022	03/09/2023	12/08/2022

ANEXO PRORROGA

SEGUROS MUNDIAL						
Documento	Garantía No.	Riesgos asegurados	Valores Amparados ($)	Vigencia de los amparos		Fecha Aprobación (dd/mm/aaaa)
				Inicio (dd/mm/aaaa)	Final (dd/mm/aaaa	
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	No. POLIZA - 61-44-101043117	CUMPLIMIENTO	$125.016.620,60	06/05/2022	18/08/2024	10/11/2023
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	No. POLIZA - 61-44-101043117	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$187.524.930,90	06/05/2022	18/08/2024	10/11/2023
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	No. POLIZA - 61-44-101043117	PRESTACIONES SOCIALES	$125.016.620,60	06/05/2022	18/08/2024	10/11/2023
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	No. POLIZA - 61-44-101043117	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$125.016.620,60	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS.		10/11/2023
POLIZA DE RCE	No. POLIZA - 61-40-101016155	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$200.000.000	06/05/2022	18/08/2024	10/11/2023
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	No. POLIZA- 61-44-101043117	CUMPLIMIENTO	$125.016.620,60	06/05/2022	18/08/2024	10/11/2023
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	No. POLIZA- 61-44-101043117	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$187.524.930,90	06/05/2022	18/08/2024	10/11/2023
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	No. POLIZA- 61-44-101043117	PRESTACIONES SOCIALES	$125.016.620,60	06/05/2022	18/08/2024	10/11/2023

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	No. POLIZA - 61-44-101043117	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$125.016.620,60	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS.	10/11/2023

4.0 BALANCE FINAL LIQUIDACIÓN:

4.1. Estado Financiero del Contrato				
RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
ANTICIPO CE No. 000000000424845	31/05/2022	$ 187.524.930,90	0	$625.083.103,00
ACTA PARCIAL 1 CE No. 000000000439806	14/10/2022	$ 353.013.700,00	$ 353.013.700,00	$ 272.069.403,00
ACTA PARCIAL 2 CE No. 000000000444305	26/10/2022	$ 149.069.662,00	$ 502.083.362,00	$ 122.999.741,00
OTROSÍ No.002	05/05/2023	$306.290.720,00	0	$429.290.461,00
ANTICIPO OTROSÍ No.002	15/06/2023	$91.887.216,00	0	$429.290.461,00
ACTA PARCIAL 3		$335.977.529,00	$838.060.891,00	$93.312.932,00
ACTA FINAL	EN TRAMITE	$93.312.932,00	$ 931.373.823,00	$ 0
Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
$ 625.083.103,00	$306.290.720,00	$ 931.373.823,00	$ 931.373.823,00	$ 0

Valor a pagar: NOVENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS ($93.312.932,00) M/Legal.

5.0 RECIBO A SATISFACCIÓN. El supervisor del Contrato certifica que el objeto se recibió mediante acta de terminación de fecha 30 de noviembre de 2023.

6.0 INFORME

Que, según el acta de terminación e informe suscrito por el supervisor, que reposa cronológicamente en el archivo, se dejó constancia expresa que el contratista cumplió con las obligaciones contractuales, según los informes de actividades ejecutadas por el mismo, y *"ha cumplido a cabalidad el objeto del contrato, en los términos y el tiempo establecido y conforme a lo preceptuado en el contrato de prestación de servicios"*.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co.
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

De igual manera se dejó constancia por parte del supervisor, de la verificación y cumplimiento de las obligaciones del Contratista, en tratándose de los aportes al sistema general de seguridad social integral, dentro del tracto del contrato, acorde con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y normas atinentes.

El contratista manifiesta clara y taxativamente que, durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones o coyunturas que pudieran generar desequilibrios económicos y ruptura de la ecuación contractual.

7.0 CONSTANCIAS

(Ninguna)

8.0 LIQUIDACIÓN: Que en cumplimiento del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, señala que en el acta de liquidación las partes harán constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

En consideración a lo anterior; El Municipio de NEIVA cancelará al Contratista la suma de **NOVENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS ($93.312.932,00) M/Legal.** Se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron:

LEVID BERMEO QUINTERO
Secretaria de Educación Municipal
Supervisora

VLADIMIR IVAN LOSADA CONDE
Apoyo a la supervisión

Diego Mauricio Calderón Obando

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal del CONSORCIO EL ROSARIO
C.C. No. 1.075.298.785 de Neiva
Contratista

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co.
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EN MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° 2512 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y CONSORCIO EL ROSARIO

OBJETO:	"ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUSTIN CODAZZI SEDE EL ROSARIO DE LA CIUDAD DE NEIVA"
CONTRATISTA:	CONSORCIO EL ROSARIO Nit. 901.588.278-2 R.L. DIEGO MAURICIO CALDERON O. C.C. No. 1.075.298.785 de Neiva.
VALOR DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TRES PESOS ($625.083.103,00) M/CTE., incluido los impuestos a que haya lugar.
VALOR DE ADICIONAL:	TRECIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ($306.290.720) M/CTE
VALOR TOTAL:	NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTI TRES PESOS ($931.373.823) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
PLAZO ADICIONAL:	TRES (03) MESES.
PLAZO TOTAL:	CINCO (06) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA ACTA DE INICIO:	**06 DE MAYO DE 2022**

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Primero Neiva	ACTA DE RECIBO FINAL	FOR-GDCO-12 Versión: 01 Vigente desde: Marzo 19 del 2021	Neiva Vida y Paz mipg

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 1:	**17 DE MAYO DE 2022**
FECHA ACTA DE REINICIO 1:	**01 DE AGOSTO DE 2022**
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 2:	**11 DE OCTUBRE DE 2022**
FECHA ACTA DE REINICIO 2:	**05 DE MAYO DE 2023**
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 3:	**21 DE JUNIO DE 2022**
FECHA ACTA DE REINICIO 3:	**02 DE NOVIEMBRE DE 2023**
FECHA OTROSÍ N°.01:	**24 DE AGOSTO DE 2022**
FECHA OTROSÍ N°.02:	**05 DE MAYO DE 2023**

FECHA ACTA DE RECIBO FINAL: 11 DE DICIEMBRE DE 2023

En Neiva, a los 11 días del mes de diciembre de 2023, se reunieron el **LEVID BERMEO QUINTERO** en calidad de Secretaria de Educación Municipal y Supervisora del contrato de obra, **VLADIMIR IVAN LOSADA CONDE**, en calidad de Apoyo a la Supervisión del contrato de obra y **DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.075.298.785 de Neiva como Representante Legal del **CONSORCIO EL ROSARIO**, en calidad de contratista, con la finalidad de firmar la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** teniendo en cuenta que se ha cumplido a cabalidad el objeto contractual.

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes hoy 11 de diciembre de 2023.

LEVID BERMEO QUINTERO
Secretaria de Educación Municipal
Supervisor

VLADIMIR IVAN LOSADA CONDE
Apoyo a la supervisión

Diego Mauricio Calderón O.

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal del CONSORCIO EL ROSARIO
C.C. No. 1.075.298.785 de Neiva
Contratista

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Primero Neiva	ACTA DE RECIBO FINAL	FOR-GDCO-12 Versión: 01 Vigente desde: Marzo 19 del 2021	Neiva Vida y Paz mipg

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 1:	**17 DE MAYO DE 2022**
FECHA ACTA DE REINICIO 1:	**01 DE AGOSTO DE 2022**
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 2:	**11 DE OCTUBRE DE 2022**
FECHA ACTA DE REINICIO 2:	**05 DE MAYO DE 2023**
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 3:	**21 DE JUNIO DE 2022**
FECHA ACTA DE REINICIO 3:	**02 DE NOVIEMBRE DE 2023**
FECHA OTROSÍ N°.01:	**24 DE AGOSTO DE 2022**
FECHA OTROSÍ N°.02:	**05 DE MAYO DE 2023**

FECHA ACTA DE RECIBO FINAL: 11 DE DICIEMBRE DE 2023

En Neiva, a los 11 días del mes de diciembre de 2023, se reunieron el **LEVID BERMEO QUINTERO** en calidad de Secretaria de Educación Municipal y Supervisora del contrato de obra, **VLADIMIR IVAN LOSADA CONDE**, en calidad de Apoyo a la Supervisión del contrato de obra y **DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.075.298.785 de Neiva como Representante Legal del **CONSORCIO EL ROSARIO**, en calidad de contratista, con la finalidad de firmar la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** teniendo en cuenta que se ha cumplido a cabalidad el objeto contractual.

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes hoy 11 de diciembre de 2023.

LEVID BERMEO QUINTERO
Secretaria de Educación Municipal
Supervisor

VLADIMIR IVAN LOSADA CONDE
Apoyo a la supervisión

Diego Mauricio Calderón O.

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal del CONSORCIO EL ROSARIO
C.C. No. 1.075.298.785 de Neiva
Contratista

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EN MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° 2512 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y CONSORCIO EL ROSARIO

OBJETO:	"ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUSTIN CODAZZI SEDE EL ROSARIO DE LA CIUDAD DE NEIVA"
CONTRATISTA:	**CONSORCIO EL ROSARIO** **Nit. 901.588.278-2** **R.L. DIEGO MAURICIO CALDERON O.** **C.C. No. 1.075.298.785 de Neiva.**
VALOR DEL CONTRATO:	**SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TRES PESOS ($625.083.103,00) M/CTE., incluido los impuestos a que haya lugar.**
VALOR ADICIONAL:	**TRECIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ($306.290.720) M/CTE**
VALOR TOTAL:	**NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTI TRES PESOS ($931.373.823) M/CTE**
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	TRES (03) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIONAL:	TRES (03) MESES.
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:	SEIS (06) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA ACTA DE INICIO:	06 DE MAYO DE 2022

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN NO 1:	**17 DE MAYO DE 2022**
FECHA ACTA DE REINICIO NO 1:	**01 DE AGOSTO DE 2022**
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No 2:	**11 DE OCTUBRE DE 2022**
FECHA ACTA DE REINICIO No 2:	**05 DE MAYO DE 2023**
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No 3:	**21 DE JUNIO DE 2022**
FECHA ACTA DE REINICIO No 3:	**02 DE NOVIEMBRE DE 2023**

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co.
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

MUNICIPIO DE NEIVA Primero Neiva	ACTA DE TERMINACIÓN	FOR-GDCO-18 Versión: 01 Vigente desde: Marzo 19 del 2021	Neiva Vida y Paz mipg

FECHA ACTA DE OTROSÍ No 1:	**24 DE AGOSTO DE 2022**
FECHA ACTA DE OTROSÍ No 2:	**05 DE MAYO DE 2023**

DESCRIPCIÓN	VALOR
1. Valor Inicial del Contrato	**$625.083.103,00**
2. Adición	**$306.290.720,00**
3. Valor Final Contratado	**$931.373.823,00**
4. Valor Final Ejecutado	**$931.373.823,00**
5. Saldo a Favor del Municipio de Neiva	**$ 00.oo**
6. Saldo a Favor del Contratista por pagar	**$ 00.oo**
7. Fecha de terminación	**30/11/2023**

En Neiva, a los 30 días del mes de noviembre de 2023, se reunieron **LEVID BERMEO QUINTERO** en calidad de Secretaria de Educación Municipal y Supervisora del contrato de obra, **VLADIMIR IVAN LOSADA CONDE**, en calidad de Apoyo a la Supervisión del contrato de obra y **DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.075.298.785 de Neiva como Representante Legal del **CONSORCIO EL ROSARIO**, en calidad de contratista, con la finalidad de firmar la presente **ACTA DE TERMINACIÓN.**

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes hoy 30 del mes de noviembre de 2023.

LIVED BERMEO QUINTERO
Secretario de Educación – Municipio de Neiva
Supervisor

VLADIMIR IVAN LOSADA CONDE
Apoyo a la supervisión

Diego Mauricio Calderón O.

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal del CONSORCIO EL ROSARIO
C.C. No. 1.075.298.785 de Neiva
Contratista

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co.
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

CONSORCIO EL ROSARIO

Anexo 1 – Acta de conformación de Consorcio

Señores:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
MUNICIPIO DE NEIVA
Carrera 5 No. 9-74 – Piso 2
Neiva

Referencia: PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. MNSEMSAMOP-004-2022

Los suscritos **DIEGO ANDRES REYES VARGAS** identificado con c.c. No. 7.704.116 de Neiva y **WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA** identificado con c.c. No. 7.711.612 de Neiva, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **PACOT INTEGRALES S.A.S.** con NIT. 900.693.242-3 y **SEINGECOL S.A.S.** con NIT. 900.072.667-5, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el proceso de la referencia cuyo objeto es "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFAESTRUCTURA FISICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUSTIN CODAZZI SEDE EL ROSARIO DE LA CIUDAD DE NEIVA", y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será de la duración del plazo del contrato y un (1) año más.

2. El Consorcio está integrado por:

Nombre	% Participación
PACOT INTEGRALES S.A.S	95 %
SEINGECOL S.A.S.	5 %

** El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los miembros, debe ser igual al 100%.*

3. El Consorcio se denomina **CONSORCIO EL ROSARIO**

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

5. El representante del Consorcio es **DIEGO ANDRES REYES VARGAS**, identificado con C. C. No. 7.704.116 de Neiva, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Actuará como suplente **WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA** identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.711.612 de Neiva.

6. La sede del Consorcio es:

Dirección de correo: **Calle 14 No. 43A -90**
Correo Electrónico: **consorcioelrosario2022@gmail.com**
Teléfono: **320 801 7654**

CONSORCIO EL ROSARIO

Ciudad: Neiva – Huila

En constancia, se firma en Neiva, a los treinta (30) días del mes de marzo del 2022

DIEGO ANDRES REYES VARGAS
Representante Legal de PACOT INTEGRALES S.A.S
C.C. No. 7.704.116 de Neiva

WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA
Representante Legal de SEINGECOL S.A.S.
C.C. No. 7.711.612 de Neiva

DIEGO ANDRES REYES VARGAS
Representante Legal del CONSORCIO EL ROSARIO
C.C. No. 7.704.116 de Neiva

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EN MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Nº 2512 DE 2022, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE NEIVA Y EL CONSORCIO EL ROSARIO

CONTRATISTA:	**CONSORCIO EL ROSARIO**
Nit.	901.588.278-2
INTEGRANTES	PACOT INTEGRALES S.A.S. (95%) SEINGECOL S.A.S. (5%)
OBJETO:	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUSTIN CODAZZI SEDE EL ROSARIO DE LA CIUDAD DE NEIVA"
VALOR:	**SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TRES PESOS ($625.083.103,00) M/CTE.**, incluido los impuestos a que haya lugar.
PLAZO:	TRES (03) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
ID SECOP II	MNSEMSAMOP-004-2022

Entre los suscritos de una parte **JOSE PAÚL AZUERO BERNAL** mayor de edad, vecino de la ciudad de Neiva, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.136.469 expedida en Neiva, obrando en nombre y en representación del Municipio de Neiva, en su condición de Secretario de Educación Municipal, debidamente delegada para contratar de conformidad con lo expuesto en el Decreto 0810 de 2021, quien en adelante se denominará **LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL** y por otra parte la, **CONSORCIO EL ROSARIO**, con Nit. 901.588.278-2; Representado Legalmente por **DIEGO ANDRÉS REYES VARGAS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.704.116 de Neiva (H.), quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, de conformidad con los documentos que hacen parte integral de este contrato, hemos acordado suscribir el presente Contrato de Obra Pública adjudicado mediante Resolución No. 0893 del 22 de abril de 2022, mediante la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. MNSEMSAMOP-004-2022, contrato que se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, demás Normas Reglamentarias y Complementarias y por las Cláusulas que más adelante se señalan previa las siguientes Consideraciones: **a) EL CONTRATISTA:** Declara expresamente bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, previstas en los Artículos 8 y 9 de las Ley 80 de1993, articulo 18 literal J, artículo 44 de la Ley 617 de 2000 y Artículo 1 de la Ley 821 de 2003 y demás normas legales y constitucionales; **b)** El presente Contrato se celebra de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 y siguientes de la Ley 80 de 1993. **c)** Que el proceso de contratación No. MNSEMSAMOP-004-2022, se adelantó en línea a través de la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II. **d)** Que existe disponibilidad presupuestal para afrontar este compromiso contractual, representado en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal número 3705 del veintiuno (21) de febrero de dos mil veintidós (2022), respectivamente. **e)** Los presentes documentos y actuaciones administrativas se someten al principio de publicidad y transparencia siendo publicadas en forma

debida en la Página Colombia Compra Eficiente - SECOP II. **f)** El presente Contrato fue adjudicado por parte de la Secretaría de Educación Municipal, mediante Resolución No. 0893 del 22 de abril de 2022, previo proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía. **g)** Que el presente Contrato se suscribe previo Estudios y Documentos suscrito por la Secretaría de Educación Municipal, dependencia donde surge la necesidad que origina el presente proceso contractual. En consecuencia, las cláusulas de este Contrato son las siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO DEL CONTRATO: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUSTIN CODAZZI SEDE EL ROSARIO DE LA CIUDAD DE NEIVA". PARÁGRAFO:** El Contratista declara que tiene pleno conocimiento de la forma de ejecutarse el Contrato, que se ha enterado de los requisitos y que está plenamente familiarizado con el trabajo que realizará, además que cumplirá con sus obligaciones de acuerdo a la propuesta presentada y las condiciones del pliego de condiciones y demás documentos previos, **CLÁUSULA SEGUNDA. – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** Fuera de las obligaciones inherentes al adecuado ejercicio del desarrollo del objeto del Contrato señalado en la Cláusula anterior; el Contratista se compromete principalmente a velare por el cumplimiento del Contrato en términos pactados. **PARÁGRAFO:** Sin perjuicio de la dirección general y del control y vigilancia que el Municipio debe ejercer sobre la ejecución de este Contrato, el Contratista responderá por la oportuna ejecución de este contrato dentro del plazo previsto y responderá por los hechos y omisiones que le fueran imputados. Además de las obligaciones usuales de este tipo de contratos tendrá entre otras las siguientes: **OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA** **Obligaciones generales**: (1). Cumplir con el objeto del contrato, consistente en la **"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUSTIN CODAZZI SEDE EL ROSARIO DE LA CIUDAD DE NEIVA"** en la forma y tiempo pactados, rigiéndose por los precios y condiciones señalados en la propuesta presentada. (2). Realizar máximo dentro de los **cinco (5) días hábiles** siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir los costos de éstos. (3). Presentar al momento de suscribir el acta de inicio un plan detallado de trabajo indicando fecha de iniciación y finalización de cada una de las actividades descritas. (4). El contratista deberá colocar una valla informativa en el lugar de ejecución contractual, donde exprese el objeto del contrato, valor, tiempo de ejecución, y demás datos que exija la reglamentación técnica colombiana. (5). Entregar las obras del objeto contractual en las condiciones establecidas en los estudios previos, pliego de condiciones, la propuesta presentada y demás documentos que obran dentro del proceso. (6). Entregar una obra funcional que cumpla con la NSR-10 (Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente) y demás normatividad aplicable. (7). Presentar informes puntuales a la Secretaria de Educación, independientemente de los informes de avance, cuando se presenten situaciones que puedan afectar la normal ejecución del contrato y el cumplimiento de los compromisos previstos. (8). Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, cuando sea requerida por el contratista o su interventor, adicionalmente a los informes que regularmente deba presentar. (9). Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga. (10). Destinar los recursos entregados por la Secretaría únicamente a la ejecución del presente contrato. (11). Consignar los rendimientos financieros que se generen en desarrollo del contrato, en la cuenta que el Municipio de Neiva indique, con copia al supervisor y/o interventor, acompañada de la certificación de rendimientos, emitida por la entidad financiera. (12). El contratista deberá presentar la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo conforme lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y el Decreto 052 de 2017 para la suscripción del acta de inicio. (13).

El contratista deberá entregar el Plan de Inversión y los soportes generados para acreditar los pagos causados por concepto de Administración e Imprevistos con el ánimo de que sean reconocidos por la Alcaldía del Municipio de Neiva Huila. (14). El contratista deberá aportar el Análisis de Precios Unitarios (APU) conforme a la oferta económica aportada con la propuesta adjudicataria. (15). Establecer las correspondientes pólizas de garantía que amparan el contrato y mantenerlas vigentes en los términos del mismo, si a ello hubiere lugar. (16). Colaborar para el normal desarrollo del contrato a celebrar. (17). El contratista deberá entregar para la aprobación del interventor previo a la firma del acta de inicio, los documentos relacionados al personal de trabajo requerido. El supervisor y/o interventor se reserva el derecho de aceptar el personal o no. Sin el cumplimiento de este requisito el Contratista no podrá dar inicio a la ejecución de la obra. (18). Mantener en obra el personal profesional y técnico presentado para la firma del acta de inicio con los tiempos exigidos so pena de imposición de las correspondientes sanciones y ocupar el personal experimentado en los trabajos que se le encomienden. En virtud de lo anterior, el contratista no podrá cambiar el personal solicitado dentro de las obligaciones sin previa autorización del interventor. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal aprobado, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación por escrito del supervisor y/o interventor. El incumplimiento de esta obligación por parte del contratista será causal de imposición de multas. (19). El contratista deberá emplear personal idóneo y calificado, de manera que la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente identificable por la supervisión cuando esta requiera de alguna acción especial del personal a su mando, la cual será de su acatamiento. (20). Vigilar permanente y directamente la ejecución técnica y administrativa de los trabajos a fin de garantizar su desarrollo de acuerdo con los fines del contrato. (21). En la ejecución de los trabajos que son materia de este contrato, el contratista se ceñirá a las especificaciones técnicas constructivas, estudios, planos con sus respectivas observaciones, diseños y/o detalles suministrados por la entidad, Normas aplicables y demás documentos técnicos de obligatorio cumplimiento, para lo cual dará órdenes al personal técnico y operativo de la obra. Cuando a juicio del contratista sea conveniente variar los planos o especificaciones, someterá las variaciones junto con los estudios correspondientes al supervisor y/o interventor explicando las causas que lo justifiquen; si estas no se aprueban, el contratista se sujetará a los planos y especificaciones acordados originalmente. En caso de aprobarlos se procederá al cambio, los ajustes del plazo o de los precios que de ellos puedan desprenderse se convendrán con el contratista y se firmará el acta por las partes. (22). Se deberán respetar los linderos de los predios vecinos colindantes, sobre los cuales no podrá avanzar la construcción. (23). Aceptar y acatar las observaciones y requerimientos que efectúe el interventor, relacionadas con el cambio de procedimientos o equipos de construcción y la imposición de medidas que este considere necesarias para garantizar la buena calidad y correcta ejecución de las obras. (24). El contratista deberá cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el interventor, si el contratista considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los estipulados en el contrato o si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha orden por escrito a la entidad durante los primeros diez días calendario. (25). Toda actividad ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, deberán ser demolidos y remplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado por el interventor. (26). Suministrar los materiales, equipos, herramientas y todos los demás elementos necesarios para la ejecución de los trabajos de acuerdo con lo ofrecido en la propuesta. (27). El personal que ocupe será nombrado y removido por el CONTRATISTA de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y el Municipio no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculación

laboral, administrativa, ni de otra índole, sin embargo, éste podrá exigir el reemplazo de aquel personal que, a su juicio no reúna las calificaciones para el desempeño de su oficio o que considere perjudicial para los intereses del proyecto, previa solicitud fundamentada y escrita por el interventor, sin que por ello el Municipio adquiera obligación alguna con el trabajador o con el Contratista. (28). El interventor podrá solicitar, en cualquier momento, el suministro de información sobre la nómina del personal asignado a la obra, y el Contratista atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado. El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del contrato. El Contratista dará estricto cumplimiento al código sustantivo del trabajo y normas que lo complementan. (29). Dotar a cada uno de sus trabajadores de los elementos de protección personal (EPP) necesarios para el buen desempeño de las actividades. (30). Demostrar el pago de aportes de parafiscales señalados por la Ley 789 de 2.002, si estuviere obligado a ello. (31). Tener el personal contratado afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral (Pensión, Salud, Riesgos Profesionales). (32). Suministrar al personal, todas las prerrogativas de Ley (Auxilio de transporte, dotación etc). (33). Los materiales y demás elementos que el contratista suministre para la ejecución de los trabajos que se le encomienden, deberán ser de primera calidad en su género y para el fin a que se destinen, para lo cual deberán cumplir las normas Técnicas establecidas en la Ley y lo consignado en la propuesta presentada. El contratista deberá garantizar su calidad mediante ensayos de laboratorio certificados. Los materiales que el contratista emplee en la ejecución de los trabajos y que se encuentren deficientes podrán ser rechazados por el interventor cuando no los encontrare convenientemente adecuados de conformidad con las normas aplicables. (34). Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas que se soliciten para verificar la calidad de los materiales estructurales y elementos no estructurales que señalan las normas de construcción sismo resistentes y demás elementos que se instalen en la obra. (35). Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los análisis de laboratorio antes de iniciar las obras y en el transcurso de ejecución de las mismas. Los laboratorios encargados de dichos ensayos deben estar debidamente certificados, si existe merito a ello. (36). Mantener el sitio de ejecución de los trabajos libres de desperdicios, basuras, escombros acumulados y a su terminación retirar definitivamente del lugar los materiales sobrantes y desechos a fin de que la obra quede totalmente limpia y las áreas intervenidas en perfecto estado. Para el efecto, la disposición final de los escombros debe realizarse en los sitios autorizados, de acuerdo a la normatividad vigente. (37). Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como con sus despachos y entrega oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido. (38). Ejecutar las obras de construcción, de forma tal que se garantice tanto la salubridad y seguridad de las personas, como la estabilidad de los terrenos, edificaciones vecinas, elementos constitutivos del espacio público y áreas de influencia como construcciones vecinas, las cuales no podrán alterarse, ni causar molestias. (39). El Contratista, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen. (40). Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes, y d) Todo el personal deberá estar debidamente identificado ya sea por escarapela o por uniformes. (41). Cumplir con todas las normas vigentes en cuanto a señalización de seguridad para el área de influencia de la obra. (42). Proporcionar al interventor cuando este lo requiera informes detallados o generales sobre cualquier aspecto de la obra. (43). El contratista deberá descubrir la parte o partes de las obras que indique

el interventor si fueron cubiertas sin la debida aprobación de éste y deberá igualmente responder y reparar a satisfacción del mismo y a expensas del CONTRATISTA. (44). Participar a la entidad contratante de cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobres sus obligaciones. (45). Comunicarle a la Secretaría de Educación del Municipio de Neiva cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. (46). No detener injustificadamente la ejecución de la obra en ningún momento. (47). Velar porque el municipio se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratista y proveedores y demás servicios que de forma indirecta se hayan requeridas para la ejecución del contrato. (48). Llevar un registro fotográfico, memorias del cálculo, señalización y demás labores que exija el interventor. El registro fotográfico deberá ser a color y en tamaño de media hoja por foto, con su correspondiente título, fecha y ubicación y descripción o explicación, cada ítem de obra intervenido deberá ser fotografiado antes, durante y después de la intervención del contratista. (49). El día en que se inicien los trabajos el contratista deberá abrir el libro de obra (bitácora) en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias que haga el interventor. En él se debe plasmar el avance diario de las actividades realizadas, los recursos ejecutados, los inventarios diarios periódicos de equipo, material y personal (con nombre e identificación), el registro fotográfico, el estado climatológico (día soleado, lluvioso, etc.) así como las diferentes actas de las reuniones y los estudios realizados, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, accidentes de trabajo, etc. El libro deberá ir organizado cronológicamente indicando las fechas de los reportes y cada anotación diaria deberá llevar la firma de los ingenieros residentes del Contratista y del interventor o Interventor. El responsable de mantener al día este diario será el Residente de Obra y deberá ser revisado y aprobado por el interventor. Este documento deberá ser cargado en la plataforma del SECOP II en la sección Documentos de Ejecución del Contrato. (50). Disponer del equipo de topografía para la localización, control de niveles y determinación de cantidades de obra ejecutada, si fuere necesario. (51). Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño o perjuicio a la entidad de acuerdo con la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. (52). Mantener en la obra la adecuada maquinaria equipo y herramienta necesarios para la realización de las actividades del objeto de esta contratación. (53). Poner en práctica procedimientos adecuados de construcción y protección de la obra contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Así mismo deberá tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales y subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o instalaciones. (54). Deberá velar y garantizar el cumplimiento de todas las normas de seguridad industrial durante la ejecución de la obra, tendientes a salvaguardar la vida e integridad física del personal involucrado en la misma, de tal manera que cualquier omisión al respecto exonere de responsabilidad al municipio. (55). Reparar las vías de acceso en los lugares de obra concernientes al presente contrato de obra, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras contratadas. (56). Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicio cuentan con todas las licencias y permisos exigidos según la normatividad vigente y que se encuentren al día con los pagos al sistema de seguridad social integral de su personal. Como garantía de lo anterior el contratista entregará al municipio, antes de la suscripción del acta de iniciación de las obras, los permisos ambientales de las personas o empresas cuyos servicios utilizará durante la ejecución del contrato. (57). Elaborar,

suscribir y presentar de manera conjunta con el interventor las actas de obra y presentarlas a la entidad contratante de manera oportuna. (58). Comunicarle a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de derechos económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el presente contrato. (59). El contratista deberá tener en cuenta que los trabajos objeto de este contrato se realizarán evitando al máximo traumatismos e incomodidades al vecindario donde se ejecutará la obra, para lo cual se elaborará un acta de inventario o vecindad conjuntamente con el interventor del proyecto y los vecinos afectados. (60). Las obras extras y adicionales deberán ser previamente acordadas entre el interventor y el contratista, previo aval por parte del municipio, lo cual se hará constar en actas que suscriban las partes, el valor o los precios unitarios para estas obras deberán ser acordados por ambas partes y aprobadas por el Municipio. (61). Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos. (62). No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. (63). Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. (64). En el caso que se requiera, el contratista colocará una valla de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que serán suministradas por el interventor. Su costo no tendrá ítem de pago, deberá asumirlos el contratista. Esta será instalada al momento de iniciar el contrato y se desmontará 15 días después de haberse recibido los trabajos a satisfacción por parte del Municipio. (65). Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y cuatro meses más y presentarse. (66). Toda la documentación resultante de la ejecución del contrato deberá ser cargada en la plataforma del SECOP II en la sección Documentos de Ejecución del Contrato. (67). Las demás obligaciones que sean análogas y de uso común de acuerdo con el objeto del contrato. **Obligaciones específicas:** (1). El contratista, deberá realizar la respectiva revisión visual de la estructura a intervenir, indicando el reporte de la implantación frente al lote. (2). El contratista debe presentar antes de la firma del acta de inicio el personal o equipo de trabajo con la respectiva documentación que soporte los requisitos exigidos para ser verificado y aprobado por el interventor del contrato y que deberá comprender:

CAN.	CARGO	FORMACIÓN PROFESIONAL Y EXPERIENCIA	% DE DEDICACIÓN
	DIRECTOR DE OBRA	**HABILITANTE-EVALUABLE** **PERFIL:** Profesional en Ingeniería Civil. **EXPERIENCIA GENERAL:** Debe contar con experiencia general mínima de Diez (10) años contados a partir de la expedición de la Matrícula Profesional hasta el cierre del presente proceso. **EXPERIENCIA ESPECIFICA:** Deberá acreditar experiencia específica Certificada como Director de Obra en un (1) contrato celebrado con entidades públicas cuyo objeto corresponda a la **ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS;** cuyo valor sea igual o superior a 1.000 SMMLV.	20%
1	RESIDENTES DE OBRA	**HABILITANTE-EVALUABLE** **PERFIL:** Profesional en Ingeniería Civil. **EXPERIENCIA GENERAL:** Debe contar con experiencia general mínima de diez (10) años de experiencia a partir de la expedición de la matrícula profesional como Ingeniero civil y/o Arquitecto.	100%

1	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	HABILITANTE-EVALUABLE PERFIL: Ingeniero Civil con estudios de posgrado en Estructuras. EXPERIENCIA GENERAL: Debe contar con experiencia general mínima de Diez (10) años contados a partir de la expedición de la Matrícula Profesional hasta el cierre del presente proceso. EXPERIENCIA ESPECIFICA: Deberá acreditar experiencia específica Certificada como Especialista en Estructuras de Obra en un (1) contrato celebrado con entidades públicas cuyo objeto corresponda a la "ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS"; cuyo valor sea igual o superior a 1.000 SMMLV.	20%
1	ESPECIALISTA EN FUNDACIONES	HABILITANTE - EVALUABLE PERFIL: Ingeniero Civil con Posgrado en Ingeniería de Fundaciones. EXPERIENCIA GENERAL: Debe contar con experiencia general mínima de Diez (10) años contados a partir de la expedición de la Matrícula Profesional hasta el cierre del presente proceso.	20%
1	QHSE	HABILITANTE - EVALUABLE PERFIL: Ingeniero Civil y/o Industrial con Posgrado en sistemas Integrales de Gestión QHSE con énfasis en calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. EXPERIENCIA GENERAL: Debe contar con experiencia general mínima de ocho (8) años contados a partir de la expedición de la Licencia Ocupacional hasta el cierre del presente proceso.	20%
1	INGENIERO ELECTRICISTA	HABILITANTE-EVALUABLE PERFIL: Ingeniero Electricista EXPERIENCIA GENERAL: Debe contar con experiencia general mínima de Diez (10) años contados a partir de la expedición de la Matrícula Profesional hasta el cierre del presente proceso.	20%

El personal ofrecido deberá contar con toda la documentación que soporte los requisitos exigidos a saber:

- Copia legible del documento de identificación: cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte.
- Hoja de vida.
- Copia de la matrícula o Tarjeta Profesional.
- Certificación de vigencia de la tarjeta profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, para los ingenieros o el Certificado expedido por Consejo Profesional de Arquitectura para los Arquitectos que conformen el equipo de trabajo; y para los demás profesionales la autoridad competente.

(3). Para la acreditación de la experiencia específica del equipo de trabajo deberá allegar copia de los contratos ejecutados con la respectiva acta de liquidación y/o terminación o certificación expedida por el contratante. En este último evento, la certificación deberá contener la siguiente información: Número y fecha

de suscripción del contrato, nombre de la entidad o empresa contratante, datos de contacto del contratante, nombre del Contratista, Objeto del contrato, Fecha de iniciación, Fecha de terminación: 100% ejecutado, Valor final del contrato (incluye el valor inicial más las adiciones en valor y los reajustes que se hubiesen presentado durante la ejecución del contrato) en pesos, a la fecha de terminación de los servicios certificados. (4). Revisión de los diseños técnicos: El contratista, deberá realizar revisión con respecto a los diseños técnicos; ajustarlos y complementarlos si fuese el caso y en el informe se debe plasmar el concepto de aceptación y apropiación de los diseños y certificar que los diferentes diseños se encuentran completos y coordinados, es decir el cruce de elementos estructurales y arquitectónicos con las diferentes redes entre otras la de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, y el cumplimiento de la normativa vigente. (RETIE, RETILAP, RAS y demás que apliquen). Cualquier modificación o ajuste debe ser avalado por la supervisión o el profesional designado por la Secretaría para tal fin. (5). Cumplimiento NSR-10: El contratista deberá realizar revisión, ajustar y complementar los diseños si fuese el caso, para certificar mediante un informe en el que indique el cumplimiento de los diseños técnicos frente a la NSR-10, suscrito por el contratista. Cualquier modificación o ajuste debe ser avalado por la supervisión o el profesional designado por la Secretaría para tal fin, en caso de requerirse. (6). El contratista deberá dar aplicación al MANUAL DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA expedido por el Ministerio de Educación Nacional. (7). Cantidades de obra: El contratista deberá verificar si las cantidades de obra se encuentran acorde al objeto contractual. Toda información y concepto debe venir avalado por la supervisión. (8). El contratista deberá presentar los análisis de precios unitarios (APU) conforme a lo estipulado en el presente documento previo a la suscripción del acta de inicio, incluyendo el sustento del AIU. (9). El contratista deberá aportar los Análisis de Precios Unitarios (APU) conforme a la oferta económica aportada con la propuesta adjudicataria y ejecutar el objeto contractual rigiéndose por los precios y condiciones señalados en la propuesta presentada, previa suscripción de acta de inicio. (10). El contratista deberá aportar el desglose de los valores correspondientes a Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU) conforme a la oferta económica aportada con la propuesta adjudicataria y ejecutar el objeto contractual rigiéndose por los precios y condiciones señalados en la propuesta presentada previa suscripción de acta de inicio. (11). Presentar al momento de suscribir el acta de inicio un plan detallado de trabajo indicando fecha de iniciación y finalización de cada una de las actividades descritas, de igual manera presentar programa de inversión o plan de flujo de inversión y la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo conforme lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y el Decreto 052 de 2017, los cuales deberán ser aprobados por el supervisor. (12). Programación de obra. El contratista deberá entregar un cronograma de obra, el cual debe contener como mínimo: Programación de compras de insumos, programación de mano de obra (cuadrillas), Flujo de caja (en periodos semanales) y programación de las actividades a ejecutar. (13). Cumplir el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que hace referencia la resolución 541 de 1994 del Ministerio del medio Ambiente, para aquellos proyectos que no requieran Licencia Ambiental, o planes de manejo, recuperación o restauración ambiental de conformidad con el Decreto 1220 de 2005 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. (14). Realizar el manejo y disposición final de los Residuos de demolición y de Construcción RCD conforme el Decreto Municipal 0437 de 2017 y demás normativa complementaria cumpliendo todos los estándares y condiciones técnico-ambientales vigentes, para lo cual deberá entregar al interventor las constancias de los pagos realizados para la disposición como requisito para la liquidación del contrato suscrito. (15). Socialización del resultado: Se deberá realizar una reunión para informar a la comunidad, alcaldía, sobre el alcance de las obras a ejecutar y en caso de ser necesario, informar todos los cambios que vayan a sufrir las especificaciones del contrato. (16). El

CONTRATISTA deberá elaborar los planos record de todos los diseños y planos arquitectónicos y demás, los cuales deberán ser entregados al Municipio de Neiva, con el visto bueno de la interventoría, en el proceso de liquidación de la obra, en medio impreso y magnético si se requiere. (17). El material forestal resultante de la erradicación, tala (ramas, hojas, entre otros) se debe picar y repicar e incorporarse al suelo como material orgánico o disponerse en el relleno sanitario autorizado para tal fin. (18). Antes de iniciar las actividades de apeo, se deberán tomar en consideración las medidas de seguridad necesarias con relación a bienes muebles e inmuebles, peatones, tránsito vehicular, infraestructura aérea, equipamiento urbano y otros obstáculos que impidan maniobrar con facilidad, acordonando y señalizando el área de trabajo. El personal que realice el trabajo deberá revisar el equipo de protección asegurándose que se encuentre en óptimas condiciones antes de utilizarlo. (19). El volumen autorizado, no podrá ser comercializado según las consideraciones expuestas, se debe utilizar en labores propias de la obra o en' otras obras de carácter social o ser donadas como material dendroenergético a comunidades de la zona de influencia del proyecto. (20). Si el material forestal obtenido durante el aprovechamiento requiere ser movilizado, deben obtener el salvoconducto ante la CAM, el cual se expide en horario de lunes a jueves. **CLÁUSULA TERCERA. – DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:** Además de las obligaciones usuales en este tipo de Contratos, el Municipio tendrá las siguientes: (1). Suministrar la información requerida y que fuese responsabilidad del municipio para la correcta ejecución del contrato. (2). Delegar de manera oportuna el supervisor y/o interventor del contrato. (3). Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. (4). Pagar oportunamente los valores que se establecen en el contrato. (5). Acudir ante las autoridades para obtener la protección de los derechos derivados de la presente contratación y sanción para quien los vulnere. (6). Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiera lugar, para lo cual la supervisión dará aviso oportuno a la Secretaria de Educación, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. (7). Repetir contra los servidores públicos, contratista o terceros, por las indemnizaciones que deba pagar, como consecuencia de la presente contratación. (8). Supervisar el desarrollo y ejecución del presente contrato, y acceder a los documentos e información que soportan la labor del contratista. (9). Recibir las actividades a satisfacción y cancelar el valor respectivo pactado con sujeción a los procedimientos y requisitos establecidos. (10). Exigir calidad de la obra y que esta se ajuste a los requisitos previstos por las normas técnicas obligatorias. (11). Pagar al contratista el valor pactado una vez el contratista cumpla con los requisitos exigidos, tanto operaciones, administrativos y tributarios. (12). Verificar el cumplimiento de la contratación laboral, la afiliación al sistema de seguridad social y parafiscal, de los trabajadores del Contratista y exigir para cada pago la planilla de pagos a la seguridad social y parafiscal y exigirlas para cada pago de los servicios prestados. (13). Facilitar al Contratista todo el medio físico para llevar a cabo su labor. (14). Exigir las pólizas de garantía preestablecidas: Garantías de la propuesta; de Calidad y cumplimiento del contrato; responsabilidad civil contractual y extracontractual, de cumplimiento de las obligaciones laborales y las demás que se requieren para realizar objetivamente el contrato de obra. (Previo desembolso del anticipo). (15). Requerir al contratista por intermedio del supervisor y/o interventor y/o interventor del contrato, las constancias y/o pagos de la disposición final de Residuos de Construcción y Demolición RCD como requisito para la liquidación del contrato. (16). Emitir las autorizaciones y condiciones necesarias para que el contratista preste un servicio adecuado, con calidad y cumplimiento. (17). A tramitar y entregar los permisos y licencias necesarios para la ejecución de la obra. (18). Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato. **CLÁUSULA CUARTA. – EXENCIÓN DEL PAGO DE PRESTACIONES:** De acuerdo con lo establecido en el inciso segundo, numeral tercero de artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el contratista no

tendrá derecho a ninguna prestación distinta a lo pactado en el contrato, razón por la cual con este contrato no existe ningún vínculo laboral entre la Secretaría de Educación Municipal y el contratista, y los prestadores del servicio de vigilancia. **CLÁUSULA QUINTA. – VALOR DEL CONTRATO:** Para efectos fiscales el valor de este Contrato se fija en la suma de **SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TRES PESOS ($625.083.103,00) M/CTE.**, incluido los impuestos a que haya lugar., **CLÁUSULA SEXTA. – FORMA DE PAGO:** El MUNICIPIO cancelará AL CONTRATISTA el valor del presente contrato de la siguiente manera: La Secretaria de Educación del Municipio cancelará AL CONTRATISTA el valor del presente contrato de la siguiente manera: SE ENTREGARÁ EL 30% COMO ANTICIPIO, y mediante acta(s) de recibo parcial, recibidas, aprobadas y certificadas por el interventor de acuerdo al avance hasta el 90%, y el restante 10% a la terminación del objeto contratado, previa entrega y recibo a satisfacción, liquidación del contrato y aprobación del interventor y/o supervisor. Los valores facturados deben ser conforme a las tarifas establecidas en el presente estudio, y sin superar el valor total del presupuesto estimado. Todo pago está sujeto a la Programación Anual Mensual de caja PAC del Municipio, sin generar intereses moratorios. El contratista deberá informar al Municipio de Neiva, la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente los pagos que por este concepto le efectúe el Municipio de Neiva. **CLÁUSULA SÉPTIMA. – PLAZO: A) PLAZO DE VIGENCIA:** El presente Contrato estará vigente por el término de ejecución y TRES (4) meses más, contados a partir de la suscripción del contrato. **B) PLAZO DE EJECUCIÓN:** El contratista se obliga a ejecutar el objeto del contrato por el término de TRES (3) MESES, contados a partir del acta de inicio, sin que en ningún caso sea inferior al plazo del contrato objeto de vigilancia, y en todo caso hasta la liquidación del contrato objeto de interventoría. **CLÁUSULA OCTAVA. – GARANTÍAS:** Para garantizar las obligaciones que se contraen en virtud del presente contrato, el **CONTRATISTA** constituirá a su costa y a favor del Municipio de Neiva en compañía de seguros legalmente establecida en el país, una póliza única que cubra los siguientes amparos: **a) Cumplimiento:** Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, que garantizará el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la totalidad de sus obligaciones derivadas del presente contrato, por el término de duración y seis (6) meses más. **b) Buen manejo y correcta inversión del Anticipo:** Equivalente al cien por ciento (100%) del valor del pago anticipado, por el termino de duración del contrato y seis (6) meses más. **c) Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones:** Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por el término de duración del contrato y tres (3) años más. **d) Responsabilidad Civil Extracontractual:** Por valor de doscientos SMMLV (200), por el termino de duración del contrato y seis (6) meses más. **e) Estabilidad de la obra y calidad de la obra:** Equivalente al veinte por ciento 20% del valor del contrato, por el termino de cinco (5) años. **CLÁUSULA NOVENA. – RIESGOS PREVISIBLES:** Los riesgos tipificados para el presente contrato, se establece conforme el estudio previo, los pliegos de condiciones y la propuesta presentada por el contratista, los cuales hacen parte integral del presente contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA. – INDEMNIDAD:** El contratista mantendrá indemne al Municipio de Neiva, de reclamos, pleito, quejas, demandas, acciones legales y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones originados en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. – AFILIACIÓN Y PAGO DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:** De conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y 510 de 2003, el contratista deberá estar afiliado y afiliar a su personal contratado al sistema de seguridad social y realizar los pagos respectivos. Dicho requisito será indispensable para que se efectúen los pagos mensuales y finales por parte del Municipio al contratista. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. – CLÁUSULAS**

EXCEPCIONALES: De acuerdo a lo previsto en el inciso tercero, numeral segundo, del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, el Municipio podrá declarar la caducidad del presente contrato si se dan las situaciones previstas en el artículo 18 de dicha ley. Así mismo, el Municipio podrá interpretar, modificar o terminar unilateralmente el presente contrato, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 15,16 y 17 de la ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. – PENAL PECUNARIA:** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente contrato, EL CONTRATISTA debe pagar al Municipio, a título de indemnización una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios. No obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos el Municipio adeude al contratista con ocasión de la ejecución del presente contrato de conformidad con las normas que rigen la materia. De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el CONTRATISTA, autoriza al Municipio de Neiva para compensar el valor por concepto de la cláusula penal pecuniaria, de las sumas que resulten a su favor al momento de la liquidación del contrato. Cuando no exista saldo a favor del CONTRATISTA, el valor por concepto de la cláusula penal pecuniaria se podrá hacer efectivo a través de la garantía constituida o el Municipio de Neiva podrá acudir a la Jurisdicción Coactiva. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. – MULTAS:** En el evento en que el Contratista incurra en mora o incumplimiento parcial de las obligaciones que adquiere por el contrato, El Municipio de Neiva, mediante resolución motivada, le aplicará las siguientes multas: (1) Por no iniciar o no reanudar, según el caso, en la fecha determinada, o por suspensión temporal de la misma sin causa justificada o por causas imputables al Contratista, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato por cada día de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo. (2) Cuando se presente un atraso mayor del veinte por ciento (20%) en cualquiera de las grandes partidas de pago o más de un veinte por ciento (20%) en la inversión total acumulada, según el programa de trabajo e inversiones presentado por el contratista y aprobado por la Interventoría, el dos por ciento (2%)del valor de lo ejecutado, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al Contratista de la obligación de ejecutar el contrato hasta su terminación a satisfacción del Municipio de Neiva. (3) Por no disponer del personal requerido para la ejecución del contrato, o por reemplazarlo sin previa autorización de la Interventoría, y por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al Contratista del cumplimiento de esta obligación. (4) Por no suministrar oportunamente el equipo necesario para el adecuado desarrollo de los trabajos, y por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. (5) Por no dar cumplimiento a la obligación de instalar y mantener la señalización preventiva durante la ejecución del contrato, y por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por mil (0.1‰) del valor total del contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato dejado ejecutar. (6) Por no constituir a tiempo la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato, suma que será deducida de la primera acta de pago. (7) Por cada día de retraso en la entrega, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato dejado de ejecutar. (8) Por cada día de retraso en la entrega, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato. (9) Por no presentar los documentos exigidos para la liquidación del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto, según las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato. En este caso, El Municipio de Neiva elaborará la liquidación de oficio. (10) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato. En caso de que el

contratista incurra en una de las causales de multa, éste autoriza al Municipio de Neiva para descontar el valor de la misma de cualquier suma que le adeude, sin perjuicio de hacerle efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. Si posteriormente el contratista acredita la existencia de situaciones que lo exoneren de responsabilidad, y éstas son aceptadas por La Secretaria de Educación del Municipio de Neiva, habrá lugar a que se le devuelvan los valores deducidos, ajustados en un porcentaje igual al índice de inflación fijado por el Gobierno Nacional para el año en que se proceda a la devolución. **PARÁGRAFO:** Para efectivizar la imposición y cobro de la multa se tendrá ceder el presente Contrato, ni Subcontratar con persona natural o jurídica alguna, sin el consentimiento previo y escrito de la Secretaría de Educación Municipal. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. – REGISTRO PRESUPUESTAL Y SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** El Municipio de Neiva se obliga a reservar la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($637.839.832,00) M/CTE suma que será imputable a la siguiente disponibilidad presupuestal:

PRESUPUESTO ASIGNADO	SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($637.839.832,00) M/CTE			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	GASTO	RUBRO	RECURSO	No CDP
	C	23113220112021410 01008101	2000	3705
CONCEPTO DE GASTO	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA			

PARÁGRAFO: Finalmente es pertinente precisar que de conformidad a lo establecido por el Ministerio de Haciendo en la Resolución No. 3832 de 2019 y sus resoluciones modificatorias (1355 de 2020, 2323 de 2020, 0401 de 2021 y 3438 de 20212), el objeto contractual a desarrollar se enmarca en las siguientes actividades y/o conceptos. Educación código CPC "54129" Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales.

CLÁUSULA DECIMA SÉPTIMA. – SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA DEL CONTRATO: De acuerdo con las especificaciones técnicas, la Secretaria de Educación del Municipio de Neiva determinó la necesidad de contratar de manera exclusiva con un tercero la interventoría técnica, administrativa y financiera. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato se perfecciona una vez suscrito por las partes. Para su ejecución, la Secretaría de Educación Municipal entregará copia del Contrato para que en un plazo no superior a tres (3) días hábiles el contratista realice los pagos de gravámenes municipales y demás impuestos y demás impuestos a que hay lugar, requisitos que se entienden cumplidos con la presentación de recibo de pago de los derechos correspondientes. Para el inicio del plazo contractual, se requiere la expedición del Registro Presupuestal de conformidad con lo previsto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. – DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Hacen parte del presente contrato los siguientes documentos: **a)** Los estudios y documentos previos elaborados por la entidad. **b).** Los documentos presentados por el oferente en su oferta. **c).** Recibo de pago de impuestos. **d)** Todos los demás que surjan en desarrollo y ejecución del presente Contrato; **e)** Copia de Informes parciales

y final; **f)** Acta de liquidación respectiva. **CLÁUSULA VIGÉSIMA – LIQUIDACIÓN:** La liquidación del presente contrato se realizará de acuerdo con lo previsto en los artículos 60 y 61 de la ley 80 de 1993 dentro de los cuatro meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución. **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA – SOLUCION A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:** Las partes contratantes, solucionarán sus diferencias observando el siguiente procedimiento: a) En primer lugar agotaran el arreglo directo para llegar a tranzar sus diferencias, cuya etapa no podrá ser superior a cinco (5) días; b) Fracasada la etapa anterior al siguiente día de su terminación acudirá a la conciliación, para lo cual nombrará cada parte un conciliador, etapa que no podrá prorrogarse más de quince (15) días. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DOMICILIO Y LEYES:** Para todos los efectos, las partes declaran su domicilio contractual en la ciudad de Neiva. Así mismo, el contrato se regirá por lo dispuesto por la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 y los decretos reglamentarios, su legislación complementaria y la normativa civil y comercial aplicable. Para constancia se firma en Neiva (H), a los

27 ABR 2022

POR EL MUNICIPIO.

JOSE PAUL AZUERO BERNAL
Secretario de Educación Municipal

EL CONTRATISTA

CONSORCIO EL ROSARIO
Nit. 901.588.278-2
Representante Legal:
DIEGO ANDRES REYES VARGAS
C.C. No. 7.704.116 de Neiva (H).

Proyectó:
CARLOS CORREDOR Q
Apoyo Jurídico SEM

PACOT S.A.S
PROFESIONALES EN ASESORIAS, CAPACITACIONES, OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES INTEGRALES S.A.S
NIT 900.693.242-3

Capacidad Organización

Dirección: carrera 5 N° 10 – 36 oficina 503 – Tel: 320 801 7654
Email: pacotingn2020@gmail.com

PACOT S.A.S
PROFESIONALES EN ASESORIAS, CAPACITACIONES, OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES INTEGRALES S.A.S
NIT 900.693.242-3

Director De Obra

Dirección: carrera 5 N° 10 – 36 oficina 503 – Tel: 320 801 7654
Email: pacotingn2020@gmail.com

PACOT S.A.S
PROFESIONALES EN ASESORIAS, CAPACITACIONES, OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES INTEGRALES S.A.S
NIT 900.693.242-3

ANEXO No. 10
HOJA DE VIDA DEL PERSONAL
(Nota: Aplicar para cada personal solicitado)

NOMBRE DEL ASOCIADO TÉCNICO: **PROFESIONALES EN ASESORIAS CAPACITACIONES OBRAS CIVILES Y TRANSPORTE INTEGRALES S.A.S**

1. DATOS PERSONALES

NOMBRES Y APELLIDOS:	**DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO**
CARGO POR OCUPAR:	**DIRECTOR DE OBRA**
DOMICILIO:	**NEIVA**
DIRECCION:	**Carrera 75 C NO. 57 N SUR -62**
No. TELEFONO:	**3167945252**
No. CEDULA IDENTIFICACION	**1075298785**
TARJETA PROFESIONAL No.	**N/A**
DEDICACIÓN:	**50%**

COMPROMISO

Me comprometo a hacer parte del grupo de trabajo de la empresa **PROFESIONALES EN ASESORIAS CAPACITACIONES OBRAS CIVILES Y TRANSPORTE INTEGRALES S.A.S.**, en caso de salir favorecido en el proceso de referencia, con una disponibilidad del **50%,** en el cargo de **PROFESIONAL SST** y además declaro bajo la gravedad de juramento que los documentos presentados son verídicos.

FIRMA: Diego Mauricio Calderon Obando.

Nota: La hoja de vida deberá venir firmada por el profesional y anexar los documentos que acreditan la experiencia.

Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	*SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)*	*NOMBRES*
CALDERON	OBANDO	DIEGO MAURICIO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C (X) C.E ( ) PAS ( ) No. 1075298785

SEXO: F ( ) M (X)

NACIONALIDAD: COL. (X) EXTRANJERO ( ) *PAÍS*: _____

LIBRETA MILITAR

PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE ( ) NÚMERO _____ D.M _____

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DÍA 18 MES 08 AÑO 1996

PAÍS _____

DEPTO HUILA

MUNICIPIO NEIVA

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

CARRERA 75C NO. 57N SUR 62

PAÍS COLOMBIA DEPTO HUILA

MUNICIPIO NEIVA

TELÉFONO 3167945252 EMAIL .

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA										*TÍTULO OBTENIDO:*
PRIMARIA					*SECUNDARIA*				*MEDIA*	*FECHA DE GRADO*
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	11 (X) MES 12 AÑO 2012

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA), **TL** (TECNOLÓGICA), **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), **UN** (UNIVERSITARIA), **ES** (ESPECIALIZACIÓN), **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER), **DOC** (DOCTORADO O PHD),

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	*No.SEMESTRES APROBADOS*	*GRADUADO SI*	*GRADUADO NO*	*NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO*	*TERMINACIÓN MES*	*TERMINACIÓN AÑO*	*No. DE TARJETA PROFESIONAL*
UN	10	X		INGENIERO CIVIL	10	2022	161037-0629428

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (**R**), BIEN (**B**) O MUY BIEN (**MB**)

IDIOMA	*LO HABLA*			*LO LEE*			*LO ESCRIBE*		
	R	B	MB	R	B	MB	R	B	MB

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO ACTUAL	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
CONSORCIO EL ROSARIO		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
HUILA	NEIVA	

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
3208017654	DÍA 02 MES 04 AÑO 2023	DÍA 25 MES 12 AÑO 2023

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
DIRECTOR DE OBRA		

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA .

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	*TIEMPO DE EXPERIENCIA*	
	AÑOS	*MESES*
SERVIDOR PÚBLICO		
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	3	
TRABAJADOR INDEPENDIENTE		
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA		

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ◯ NO ⓧ ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

Ciudad y fecha de diligenciamiento 21 DE FEBRERO DE 2026

Diego Mauricio Calderon Obando

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

Ciudad y fecha

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.075.298.785

CALDERON OBANDO
APELLIDOS

DIEGO MAURICIO
NOMBRES

Diego Mauricio Calderon Obando
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-AGO-1996

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

B+
G.S. RH

M
SEXO

03-SEP-2014 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1900100-00650733-M-1075298785-20141206 0041760303A 1 42154589

MATRICULA PROFESIONAL

161037-0629428 TLM

R2022029083

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

INGENIERIA CIVIL

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
ID: 1075298785
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4329971

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1075298785, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 161037-0629428 TLM desde el 11 de Agosto de 2022, otorgado(a) mediante Resolución Nacional R2022029083.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de Febrero del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Diego Mauricio Calderon Obando

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

UNIVERSIDAD
COOPERATIVA DE COLOMBIA

Personería Jurídica, Resolución 24195 del 20 de Diciembre de 1983 del Ministerio de Educación Nacional.
Resolución No. 501 del 7 de Mayo de 1974 de la Superintendencia Nacional de Cooperativas.
Resolución No. 1850 del 31 de Julio de 2002,emanada del Ministerio de Educación Nacional.

En atención a que

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO

con cédula de ciudadanía No. 1.075.298.785 de Neiva
Cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos
por la Universidad, le confiere el título de

INGENIERO CIVIL

En testimonio de ello le expide el presente diploma y se firma en
Neiva el día 25 de febrero de 2022

Libro de Registros No. 0060620221 Folio No. 008 Registro No. 0073
Refrendado en Neiva el día 24 de febrero de 2022

Director (a) Sede

Rector (a)

Gloria Patricia Ramos
Secretario (a) General

Este documento fue firmado digitalmente conforme a la legislación colombiana vigente.

Registros y Diplomas: Martha Estella Cadena Manjarres

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Diego Mauricio Calderon Obando
Ingeniero Civil
Cel.: 316 794 5252

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

UNIVERSIDAD
COOPERATIVA DE COLOMBIA

Personería Jurídica, Resolución 24195 del 20 de Diciembre de 1983 del Ministerio de Educación Nacional.
Resolución No. 501 del 7 de Mayo de 1974 de la Superintendencia Nacional de Cooperativas.
Resolución No. 1850 del 31 de Julio de 2002,emanada del Ministerio de Educación Nacional.

Acta Individual de Graduación No. 06-2131-2022

PROGRAMA:	INGENIERÍA CIVIL
CODIGO SNIES:	5530
FECHA GRADO:	25 DE FEBRERO DE 2022
LUGAR:	UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, CAMPUS NEIVA

En atención a que DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
con Cédula de Ciudadanía No 1.075.298.785 de Neiva
cumplió todos los requisitos exigidos por las normas legales y estatutarias, le expide el título de: INGENIERO CIVIL.

Lo anterior, atendiendo la aprobación del Consejo Académico del Campus Neiva, mediante acta No 001 en sesión del día 07 de febrero de 2022.

Para constancia se citan en este título las autoridades competentes: Rector(a), Director(a) de Campus, Jefe de programa y Secretario(a) General de la Universidad, así:

Rector(a):	MARITZA RONDON RANGEL
Director(a) de Campus:	OLGA PATRICIA SANCHEZ RUBIO
Jefe de programa:	LUIS ALFREDO ARENAS SAAVEDRA
Secretario (a) General:	GLORIA PATRICIA RAVE IGLESIAS

Se expide la presente Acta en la ciudad de Neiva el día 25 DE FEBRERO DE 2022

Gloria Patricia Rave I

GLORIA PATRICIA RAVE IGLESIAS
Secretario (a) General

Este documento fue firmado digitalmente conforme a la legislación colombiana vigente.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 17 de febrero de 2026, a las 18:47:28, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1075298785
Código de Verificación	1075298785260217184728

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 291473815

PIB
18:49:54
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 17 de febrero del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1075298785:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 18:59:52 horas del 17/02/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **1075298785,** Apellidos y Nombres **CALDERON OBANDO DIEGO MAURICIO**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL** , con NIT **901039684-5** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 06:52:20 PM horas del 17/02/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1075298785**
Apellidos y Nombres: **CALDERON OBANDO DIEGO MAURICIO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 17/02/2026 06:54:00 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1075298785** y Nombre: **DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **134968821** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda Imprimir

CONSORCIO EL ROSARIO

NIT. 901.588.278-2

C E R T I F I C A:

Que el ingeniero **DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO**, identificado con cédula de ciudadanía **No. 1.075.298.785** de Neiva (H) y tarjeta profesional **No. 161037-0629428 TLM**, trabajo con nosotros **DESDE ABRIL DEL 2023** hasta **DICIEMBRE DEL 2023,** desempeñando el cargo de **DIRECTOR DE OBRA** en el contrato de obra pública **No. 2512 de 2022, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE NEIVA Y EL CONSORCIO EL ROSARIO. Cuyo objeto es:" "ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUSTIN CODAZZI SEDE EL ROSARIO DE LA CIUDAD DE NEIVA". Por medio de un contrato a término fijo con una dedicación del 50%, devengando un salario de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) M/CTE, Demostrando honestidad, responsabilidad y cumplimiento en las actividades ejecutadas.**

Cordialmente:

Diego Mauricio Calderon O.

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal del CONSORCIO EL ROSARIO

Dirección: Calle 14 No. 43A -90 – Tel: 320 801 7654 Email:
consorcioelrosario2022@gmail.com

	MINUTA PARA CONTRATOS	FOR-GDCO-21	
		Versión: 05	
		Vigente desde: Enero 05 del 2022	

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EN MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Nº 2512 DE 2022, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE NEIVA Y EL CONSORCIO EL ROSARIO

CONTRATISTA:	**CONSORCIO EL ROSARIO**
Nit.	901.588.278-2
INTEGRANTES	PACOT INTEGRALES S.A.S. (95%) SEINGECOL S.A.S. (5%)
OBJETO:	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUSTIN CODAZZI SEDE EL ROSARIO DE LA CIUDAD DE NEIVA"
VALOR:	**SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TRES PESOS ($625.083.103,00) M/CTE.** incluido los impuestos a que haya lugar.
PLAZO:	TRES (03) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
ID SECOP II	MNSEMSAMOP-004-2022

Entre los suscritos de una parte **JOSE PAÚL AZUERO BERNAL** mayor de edad, vecino de la ciudad de Neiva, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.136.469 expedida en Neiva, obrando en nombre y en representación del Municipio de Neiva, en su condición de Secretario de Educación Municipal, debidamente delegada para contratar de conformidad con lo expuesto en el Decreto 0810 de 2021, quien en adelante se denominará **LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL** y por otra parte la, **CONSORCIO EL ROSARIO**, con Nit. 901.588.278-2; Representado Legalmente por **DIEGO ANDRÉS REYES VARGAS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.704.116 de Neiva (H.), quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, de conformidad con los documentos que hacen parte integral de este contrato, hemos acordado suscribir el presente Contrato de Obra Pública adjudicado mediante Resolución No. 0893 del 22 de abril de 2022, mediante la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. MNSEMSAMOP-004-2022, contrato que se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, demás Normas Reglamentarias y Complementarias y por las Cláusulas que más adelante se señalan previa las siguientes Consideraciones: **a) EL CONTRATISTA:** Declara expresamente bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, previstas en los Artículos 8 y 9 de las Ley 80 de1993, articulo 18 literal J, artículo 44 de la Ley 617 de 2000 y Artículo 1 de la Ley 821 de 2003 y demás normas legales y constitucionales; **b)** El presente Contrato se celebra de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 y siguientes de la Ley 80 de 1993. **c)** Que el proceso de contratación No. MNSEMSAMOP-004-2022, se adelantó en línea a través de la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II. **d)** Que existe disponibilidad presupuestal para afrontar este compromiso contractual, representado en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal número 3705 del veintiuno (21) de febrero de dos mil veintidós (2022), respectivamente. **e)** Los presentes documentos y actuaciones administrativas se someten al principio de publicidad y transparencia siendo publicadas en forma

PACOT S.A.S
PROFESIONALES EN ASESORIAS, CAPACITACIONES, OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES INTEGRALES S.A.S
NIT 900.693.242-3

Residente De Obra

Dirección: carrera 5 N° 10 – 36 oficina 503 – Tel: 320 801 7654
Email: pacotingn2020@gmail.com

PACOT S.A.S
PROFESIONALES EN ASESORIAS, CAPACITACIONES, OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES INTEGRALES S.A.S
NIT 900.693.242-3

ANEXO No. 10
HOJA DE VIDA DEL PERSONAL
(Nota: Aplicar para cada personal solicitado)

NOMBRE DEL ASOCIADO TÉCNICO: **PROFESIONALES EN ASESORIAS CAPACITACIONES OBRAS CIVILES Y TRANSPORTE INTEGRALES S.A.S**

1. DATOS PERSONALES

NOMBRES Y APELLIDOS:	**ESTIVEN ALDANA QUINTERO**
CARGO POR OCUPAR:	**RESIDENTE DE OBRA**
DOMICILIO:	**NEIVA**
DIRECCION:	**Calle 31 Sur No. 29-30** No.
TELEFONO:	**3208505264**
No. CEDULA IDENTIFICACION	**83.238130**
TARJETA PROFESIONAL No.	70206-19617
DEDICACIÓN:	**100%**

COMPROMISO

Me comprometo a hacer parte del grupo de trabajo de la empresa **PROFESIONALES EN ASESORIAS CAPACITACIONES OBRAS CIVILES Y TRANSPORTE INTEGRALES S.A.S**, en caso de salir favorecido en el proceso de referencia, con una disponibilidad del **100%,** en el cargo de **RESIDENTE DE OBRA** y además declaro bajo la gravedad de juramento que los documentos presentados son verídicos.

FIRMA: 

Nota: La hoja de vida deberá venir firmada por el profesional y anexar los documentos que acreditan la experiencia.

Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	*SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)*	*NOMBRES*
ALDANA	QUITERO	ESTIVEN

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C (X) C.E ( ) PAS ( ) No. 83238130 — *SEXO*: F ( ) M (X) — *NACIONALIDAD*: COL. (X) EXTRANJERO ( ) *PAÍS*: ____

LIBRETA MILITAR: PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE ( ) NÚMERO ____ D.M ____

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DÍA 0 8 MES 0 8 AÑO 1 9 8 4

PAÍS ____

DEPTO HUILA

MUNICIPIO NEIVA

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

CALLE 31 SUR NO. 29-30

PAÍS COLOMBIA DEPTO HUILA

MUNICIPIO NEIVA

TELÉFONO 3208505264 EMAIL .

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA										*TÍTULO OBTENIDO:*
PRIMARIA					*SECUNDARIA*				*MEDIA*	*FECHA DE GRADO*
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	11 X — MES 1 2 AÑO 2 0 0 1

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA), **TL** (TECNOLÓGICA), **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), **UN** (UNIVERSITARIA), **ES** (ESPECIALIZACIÓN), **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER), **DOC** (DOCTORADO O PHD),

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	*No.SEMESTRES APROBADOS*	*GRADUADO SI*	*GRADUADO NO*	*NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO*	*TERMINACIÓN MES*	*TERMINACIÓN AÑO*	*No. DE TARJETA PROFESIONAL*
UN	10	X		INGENIERO CIVIL	04	2010	70202-196175

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (**R**), BIEN (**B**) O MUY BIEN (**MB**)

IDIOMA	*LO HABLA* R	B	MB	*LO LEE* R	B	MB	*LO ESCRIBE* R	B	MB

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE			
EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*	
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO* DÍA MES AÑO	*FECHA DE RETIRO* DÍA MES AÑO	
CARGO O CONTRATO ACTUAL	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*	
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
JAVIER HERNAN RINCON		X	COLOMBIA
DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*	
HUILA	YAGUARA		
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO* DÍA 10 MES 06 AÑO 2011	*FECHA DE RETIRO* DÍA 10 MES 11 AÑO 2011	
CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*	
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
		X	COLOMBIA
DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*	
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO* DÍA MES AÑO	*FECHA DE RETIRO* DÍA MES AÑO	
CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*	
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*	
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO* DÍA MES AÑO	*FECHA DE RETIRO* DÍA MES AÑO	
CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*	

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA .

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	*TIEMPO DE EXPERIENCIA*	
	AÑOS	*MESES*
SERVIDOR PÚBLICO		
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	15	
TRABAJADOR INDEPENDIENTE		
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA		

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ◯ NO (X) ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

Ciudad y fecha de diligenciamiento 21 DE FEBRERO DE 2026

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

Ciudad y fecha

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

y en su nombre la

Universidad Cooperativa de Colombia

Personería Jurídica, resolución 24.195 del 20 de Diciembre de 1.983 del Ministerio de Educación Nacional.

Certifica que

Estiven Aldana Quintero

CEDULA DE CIUDADANIA Nº 83'238.130 DE YAGUARA

Ha cumplido con todos los estudios
que los estatutos universitarios exigen para optar al título de

INGENIERO CIVIL

Le expide el presente diploma. En testimonio de ello
se firma en Neiva, el día 15 de abril de 2.010

Rector

Decano de Facultad

Director Seccional

Secretario General

Registros y Diplomas

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Resolución 24195 del 20 de Diciembre de 1983
Ministerio de Educación Nacional

Acta Individual de Graduación No. 04-10

DEPENDENCIA: FACULTAD DE INGENIERIAS

PROGRAMA: INGENIERIA CIVIL

APROBACIÓN DEL PROGRAMA: SNIES 18184624000410010100

FECHA: 15 DE ABRIL DE 2010

LUGAR: UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - NEIVA

En atención a que ESTIVEN ALDANA QUINTERO

con cédula de ciudadanía No. 83,238,130 de YAGUARA

Cumplió satisfactoriamente los requisitos exigidos por las normas legales y estatutarias, le expide el titulo de INGENIERO CIVIL.

Lo anterior, atendiendo la autorización del Consejo Académico mediante acta

No. 04-10 en sesión del dia 3 de MARZO de 2010

Para constancia se suscribe por:

CESAR PEREZ GARCIA
Rector

LUIS ALFREDO ORTIZ TOVAR
Director Seccional

HENRY FERNANDO VALENCIA R.
Decano Facultad

GLORIA PATRICIA RAVE IGLESIAS
Secretario General

SGS

Certificate SGS/SSC/AllIntegral/ 001445/P/23330

Estiven Aldana Quintero

has successfully completed the

Auditor Interno Integral ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Held in Neiva, Colombia

On the 14/08/2009-17/08/2009
32 hours

Claudia Vela
Tutor Course

By

Diana Susana Pérez Gándara – Training Product Manager

SGS COLOMBIA S.A., Systems Services Certification
Carrera 16A No. 78-11 Piso 3, Bogotá D.C., Colombia
Telefono: +57 1 6089292, Fax: +57 1 6359252/6394
www.sgs.com, www.co.sgs.com

Page 1 of 1




FECHA DE NACIMIENTO
21-AGO-1984
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
03-SEP-2002 YAGUARA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
P-1909400-50113341-M-0083238130-20030416
07569 03098A 01 122960115


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
83238130
NUMERO
ALDANA QUINTERO
APELLIDOS
ESTIVEN
NOMBRES
FIRMA

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 25 de febrero de 2026, a las 15:40:17, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	83238130
Código de Verificación	832381302602251540 16

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 291974113

PIB
15:44:01
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 25 de febrero del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ESTIVEN ALDANA QUINTERO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 83238130:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 15:42:00 horas del 25/02/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **83238130,** Apellidos y Nombres **ALDANA QUINTERO ESTIVEN**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **FONPACIFICO** , con NIT **901039684-5** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 25/02/2026 03:40:35 p. m. para **el Nº de Expediente o Comparendo:** Nº. **83238130**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **135460310** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda Imprimir

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 03:39:53 PM horas del 25/02/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **83238130**
Apellidos y Nombres: **ALDANA QUINTERO ESTIVEN**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

JAVIER HERNAN RINCON SILVA
CC. 76.313.672 Popayán
Ingeniero Civil
M.P.N. 19202 - 49107

CERTIFICA:

Que el señor **ESTIVEN ALDANA QUINTERO**, identificado con cedula de ciudadania numero 83.238.130 expedida en Yaguará-Huila, labora para mi desempeñando el cargo de. Ingeniero Residente de Obra durante la ejecución del proyecto Vivienda Saludable para el Barrio las Mercedes y Otros del Municipio de Yaguará Huila, desde el Diez (10) de Junio del 2011 hasta la fecha, para un tiempo total de cinco (05) meses, demostrando responsabilidad y cumplimiento en el desarrollo de sus actividades.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado para los fines pertinentes.

Dada en Yaguará a los a los 18 días del mes de Noviembre del 2011.

JAVIER HERNAN RINCON SILVA
CC. 76.313.672 Popayán
Ingeniero Civil
M.P.N. 19202 - 49107

CONSORCIO JASA ARGENTINA 2021

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO JASA ARGENTINA 2021
NIT. 901.546.389 – 1

C E R T I F I C A:

Que el Ingeniero ***ESTIVEN ALDANA QUINTERO***, identificado con cédula de ciudadanía No. *83.238.130* de Yaguará (Huila), prestó sus servicios en nuestra empresa desde el día 14 de febrero de 2.022 al 29 de octubre de 2.022, prestando sus servicios como **RESIDENTE DE OBRA**, en la Construcción de Placa Huella y un puente, dentro del Contrato de obra derivado de la licitación pública No. 002 DE 2021 cuyo Objeto: MEJORAMIENTO DE SITIOS CRÍTICOS EN LA VÍA MIRADOR – BUENOS AIRES, CÓD. 20001, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1261 DE 2021, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA; demostrando responsabilidad y compromiso en sus labores**,** mediante contrato de prestación de servicios.

La presente se expide a solicitud del interesado a los cinco (05) días del mes de noviembre de 2022.

Cordialmente,

JOSE DAVID SALINAS OLAYA
Representante Legal
Consorcio Jasa Argentina 2021
NIT. 901.546.389-1

E-mail: constructoradye2021@gmail.com
Dirección: Cra 3 N. 11-28 Of. 202
Cel.: 3115387797 - 3143671069

PACOT S.A.S
PROFESIONALES EN ASESORIAS, CAPACITACIONES, OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES INTEGRALES S.A.S
NIT 900.693.242-3

Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo

Dirección: carrera 5 N° 10 – 36 oficina 503 – Tel: 320 801 7654
Email: pacotingn2020@gmail.com

ANEXO No. 10
HOJA DE VIDA DEL PERSONAL
(Nota: Aplicar para cada personal solicitado)

NOMBRE DEL ASOCIADO TÉCNICO: **PROFESIONALES EN ASESORIAS CAPACITACIONES OBRAS CIVILES Y TRANSPORTE INTEGRALES S.A.S**

1. DATOS PERSONALES

NOMBRES Y APELLIDOS:	**SHARIX VANESSA RINCON TRUJILLO**
CARGO POR OCUPAR:	**PROFESIONAL SST**
DOMICILIO:	**NEIVA**
DIRECCION:	**Calle 49 SUR NO. 37-170**
No. TELEFONO:	**3204044131**
No. CEDULA IDENTIFICACION	**1.079.411.490**
TARJETA PROFESIONAL No.	**N/A**
DEDICACIÓN:	**100%**

COMPROMISO

Me comprometo a hacer parte del grupo de trabajo de la empresa **PROFESIONALES EN ASESORIAS CAPACITACIONES OBRAS CIVILES Y TRANSPORTE INTEGRALES S.A.S.**, en caso de salir favorecido en el proceso de referencia, con una disponibilidad del **100%,** en el cargo de **PROFESIONAL SST** y además declaro bajo la gravedad de juramento que los documentos presentados son verídicos.

FIRMA: _____

Nota: La hoja de vida deberá venir firmada por el profesional y anexar los documentos que acreditan la experiencia.

Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	*SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)*	*NOMBRES*
RINCON	TRUJILLO	SHARIX VANESSA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C (X) C.E ( ) PAS ( ) No. 1079411490

SEXO: F (X) M ( )

NACIONALIDAD: COL. (X) EXTRANJERO ( ) *PAÍS*: ____

LIBRETA MILITAR

PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE ( ) NÚMERO ____ D.M ____

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DÍA 10 MES 10 AÑO 1995

PAÍS ____

DEPTO HUILA

MUNICIPIO TESALIA

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

CALLE 49C SUR NO. 37-170

PAÍS COLOMBIA DEPTO HUILA

MUNICIPIO NEIVA

TELÉFONO 3204044131 EMAIL .

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA										*TÍTULO OBTENIDO:*
PRIMARIA					*SECUNDARIA*				*MEDIA*	*FECHA DE GRADO*
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	11 X — MES 12 AÑO 2012

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA), **TL** (TECNOLÓGICA), **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), **UN** (UNIVERSITARIA), **ES** (ESPECIALIZACIÓN), **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER), **DOC** (DOCTORADO O PHD),

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	*No.SEMESTRES APROBADOS*	*GRADUADO SI*	*GRADUADO NO*	*NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO*	*TERMINACIÓN MES*	*TERMINACIÓN AÑO*	*No. DE TARJETA PROFESIONAL*
UN	10	X		ADMINISTRADORA EN SALUD OCUPACIONAL	10	2021	

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (**R**), BIEN (**B**) O MUY BIEN (**MB**)

IDIOMA	*LO HABLA*			*LO LEE*			*LO ESCRIBE*		
	R	B	MB	R	B	MB	R	B	MB

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO ACTUAL	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
GRUPO EMPRESARIAL PRADA		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
HUILA	NEIVA	

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
3175133031	DÍA 02 MES 01 AÑO 2022	DÍA 25 MES 02 AÑO 2025

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
COODINADORA HSEQ		

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA .

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	*TIEMPO DE EXPERIENCIA*	
	AÑOS	*MESES*
SERVIDOR PÚBLICO		
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	3	
TRABAJADOR INDEPENDIENTE		
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA		

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ◯ NO (X) ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

Ciudad y fecha de diligenciamiento 21 DE FEBRERO DE 2026

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

Ciudad y fecha

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.079.411.490**

RINCON TRUJILLO

APELLIDOS

SHARIX VANESSA

NOMBRES



Sharix Vanessa Rincon T

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-OCT-1995**

TESALIA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.59	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

20-NOV-2013 TESALIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1902500-00535521-F-1079411490-20140111 0036573353A 1 39697569

UNIMINUTO

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Sharix Vanessa Rincon Trujillo

CC No. 1.079.411.490

Ha cumplido con los requisitos académicos exigidos por la Institución, la cual, con las debidas autorizaciones le otorga el título de

Administradora en Salud Ocupacional

Código SNIES: 91236

en testimonio se firma y sella este diploma

Consejo de Fundadores

Rector UVD

Secretaria

Personería Jurídica otorgada por Resolución No. 10345 del 1 de Agosto de 1980, Ministerio de Educación Nacional.

República de Colombia

... 053 en el Libro de Registro No. 011 Bogotá, 9 de Octubre de 2021 No. DP 011180053157219

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios

ACTA INDIVIDUAL DE GRADO No. 160

La Suscrita Secretaria General de La Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO.

Certifica:

Que en la ciudad de Neiva, departamento del Huila; el día nueve (9) de Octubre de dos mil veintiuno (2021), la **Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO,** Institución de Educación Superior, reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, previo el juramento reglamentario, confirió el título de **Administradora en Salud Ocupacional a Sharix Vanessa Rincon Trujillo** con cédula de ciudadanía No. **1.079.411.490** quien aprobó la opción de grado correspondiente y cumplió con las normas legales, los requisitos académicos y las exigencias establecidas en los Estatutos y Reglamentos para el grado, y le otorgó el Diploma No. **DP011160868157219** que la acredita como tal, registrado en el Folio **868** del Libro No. **011** de Registro de Títulos expedidos por la **Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO.**

La Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO está autorizada para conferir este título por la Ley 30 del 28 de Diciembre de 1992. El programa cuenta con Resolución de Registro Calificado según Código SNIES **91236** concedido por el Ministerio de Educación Nacional.

En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Neiva, departamento del Huila; el día nueve (9) de Octubre de dos mil veintiuno (2021).

Javier Alonso Arango Pardo
Rector UVD

Linda Lucía Guarín Gutiérrez
Secretaria General

GOBERNACION DEL HUILA
Secretaría de Salud Departamental

GOBERNACIÓN DEL HUILA
Luis Enrique Dussán López
GOBERNADOR

HUILA CRECE

2021SAL00076722

RESOLUCIÓN 2802 DE 2021
Por medio de la cual se concede una Licencia para Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo

LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en la Ley 1562 de 2012 y Resolución 4502 de 2012

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1562 de 2012, se hace necesario proceder a la expedición y renovación de las Licencias de Seguridad y Salud en el Trabajo a los profesionales universitarios con postgrado en salud ocupacional, a los profesionales universitarios en salud ocupacional, tecnólogos en salud ocupacional y técnicos en salud ocupacional, facultad que está radicada en las Entidades Departamentales y Distritales de Salud.

Que **SHARIX VANESSA RINCON TRUJILLO,** identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.079.411.490**,** ha solicitado la Licencia para la Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo, anexando a su petición la documentación exigida en la Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012.

Que, con base en la documentación allegada, previo estudio técnico No. 775 del 16-11-2021, efectuados, por profesionales responsables del área de Riesgos Laborales de ésta Secretaria de Salud, se emitió concepto favorable otorgamiento de la Licencia.

Que, en consideración a lo anterior, este Despacho.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder Licencia para Prestación de servicios de **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** a **SHARIX VANESSA RINCON TRUJILLO,** identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.079.411.490., **ADMINISTRADORA EN SALUD OCUPACIONAL**, en las áreas de; **PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO, EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, DISEÑO, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.**

ARTICULO SEGUNDO: La Licencia de que trata el artículo anterior se concede por un término de diez años, contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución y podrá

Watermarkly

RESOLUCIÓN 2802 DE 2021
Por medio de la cual se concede una Licencia para Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo

ser renovada por un término igual, siempre y cuando cumplan con los requisitos estipulados en la normatividad vigente al momento de la renovación.

PARÁGRAFO: Esta Licencia es válida en todo el territorio nacional y tendrá carácter personal e intransferible.

ARTICULO TERCERO: Vigilancia y Control. La Secretaría de Salud Departamental del Huila, vigilará y controlará el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente resolución e impondrá las sanciones que acarreen su incumplimiento de conformidad con las normas legales que rigen esta materia, sin detrimento de las demás sanciones que pueden derivarse de la transgresión a las normas legales vigentes.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución proceden los recursos de Reposición y Apelación en los términos de la Ley 1437 del 2011.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Expedida en Neiva (H) el día Noviembre 16 de 2021

CESAR ALBERTO POLANIA SILVA
Secretario de Salud del Huila

Revisó: Andrea del Pilar Alvarez Perdomo

Proyectó: Karla Ximena Paredes Trujillo

Watermarkly

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 291762570

PIB
16:56:39
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 22 de febrero del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) SHARIX VANESSA RINCON TRUJILLO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1079411490:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy domingo 22 de febrero de 2026, a las 16:55:20, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1079411490
Código de Verificación	1079411490260222165520

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 05:01:44 PM horas del 22/02/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1079411490**
Apellidos y Nombres: **RINCON TRUJILLO SHARIX VANESSA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 17:06:27 horas del 22/02/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **1079411490,**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL FOP**, con NIT **901039684-5** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 22/02/2026 05:01:07 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1079411490** y Nombre: **SHARIX VANESSA RINCON TRUJILLO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **135246883** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda Imprimir

CURSOS DE ALTURAS

CURSOS DE ALTURAS CH S.A.S.

NIT: 901.587.519-8
Licencia Jurídica SST - Resolución Nº 3389 15/07/2022

CERTIFICA A:

Sharix Vanesa Rincon Trujillo

IDENTIFICADO CON EL TIPO DE DOCUMENTO CC N°
1079411490

por haber cursado y aprobado el nivel

TRABAJADOR AUTORIZADO

Con una intensidad horaria de
32 Horas de Formación

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 4272 de 2021 del 27 de diciembre
Bureau Veritas Certificado N° CO22.01428 15/DIC/2022, acreditado por la ONAC 09-CPR-008
Ministerio de trabajo Radicado N° 08SE2023220000000022453 de Día 18/05/2023
Cursado en Bogotá entre el día 19 de septiembre del 2023 al 22 de septiembre del 2023

NOMBRE DE LA EMPRESA: SHARIX VANESA RINCON TRUJILLO
CON NIT: 1079411490
REPRESENTADA POR: SHARIX VANESA RINCON TRUJILLO
DICHA AFILIADA A LA ARL: POSITIVA

Lo anterior se firma en Bogotá, D.C., a los 22 días del mes de septiembre del año 2023

Nombre del Entrenador:
Luis Eduardo Valbuena Pérez
Licencia: Nº 3501 del 15/07/2022

Nombre Representante legal:
Claudia Hernández Martínez
C.C. 52.555.412

Código de Verificación TA00163

La autenticidad de este documento puede verificarse en: www.cursosdealturasch.com
Tel.: +57 601 605 0745 | Móvil: +57 318 845 9295
Cra. 69p # 78-70 | E-mail: gerencia@cursosdealturasch.com

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS | suma 5.0 | educa | comunica

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Mediante registro RCO-002 del Ministerio de Trabajo, Resolución 4927 de 2016
y conforme con la circular 0047 de 2025, en nombre de

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A

Certifica que

SHARIX VANESSA RINCON TRUJILLO

Identificado(a) con documento de identidad No CC1079411490

Realizó y aprobó satisfactoriamente el

Curso de 20 horas de actualización de la capacitación virtual en SG-SST

Realizado con una intensidad horaria de 20 horas

Luego de cumplir con las actividades programadas y reunir los requisitos que exigen las normas académicas se firma en Bogotá, Colombia, el 10 de diciembre de 2025

wd7AAY5UII

Carlos Iván Heredia Ferreira
Vicepresidente de Promoción y Prevención
Positiva Compañía de Seguros S.A.

icontec

Certifica que:

SHARIX VANESSA RINCON TRUJILLO

1079411490

asistió y aprobó el programa

FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS HSEQ: NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y NTC ISO 45001:2018

Con una intensidad de 64 horas

El contenido del programa comprendió:

- FUNDAMENTOS ISO 9001 (16 horas)
- COMPETENCIAS BASICAS PARA LA GESTION AMBIENTAL (8 horas)
- ELEMENTOS ESTRUCTURALES NTC ISO 45001:2018 (8 horas)
- PENSAMIENTO BASADO EN RIESGO (8 horas)
- AUDITORIAS COMBINADAS AL SGI. (24 horas)

Neiva(Colombia), 29 de Abril del 2021

Victoria Eugenia Manrique Carvajal
Gerente UT Educación
ICONTEC

ES-C-PS-01-F-010
Versión 01

CSO21766D011C1

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

SHARIX VANESSA RINCON TRUJILLO

Con Cedula de Ciudadania No. 1079411490

Cursó y aprobó la acción de Formación

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

con una duración de 50 horas

En testimonio de lo anterior. se firma el presente en El Bagre. a los doce (12) días del mes de septiembre de dos mil diecinueve (2019)

Firmado Digitalmente por

JAIRO LEON JIMENEZ ZAPATA
Subdirector (E)
CENTRO DE FORMACIÓN MINERO AMBIENTAL
REGIONAL ANTIOQUIA

62220218 - 12/09/2019
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9127001958712CC1079411490C.

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

SHARIX VANESSA RINCON TRUJILLO

Con Cedula de Ciudadania No. 1079411490

Cursó y aprobó la acción de Formación

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN COLOMBIA

con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Cartago, a los dos (2) dias del mes de octubre de dos mil diecinueve (2019)

Firmado Digitalmente por
GERARDO AUGUSTO CASTRO MUNOZ
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Autenticidad del Documento
Bogota - Colombia

GERARDO AUGUSTO CASTRO MUÑOZ
SUBDIRECTOR
CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES
REGIONAL VALLE

63047436 - 02/10/2019
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9543001983500CC1079411490C.

LA SUSCRITA GERENTE

CERTIFICA:

Que la Señora ***SHARIX VANESSA RINCON TRUJILLO***, identificada con la cedula identidad No. 1.079.411.490 de Tesalia, labora para esta Empresa, desempeñando el cargo de COORDINADORA HSEQ; desde el 02 de enero del 2022, hasta el 25 de febrero del 2025 con un salario mensual de tres millones doscientos mil pesos (3.200.000)

Durante este tiempo la Sra. Vanessa demostró ser una persona, honesta, responsable, comprometida y cumplidora de las funciones mencionadas a continuación:

- Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros que la organización suscriba en calidad, seguridad y salud en el trabajo y ambiental.
- Asegurar que los procesos necesarios para el funcionamiento del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. se establezcan, implementen y mantengan.
- Informar a la Gerencia sobre el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y de cualquier necesidad de mejora.
- Asesorar a los demás procesos sobre aspectos relacionados con seguridad y salud en el trabajo o gestión ambiental en temas como asimilación de política, entre otros.
- Diseñar y presentar los diferentes programas que contribuyen a la prevención de riesgos e impactos ambientales y al cumplimiento en la calidad del servicio.
- Realizar las actualizaciones que correspondan a documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Recepcionar las quejas y reclamos y dar el tratamiento respectivo según los procedimientos internos.

- Servir de apoyo a las decisiones de la Gerencia frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

- Participar en la investigación de incidentes o análisis de causa raíz.
- Cumplir con los reglamentos internos establecidos por la empresa.
- Participar activamente de los planes, programas y capacitaciones que la empresa considere necesarios como formación.
- Cumplir con las demás funciones que le asigne la Empresa y las que sean inherentes a su cargo.
- Realizar desplazamientos eventuales para la radicación y/o la entrega de documentos y correspondencias.

Este certificado se expide en Neiva, a los catorce (04) días del mes de febrero del 2025, para trámites PERSONALES.

Cordialmente,

CLARA INES PRADA VARON
CC No. 36.181.947 de Neiva
Representante Legal
GRUPO EMPRESARIAL PRADA SAS
Nit No. 9 0 1 3 3 2 7 9 2

PACOT S.A.S
PROFESIONALES EN ASESORIAS, CAPACITACIONES, OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES INTEGRALES S.A.S
NIT 900.693.242-3

Secretaria Auxiliar Administrativo

Dirección: carrera 5 N° 10 – 36 oficina 503 – Tel: 320 801 7654
Email: pacotingn2020@gmail.com

PACOT S.A.S
PROFESIONALES EN ASESORIAS, CAPACITACIONES, OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES INTEGRALES S.A.S
NIT 900.693.242-3

ANEXO No. 10
HOJA DE VIDA DEL PERSONAL
(Nota: Aplicar para cada personal solicitado)

NOMBRE DEL ASOCIADO TÉCNICO: **PROFESIONALES EN ASESORIAS CAPACITACIONES OBRAS CIVILES Y TRANSPORTE INTEGRALES S.A.S**

1. DATOS PERSONALES

NOMBRES Y APELLIDOS:	**TANIA YASMIN LOZANO CHARRY**
CARGO POR OCUPAR:	**SECRETARIA – AUXILIAR ADMINISTRATIVO**
DOMICILIO:	**NEIVA**
DIRECCION:	**Diag 14 # 29 - 38**
No. TELEFONO:	**3112576112**
No. CEDULA IDENTIFICACION	**1075313070**
TARJETA PROFESIONAL No.	**N/A**
DEDICACIÓN:	**100%**

COMPROMISO

Me comprometo a hacer parte del grupo de trabajo de la empresa **PROFESIONALES EN ASESORIAS CAPACITACIONES OBRAS CIVILES Y TRANSPORTE INTEGRALES S.A.S.**, en caso de salir favorecido en el proceso de referencia, con una disponibilidad del **100%,** en el cargo de **PROFESIONAL SST** y además declaro bajo la gravedad de juramento que los documentos presentados son verídicos.

FIRMA: _____

Nota: La hoja de vida deberá venir firmada por el profesional y anexar los documentos que acreditan la experiencia.

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	*SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)*	*NOMBRES*
LOZANO	CHARRY	TANIA YASMIN

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C (X) C.E ( ) PAS ( ) No. 1075313070

SEXO: F (X) M ( )

NACIONALIDAD: COL. (X) EXTRANJERO ( ) *PAÍS*: ____

LIBRETA MILITAR

PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE ( ) NÚMERO ____ D.M ____

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DÍA 07 MES 08 AÑO 1998

PAÍS ____

DEPTO HUILA

MUNICIPIO NEIVA

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

DIAGONAL 14 NO. 19-38

PAÍS COLOMBIA DEPTO HUILA

MUNICIPIO NEIVA

TELÉFONO 3112576112 EMAIL .

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA										*TÍTULO OBTENIDO:*
PRIMARIA					*SECUNDARIA*				*MEDIA*	*FECHA DE GRADO*
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	11 X — MES 12 AÑO 2014

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA), **TL** (TECNOLÓGICA), **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), **UN** (UNIVERSITARIA), **ES** (ESPECIALIZACIÓN), **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER), **DOC** (DOCTORADO O PHD),

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	*No.SEMESTRES APROBADOS*	*GRADUADO SI*	*GRADUADO NO*	*NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO*	*TERMINACIÓN MES*	*TERMINACIÓN AÑO*	*No. DE TARJETA PROFESIONAL*
UN	10	X		CONTADORA PUBLICA	10	2025	
TL	2	X		TECNOLOGO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS	10	2017	

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (**R**), BIEN (**B**) O MUY BIEN (**MB**)

IDIOMA	*LO HABLA*			*LO LEE*			*LO ESCRIBE*		
	R	B	MB	R	B	MB	R	B	MB

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE			
EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*	
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO* DÍA MES AÑO	*FECHA DE RETIRO* DÍA MES AÑO	
CARGO O CONTRATO ACTUAL	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*	

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*	
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO* DÍA MES AÑO	*FECHA DE RETIRO* DÍA MES AÑO	
CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*	

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
		X	COLOMBIA
DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*	
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO* DÍA MES AÑO	*FECHA DE RETIRO* DÍA MES AÑO	
CARGO O CONTRATO DIRECTOR DE OBRA	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*	

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*	
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO* DÍA MES AÑO	*FECHA DE RETIRO* DÍA MES AÑO	
CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*	

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA .

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	*TIEMPO DE EXPERIENCIA*	
	AÑOS	*MESES*
SERVIDOR PÚBLICO		
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	3	
TRABAJADOR INDEPENDIENTE		
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA		

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ◯ NO ⓧ ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

Ciudad y fecha de diligenciamiento 21 DE FEBRERO DE 2026

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

Ciudad y fecha

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 24/02/2026 09:04:05 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1075313070** y Nombre: **TANIA YASMIN LOZANO CHARRY.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **135340236** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 1.075.313.070
LOZANO CHARRY
APELLIDOS
TANIA YASMIN
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 07-AGO-1998
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.56
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
10-AGO-2016 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA
P-1900100-00849471-F-1075313070-20160917
0051251365A 2
46825094

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Y EN SU NOMBRE, LA

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

CON PERSONERÍA JURÍDICA 4571 DE 1977

UAN
UNIVERSIDAD
ANTONIO NARIÑO
VIGILADA MINEDUCACIÓN

CONFIERE EL TÍTULO DE

CONTADORA PÚBLICA

A

Tania Yasmin Lozano Charry

C.C. No. 1075313070 de Neiva

QUIEN CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE TODOS LOS REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS.
EN TESTIMONIO DE ELLO SE OTORGA EL PRESENTE

DIPLOMA

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C., A LOS 24 DÍAS DEL MES X DE 2025

RECTOR

VICE RECTOR ACADÉMICO

DECANO DE LA FACULTAD

SECRETARIO GENERAL

REGISTRADO AL FOLIO 315-4 DEL LIBRO DE DIPLOMAS 35

BOGOTÁ, D.C. 27 DE X DE 2025 No. 67108

ELABORÓ

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 291857089

PIB
08:55:59
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 24 de febrero del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) TANIA YASMIN LOZANO CHARRY identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1075313070:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 24 de febrero de 2026, a las 08:54:31, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1075313070
Código de Verificación	1075313070260224085431

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 08:56:46 AM horas del 24/02/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1075313070**
Apellidos y Nombres: **LOZANO CHARRY TANIA YASMIN**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994 y en atención a que

TANIA YASMIN LOZANO CHARRY

Con Cedula de Ciudadania No. 1.075.313.070

Cursó y aprobó el programa de Formación Profesional Integral
y cumplió con las condiciones requeridas por la entidad, le confiere el

Título de

TECNÓLOGO EN

CONTABILIDAD Y FINANZAS

En testimonio de lo anterior, se firma el presente Titulo en Neiva,
a los veintisiete (27) días del mes de octubre de dos mil diecisiete (2017)

Firmado Digitalmente por
FERMIN BELTRAN BARRAGAN
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

FERMIN BELTRAN BARRAGAN
SUBDIRECTOR CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS
REGIONAL HUILA

33240641 - 27/10/2017
No y FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9527001116932CC1075313070C.

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994 y en atención a que

TANIA YASMIN LOZANO CHARRY

Con Cedula de Ciudadania No. 1.075.313.070

Cursó y aprobó el programa de Formación Profesional Integral
y cumplió con las condiciones requeridas por la entidad, le confiere el

Título de

TÉCNICO EN

CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS

En testimonio de lo anterior, se firma el presente Titulo en Neiva,
a los quince (15) dias del mes de noviembre de dos mil quince (2015)

Firmado Digitalmente por
FERMIN BELTRAN BARRAGAN
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

FERMIN BELTRAN BARRAGAN
SUBDIRECTOR CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS
REGIONAL HUILA

19686152 - 15/11/2015
No y FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 952700707375CC1075313070C.

PACOT S.A.S
PROFESIONALES EN ASESORIAS, CAPACITACIONES, OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES INTEGRALES S.A.S
NIT 900.693.242-3

Personal de Seguridad (Celaduría)

Dirección: carrera 5 N° 10 – 36 oficina 503 – Tel: 320 801 7654
Email: pacotingn2020@gmail.com

PACOT S.A.S
PROFESIONALES EN ASESORIAS, CAPACITACIONES, OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES INTEGRALES S.A.S
NIT 900.693.242-3

ANEXO No. 10
HOJA DE VIDA DEL PERSONAL
(Nota: Aplicar para cada personal solicitado)


NOMBRE DEL ASOCIADO TÉCNICO: **PROFESIONALES EN ASESORIAS CAPACITACIONES OBRAS CIVILES Y TRANSPORTE INTEGRALES S.A.S**

1. DATOS PERSONALES

NOMBRES Y APELLIDOS:	**DIEGO FERNANDO RODAS**
CARGO POR OCUPAR:	**CELADURIA**
DOMICILIO:	**NEIVA**
DIRECCION:	**CLLE 31 NO. 19-30**
No. TELEFONO:	**3219581497**
No. CEDULA IDENTIFICACION	**1075237858**
TARJETA PROFESIONAL No.	**N/A**
DEDICACIÓN:	**100%**

COMPROMISO

Me comprometo a hacer parte del grupo de trabajo de la empresa **PROFESIONALES EN ASESORIAS CAPACITACIONES OBRAS CIVILES Y TRANSPORTE INTEGRALES S.A.S.**, en caso de salir favorecido en el proceso de referencia, con una disponibilidad del **100%,** en el cargo de **CELADOR** y además declaro bajo la gravedad de juramento que los documentos presentados son verídicos.

FIRMA: 

Nota: La hoja de vida deberá venir firmada por el profesional y anexar los documentos que acreditan la experiencia.

Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	*SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)*	*NOMBRES*
RODAS	MUÑOZ	DIEGO FERNANDO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C (X) C.E ( ) PAS ( ) No. 1075237858

SEXO: F ( ) M (X)

NACIONALIDAD: COL. (X) EXTRANJERO ( ) *PAÍS*: _____

LIBRETA MILITAR

PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE ( ) NÚMERO _____ D.M _____

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DÍA 28 MES 06 AÑO 2007

PAÍS _____

DEPTO HUILA

MUNICIPIO NEIVA

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

CALLE 31 NO. 19-30

PAÍS COLOMBIA DEPTO HUILA

MUNICIPIO NEIVA

TELÉFONO 3219581497 EMAIL .

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA										*TÍTULO OBTENIDO:*
PRIMARIA					*SECUNDARIA*				*MEDIA*	*FECHA DE GRADO*
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	MES 12 AÑO 2004
									X	

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA), **TL** (TECNOLÓGICA), **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), **UN** (UNIVERSITARIA),
ES (ESPECIALIZACIÓN), **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER), **DOC** (DOCTORADO O PHD),
RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	*No.SEMESTRES APROBADOS*	*GRADUADO SI*	*GRADUADO NO*	*NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO*	*TERMINACIÓN MES*	*TERMINACIÓN AÑO*	*No. DE TARJETA PROFESIONAL*

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (**R**), BIEN (**B**) O MUY BIEN (**MB**)

IDIOMA	*LO HABLA*			*LO LEE*			*LO ESCRIBE*		
	R	B	MB	R	B	MB	R	B	MB

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE			
EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*	
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO* DÍA MES AÑO	*FECHA DE RETIRO* DÍA MES AÑO	
CARGO O CONTRATO ACTUAL	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*	

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
JAVIER HERNAN RINCON		X	COLOMBIA
DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*	
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO* DÍA MES AÑO	*FECHA DE RETIRO* DÍA MES AÑO	
CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*	

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
		X	COLOMBIA
DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*	
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO* DÍA MES AÑO	*FECHA DE RETIRO* DÍA MES AÑO	
CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*	

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*	
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO* DÍA MES AÑO	*FECHA DE RETIRO* DÍA MES AÑO	
CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*	

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA .

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	*TIEMPO DE EXPERIENCIA*	
	AÑOS	*MESES*
SERVIDOR PÚBLICO		
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	15	
TRABAJADOR INDEPENDIENTE		
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA		

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ◯ NO (X) ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

Ciudad y fecha de diligenciamiento 21 DE FEBRERO DE 2026

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

Ciudad y fecha

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 25 de febrero de 2026, a las 16:16:52, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1075237858
Código de Verificación	1075237858260225161652

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 25/02/2026 04:17:57 p. m. para **el Nº de Expediente o Comparendo:** Nº. **1075237858**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **135464944** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda Imprimir

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 04:30:53 PM horas del 25/02/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1075237858**
Apellidos y Nombres: **RODAS MUÑOZ DIEGO FERNANDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
GOV.CO
Todos los derechos reservados.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 04:17:24 PM horas del 25/02/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1075237858**
Apellidos y Nombres: RODAS MUÑOZ DIEGO FERNANDO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

La República de Colombia
y en su nombre el

Instituto de Servicios Académicos
IDESA

Neiva - Huila

Autorizado por la Secretaría de Educación del Municipio de Neiva
según Resolución No. 1003 del 03 de Abril de 2017.

Confiere a

Diego Fernando Rodas Muñoz

T.I. 1.075.237.858 de Neiva (Huila)

El Título de

Bachiller Académico

Por haber cursado y aprobado los estudios correspondientes al Ciclo VI - Undécimo Lectivo Especial Integrado del Nivel de Educación Media de Adultos, Modalidad Académica, al tenor de lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley 115 de 1994 y 27 del Decreto 3011 de 1997 del Gobierno Nacional, según los planes vigentes.



INSTITUTO DE SERVICIOS ACADEMICOS IDESA RECTORIA
Johanna Vivas Dussán
Rectora
C.C. 36.306.813 de Neiva

Instituto de Servicios acadé IDESA SECRETARIA
Mireya Vivas
Secretaria
C.C. 36.173.170 de Neiva

Acta General de Graduacion No. 55
Anotado al Folio 17 - 18, del Libro para Control Interno de Diplomas No. 02
Dado en Neiva - Huila, a los 28 días del mes de Noviembre de 2024

CENTRO INTERNACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

CENTRO INTERNACIONAL DE MAQUINARIA PESADA DPL S.A.S.

Aprobación Oficial Res No. 1949 Secretaría de Educación Municipal de Neiva

ACTA INDIVIDUAL DE CERTIFICACIÓN No. 64

LA INSTITUCIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO

CENTRO INTERNACIONAL DE MAQUINARIA PESADA DPL S.A.S

NEIVA - HUILA

En la ciudad de Neiva a los 20 días del mes de Diciembre de 2025, se dieron cita con el fin de formalizar la entrega de certificados de los alumnos(as), de los programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano, el suscrito Director Nacional en representación del **CENTRO INTERNACIONAL DE MAQUINARIA PESADA DPL S.A.S** Institución Técnica de Formación para el trabajo y el desarrollo humano, con aprobación oficial según resolución No. 1949 Agosto 2017 Otorgado por la Secretaria de Educación Municipal de Neiva.

TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN:

OPERACIÓN DE EQUIPO PESADO

Registro No. 1949 / 2017

Al estudiante cuyos nombres, apellidos y número de identificación se realizan a continuación.

DIEGO FERNANDO RODAS MUÑOZ
C.C. NO. 1.075.237.858 NEIVA – HUILA

Daniel Eduardo Paez Losada
C.C. No. 1.075.232.715 de Neiva
Director General

Dada en Neiva, el día 20 del mes de diciembre de 2025

Calle 6 Nro. 9 -10 Altico / Frente al Parque de la música Tel: 8575171
gerencia@escuelademaquinariapesadadpl.edu.co

PACOT S.A.S
PROFESIONALES EN ASESORIAS, CAPACITACIONES, OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES INTEGRALES S.A.S
NIT 900.693.242-3

Propuesta Económica

Dirección: carrera 5 N° 10 – 36 oficina 503 – Tel: 320 801 7654
Email: pacotingn2020@gmail.com

ANEXO No. 9

PROCESO No. OB-006-2026

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA"

CUBIERTA No.1 - LA VICTORIA

ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 5.239.847,00**
1.1	Localización y replanteo	m^2	533,95	$ 3.494,00	$ 1.865.621,00
1.2	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	m^2	66,53	$ 28.622,00	$ 1.904.222,00
1.3	Desmonte marcos canchas existentes.	Und.	2,00	$ 116.592,00	$ 233.184,00
1.4	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.	Und.	4,00	$ 309.205,00	$ 1.236.820,00
2	**CIMIENTOS**				**$ 77.006.228,00**
2.1	Excavación manual para cimentaciónes </= 2 mts	m^3	46,77	$ 45.158,00	$ 2.112.040,00
2.2	Rellenos compactados en recebo seleccionado al 95% PROCTOR	m^3	21,12	$ 78.064,00	$ 1.648.712,00
2.4	Concreto de limpieza o solado E= 0,05 en concreto de 1.500 PSI	m^2	27,00	$ 34.791,00	$ 939.357,00
2.5	Zapatas en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo	m^3	14,85	$ 811.283,00	$ 12.047.553,00
2.6	Columnas en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo	m^3	8,82	$ 837.807,00	$ 7.389.458,00
2.7	Viga de cimentación en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo	m^3	5,88	$ 877.594,00	$ 5.160.253,00
2.8	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	Kg	5235,70	$ 8.491,00	$ 44.456.329,00
2.9	Retiros de material sobrante de excavaciones y escombros	m^3	46,77	$ 69.543,00	$ 3.252.526,00
3	**ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA**				**$ 244.940.592,00**
3.1	Suministro e localización Estructura metálica según diseño estructural, en tubería estructural para columnas, domos y viga de amarre según diseño.	Kg	5794,34	$ 27.647,00	$ 160.196.118,00
3.2	Correa en perfil metálico rectangular de 10x10 cm Cal.16. Incluye anticorrosivo y pintura esmalte.	m	560,50	$ 61.004,00	$ 34.192.742,00
3.3	Suministro e instalación cubierta en teja galvanizada Cal.28 Tipo STANDING SEAM ó similar, incluye tornillos de sujeción, color según diseño.	m2	566,55	$ 72.030,00	$ 40.808.416,00
3.4	Platinas de apoyos columnas de 0.50x0.50(m) cajón principal de cubierta en platina 1/2" y 12 pernos grado 8 Ø3/4", incluye, empalme de pernos, empalme de columna a platina, soldadura y montaje.	Und.	12,00	$ 811.943,00	$ 9.743.316,00
4	**INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS**				**$ 22.174.111,00**
4.1	Suministro e instalaciòn Bajante PVC aguas lluvias de 4".	m	43,20	$ 51.785,00	$ 2.237.112,00
4.2	Abrazadera galvanizada 2" - 4"	Und.	36,00	$ 34.708,00	$ 1.249.488,00
4.3	Codo de 45/90 4" PVC SANITARIO	Und.	36,00	$ 31.143,00	$ 1.121.148,00
4.4	Suministro e Instalación de tubería PVC Aguas Lluvias Ø6"	m	76,56	$ 55.876,00	$ 4.277.867,00
4.5	Caja de inspección en concreto de 3000 PSI SECC(0,60*0,60*1,00 m) incluye tapa en concreto y refuerzo	Und.	4,00	$ 541.269,00	$ 2.165.076,00
4.6	Canal en lámina Galvanizada Cal.18 ancho=0.38 metros. H=0.20 metros (Sum. E Inst. Wash Primer + Esmalte + Anclaje estructura metalica)	m	59,00	$ 93.428,00	$ 5.512.252,00
4.7	Suministro e instalaciòn tuberia pvc aguas lluvias de 8" CORRUGADA	M	24,00	$ 112.011,00	$ 2.688.264,00
4.9	Excavacion manual Tipo zanja </= 0.9 mts -- e=0,50 m	M3	45,25	$ 45.158,00	$ 2.043.400,00
4.10	Rellenos en recebo seleccionado de la misma excavacion compactado mecanico	M3	36,10	$ 24.363,00	$ 879.504,00
5	**PISOS Y ACABADOS**				**$ 3.602.243,00**
5.1	Placa de contrapiso en concreto de 3000 psi e= 0,10 cm con malla electrosoldada de 0,15 x 0,15 de 5.0 mm	m^2	43,40	$ 83.001,00	$ 3.602.243,00
6	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$ 38.946.923,00**
6.1	Tuberia emt 3/4", incluye accesorios de fijación y ajustes para tubería.	m	89,60	$ 56.823,00	$ 5.091.341,00
6.2	Cable eléctrico No 10 CU AWG Libre de halogeno. Incluye: 2 fases + 1 tierra	m	89,60	$ 22.503,00	$ 2.016.269,00
6.3	Lámpara SYLVANIA-SYLVEO LED 2000 LM NAR 4K Incluye: Una Caja metalica galvanizada 4x4", un Tomacorriente 15v, 15A, con PT, una Clavija aerea 125V 15A con PT, conector terminal para tubo EMT 1/2" con contra tuerca, Elementos de fijación y ajuste, Marcación e identificación del circuito.	Und.	8,00	$ 447.300,00	$ 3.578.400,00

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA"

6.4	Tablero eléctrico tipo exterior intemperie con Protección 2X40A y fotocontrol temporizado 220V, cumpliendo RETIE. Incluye elementos de fijación y ajuste.	Und.	1,00	$ 1.870.200,00	$ 1.870.200,00
6.5	Protección Termomagnética bipolar 2X20A 10 kA Tipo riel.	Und.	2,00	$ 85.345,00	$ 170.690,00
6.6	Alambrón de aluminio No 1/0. Incluye: Soporte plástico corto para alambrón y elementos de fijación y ajuste.	m	166,50	$ 57.892,00	$ 9.639.018,00
6.7	Cable de cobre desnudo No 2/0	m	110,00	$ 64.422,00	$ 7.086.420,00
6.8	Punta captadora aluminio 5/8" X 0,8m roscada Incluye: Base en aluminio, elementos de fijación y ajuste.	Und.	9,00	$ 393.125,00	$ 3.538.125,00
6.9	Grapa paralela bimetalica para alambrón 1/0. Inlcuye caja raweld 2400 con su respectiva tapa ciega.	Und.	4,00	$ 171.550,00	$ 686.200,00
6.10	Sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 5/8" X 2,4m. Incluye: Caja de inspección premoldeada 40X40X40cm, Soldadura exotermica 115g.	Und.	5,00	$ 851.700,00	$ 4.258.500,00
6.11	Suminsitro e localización de medidor bifasico trifilar.	Und.	1,00	$ 1.011.760,00	$ 1.011.760,00
	VALOR COSTO DIRECTO - CUBIERTA LA VICTORIA				**$ 391.909.944,00**

CUBIERTA No.2 - CRISTO REY

ITEM	DESCRIPCIÓN	Und.	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 4.301.203,00**
1.1	Localización y replanteo	m^2	540,00	$ 3.494,00	$ 1.886.760,00
1.2	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	m^2	43,80	$ 28.622,00	$ 1.253.644,00
1.3	Desmonte marcos canchas existentes.	Und.	2,00	$ 116.592,00	$ 233.184,00
1.4	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.	Und.	3,00	$ 309.205,00	$ 927.615,00
2	**CIMIENTOS**				**$ 75.410.676,00**
2.1	Excavación manual para cimentaciónes </= 2 mts	m^3	46,89	$ 45.158,00	$ 2.117.459,00
2.2	Rellenos compactados en recebo seleccionado al 95% PROCTOR	m^3	21,12	$ 78.064,00	$ 1.648.712,00
2.4	Concreto de limpieza o solado E= 0,05 en concreto de 1.500 PSI	m^2	27,00	$ 34.791,00	$ 939.357,00
2.5	Zapatas en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo	m^3	14,85	$ 811.283,00	$ 12.047.553,00
2.6	Columnas en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo	m^3	5,88	$ 837.807,00	$ 4.926.305,00
2.7	Viga de cimentación en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo	m^3	6,00	$ 877.594,00	$ 5.265.564,00
2.8	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	Kg	5261,02	$ 8.491,00	$ 44.671.321,00
2.9	Retiros de material sobrante de excavaciones y escombros	m^3	54,56	$ 69.543,00	$ 3.794.405,00
3	**ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA**				**$ 248.237.082,00**
3.1	Suministro e localización Estructura metálica según diseño estructural, en tubería estructural para columnas, domos y viga de amarre según diseño.	Kg	5906,05	$ 27.647,00	$ 163.284.564,00
3.2	Correa en perfil metálico rectangular de 10x10 cm Cal.16. Incluye anticorrosivo y pintura esmalte.	m	570,00	$ 61.004,00	$ 34.772.280,00
3.3	Suministro e instalación cubierta en teja galvanizada Cal.28 Tipo STANDING SEAM ó similar, incluye tornillos de sujeción, color según diseño.	m^2	561,39	$ 72.030,00	$ 40.436.922,00
3.4	Platinas de apoyos columnas de 0.50x0.50(m) cajón principal de cubierta en platina 1/2" y 12 pernos grado 8 Ø3/4", incluye, empalme de pernos, empalme de columna a platina, soldadura y montaje.	Und.	12,00	$ 811.943,00	$ 9.743.316,00
4	**INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS**				**$ 20.622.491,00**
4.1	Suministro e instalaciòn Bajante PVC aguas lluvias de 4"	m	43,20	$ 51.785,00	$ 2.237.112,00
4.2	Abrazadera galvanizada 2" - 4"	Und.	36,00	$ 34.708,00	$ 1.249.488,00
4.3	Codo de 45/90 4" PVC SANITARIO	Und.	36,00	$ 31.143,00	$ 1.121.148,00
4.4	Suministro e Instalación de tubería PVC Aguas Lluvias Ø6"	m	77,00	$ 55.876,00	$ 4.302.452,00
4.5	Caja de inspección en concreto de 3000 PSI SECC(0,60*0,60*1,00 m) incluye tapa en concreto y refuerzo	Und.	4,00	$ 541.269,00	$ 2.165.076,00
4.6	Canal en lámina Galvanizada Cal.18 ancho=0.40 metros. H=0.25 metros (Sum. E Inst. Wash Primer + Esmalte + Anclaje estructura metalica)	m	60,00	$ 93.428,00	$ 5.605.680,00
4.7	Suministro e Instalación de tubería PVC Sanitaria Corrugada Ø8"	m	12,00	$ 112.011,00	$ 1.344.132,00
4.9	Excavacion manual Tipo zanja </= 0.9 mts -- e=0,50 m	M3	40,05	$ 45.158,00	$ 1.808.578,00
4.10	Rellenos en recebo seleccionado de la misma excavacion compactado mecanico	M3	32,38	$ 24.363,00	$ 788.825,00
5	**PISOS Y ACABADOS**				**$ 3.635.444,00**
5.1	Placa de contrapiso en concreto de 3000 psi e= 0,10 cm con malla electrosoldada de 0,15 x 0,15 de 5.0 mm	m^2	43,80	$ 83.001,00	$ 3.635.444,00
6	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$ 37.664.930,00**
6.1	Tuberia emt 3/4", incluye accesorios de fijación y ajustes para tubería.	m	70,72	$ 56.823,00	$ 4.018.523,00
6.2	Cable eléctrico No 10 CU AWG Libre de halogeno. Incluye: 2 fases + 1 tierra	m	70,72	$ 22.503,00	$ 1.591.412,00

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA"

6.3	Lámpara SYLVANIA-SYLVEO LED 2000 LM NAR 4K Incluye: Una Caja metalica galvanizada 4x4", un Tomacorriente 15v, 15A, con PT, una Clavija aerea 125V 15A con PT, conector terminal para tubo EMT 1/2" con contra tuerca, Elementos de fijación y ajuste, Marcación e identificación del circuito.	Und.	8,00	$	447.300,00	$	3.578.400,00
6.4	Tablero eléctrico tipo exterior intemperie con Protección 2X40A y fotocontrol temporizado 220V, cumpliendo RETIE. Incluye elementos de fijación y ajuste.	Und.	1,00	$	1.870.200,00	$	1.870.200,00
6.5	Protección Termomagnética bipolar 2X20A 10 kA Tipo riel.	Und.	2,00	$	85.345,00	$	170.690,00
6.6	Alambrón de aluminio No 1/0. Incluye: Soporte plástico corto para alambrón y elementos de fijación y ajuste.	m	168,00	$	57.892,00	$	9.725.856,00
6.7	Cable de cobre desnudo No 2/0	m	112,00	$	64.422,00	$	7.215.264,00
6.8	Punta captadora aluminio 5/8" X 0,8m roscada Incluye: Base en aluminio, elementos de fijación y ajuste.	Und.	9,00	$	393.125,00	$	3.538.125,00
6.9	Grapa paralela bimetalica para alambrón 1/0. Inlcuye caja raweld 2400 con su respectiva tapa ciega.	Und.	4,00	$	171.550,00	$	686.200,00
6.10	Sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 5/8" X 2,4m. Incluye: Caja de inspección premoldeada 40X40X40cm, Soldadura exotermica 115g.	Und.	5,00	$	851.700,00	$	4.258.500,00
6.11	Suminsitro e localización de medidor bifasico trifilar.	Und.	1,00	$	1.011.760,00	$	1.011.760,00
	VALOR COSTO DIRECTO - CUBIERTA CRISTO REY					$	**389.871.826,00**
CUBIERTA No.3 - LA CARBONA							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**Und.**	**CANTIDAD**	**VR/. UNITARIO**		**VR/. PARCIAL**	
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**					$	**3.876.938,00**
1.1	Localización y replanteo	m^2	421,85	$	3.494,00	$	1.473.944,00
1.2	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	m^2	43,40	$	28.622,00	$	1.242.195,00
1.3	Desmonte marcos canchas existentes.	Und.	2,00	$	116.592,00	$	233.184,00
1.4	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.	Und.	3,00	$	309.205,00	$	927.615,00
2	**CIMIENTOS**					$	**73.549.198,00**
2.1	Excavación manual para cimentaciónes </= 2 mts	m^3	46,77	$	45.158,00	$	2.112.040,00
2.2	Rellenos compactados en recebo seleccionado al 95% PROCTOR	m^3	21,12	$	78.064,00	$	1.648.712,00
2.4	Concreto de limpieza o solado E= 0,05 en concreto de 1.500 PSI	m^2	27,00	$	34.791,00	$	939.357,00
2.5	Zapatas en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo	m^3	14,85	$	811.283,00	$	12.047.553,00
2.6	Columnas en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo	m^3	5,88	$	837.807,00	$	4.926.305,00
2.7	Viga de cimentación en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo	m^3	5,88	$	877.594,00	$	5.160.253,00
2.8	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	Kg	5068,64	$	8.491,00	$	43.037.822,00
2.9	Retiros de material sobrante de excavaciones y escombros	m^3	52,88	$	69.543,00	$	3.677.156,00
3	**ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA**					$	**224.257.230,00**
3.1	Suministro e localización Estructura metálica según diseño estructural, en tubería estructural para columnas, domos y viga de amarre según diseño.	Kg	5546,32	$	27.647,00	$	153.339.109,00
3.2	Correa en perfil metálico rectangular de 10x10 cm Cal.16. Incluye anticorrosivo y pintura esmalte.	m	450,00	$	61.004,00	$	27.451.800,00
3.3	Suministro e instalación cubierta en teja galvanizada Cal.28 Tipo STANDING SEAM ó similar, incluye tornillos de sujeción, color según diseño.	m^2	468,18	$	72.030,00	$	33.723.005,00
3.4	Platinas de apoyos columnas de 0.50x0.50(m) cajón principal de cubierta en platina 1/2" y 12 pernos grado 8 Ø3/4", incluye, empalme de pernos, empalme de columna a platina, soldadura y montaje.	Und.	12,00	$	811.943,00	$	9.743.316,00
4	**INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS**					$	**18.900.318,00**
4.1	Suministro e instalaciòn Bajante PVC aguas lluvias de 4"	m	43,20	$	51.785,00	$	2.237.112,00
4.2	Abrazadera galvanizada 2" - 4"	Und.	36,00	$	34.708,00	$	1.249.488,00
4.3	Codo de 45/90 4" PVC SANITARIO	Und.	36,00	$	31.143,00	$	1.121.148,00
4.4	Suministro e Instalación de tubería PVC Aguas Lluvias Ø6"	m	71,60	$	55.876,00	$	4.000.722,00
4.5	Caja de inspección en concreto de 3000 PSI SECC(0,60*0,60*1,00 m) incluye tapa en concreto y refuerzo	Und.	4,00	$	541.269,00	$	2.165.076,00
4.6	Canal en lámina Galvanizada Cal.18 ancho=0.40 metros. H=0.25 metros (Sum. E Inst. Wash Primer + Esmalte + Anclaje estructura metalica)	m	60,00	$	93.428,00	$	5.605.680,00
4.7	Suministro e Instalación de tubería PVC Sanitaria Corrugada Ø8"	m	3,00	$	112.011,00	$	336.033,00
4.9	Excavacion manual Tipo zanja </= 0.9 mts -- e=0,50 m	M3	33,57	$	45.158,00	$	1.515.954,00
4.10	Rellenos en recebo seleccionado de la misma excavacion compactado mecanico	M3	27,46	$	24.363,00	$	669.105,00
5	**PISOS Y ACABADOS**					$	**3.602.243,00**
5.1	Placa de contrapiso en concreto de 3000 psi e= 0,10 cm con malla electrosoldada de 0,15 x 0,15 de 5.0 mm	m^2	43,40	$	83.001,00	$	3.602.243,00

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA"

6	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$**	**37.098.892,00**
6.1	Tuberia emt 3/4", incluye accesorios de fijación y ajustes para tubería.	m	76,12	$ 56.823,00	$	4.325.367,00
6.2	Cable eléctrico No 10 CU AWG Libre de halogeno. Incluye: 2 fases + 1 tierra	m	76,12	$ 22.503,00	$	1.712.928,00
6.3	Lámpara SYLVANIA-SYLVEO LED 2000 LM NAR 4K Incluye: Una Caja metalica galvanizada 4x4", un Tomacorriente 15v, 15A, con PT, una Clavija aerea 125V 15A con PT, conector terminal para tubo EMT 1/2" con contra tuerca, Elementos de fijación y ajuste, Marcación e identificación del circuito.	Und.	8,00	$ 447.300,00	$	3.578.400,00
6.4	Tablero eléctrico tipo exterior intemperie con Protección 2X40A y fotocontrol temporizado 220V, cumpliendo RETIE. Incluye elementos de fijación y ajuste.	Und.	1,00	$ 1.870.200,00	$	1.870.200,00
6.5	Protección Termomagnética bipolar 2X20A 10 kA Tipo riel.	Und.	2,00	$ 85.345,00	$	170.690,00
6.6	Alambrón de aluminio No 1/0. Incluye: Soporte plástico corto para alambrón y elementos de fijación y ajuste.	m	157,50	$ 57.892,00	$	9.117.990,00
6.7	Cable de cobre desnudo No 2/0	m	106,00	$ 64.422,00	$	6.828.732,00
6.8	Punta captadora aluminio 5/8" X 0,8m roscada Incluye: Base en aluminio, elementos de fijación y ajuste.	Und.	9,00	$ 393.125,00	$	3.538.125,00
6.9	Grapa paralela bimetalica para alambrón 1/0. Inlcuye caja raweld 2400 con su respectiva tapa ciega.	Und.	4,00	$ 171.550,00	$	686.200,00
6.10	Sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 5/8" X 2,4m. Incluye: Caja de inspección premoldeada 40X40X40cm, Soldadura exotermica 115g.	Und.	5,00	$ 851.700,00	$	4.258.500,00
6.11	Suminsitro e localización de medidor bifasico trifilar.	Und.	1,00	$ 1.011.760,00	$	1.011.760,00
	VALOR COSTO DIRECTO - CUBIERTA LA CARBONA				**$**	**361.284.819,00**

CUBIERTA No.4 - VERSALLES

ITEM	DESCRIPCIÓN	Und.	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 5.467.549,00**
1.1	Localización y replanteo	m^2	540,00	$ 3.494,00	$ 1.886.760,00
1.2	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	m^2	84,55	$ 28.622,00	$ 2.419.990,00
1.3	Desmonte marcos canchas existentes.	Und.	2,00	$ 116.592,00	$ 233.184,00
1.4	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.	Und.	3,00	$ 309.205,00	$ 927.615,00
2	**CIMIENTOS**				**$ 75.410.676,00**
2.1	Excavación manual para cimentaciónes </= 2 mts	m^3	46,89	$ 45.158,00	$ 2.117.459,00
2.2	Rellenos compactados en recebo seleccionado al 95% PROCTOR	m^3	21,12	$ 78.064,00	$ 1.648.712,00
2.4	Concreto de limpieza o solado E= 0,05 en concreto de 1.500 PSI	m^2	27,00	$ 34.791,00	$ 939.357,00
2.5	Zapatas en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo	m^3	14,85	$ 811.283,00	$ 12.047.553,00
2.6	Columnas en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo	m^3	5,88	$ 837.807,00	$ 4.926.305,00
2.7	Viga de cimentación en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo	m^3	6,00	$ 877.594,00	$ 5.265.564,00
2.8	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	Kg	5261,02	$ 8.491,00	$ 44.671.321,00
2.9	Retiros de material sobrante de excavaciones y escombros	m^3	54,56	$ 69.543,00	$ 3.794.405,00
3	**ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA**				**$ 248.237.082,00**
3.1	Suministro e localización Estructura metálica según diseño estructural, en tubería estructural para columnas, domos y viga de amarre según diseño.	Kg	5906,05	$ 27.647,00	$ 163.284.564,00
3.2	Correa en perfil metálico rectangular de 10x10 cm Cal.16. Incluye anticorrosivo y pintura esmalte.	m	570,00	$ 61.004,00	$ 34.772.280,00
3.3	Suministro e instalación cubierta en teja galvanizada Cal.28 Tipo STANDING SEAM ó similar, incluye tornillos de sujeción, color según diseño.	m^2	561,39	$ 72.030,00	$ 40.436.922,00
3.4	Platinas de apoyos columnas de 0.50x0.50(m) cajón principal de cubierta en platina 1/2" y 12 pernos grado 8 Ø3/4", incluye, empalme de pernos, empalme de columna a platina, soldadura y montaje.	Und.	12,00	$ 811.943,00	$ 9.743.316,00
4	**INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS**				**$ 20.622.491,00**
4.1	Suministro e instalaciòn Bajante PVC aguas lluvias de 4"	m	43,20	$ 51.785,00	$ 2.237.112,00
4.2	Abrazadera galvanizada 2" - 4"	Und.	36,00	$ 34.708,00	$ 1.249.488,00
4.3	Codo de 45/90 4" PVC SANITARIO	Und.	36,00	$ 31.143,00	$ 1.121.148,00
4.4	Suministro e Instalación de tubería PVC Aguas Lluvias Ø6"	m	77,00	$ 55.876,00	$ 4.302.452,00
4.5	Caja de inspección en concreto de 3000 PSI SECC(0,60*0,60*1,00 m) incluye tapa en concreto y refuerzo	Und.	4,00	$ 541.269,00	$ 2.165.076,00
4.6	Canal en lámina Galvanizada Cal.18 ancho=0.40 metros. H=0.25 metros (Sum. E Inst. Wash Primer + Esmalte + Anclaje estructura metalica)	m	60,00	$ 93.428,00	$ 5.605.680,00
4.7	Suministro e Instalación de tubería PVC Sanitaria Corrugada Ø8"	m	12,00	$ 112.011,00	$ 1.344.132,00
4.9	Excavacion manual Tipo zanja </= 0.9 mts -- e=0,50 m	M3	40,05	$ 45.158,00	$ 1.808.578,00
4.10	Rellenos en recebo seleccionado de la misma excavacion compactado mecanico	M3	32,38	$ 24.363,00	$ 788.825,00
5	**PISOS Y ACABADOS**				**$ 9.327.444,88**
5.1	Placa de contrapiso en concreto de 3000 psi e= 0,10 cm con malla electrosoldada de 0,15 x 0,15 de 5.0 mm	m^2	112,38	$ 83.001,00	$ 9.327.444,88

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA"

6	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$**	**37.664.930,00**
6.1	Tuberia emt 3/4", incluye accesorios de fijación y ajustes para tubería.	m	70,72	$ 56.823,00	$	4.018.523,00
6.2	Cable eléctrico No 10 CU AWG Libre de halogeno. Incluye: 2 fases + 1 tierra	m	70,72	$ 22.503,00	$	1.591.412,00
6.3	Lámpara SYLVANIA-SYLVEO LED 2000 LM NAR 4K Incluye: Una Caja metalica galvanizada 4x4", un Tomacorriente 15v, 15A, con PT, una Clavija aerea 125V 15A con PT, conector terminal para tubo EMT 1/2" con contra tuerca, Elementos de fijación y ajuste, Marcación e identificación del circuito.	Und.	8,00	$ 447.300,00	$	3.578.400,00
6.4	Tablero eléctrico tipo exterior intemperie con Protección 2X40A y fotocontrol temporizado 220V, cumpliendo RETIE. Incluye elementos de fijación y ajuste.	Und.	1,00	$ 1.870.200,00	$	1.870.200,00
6.5	Protección Termomagnética bipolar 2X20A 10 kA Tipo riel.	Und.	2,00	$ 85.345,00	$	170.690,00
6.6	Alambrón de aluminio No 1/0. Incluye: Soporte plástico corto para alambrón y elementos de fijación y ajuste.	m	168,00	$ 57.892,00	$	9.725.856,00
6.7	Cable de cobre desnudo No 2/0	m	112,00	$ 64.422,00	$	7.215.264,00
6.8	Punta captadora aluminio 5/8" X 0,8m roscada Incluye: Base en aluminio, elementos de fijación y ajuste.	Und.	9,00	$ 393.125,00	$	3.538.125,00
6.9	Grapa paralela bimetalica para alambrón 1/0. Inlcuye caja raweld 2400 con su respectiva tapa ciega.	Und.	4,00	$ 171.550,00	$	686.200,00
6.10	Sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 5/8" X 2,4m. Incluye: Caja de inspección premoldeada 40X40X40cm, Soldadura exotermica 115g.	Und.	5,00	$ 851.700,00	$	4.258.500,00
6.11	Suminsitro e localización de medidor bifasico trifilar.	Und.	1,00	$ 1.011.760,00	$	1.011.760,00
	VALOR COSTO DIRECTO - CUBIERTA VERSALLES				**$**	**396.730.173,00**

CUBIERTA No.5 - PLAYITAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	Und.	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 3.735.073,00**
1.1	Localización y replanteo	m^2	518,10	$ 3.494,00	$ 1.810.241,00
1.2	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	m^2	48,30	$ 28.622,00	$ 1.382.443,00
1.3	Desmonte marcos canchas existentes.	Und.	2,00	$ 116.592,00	$ 233.184,00
1.4	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.	Und.	1,00	$ 309.205,00	$ 309.205,00
2	**CIMIENTOS**				**$ 85.280.254,00**
2.1	Excavación manual para cimentaciónes </= 2 mts	m^3	53,87	$ 45.158,00	$ 2.432.661,00
2.2	Rellenos compactados en recebo seleccionado al 95% PROCTOR	m^3	41,97	$ 78.064,00	$ 3.275.956,00
2.4	Concreto de limpieza o solado E= 0,05 en concreto de 1.500 PSI	m^2	31,50	$ 34.791,00	$ 1.095.917,00
2.5	Zapatas en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo	m^3	17,33	$ 811.283,00	$ 14.059.534,00
2.6	Columnas en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo	m^3	6,86	$ 837.807,00	$ 5.747.356,00
2.7	Viga de cimentación en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo	m^3	6,19	$ 877.594,00	$ 5.432.307,00
2.8	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	Kg	5774,35	$ 8.491,00	$ 49.030.006,00
2.9	Retiros de material sobrante de excavaciones y escombros	m^3	60,49	$ 69.543,00	$ 4.206.517,00
3	**ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA**				**$ 261.148.858,00**
3.1	Suministro e localización Estructura metálica según diseño estructural, en tubería estructural para columnas, domos y viga de amarre según diseño.	Kg	6397,63	$ 27.647,00	$ 176.875.277,00
3.2	Correa en perfil metálico rectangular de 10x10 cm Cal.16. Incluye anticorrosivo y pintura esmalte.	m	561,00	$ 61.004,00	$ 34.223.244,00
3.3	Suministro e instalación cubierta en teja galvanizada Cal.28 Tipo STANDING SEAM ó similar, incluye tornillos de sujeción, color según diseño.	m^2	537,04	$ 72.030,00	$ 38.683.135,00
3.4	Platinas de apoyos columnas de 0.50x0.50(m) cajón principal de cubierta en platina 1/2" y 12 pernos grado 8 Ø3/4", incluye, empalme de pernos, empalme de columna a platina, soldadura y montaje.	Und.	14,00	$ 811.943,00	$ 11.367.202,00
4	**INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS**				**$ 21.076.874,00**
4.1	Suministro e instalaciòn Bajante PVC aguas lluvias de 4"	m	57,60	$ 51.785,00	$ 2.982.816,00
4.2	Abrazadera galvanizada 2" - 4"	Und.	34,59	$ 34.708,00	$ 1.200.703,00
4.3	Codo de 45/90 4" PVC SANITARIO	Und.	48,00	$ 31.143,00	$ 1.494.864,00
4.4	Suministro e Instalación de tubería PVC Aguas Lluvias Ø6"	m	78,00	$ 55.876,00	$ 4.358.328,00
4.5	Caja de inspección en concreto de 3000 PSI SECC(0,60*0,60*1,00 m) incluye tapa en concreto y refuerzo	Und.	4,00	$ 541.269,00	$ 2.165.076,00
4.6	Canal en lámina Galvanizada Cal.18 ancho=0.40 metros. H=0.25 metros (Sum. E Inst. Wash Primer + Esmalte + Anclaje estructura metalica)	m	66,00	$ 93.428,00	$ 6.166.248,00
4.7	Suministro e Instalación de tubería PVC Sanitaria Corrugada Ø8"	m	3,00	$ 112.011,00	$ 336.033,00
4.9	Excavacion manual Tipo zanja </= 0.9 mts -- e=0,50 m	M3	36,45	$ 45.158,00	$ 1.646.009,00
4.10	Rellenos en recebo seleccionado de la misma excavacion compactado mecanico	M3	29,83	$ 24.363,00	$ 726.797,00
5	**PISOS Y ACABADOS**				**$ 4.008.948,00**
5.1	Placa de contrapiso en concreto de 3000 psi e= 0,10 cm con malla electrosoldada de 0,15 x 0,15 de 5.0 mm	m^2	48,30	$ 83.001,00	$ 4.008.948,00

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA"

6	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$**	**38.023.484,00**
6.1	Tuberia emt 3/4", incluye accesorios de fijación y ajustes para tubería.	m	75,24	$ 56.823,00	$	4.275.363,00
6.2	Cable eléctrico No 10 CU AWG Libre de halogeno. Incluye: 2 fases + 1 tierra	m	75,24	$ 22.503,00	$	1.693.126,00
6.3	Lámpara SYLVANIA-SYLVEO LED 2000 LM NAR 4K Incluye: Una Caja metalica galvanizada 4x4", un Tomacorriente 15v, 15A, con PT, una Clavija aerea 125V 15A con PT, conector terminal para tubo EMT 1/2" con contra tuerca, Elementos de fijación y ajuste, Marcación e identificación del circuito.	Und.	8,00	$ 447.300,00	$	3.578.400,00
6.4	Tablero eléctrico tipo exterior intemperie con Protección 2X40A y fotocontrol temporizado 220V, cumpliendo RETIE. Incluye elementos de fijación y ajuste.	Und.	1,00	$ 1.870.200,00	$	1.870.200,00
6.5	Protección Termomagnética bipolar 2X20A 10 kA Tipo riel.	Und.	2,00	$ 85.345,00	$	170.690,00
6.6	Alambrón de aluminio No 1/0. Incluye: Soporte plástico corto para alambrón y elementos de fijación y ajuste.	m	168,00	$ 57.892,00	$	9.725.856,00
6.7	Cable de cobre desnudo No 2/0	m	112,00	$ 64.422,00	$	7.215.264,00
6.8	Punta captadora aluminio 5/8" X 0,8m roscada Incluye: Base en aluminio, elementos de fijación y ajuste.	Und.	9,00	$ 393.125,00	$	3.538.125,00
6.9	Grapa paralela bimetalica para alambrón 1/0. Inlcuye caja raweld 2400 con su respectiva tapa ciega.	Und.	4,00	$ 171.550,00	$	686.200,00
6.10	Sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 5/8" X 2,4m. Incluye: Caja de inspección premoldeada 40X40X40cm, Soldadura exotermica 115g.	Und.	5,00	$ 851.700,00	$	4.258.500,00
6.11	Suminsitro e localización de medidor bifasico trifilar.	Und.	1,00	$ 1.011.760,00	$	1.011.760,00
	VALOR COSTO DIRECTO - CUBIERTA PLAYITAS				**$**	**413.273.491,00**
CUBIERTA No.6 - RIECITO						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**Und.**	**CANTIDAD**	**VR/. UNITARIO**	**VR/. PARCIAL**	
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$**	**3.052.346,00**
1.1	Localización y replanteo	m^2	382,50	$ 3.494,00	$	1.336.455,00
1.2	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	m^2	41,00	$ 28.622,00	$	1.173.502,00
1.3	Desmonte marcos canchas existentes.	Und.	2,00	$ 116.592,00	$	233.184,00
1.4	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.	Und.	1,00	$ 309.205,00	$	309.205,00
2	**CIMIENTOS**				**$**	**72.237.376,00**
2.1	Excavación manual para cimentaciónes </= 2 mts	m^3	46,05	$ 45.158,00	$	2.079.526,00
2.2	Rellenos compactados en recebo seleccionado al 95% PROCTOR	m^3	21,12	$ 78.064,00	$	1.648.712,00
2.4	Concreto de limpieza o solado E= 0,05 en concreto de 1.500 PSI	m^2	27,00	$ 34.791,00	$	939.357,00
2.5	Zapatas en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo	m^3	14,85	$ 811.283,00	$	12.047.553,00
2.6	Columnas en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo	m^3	5,88	$ 837.807,00	$	4.926.305,00
2.7	Viga de cimentación en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo	m^3	5,16	$ 877.594,00	$	4.528.385,00
2.8	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	Kg	5000,58	$ 8.491,00	$	42.459.925,00
2.9	Retiros de material sobrante de excavaciones y escombros	m^3	51,88	$ 69.543,00	$	3.607.613,00
3	**ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA**				**$**	**222.110.224,00**
3.1	Suministro e localización Estructura metálica según diseño estructural, en tubería estructural para columnas, domos y viga de amarre según diseño.	Kg	5443,88	$ 27.647,00	$	150.506.950,00
3.2	Correa en perfil metálico rectangular de 10x10 cm Cal.16. Incluye anticorrosivo y pintura esmalte.	m	476,00	$ 61.004,00	$	29.037.904,00
3.3	Suministro e instalación cubierta en teja galvanizada Cal.28 Tipo STANDING SEAM ó similar, incluye tornillos de sujeción, color según diseño.	m^2	455,67	$ 72.030,00	$	32.822.054,00
3.4	Platinas de apoyos columnas de 0.50x0.50(m) cajón principal de cubierta en platina 1/2" y 12 pernos grado 8 Ø3/4", incluye, empalme de pernos, empalme de columna a platina, soldadura y montaje.	Und.	12,00	$ 811.943,00	$	9.743.316,00
4	**INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS**				**$**	**17.761.226,00**
4.1	Suministro e instalaciòn Bajante PVC aguas lluvias de 4"	m	43,20	$ 51.785,00	$	2.237.112,00
4.2	Abrazadera galvanizada 2" - 4"	Und.	36,00	$ 34.708,00	$	1.249.488,00
4.3	Codo de 45/90 4" PVC SANITARIO	Und.	36,00	$ 31.143,00	$	1.121.148,00
4.4	Suministro e Instalación de tubería PVC Aguas Lluvias Ø6"	m	68,10	$ 55.876,00	$	3.805.156,00
4.5	Caja de inspección en concreto de 3000 PSI SECC(0,60*0,60*1,00 m) incluye tapa en concreto y refuerzo	Und.	4,00	$ 541.269,00	$	2.165.076,00
4.6	Canal en lámina Galvanizada Cal.18 ancho=0.40 metros. H=0.25 metros (Sum. E Inst. Wash Primer + Esmalte + Anclaje estructura metalica)	m	51,00	$ 93.428,00	$	4.764.828,00
4.7	Suministro e Instalación de tubería PVC Sanitaria Corrugada Ø8"	m	3,00	$ 112.011,00	$	336.033,00
4.9	Excavacion manual Tipo zanja </= 0.9 mts -- e=0,50 m	M3	32,00	$ 45.158,00	$	1.444.830,00
4.10	Rellenos en recebo seleccionado de la misma excavacion compactado mecanico	M3	26,17	$ 24.363,00	$	637.555,00
5	**PISOS Y ACABADOS**				**$**	**3.403.041,00**
5.1	Placa de contrapiso en concreto de 3000 psi e= 0,10 cm con malla electrosoldada de 0,15 x 0,15 de 5.0 mm	m^2	41,00	$ 83.001,00	$	3.403.041,00

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA"

6	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$**	**36.450.595,00**
6.1	Tuberia emt 3/4", incluye accesorios de fijación y ajustes para tubería.	m	74,48	$ 56.823,00	$	4.232.177,00
6.2	Cable eléctrico No 10 CU AWG Libre de halogeno. Incluye: 2 fases + 1 tierra	m	74,48	$ 22.503,00	$	1.676.023,00
6.3	Lámpara SYLVANIA-SYLVEO LED 2000 LM NAR 4K Incluye: Una Caja metalica galvanizada 4x4", un Tomacorriente 15v, 15A, con PT, una Clavija aerea 125V 15A con PT, conector terminal para tubo EMT 1/2" con contra tuerca, Elementos de fijación y ajuste, Marcación e identificación del circuito.	Und.	8,00	$ 447.300,00	$	3.578.400,00
6.4	Tablero eléctrico tipo exterior intemperie con Protección 2X40A y fotocontrol temporizado 220V, cumpliendo RETIE. Incluye elementos de fijación y ajuste.	Und.	1,00	$ 1.870.200,00	$	1.870.200,00
6.5	Protección Termomagnética bipolar 2X20A 10 kA Tipo riel.	Und.	2,00	$ 85.345,00	$	170.690,00
6.6	Alambrón de aluminio No 1/0. Incluye: Soporte plástico corto para alambrón y elementos de fijación y ajuste.	m	153,00	$ 57.892,00	$	8.857.476,00
6.7	Cable de cobre desnudo No 2/0	m	102,00	$ 64.422,00	$	6.571.044,00
6.8	Punta captadora aluminio 5/8" X 0,8m roscada Incluye: Base en aluminio, elementos de fijación y ajuste.	Und.	9,00	$ 393.125,00	$	3.538.125,00
6.9	Grapa paralela bimetalica para alambrón 1/0. Inlcuye caja raweld 2400 con su respectiva tapa ciega.	Und.	4,00	$ 171.550,00	$	686.200,00
6.10	Sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 5/8" X 2,4m. Incluye: Caja de inspección premoldeada 40X40X40cm, Soldadura exotermica 115g.	Und.	5,00	$ 851.700,00	$	4.258.500,00
6.11	Suminsitro e localización de medidor bifasico trifilar.	Und.	1,00	$ 1.011.760,00	$	1.011.760,00
	VALOR COSTO DIRECTO - CUBIERTA RIECITO				**$**	**355.014.808,00**

	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS (PLAYITAS, CRISTO REY, CARBONA, VERSALLES, PLAYITAS, RIECITO)			**$ 2.308.085.061,00**
	Administración	**24%**	$ 553.940.415,00	
	Imprevistos	**1%**	$ 23.080.851,00	
	Utilidad	**5%**	$ 115.404.253,00	
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS			**$ 692.425.519,00**
	VALOR TOTAL DE OBRA CIVIL			**$ 3.000.510.580,00**

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal
PACOT INTEGRALES S.A.S.
NIT: 900.693.242-3
Proponente

ANEXO No. 9

PROCESO No. OB-006-2026

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA"

DISCRIMINACION DE A.I.U.

COSTOS DIRECTOS	$2.308.085.061,00		DURACION DE LA OBRA		DOCE (12) MESES	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**VALOR UNIT**	**CANTIDAD**	**DEDICACIÓN 1**	**VR / TOTAL**
	ADMINISTRACION					
1	PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO					
1,01	Directo de Obra Ingeniero Civil	MES	$ 4.000.000,00	12,00	50,00%	$ 24.000.000,00
1,02	Residente de obra Ingeniero Civil	MES	$ 3.000.000,00	12,00	100,00%	$ 36.000.000,00
1,03	Personal de Seguridad (Celaduria)	MES	$ 2.200.000,00	12,00	100,00%	$ 26.400.000,00
1,04	Profesional en seguridad y salud en el trabajo	MES	$ 2.600.000,00	12,00	100,00%	$ 31.200.000,00
	Subtotal					$ 117.600.000,00
	PRESTACIONES					1,84
	SUBTOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO				**9,38%**	$216.384.000,00
2	**PERSONAL ADMINISTRATIVO (CON VINCULACIÓN) MENOR 2 SMMLV**					
2,01	Secretaria - Aux administrativo	MES	$ 2.100.000,00	12	100%	$ 25.200.000,00
	Subtotal					$ 25.200.000,00
	PRESTACIONES					1,84
	SUBTOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO				**2,01%**	$46.368.000,00
4	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**					
4,01	Papelería, Impresiones y otros	MES	$ 2.795.569,84	12,00	N/A	$ 33.546.838,06
4,02	Gastos oficina central (arriendo oficina y Servicios publicos)	MES	$ 7.000.000,00	12,00	N/A	$ 84.000.000,00
4,03	Campamento/oficinas/almacén/patios/servicios sanitarios/bodegas (22 m²)	MES	$ 4.000.000,00	12,00	N/A	$ 48.000.000,00
4,04	Ensayos de laboratorio para materiales, pruebas de carga y otros que sean requeridos (RETIE)	MES	$ 2.000.000,00	12,00	N/A	$ 24.000.000,00
4,05	Valla publicitaria	UND	$ 3.080.000,00	2,00		$ 6.160.000,00
	SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS				**8,48%**	$ 195.706.838,06
5	**IMPUESTOS**					
5,01	Polizas	% VLR CONT	0,50%	$2.387.039.432,00		$11.935.197,16
5,02	Otros impuestos (RETEFUENTE, ICA Y 4X1000)	% VLR CONT	3,50%	$2.387.039.432,00		$83.546.380,12
	SUBTOTAL GASTOS IMPUESTOS Y POLIZAS				**4,14%**	$95.481.577,28

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION		24%	$553.940.415,34
IMPREVISTOS		1%	$23.080.850,61
UTILIDAD		5%	$115.404.253,05
TOTAL A.I.U		30%	**$692.425.519,00**

Diego Mauricio Calderon Obando

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal
PACOT INTEGRALES S.A.S.
NIT: 900.693.242-3
Proponente

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA"

CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR

1	**HONORARIOS MENSUAL BASICO**	**100,00%**
2	**PRESTACIONES SOCIALES**	
2.1	Prima de servicio	8,33%
2.2	Cesantías	8,33%
2.3	Intereses de cesantías	1,00%
2.4	Salud	8,50%
2.5	Pensión	12,00%
2.6	Subsidio Familiar	4,00%
2.7	Vacaciones	4,17%
2.8	Dotación	4,00%
2.9	ARL	6,96%
2.10	ICBF	3,00%
2.11	SENA	2,00%
2,12	Caja de compensacíon	4,00%
2,13	Auxilio de Transporte	15,00%
2,14	otros	2,70%
	SUBTOTAL 2 - PRESTACIONES SOCIALES	**84,00%**
3	**FACTOR MULTIPLICADOR** = (1 + 2) / 100	**1,84**

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal
PACOT INTEGRALES S.A.S.
NIT: 900.693.242-3
Proponente

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN CUBIERTAS	1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

1.1	Localización y replanteo	UNIDAD:	M2

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Rendimiento	Tarifa/Hora	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR.	%M.O.	10%	$ 632	$ 63	
				SUB-TOTAL	$ 63

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
PUNTILLA 1 1/2" a 3"	LB	0,10	$ 6.900,00	$ 690	
POLIN DE MADERA (5x5) VERDE PARA CONSTRUCCION	m	0,50	$ 3.000,00	$ 1.500	
CERCO DE MADERA 5X10	m	0,10	$ 5.000,00	$ 500	
PIOLA GRUESA ROLLO 50 ML	UND	0,03	$ 3.650,00	$ 110	
				SUB-TOTAL	$ 2.800

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				SUB-TOTAL	

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL (INCL. PRESTACIONE	$ 16.140,18	1,00	60,00	$ 269	
AYUDANTE (INCL. PRESTACIONES)	$ 10.876,13	2,00	60,00	$ 363	
				SUB-TOTAL	$ 632

TOTAL UNITARIO	**$ 3.494**

1.2	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	UNIDAD:	M2

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Rendimiento	Tarifa/Hora	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR.	%M.O.	0,10	$ 16.475	$ 1.647	
PULIDORA MANUAL	DIA	0,10	$ 35.000	$ 3.500	
COMPRESOR PISTOLA	DIA	0,10	$ 70.000,00	$ 7.000	
				SUB-TOTAL	$ 12.147

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
				SUB-TOTAL	$ -

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				SUB-TOTAL	

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL (INCL. PRESTACIONE	$ 16.140,18	1,00	2,30	$ 7.017	
AYUDANTE (INCL. PRESTACIONES)	$ 10.876,13	2,00	2,30	$ 9.458	
				SUB-TOTAL	$ 16.475

TOTAL UNITARIO	**$ 28.622**

1.3	Desmonte marcos canchas existentes.	UNIDAD:	Und.

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Rendimiento	Tarifa/Hora	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR.	%M.O.	1,00	$ 58.296	$ 58.296	
				SUB-TOTAL	$ 58.296

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
				SUB-TOTAL	$ -

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				SUB-TOTAL	

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL (INCL. PRESTACIONE	$ 16.140,18	1,00	0,65	$ 24.831	
AYUDANTE (INCL. PRESTACIONES)	$ 10.876,13	2,00	0,65	$ 33.465	
				SUB-TOTAL	$ 58.296

TOTAL UNITARIO	$ 116.592

1.4	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.	UNIDAD:	Und.

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Rendimiento	Tarifa/Hora	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR.	%M.O.	1,00	$ 42.103	$ 42.103	
Grua	Dia	0,25	$ 900.000	$ 225.000	
				SUB-TOTAL	$ 267.103

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
				SUB-TOTAL	$ -

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				SUB-TOTAL	

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL (INCL. PRESTACIONE	$ 16.140,18	1,00	0,90	$ 17.934	
AYUDANTE (INCL. PRESTACIONES)	$ 10.876,13	2,00	0,90	$ 24.169	
				SUB-TOTAL	$ 42.103

TOTAL UNITARIO	$ 309.205

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN CUBIERTAS	2 CIMIENTOS

2.1	Excavación manual para cimentaciónes </= 2 mts	UNIDAD:	M3

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Rendimiento	Tarifa/Hora	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR.	%M.O.	0,04	$ 43.505	$ 1.654	
				SUB-TOTAL	$ 1.654

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				SUB-TOTAL	

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				SUB-TOTAL	

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (INCL. PRESTACI	$ 10.876,13	1,00	0,25	$ 43.505	
				SUB-TOTAL	$ 43.505

TOTAL UNITARIO	$ 45.158

2.2	Rellenos compactados en recebo seleccionado al 95% PROCTOR	UNIDAD:	M3

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Rendimiento	Tarifa/Hora	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR.	%M.O.	0,04	$ 6.852	$ 260	
APISONADOR TIPO CANGURO, INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	0,08	$ 70.000	$ 5.600	
				SUB-TOTAL	$ 5.860

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
RECEBO TAMIZADO A 2" (AFIRMADO) ZONA NORTE	m^3	1,05	54.740,00	$ 57.477	
				SUB-TOTAL	$ 57.477

III. TRANSPORTES

Descripción	m3-km	Tarifa	Distancia (km)	Valor-Unit.	
RECEBO TAMIZADO A 2" (AFIRMADO) ZONA NORTE	$ 1,05	$ 1.500	5,00	$ 7.875	
				SUB-TOTAL	$ 7.875

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (INCL. PRESTACIONES)	$ 10.876,13	1,00	0,63	$ 6.852	
				SUB-TOTAL	$ 6.852

TOTAL UNITARIO	**$ 78.064**

2.3	Concreto ciclopeo impermeabilizado 3000 PSI, para bases de estructura (60%concreto-40% piedra)	UNIDAD:	M3

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Rendimiento	Tarifa/Hora	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR.	%M.O.	0,05	$ 126.308	$ 6.315	
				SUB-TOTAL	$ 6.315

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
CONCRETO NORMAL - 3000 PSI (210 KG/CM2)	m^3	0,62	$ 646.342,00	$ 400.732	
PIEDRA ZONGA Y/O MEDIA ZONGA(6"-10")	m^3	0,42	$ 135.000,00	$ 56.700	
IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO PLASTOCRETE O SIMILAR	kg	1,10	$ 32.000,00	$ 35.200	
AGUA	LT	4,00	$ 20,00	$ 80	
				SUB-TOTAL	$ 492.712

III. TRANSPORTES

Descripción	m3-km	Tarifa	Distancia (km)	Valor-Unit.	
PIEDRA ZONGA Y/O MEDIA ZONGA(6"-10")	0,42	$ 1.500	54,88	$ 34.574	
				SUB-TOTAL	$ 34.574

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL (INCL. PRESTACIONE	$ 16.140,18	1,00	0,30	$ 53.801	
AYUDANTE (INCL. PRESTACIONES)	$ 10.876,13	2,00	0,30	$ 72.508	
				SUB-TOTAL	$ 126.308

TOTAL UNITARIO	**$**	**659.910**

2.4	Concreto de limpieza o solado E= 0,05 en concreto de 1.500 PSI	UNIDAD:	M3

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Rendimiento	Tarifa/Hora	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR.	%M.O.	0,02	$ 12.192	$ 244	
				SUB-TOTAL	$ 244

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
CEMENTO GRIS	Kg	10,30	$ 700,00	$ 7.210	
ARENA	m^3	0,04	$ 73.150,00	$ 2.926	
GRAVILLA DE PLANTA	m^3	0,06	$ 118.000,00	$ 7.080	
AGUA	LT	1,50	$ 133,00	$ 200	
				SUB-TOTAL	$ 17.416

III. TRANSPORTES

Descripción	m3-km	Tarifa	Distancia (km)	Valor-Unit.	
ARENA	0,06	$ 1.500	54,88	$ 4.939	
				SUB-TOTAL	$ 4.939

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL (INCL. PRESTACIONE	$ 16.140,18	1,00	4,00	$ 4.035	
AYUDANTE (INCL. PRESTACIONES)	$ 10.876,13	3,00	4,00	$ 8.157	
				SUB-TOTAL	$ 12.192

TOTAL UNITARIO	**$ 34.791**

2.5	Zapatas en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo	UNIDAD:	M3

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Rendimiento	Tarifa/Hora	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR.	%M.O.	0,05	$ 126.308	$ 6.315	
				SUB-TOTAL	$ 6.315

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
CONCRETO NORMAL - 3000 PSI (210 KG/CM2)	m^3	1,05	$ 646.342,00	$ 678.659	
				SUB-TOTAL	$ 678.659

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Rendimiento	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
				SUB-TOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL (INCL. PRESTACIONE	$ 16.140,18	1,00	0,30	$ 53.801	
AYUDANTE (INCL. PRESTACIONES)	$ 10.876,13	2,00	0,30	$ 72.508	
				SUB-TOTAL	$ 126.308

TOTAL UNITARIO	$ 811.283

2.6	Columnas en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo

UNIDAD:	M3

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Rendimiento	Tarifa/Hora	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR.	%M.O.	0,05	$ 151.570	$ 7.578	
				SUB-TOTAL	$ 7.578

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
CONCRETO NORMAL - 3000 PSI (210 KG/CM2)	m^3	1,05	$ 646.342,00	$ 678.659	
				SUB-TOTAL	$ 678.659

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Rendimiento	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
				SUB-TOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL (INCL. PRESTACIONE	$ 16.140,18	1,00	0,25	$ 64.561	
AYUDANTE (INCL. PRESTACIONES)	$ 10.876,13	2,00	0,25	$ 87.009	
				SUB-TOTAL	$ 151.570

TOTAL UNITARIO	$ 837.807

2.7	Viga de cimentación en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo	UNIDAD:	M3

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Rendimiento	Tarifa/Hora	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR.	%M.O.	0,05	$ 189.462	$ 9.473	
				SUB-TOTAL	$ 9.473

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
CONCRETO NORMAL - 3000 PSI (210 KG/CM2)	m^3	1,05	$ 646.342,00	$ 678.659	
				SUB-TOTAL	$ 678.659

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Rendimiento	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
				SUB-TOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL (INCL. PRESTACIONE	$ 16.140,18	1,00	0,20	$ 80.701	
AYUDANTE (INCL. PRESTACIONES)	$ 10.876,13	2,00	0,20	$ 108.761	
				SUB-TOTAL	$ 189.462

TOTAL UNITARIO	$ 877.594

2.8	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	UNIDAD:	Kg

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Rendimiento	Tarifa/Hora	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR.	%M.O.	0,12	$ 2.719	$ 326	
				SUB-TOTAL	$ 326

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
ALAMBRE NEGRO No. 18	KG	0,10	$ 7.200,00	$ 742	
ACERO Fy= 60000 Kg/cm2	KG	1,03	$ 4.400,00	$ 4.532	
				SUB-TOTAL	$ 5.274

III. TRANSPORTES

Descripción	Ton-km	Tarifa	Distancia (km)	Valor-Unit.	
ACERO Fy= 60000 Kg/cm2	0,0010	$ 850	196,38	$ 172	
				SUB-TOTAL	$ 172

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (INCL. PRESTACI	$ 10.876,13	1,00	4,00	$ 2.719	
				SUB-TOTAL	$ 2.719

TOTAL UNITARIO	$ 8.491

2.9	Retiros de material sobrante de excavaciones y escombros	UNIDAD:	m3

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Rendimiento	Tarifa/Hora	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR.	%M.O.	0,10	$ 12.085	$ 1.208	
				SUB-TOTAL	$ 1.208

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
				SUB-TOTAL	$ -

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Rendimiento	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
VOLQUETA	m^3	1,25	$ 40.000	$ 50.000	
DERECHOS DE BOTE	m^3	1,25	$ 5.000	$ 6.250	
				SUB-TOTAL	$ 56.250

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (INCL. PRESTACIO	$ 10.876,13	1,00	0,90	$ 12.085	
				SUB-TOTAL	$ 12.085

TOTAL UNITARIO	**$**	**69.543**

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN CUBIERTAS	3 ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA

3.1	Suministro e localización Estructura metálica según diseño estructural, en tubería estructural para columnas, domos y viga de amarre según diseño.	UNIDAD:	Kg

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Rendimiento	Tarifa/Hora	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR.	%M.O.	0,30	$ 8.867	$ 2.660	
ANDAMIO TUBULAR. 1.5 x 1.5 SECCIÓN	Día	0,10	$ 5.500	$ 550	
EQUIPO ELÉCTRICO SOLDADURA	Día	0,01	$ 90.000	$ 900	
COMPRESOR PISTOLA	Día	0,01	$ 70.000	$ 700	
				SUB-TOTAL	$ 4.810

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
ACERO ESTRUCTURAL	KG	1,03	10.000,00	$ 10.300	
SOLDADURA 6013 x 1/8"	Kg	0,03	22.500,00	$ 675	
ANTICORROSIVO	Gal	0,02	74.900,00	$ 1.498	
				SUB-TOTAL	$ 12.473

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Rendimiento	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
MATERIAL	M.E %	12%	$ 12.473	$ 1.497	
				SUB-TOTAL	$ 1.497

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL (INCL. PRESTACIONE	$ 16.140,18	1,00	5,50	$ 2.935	
AYUDANTE (INCL.	$ 10.876,13	3,00	5,50	$ 5.932	
				SUB-TOTAL	$ 8.867

TOTAL UNITARIO	$ 27.647

3.2	Correa en perfil metálico rectangular de 10x10 cm Cal.16. Incluye anticorrosivo y pintura esmalte.	UNIDAD:	m

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Rendimiento	Tarifa/Hora	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR.	%M.O.	0,30	$ 12.999	$ 3.900	
ANDAMIO TUBULAR. 1.5 x 1.5 SECCIÓN	Día	0,03	$ 5.500	$ 165	
EQUIPO ELÉCTRICO SOLDADURA	Día	0,02	$ 90.000	$ 1.800	
COMPRESOR PISTOLA	Día	0,05	$ 70.000	$ 3.500	
				SUB-TOTAL	$ 9.365

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
PERFIL METÁLICO CAL.16 - 10X10	m	1,03	30.000,00	$ 30.900	
PLATINA 1/8 X 1 1/2"	m	0,10	6.785,00	$ 679	
SOLDADURA 1/8"	Kg	0,03	22.500,00	$ 675	
ANTICORROSIVO	Gal	0,03	74.900,00	$ 2.247	
				SUB-TOTAL	$ 34.501

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Rendimiento	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
MATERIAL	M.E %	12%	$ 34.501	$ 4.140	
				SUB-TOTAL	$ 4.140

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL (INCL. PRESTACIONE	$ 16.248,45	1,00	1,25	$ 12.999	
				SUB-TOTAL	$ 12.999

TOTAL UNITARIO	**$**	**61.004**

3.3	Cubierta en teja arquitectonica acesco o similar cal. 28	UNIDAD:	Und.

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Rendimiento	Tarifa/Hora	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR.	%M.O.	0,10	$ 24.384	$ 2.438	
ANDAMIO TUBULAR. 1.5 x 1.5	Día	0,05	$ 5.500	$ 275	
				SUB-TOTAL	$ 2.713

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
TEJA ARQUITECTÓNICA C. 28 o similar	m^2	1,03	38.600	$ 39.758	
TORNILLO AUTOPERFORANTE 3"	Un	0,60	600	$ 360	
				SUB-TOTAL	$ 40.118

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Rendimiento	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
MATERIAL	M.E %	12%	$ 40.118	$ 4.814	
				SUB-TOTAL	$ 4.814

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL (INCL. PRESTACIONE	$ 16.140,18	1,00	2,00	$ 8.070	
AYUDANTE (INCL.	$ 10.876,13	3,00	2,00	$ 16.314	
				SUB-TOTAL	$ 24.384

TOTAL UNITARIO	**$ 72.030**

3.4	Platinas de apoyos columnas de 0.50x0.50(m) cajón principal de cubierta en platina 1/2" y 12 pernos grado 8 Ø3/4", incluye, empalme de pernos, empalme de columna a platina, soldadura y montaje.	UNIDAD:	Und.

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Rendimiento	Tarifa/Hora	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR.	%M.O.	0,10	$ 161.402	$ 16.140	
EQUIPO ELÉCTRICO SOLDADURA	Día	0,08	$ 90.000	$ 7.200	
				SUB-TOTAL	$ 23.340

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
PERNO Grado 8, Ø1/2" L=0.30 m Ø1/2" CON TUERCA Y ARANDELA	m	12,00	24.500,00	$ 294.000	
SOLDADURA 1/8"	Kg	0,60	22.500,00	$ 13.500	
PLATINA METALICA 3/16" SECC. 0.70x0.70m Ext. y 0.44 x 0.44	Un	1,00	250.000,00	$ 250.000	
				SUB-TOTAL	$ 557.500

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Rendimiento	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
MATERIAL	M.E %	12%	$ 557.500	$ 66.900	
EQUIPO	M.E %	12%	$ 23.340	$ 2.801	
				SUB-TOTAL	$ 69.701

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL (INCL. PRESTACIONE	$ 16.140,18	1,00	0,10	$ 161.402	
				SUB-TOTAL	$ 161.402

TOTAL UNITARIO	**$ 811.943**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

4.1	Suministro e instalaciòn Bajante PVC aguas lluvias de 4".	UNIDAD:	m

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Rendimiento	Tarifa/Hora	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR.	%M.O.	0,05	$ 4.503	$ 225	
ANDAMIO TUBULAR. 1.5 x 1.5 SECCIÓN	Día	0,05	$ 5.500	$ 275	
				SUB-TOTAL	$ 500

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
TUBO PVC Ø 4" SANITARIO	m	1,03	$ 16.525,00	$ 17.021	
SOLDADURA LIQUIDA PVC. (1/4 Gal)	Un	0,02	$ 126.348,00	$ 1.895	
YEE SANITARIA REDUCIDA 6x4	Und	0,17	$ 138.900,00	$ 23.613	
				SUB-TOTAL	$ 42.529

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Rendimiento	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
TRANSPORTE MATERIAL	M.E %	10%	$ 42.529	$ 4.253	
				SUB-TOTAL	$ 4.253

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL (INCL. PRESTACIONES)	$ 16.140,18	1,00	6,00	$ 2.690	
AYUDANTE (INCL. PRESTACIONES)	$ 10.876,13	1,00	6,00	$ 1.813	
				SUB-TOTAL	$ 4.503

	TOTAL UNITARIO	**$ 51.785**

4,2	Abrazadera galvanizada 2" - 4"	UNIDAD:	Und.

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Rendimiento	Tarifa/Hora	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR.	%M.O.	0,05	$ 1.793	$ 90	
				SUB-TOTAL	$ 90

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA CON PLATINA DE 4"	Un	1,00	$ 25.000,00	$ 25.000	
ACCESORIOS DE ANCLAJE	Un	1,00	$ 7.500,00	$ 7.500	
				SUB-TOTAL	$ 32.500

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Rendimiento	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
TRANSPORTE MATERIAL	M.E %	1%	$ 32.500	$ 325	
				SUB-TOTAL	$ 325

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL (INCL. PRESTACIONES)	$ 16.140,18	1,00	9,00	$ 1.793	
				SUB-TOTAL	$ 1.793

TOTAL UNITARIO	**$ 34.708**

4,3	Codo de 45/90 4" PVC SANITARIO	UNIDAD:	Und.

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Rendimiento	Tarifa/Hora	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR.	%M.O.	0,05	$ 3.859	$ 193	
				SUB-TOTAL	$ 193

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
SOLDADURA LIQUIDA PVC. (1/4 Gal)	Un	0,02	$ 126.348,00	$ 2.527	
Codos 45° Ø4" - 1/8 C x C	Un	1,00	$ 22.101,00	$ 22.101	
				SUB-TOTAL	$ 24.628

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Rendimiento	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
TRANSPORTE MATERIAL	M.E %	10%	$ 24.628	$ 2.463	
				SUB-TOTAL	$ 2.463

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL (INCL. PRESTACIONES)	$ 16.140,18	1,00	7,00	$ 2.306	
AYUDANTE (INCL.	$ 10.876,13	1,00	7,00	$ 1.554	
				SUB-TOTAL	$ 3.859

TOTAL UNITARIO	**$ 31.143**

4.4	Suministro e Instalación de tubería PVC Aguas Lluvias Ø6"	UNIDAD:	m

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Rendimiento	Tarifa/Hora	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR.	%M.O.	0,05	$ 12.280	$ 614	
				SUB-TOTAL	$ 614

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
TUBO PVC Ø 6" SANITARIO	m	1,03	$ 35.483,33	$ 36.548	
SOLDADURA LIQUIDA PVC. (1/4 Gal)	Un	0,02	$ 126.348,00	$ 2.527	
				SUB-TOTAL	$ 39.075

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Rendimiento	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
TRANSPORTE MATERIAL	M.E %	10%	$ 39.075	$ 3.907	
				SUB-TOTAL	$ 3.907

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL (INCL. PRESTACIONES)	$ 16.140,18	1,00	2,20	$ 7.336	
AYUDANTE (INCL. PRESTACIONES)	$ 10.876,13	1,00	2,20	$ 4.944	
				SUB-TOTAL	$ 12.280

TOTAL UNITARIO	**$ 55.876**

4.5	Caja de inspección en concreto de 3000 PSI SECC(0,60*0,60*1,00 m) incluye tapa en concreto y refuerzo	UNIDAD:	Und.

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Rendimiento	Tarifa/Hora	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR.	%M.O.	0,05	$ 151.570	$ 7.578	
FORMALETA	Día	0,20	$ 70.000	$ 14.000	
				SUB-TOTAL	$ 21.578

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
CONCRETO NORMAL - 3000 PSI (210 KG/CM2)	m^3	0,49	$ 646.342,00	$ 315.415	
ACERO Fy= 4200 Kg/cm2	Kg	8,20	$ 4.400,00	$ 36.080	
ALAMBRE NEGRO No. 18	Kg	0,82	$ 7.200,00	$ 5.904	
				SUB-TOTAL	$ 357.399

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Rendimiento	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
TRANSPORTE DE MATERIAL CANTERA	M.E %	3%	$ 357.399	$ 10.722	
				SUB-TOTAL	$ 10.722

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL (INCL. PRESTACIONES)	$ 16.140,18	1,00	0,25	$ 64.561	
AYUDANTE (INCL. PRESTACIONES)	$ 10.876,13	2,00	0,25	$ 87.009	
				SUB-TOTAL	$ 151.570

	TOTAL UNITARIO	**$ 541.269**

4.6	Canal en lámina Galvanizada Cal.18 ancho=0.38 metros. H=0.20 metros (Sum. E Inst. Wash Primer + Esmalte + Anclaje estructura metalica)	UNIDAD:	M

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Rendimiento	Tarifa/Hora	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR.	%M.O.	0,05	$ 5.403	$ 270	
COMPRESOR PISTOLA	Día	0,05	$ 70.000	$ 3.500	
ANDAMIO TUBULAR. 1.5 x 1.5 SECCIÓN	Día	0,30	$ 5.500	$ 1.650	
				SUB-TOTAL	$ 5.420

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
LÁMINA GALVANIZADA C.18 DOBLADA P= 1 m. SECC 1.20 m	m	1,05	$ 30.277	$ 31.791	
SOPORTES EN ANGULO 1"x1/8"	m	4,50	$ 6.500	$ 29.250	
WASH PRIMER	Gal	0,085	$ 168.000	$ 14.280	
ANTICORROSIVO	Gal	0,05	$ 67.000	$ 3.350	
				SUB-TOTAL	$ 78.671

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Rendimiento	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
MATERIAL	M.E %	5%	$ 78.671	$ 3.934	
				SUB-TOTAL	$ 3.934

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL (INCL. PRESTACIONES)	$ 16.140,18	1,00	0,20	$ 3.228	
AYUDANTE (INCL. PRESTACIONES)	$ 10.876,13	1,00	0,20	$ 2.175	
				SUB-TOTAL	$ 5.403

TOTAL UNITARIO	**$ 93.428**

4.7	Suministro e instalaciòn tuberia pvc aguas lluvias de 8" CORRUGADA	UNIDAD:	m

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Rendimiento	Tarifa/Hora	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR.	%M.O.	0,10	$ 37.892	$ 3.789	
				SUB-TOTAL	$ 3.789

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
TUBO PVC Ø 8" SANITARIO CORRUGADA	m	1,05	$ 50.816,67	$ 53.358	
SELLO ELASTOMERICO	und	0,50	$ 10.500,00	$ 5.250	
				SUB-TOTAL	$ 58.608

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Rendimiento	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
TRANSPORTE MATERIAL	M.E %	20%	$ 58.608	$ 11.722	
				SUB-TOTAL	$ 11.722

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL (INCL. PRESTACIONES)	$ 16.140,18	1,00	1,00	$ 16.140	
AYUDANTE (INCL. PRESTACIONES)	$ 10.876,13	2,00	1,00	$ 21.752	
				SUB-TOTAL	$ 37.892

TOTAL UNITARIO	**$ 112.011**

4.9	Excavacion manual Tipo zanja </= 0.9 mts -- e=0,50 m	UNIDAD:	M3

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Rendimiento	Tarifa/Hora	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR.	%M.O.	0,04	$ 43.505	$ 1.654	
				SUB-TOTAL	$ 1.654

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				SUB-TOTAL	

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				SUB-TOTAL	

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (INCL. PRESTACIONES	$ 10.876,13	1,00	0,25	$ 43.505	
				SUB-TOTAL	$ 43.505

TOTAL UNITARIO	$ 45.158

4.10	Rellenos en recebo seleccionado de la misma excavacion compactado mecanico

UNIDAD:	m

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Rendimiento	Tarifa/Hora	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR.	%M.O.	0,04	$ 5.724	$ 218	
APISONADOR TIPO CANGURO, INCLUYE COMBUSTIBLE	HORA	3,80	$ 70.000	$ 18.421	
				SUB-TOTAL	$ 18.639

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
				SUB-TOTAL	$ -

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Rendimiento	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
				SUB-TOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (INCL. PRESTACIONES)	$ 10.876,13	2,00	3,80	$ 5.724	
				SUB-TOTAL	$ 5.724

TOTAL UNITARIO	**$ 24.363**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - CUBIERTA PARA ESCENARIO DEPORTIVO, MPIO DE ACEVEDO.

INSTALACION ELECTRICA

ACTIVIDAD Tuberia emt 3/4", incluye accesorios de fijación y ajustes para tubería.

ITEM	6.1

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	REF.	P. UNIT.	CANTIDAD	V. TOTAL
Tubo EMT 3/4" x 3m	Ml	14.575,00	1,04	15.158,00
Grapa metalica doble ala 3/4"	Und.	500,00	1,00	500,00
Chazo puntilla plastico con tornillo 1/4" x 1"	Und.	250,00	2,00	500,00
Cinta reflectiva color naranja x pliego	Und.	10.000,00	0,04	400,00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		Subtotal MATERIALES		**16.558,00**

EQUIPO Y HERRAMIENTA

DESCRIPCION	Und.	TARIFA	RENDIMIEN.	VALOR UNIT.
Herramienta menor eléctrica	Día	21.150,00	0,10	2.115,00
Arnes certificado	Día	120.000,00	0,10	12.000,00
Andamios certificados	Día	50.000,00	0,10	5.000,00
		Subtotal EQUIPO Y HERR.		**19.115,00**

TRANSPORTE

DESCRIPCION	Und.	TARIFA	RENDIMIEN.	VALOR UNIT.
6% material	Und.	6%	1,00	993,48
				-
		Subtotal EQUIPO Y HERR.		**993,48**

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UND.	JORNAL H	PREST.	JORN. H con P.	RENDIM. H	VALOR UNIT.
Ingeniero electricista	Hora	$ 25.000,00	$ 12.500,00	37.500,00	0,06	2.250,00
Coordinador HSE	Hora	$ 16.000,00	$ 8.000,00	24.000,00	0,30	7.200,00
Técnico oficial	Hora	$ 16.000,00	$ 8.000,00	24.000,00	0,30	7.200,00
Ayudante	Hora	$ 10.000,00	$ 5.000,00	15.000,00	0,30	4.500,00
			Subtotal MANO DE OBRA			**21.150,00**

PRECIO UNITARIO TOTAL **56.823**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - CUBIERTA PARA ESCENARIO DEPORTIVO, MPIO DE ACEVEDO.

INSTALACION ELECTRICA

ACTIVIDAD Cable eléctrico No 10 CU AWG Libre de halogeno. Incluye: 2 fases + 1 tierra

ITEM	6,20

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	Ref.	P. UNIT.	CANTIDAD	V. TOTAL
Cable L. Halogeno No 10 Color Amarillo	ml	4.078,00	1,03	4.200,34
Cable L. Halogeno No 10 Color Azul	ml	4.078,00	1,03	4.200,34
Cable L Halogeno No 12 Color verde	ml	2.565,00	1,03	2.641,95
Vaselina Industrial X 250g	gr	10.500,00	0,01	105,00
Cinta aislante Negra 3M	Und.	8.000,00	0,03	200,00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		Subtotal MATERIALES		**11.347,63**

EQUIPO Y HERRAMIENTA

DESCRIPCION	Und.	TARIFA	RENDIMIEN.	VALOR UNIT.
Herramienta menor eléctrica	Día	7.050,00	0,10	705,00
Arnes certificado	Día	120.000,00	0,02	2.400,00
Andamios certificados	Día	50.000,00	0,02	1.000,00
		Subtotal EQUIPO Y HERR.		**4.105,00**

TRANSPORTE

DESCRIPCION	Und.	TARIFA	RENDIMIEN.	VALOR UNIT.
6% material	Und.	6%	1,00	680,86
				-
		Subtotal EQUIPO Y HERR.		**680,86**

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UND.	JORNAL H	PREST.	JORN. H con P.	RENDIM. H	VALOR UNIT.
Ingeniero electricista	Hora	$ 25.000,00	$ 12.500,00	37.500,00	0,02	750,00
Coordinador HSE	Hora	$ 16.000,00	$ 8.000,00	24.000,00	0,10	2.400,00
Técnico oficial	Hora	$ 16.000,00	$ 8.000,00	24.000,00	0,10	2.400,00
Ayudante	Hora	$ 10.000,00	$ 5.000,00	15.000,00	0,10	1.500,00
			Subtotal MANO DE OBRA			**7.050,00**

PRECIO UNITARIO TOTAL	**22.503**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - CUBIERTA PARA ESCENARIO DEPORTIVO, MPIO DE ACEVEDO.

INSTALACION ELECTRICA

ACTIVIDAD	Lámpara SYLVANIA-SYLVEO LED 2000 LM NAR 4K Incluye: Una Caja metalica galvanizada 4x4", un Tomacorriente 15v, 15A, con PT, una Clavija aerea 125V 15A con PT, conector terminal para tubo EMT 1/2" con contra tuerca, Elementos de fijación y ajuste, Marcación e identificación del circuito.

ITEM	6,30

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	Ref.	P. UNIT.	CANTIDAD	V. TOTAL
Lampara Led Higbay 200W 2000LM 100-240 6000k	Und.	$ 195.000,00	1,00	195.000,00
Caja metalica galvanizada 2400 (10X10X5cm)	Und.	$ 5.100,00	1,00	5.100,00
Tapa ciega metalica 2400 (10X10cm)	Und.	$ 1.500,00	1,00	1.500,00
Chazo puntilla 1/4" X 1"	Und.	$ 250,00	2,00	500,00
Prensa estopa 1/2" plastica	Und.	$ 1.100,00	1,00	1.100,00
Cable encauchetado 3X14 L. Halogeno	ml	$ 10.000,00	1,00	10.000,00
Tornillo cabeza de lenteja autoperforante 1/2"	Und.	$ 200,00	4,00	800,00
Conector de resorte para cable No 14	Und.	$ 3.000,00	4,00	12.000,00
Terminal de ojo No 14	Und.	$ 250,00	2,00	500,00
Cinta aislante color negro x rollo	Und.	$ 7.000,00	0,10	700,00
soporte para lampara	Und.	$ 20.000,00	1,00	20.000,00
Clavija aérea 220V 20A con PT	Und.	$ 5.800,00	1,00	5.800,00
Toma aéreo 220V 20A con PT	Und.	$ 6.900,00	1,00	6.900,00
				-
				-
		Subtotal MATERIALES		**259.900,00**

EQUIPO Y HERRAMIENTA

DESCRIPCION	Und.	TARIFA	RENDIMIEN.	VALOR UNIT.
Herramienta menor eléctrica	Día	141.000,00	0,10	14.100,00
Arnes certificado	Día	120.000,00	0,19	22.800,00
Andamios certificados	Día	50.000,00	0,19	9.500,00
		Subtotal EQUIPO Y HERR.		**46.400,00**

TRANSPORTE

DESCRIPCION	Und.	TARIFA	RENDIMIEN.	VALOR UNIT.
6% material	Und.	6%	1,00	15.594,00
				-
		Subtotal EQUIPO Y HERR.		**15.594,00**

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UND.	JORNAL H	PREST.	JORN. H con P.	RENDIM. H	VALOR UNIT.
Ingeniero electricista	Hora	$ 25.000,00	$ 12.500,00	37.500,00	0,40	15.000,00
Coordinador HSE	Hora	$ 16.000,00	$ 8.000,00	24.000,00	2,00	48.000,00
Técnico oficial	Hora	$ 16.000,00	$ 8.000,00	24.000,00	2,00	48.000,00
Ayudante	Hora	$ 10.000,00	$ 5.000,00	15.000,00	2,00	30.000,00
			Subtotal MANO DE OBRA			**141.000,00**

PRECIO UNITARIO TOTAL	**447.300**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - CUBIERTA PARA ESCENARIO DEPORTIVO, MPIO DE ACEVEDO.

INSTALACION ELECTRICA

ACTIVIDAD: Tablero eléctrico tipo exterior intemperie con Protección 2X40A y fotocontrol temporizado 220V, cumpliendo RETIE. Incluye elementos de fijación y ajuste.

ITEM	6,40

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	Ref.	P. UNIT.	CANTIDAD	V. TOTAL
Tablero Electrico tipo Exterior intemperie con Protección 2X30A y fotocontrol temporizado.	Und.	1.550.000,00	1,00	1.550.000,00
Chazo expansivo 5/16" x 2"	Und.	2.000,00	4,00	8.000,00
Señalización	Und.	2.000,00	1,00	2.000,00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		Subtotal MATERIALES		**1.560.000,00**

EQUIPO Y HERRAMIENTA

DESCRIPCION	Und.	TARIFA	RENDIMIEN.	VALOR UNIT.
Herramienta menor eléctrica	Día	282.000,00	0,10	28.200,00
				-
		Subtotal EQUIPO Y HERR.		**28.200,00**

TRANSPORTE

DESCRIPCION	Und.	TARIFA	RENDIMIEN.	VALOR UNIT.
6% material	Und.	6%	1,00	93.600,00
				-
		Subtotal EQUIPO Y HERR.		**93.600,00**

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UND.	JORNAL H	PREST.	JORN. H con P.	RENDIM. H	VALOR UNIT.
Ingeniero electricista	Hora	$ 25.000,00	$ 12.500,00	37.500,00	0,80	30.000,00
Coordinador HSE	Hora	$ 16.000,00	$ 8.000,00	24.000,00	4,00	96.000,00
Técnico oficial	Hora	$ 16.000,00	$ 8.000,00	24.000,00	4,00	96.000,00
Ayudante	Hora	$ 10.000,00	$ 5.000,00	15.000,00	4,00	60.000,00
			Subtotal MANO DE OBRA			**282.000,00**

PRECIO UNITARIO TOTAL	**1.870.200**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - CUBIERTA PARA ESCENARIO DEPORTIVO, MPIO DE ACEVEDO.

INSTALACION ELECTRICA

ACTIVIDAD Protección Termomagnética bipolar 2X20A 10 kA Tipo riel.

ITEM	6,50

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	Ref.	P. UNIT.	CANTIDAD	V. TOTAL
Termomagnetico Bipolar 2X30A tipo Riel	Und.	37.500,00	1,00	37.500,00
Terminal de punta No 10	Und.	3.000,00	3,00	9.000,00
Marquilla de circuitos numéricos	Und.	44.000,00	0,11	4.625,00
Base adhesiva	Und.	550,00	4,00	2.200,00
Amarra plastica 15cm	Und.	250,00	4,00	1.000,00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		Subtotal MATERIALES		**54.325,00**

EQUIPO Y HERRAMIENTA

DESCRIPCION	Und.	TARIFA	RENDIMIEN.	VALOR UNIT.
Herramienta menor eléctrica	Día	28.200,00	0,10	2.820,00
				-
		Subtotal EQUIPO Y HERR.		**2.820,00**

TRANSPORTE

DESCRIPCION	Und.	TARIFA	RENDIMIEN.	VALOR UNIT.
6% material	Und.	6%	1,00	3.259,50
				-
		Subtotal EQUIPO Y HERR.		**3.259,50**

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UND.	JORNAL H	PREST.	JORN. H con P.	RENDIM. H	VALOR UNIT.
Ingeniero electricista	Hora	$ 25.000,00	$ 12.500,00	37.500,00	0,08	3.000,00
Coordinador HSE	Hora	$ 16.000,00	$ 8.000,00	24.000,00	0,40	9.600,00
Técnico oficial	Hora	$ 16.000,00	$ 8.000,00	24.000,00	0,40	9.600,00
Ayudante	Hora	$ 10.000,00	$ 5.000,00	15.000,00	0,40	6.000,00
			Subtotal MANO DE OBRA			**28.200,00**

PRECIO UNITARIO TOTAL	**85.345**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - CUBIERTA PARA ESCENARIO DEPORTIVO, MPIO DE ACEVEDO.

INSTALACION ELECTRICA

ACTIVIDAD	Alambrón de aluminio No 1/0. Incluye: Soporte plástico corto para alambrón y elementos de fijación y ajuste.
ITEM	6,60

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	Ref.	P. UNIT.	CANTIDAD	V. TOTAL
Alambron de aluminio No 1/0	ml	7.420,00	1,00	7.420,00
Soporte aislador plastico tipo anillo corto	Und.	10.780,00	1,00	10.780,00
Union Lineal en aluminio No 1/0	Und.	7.980,00	0,05	399,00
Chazo puntilla	Und.	250,00	1,00	250,00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		Subtotal MATERIALES		**18.849,00**

EQUIPO Y HERRAMIENTA

DESCRIPCION	Und.	TARIFA	RENDIMIEN.	VALOR UNIT.
Herramienta menor eléctrica	Día	24.675,00	0,10	2.467,50
Arnes certificado	Día	120.000,00	0,07	8.400,00
Andamios certificados	Día	50.000,00	0,07	3.500,00
		Subtotal EQUIPO Y HERR.		**14.367,50**

TRANSPORTE

DESCRIPCION	Und.	TARIFA	RENDIMIEN.	VALOR UNIT.
6% material	Und.	6%	1,00	1.130,94
				-
		Subtotal EQUIPO Y HERR.		**1.130,94**

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UND.	JORNAL H	PREST.	JORN. H con P.	RENDIM. H	VALOR UNIT.
Ingeniero electricista	Hora	$ 25.000,00	$ 12.500,00	37.500,00	0,07	2.625,00
Coordinador HSE	Hora	$ 16.000,00	$ 8.000,00	24.000,00	0,35	8.400,00
Técnico oficial	Hora	$ 16.000,00	$ 8.000,00	24.000,00	0,35	8.400,00
Ayudante	Hora	$ 10.000,00	$ 5.000,00	15.000,00	0,35	5.250,00
			Subtotal MANO DE OBRA			**24.675,00**

PRECIO UNITARIO TOTAL	**57.892**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - CUBIERTA PARA ESCENARIO DEPORTIVO, MPIO DE ACEVEDO.

INSTALACION ELECTRICA

ACTIVIDAD Cable de cobre desnudo No 2/0

ITEM	6,70

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	Ref.	P. UNIT.	CANTIDAD	V. TOTAL
Cable de cobre desnudo No 2/0	ml	49.680,00	1,04	51.667,20
brecha 0,40x0,40x1m	Und.	5.000,00	1,00	5.000,00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

Subtotal MATERIALES **56.667,20**

EQUIPO Y HERRAMIENTA

DESCRIPCION	Und.	TARIFA	RENDIMIEN.	VALOR UNIT.
Herramienta menor eléctrica	Día	7.050,00	0,10	705,00
				-

Subtotal EQUIPO Y HERR. **705,00**

TRANSPORTE

DESCRIPCION	Und.	TARIFA	RENDIMIEN.	VALOR UNIT.
6% material	Und.	6%	1,00	3.400,03
				-

Subtotal EQUIPO Y HERR. **3.400,03**

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UND.	JORNAL H	PREST.	JORN. H con P.	RENDIM. H	VALOR UNIT.
Ingeniero electricista	Hora	$ 25.000,00	$ 12.500,00	37.500,00	0,02	750,00
Coordinador HSE	Hora	$ 16.000,00	$ 8.000,00	24.000,00	0,10	2.400,00
Técnico oficial	Hora	$ 16.000,00	$ 8.000,00	24.000,00	0,10	2.400,00
Ayudante	Hora	$ 10.000,00	$ 5.000,00	15.000,00	0,10	1.500,00

Subtotal MANO DE OBRA **7.050,00**

PRECIO UNITARIO TOTAL **64.422**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - CUBIERTA PARA ESCENARIO DEPORTIVO, MPIO DE ACEVEDO.

INSTALACION ELECTRICA

ACTIVIDAD: Punta captadora aluminio 5/8" X 0,8m roscada Incluye: Base en aluminio, elementos de fijación y ajuste.

ITEM	6,80

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	Ref.	P. UNIT.	CANTIDAD	V. TOTAL
Base en aluminio para punta captora	Und.	100.000,00	1,00	100.000,00
Punta camptora 5/8" X 0,8m aluminio	Und.	136.500,00	1,00	136.500,00
Tornillo expansivo 5/16" X 1-1/2"	Und.	2.000,00	4,00	8.000,00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		Subtotal MATERIALES		**244.500,00**

EQUIPO Y HERRAMIENTA

DESCRIPCION	Und.	TARIFA	RENDIMIEN.	VALOR UNIT.
Herramienta menor eléctrica	Día	105.750,00	0,10	10.575,00
Arnes certificado	Día	120.000,00	0,19	22.800,00
Andamios certificados	Día	50.000,00	0,19	9.500,00
		Subtotal EQUIPO Y HERR.		**42.875,00**

TRANSPORTE

DESCRIPCION	Und.	TARIFA	RENDIMIEN.	VALOR UNIT.
6% material	Und.	6%	1,00	14.670,00
				-
		Subtotal EQUIPO Y HERR.		**14.670,00**

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UND.	JORNAL H	PREST.	JORN. H con P.	RENDIM. H	VALOR UNIT.
Ingeniero electricista	Hora	$ 25.000,00	$ 12.500,00	37.500,00	0,30	11.250,00
Coordinador HSE	Hora	$ 16.000,00	$ 8.000,00	24.000,00	1,50	36.000,00
Técnico oficial	Hora	$ 16.000,00	$ 8.000,00	24.000,00	1,50	36.000,00
Ayudante	Hora	$ 10.000,00	$ 5.000,00	15.000,00	1,50	22.500,00
			Subtotal MANO DE OBRA			**105.750,00**

PRECIO UNITARIO TOTAL	**393.125**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - CUBIERTA PARA ESCENARIO DEPORTIVO, MPIO DE ACEVEDO.

INSTALACION ELECTRICA

ACTIVIDAD Grapa paralela bimetalica para alambrón 1/0. Inlcuye caja raweld 2400 con su respectiva tapa ciega.

ITEM	6,90

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	Ref.	P. UNIT.	CANTIDAD	V. TOTAL
Grapa paralela bimetalica para alambron 1/0	Und.	51.750,00	1,00	51.750,00
caja raweld 2400 (10X10X5cm) salida de 3/4"	Und.	28.750,00	1,00	28.750,00
Tapa ciega para caja raweld 2400	Und.	13.000,00	1,00	13.000,00
Chazo puntilla 1/4" X 1" plastico	Und.	250,00	2,00	500,00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		Subtotal MATERIALES		**94.000,00**

EQUIPO Y HERRAMIENTA

DESCRIPCION	Und.	TARIFA	RENDIMIEN.	VALOR UNIT.
Herramienta menor eléctrica	Día	70.500,00	0,10	7.050,00
				-
		Subtotal EQUIPO Y HERR.		**7.050,00**

TRANSPORTE

DESCRIPCION	Und.	TARIFA	RENDIMIEN.	VALOR UNIT.
6% material	Und.	6%	1,00	5.640,00
				-
		Subtotal EQUIPO Y HERR.		**5.640,00**

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UND.	JORNAL H	PREST.	JORN. H con P.	RENDIM. H	VALOR UNIT.
Ingeniero electricista	Hora	$ 25.000,00	$ 12.500,00	37.500,00	0,20	7.500,00
Coordinador HSE	Hora	$ 16.000,00	$ 8.000,00	24.000,00	1,00	24.000,00
Técnico oficial	Hora	$ 16.000,00	$ 8.000,00	24.000,00	1,00	24.000,00
Ayudante	Hora	$ 10.000,00	$ 5.000,00	15.000,00	1,00	15.000,00
			Subtotal MANO DE OBRA			**70.500,00**

PRECIO UNITARIO TOTAL	**171.550**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - CUBIERTA PARA ESCENARIO DEPORTIVO, MPIO DE ACEVEDO.

INSTALACION ELECTRICA

ACTIVIDAD	Sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 5/8" X 2,4m. Incluye: Caja de inspección premoldeada 40X40X40cm, Soldadura exotermica 115g.

ITEM	6,10

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	Ref.	P. UNIT.	CANTIDAD	V. TOTAL
Varilla de cobre 5/8" x 2,4m	Und.	299.000,00	1,00	299.000,00
caja de inspección 40x40x40cm en concreto fundido 2500psi	Und.	202.500,00	1,00	202.500,00
Soldadura exotermica 115g	Und.	39.000,00	1,00	39.000,00
Arcilla x 1kg	kg	10.000,00	0,10	1.000,00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		Subtotal MATERIALES		**541.500,00**

EQUIPO Y HERRAMIENTA

DESCRIPCION	Und.	TARIFA	RENDIMIEN.	VALOR UNIT.
Herramienta menor eléctrica	Día	282.000,00	0,10	28.200,00
				-
		Subtotal EQUIPO Y HERR.		**28.200,00**

TRANSPORTE

DESCRIPCION	Und.	TARIFA	RENDIMIEN.	VALOR UNIT.
6% material	Und.	6%	1,00	32.490,00
				-
		Subtotal EQUIPO Y HERR.		**32.490,00**

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UND.	JORNAL H	PREST.	JORN. H con P.	RENDIM. H	VALOR UNIT.
Ingeniero electricista	Hora	$ 25.000,00	$ 12.500,00	37.500,00	0,80	30.000,00
Coordinador HSE	Hora	$ 16.000,00	$ 8.000,00	24.000,00	4,00	96.000,00
Técnico oficial	Hora	$ 16.000,00	$ 8.000,00	24.000,00	4,00	96.000,00
Ayudante	Hora	$ 10.000,00	$ 5.000,00	15.000,00	4,00	60.000,00
			Subtotal MANO DE OBRA			**282.000,00**

PRECIO UNITARIO TOTAL	**851.700**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - CUBIERTA PARA ESCENARIO DEPORTIVO, MPIO DE ACEVEDO.

INSTALACION ELECTRICA

ACTIVIDAD Suminsitro e localización de medidor bifasico trifilar.

ITEM	6,11

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	Ref.	P. UNIT.	CANTIDAD	V. TOTAL
Varilla de cobre 5/8" x 2,4m	Und.	299.000,00	1,00	299.000,00
caja de inspección 30x30x30cm en concreto fundido	Und.	202.500,00	1,00	202.500,00
Soldadura exotermica 115g	Und.	39.000,00	1,00	39.000,00
Medidor bifasico trifilar	kg	10.000,00	0,10	1.000,00
Cable concentrico 2x8+8	metro		20,00	-
Tubo metalico galvanizado IMC DE 1"	tubo	42.350,00	1,00	42.350,00
Tubo metalico galvanizado IMC DE 1/2"	tubo	18.640,00	1,00	18.640,00
Coraza metalica de 1"	metro	8.640,00	1,00	8.640,00
Conector curvo para coraza de 1"	Und.	2.150,00	1,00	2.150,00
Conector recto para coraza de 1"	Und.	1.890,00	1,00	1.890,00
Interruptor automatico de 2x 30 Amp	Und.	32.400,00	1,00	32.400,00
Conduleta metalica de 1"	Und.	2.260,00	1,00	2.260,00
Cable de cobre No. 8 verde	metro	7.040,00	3,00	21.120,00
Conector de perforacion	Und.	9.720,00	3,00	29.160,00
Adaptador terminal IMC de 1/2"	Und.	1.450,00	1,00	1.450,00
		Subtotal MATERIALES		**701.560,00**

EQUIPO Y HERRAMIENTA

DESCRIPCION	Und.	TARIFA	RENDIMIEN.	VALOR UNIT.
Herramienta menor eléctrica	Día	282.000,00	0,10	28.200,00
				-
		Subtotal EQUIPO Y HERR.		**28.200,00**

TRANSPORTE

DESCRIPCION	Und.	TARIFA	RENDIMIEN.	VALOR UNIT.
6% material	Und.	6%	1,00	42.093,60
				-
		Subtotal EQUIPO Y HERR.		**42.093,60**

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UND.	JORNAL H	PREST.	JORN. H con P.	RENDIM. H	VALOR UNIT.
Ingeniero electricista	Hora	$ 25.000,00	$ 12.500,00	37.500,00	0,80	30.000,00
Coordinador HSE	Hora	$ 16.000,00	$ 8.000,00	24.000,00	4,00	96.000,00
Técnico oficial	Hora	$ 16.000,00	$ 8.000,00	24.000,00	4,00	96.000,00
Ayudante	Hora	$ 10.000,00	$ 5.000,00	15.000,00	4,00	60.000,00
			Subtotal MANO DE OBRA			**282.000,00**

PRECIO UNITARIO TOTAL	**1.011.760**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN CUBIERTAS	6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

5.1	Placa de contrapiso en concreto de 3000 psi e= 0,10 cm con malla electrosoldada de 0,15 x 0,15 de 5.0 mm	UNIDAD:	m2

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Rendimiento	Tarifa/Hora	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR.	%M.O.	0,05	$ 13.508	$ 675	
				SUB-TOTAL	$ 675

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
CONCRETO NORMAL - 3000 PSI (210 KG/CM2)	m^3	0,08	$ 646.342,00	$ 54.293	
MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 5 mm.	m^2	1,04	$ 11.638,00	$ 12.104	
				SUB-TOTAL	$ 66.396

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Rendimiento	Precio-Unit.	Valor-Unit.	
MATERIAL	M.E %	20%	$ 12.103,52	$ 2.421	
				SUB-TOTAL	$ 2.421


IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL (INCL. PRESTACIONE	$ 16.140,18	1,00	2,00	$ 8.070	
AYUDANTE (INCL. PRESTACIONES)	$ 10.876,13	1,00	2,00	$ 5.438	
				SUB-TOTAL	$ 13.508

TOTAL UNITARIO	$ 83.001

PROGRAMA DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA
FONPACIFICO - PROCESO No OB-006-2026
FLUJO DE INVERSIÓN

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración	Comienzo	Fin
1		**CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO -**			**365 días**	**lun 9/03/26**	**dom 7/03/27**
2		**CUBIERTA No 1 LA VICTORIA**			**184 días**	**lun 9/03/26**	**mar 8/09/26**
3	**1**	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**			**15 días**	**lun 9/03/26**	**lun 23/03/26**
4	1.1	Localización y replanteo	m2	533.95	9 días	lun 9/03/26	mar 17/03/26
5	1.2	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	m2	66.53	15 días	lun 9/03/26	lun 23/03/26
6	1.3	Desmonte marcos canchas existentes.	Und.	2.00	3 días	jue 12/03/26	dom 15/03/26
7	1.4	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.	Und.	4.00	5 días	mié 11/03/26	lun 16/03/26

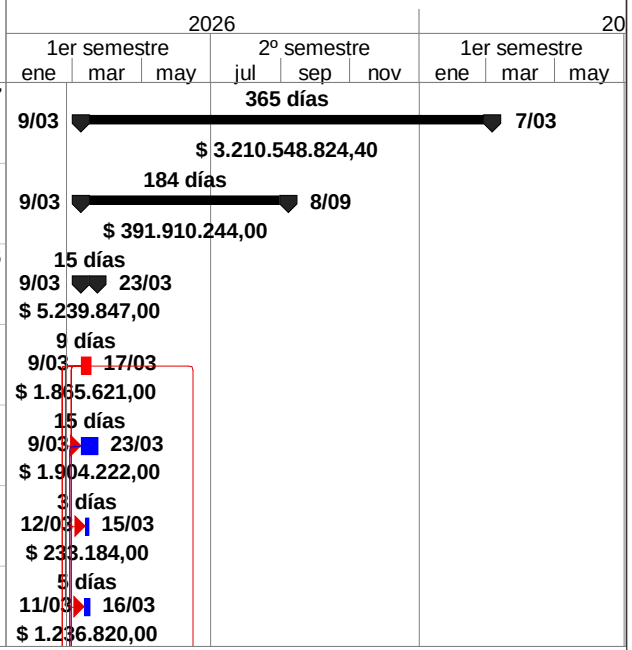

Proyecto: **CUBIERTAS ACEVEDO -H**
Fecha: mar 24/02/26

Tarea		División		Tarea manual	
Tarea crítica		Tareas externas		Sólo duración	
Hito		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual	
Tarea resumida		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin	
Hito resumido		Hito inactivo		Progreso	
Progreso resumido		Resumen inactivo		Fecha límite	


NIT: 900.693.242-3

PACOT INTEGRALES S.A.S
Proponente
Página 1

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal

PROGRAMA DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA
FONPACIFICO - PROCESO No OB-006-2026
FLUJO DE INVERSIÓN

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración	Comienzo	Fin
8	**2**	**CIMIENTOS**			**82 días**	**dom 15/03/26**	**vie 5/06/26**
9	2.1	Excavación manual para cimentaciónes </= 2 mts	m3	46.77	19 días	dom 15/03/26	vie 3/04/26
10	2.2	Rellenos compactados en recebo seleccionado al 95% PROCTOR	m3	21.12	18 días	lun 16/03/26	vie 3/04/26
11	2.4	Concreto de limpieza o solado E= 0,05 en concreto de 1.500 PSI	m2	27.00	7 días	dom 22/03/26	dom 29/03/26
12	2.5	Zapatas en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo	m3	14.85	25 días	dom 29/03/26	jue 23/04/26
13	2.6	Columnas en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo	m3	8.82	36 días	jue 30/04/26	vie 5/06/26
14	2.7	Viga de cimentación en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo	m3	5.88	15 días	dom 5/04/26	lun 20/04/26

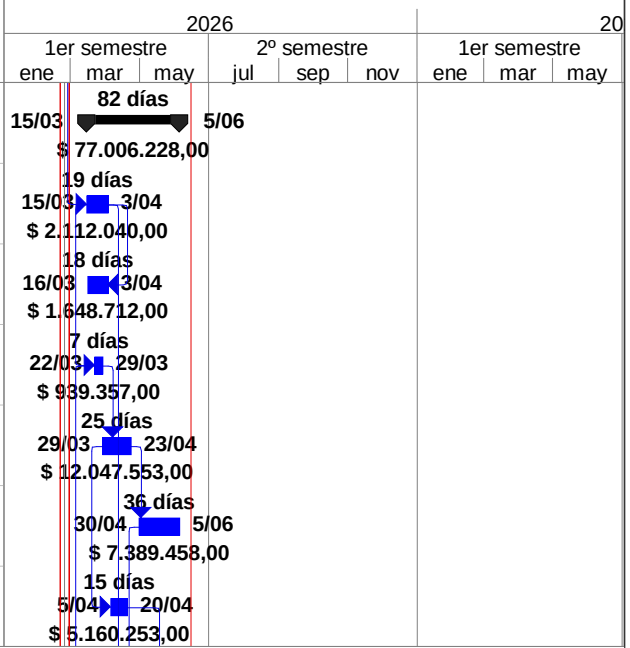

Proyecto: **CUBIERTAS ACEVEDO -H**
Fecha: mar 24/02/26

Tarea		División		Tarea manual	
Tarea crítica		Tareas externas		Sólo duración	
Hito		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual	
Tarea resumida		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin	
Hito resumido		Hito inactivo		Progreso	
Progreso resumido		Resumen inactivo		Fecha límite	


NIT: 900.693.242-3

PACOT INTEGRALES S.A.S
Proponente
Página 2

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal

PROGRAMA DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA
FONPACIFICO - PROCESO No OB-006-2026
FLUJO DE INVERSIÓN

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración	Comienzo	Fin
15	2.8	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	Kg	5235.70	37 días	dom 22/03/26	mar 28/04/26
16	2.9	Retiros de material sobrante de excavaciones y escombros	m3	46.77	12 días	vie 3/04/26	mié 15/04/26
17	**3**	**ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA**			**110 días**	**jue 21/05/26**	**mar 8/09/26**
18	3.1	Suministro e localización Estructura metálica según diseño estructural, en tubería estructural para columnas, domos y viga de	Kg	5794.34	96 días	jue 21/05/26	mar 25/08/26
19	3.2	Correa en perfil metálico rectangular de 10x10 cm Cal.16. Incluye anticorrosivo y pintura esmalte.	m	560.50	64 días	lun 22/06/26	mar 25/08/26
20	3.3	Suministro e instalación cubierta en teja galvanizada Cal.28 Tipo STANDING SEAM ó similar, incluye tornillos de sujeción, color	m2	566.55	57 días	lun 13/07/26	mar 8/09/26
21	3.4	Platinas de apoyos columnas de 0.50x0.50(m) cajón principal de cubierta en platina 1/2" y 12 pernos grado 8 Ø3/4", incluye, empalme de	Und.	12.00	30 días	dom 26/07/26	mar 25/08/26

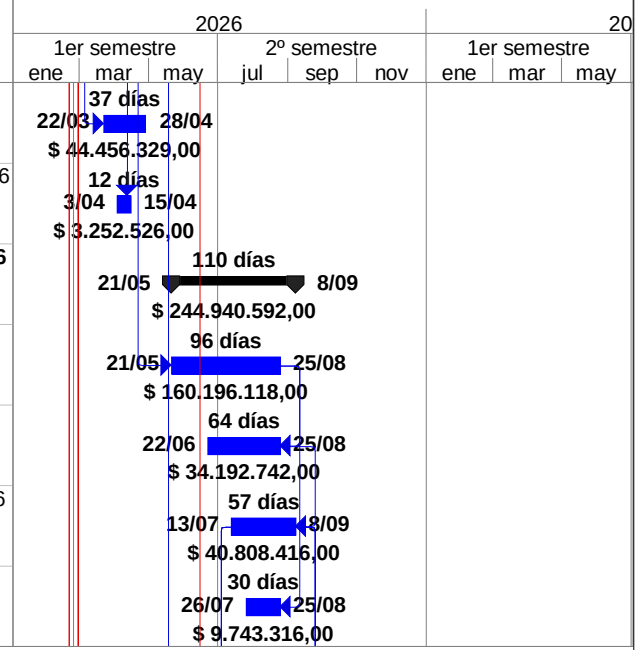

Proyecto: **CUBIERTAS ACEVEDO -H**
Fecha: mar 24/02/26

Tarea		División		Tarea manual	
Tarea crítica		Tareas externas		Sólo duración	
Hito		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual	
Tarea resumida		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin	
Hito resumido		Hito inactivo		Progreso	
Progreso resumido		Resumen inactivo		Fecha límite	


NIT: 900.693.242-3

PACOT INTEGRALES S.A.S
Proponente
Página 3

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal

PROGRAMA DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA
FONPACIFICO - PROCESO No OB-006-2026
FLUJO DE INVERSIÓN

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración	Comienzo	Fin
22	**4**	**INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS**			**113 días**	**lun 18/05/26**	**mar 8/09/26**
23	4.1	Suministro e instalaciòn Bajante PVC aguas lluvias de 4".	m	43.20	7 días	lun 24/08/26	lun 31/08/26
24	4.2	Abrazadera galvanizada 2" - 4"	Und.	36.00	5 días	mié 26/08/26	lun 31/08/26
25	4.3	Codo de 45/90 4" PVC SANITARIO	Und.	36.00	6 días	lun 24/08/26	dom 30/08/26
26	4.4	Suministro e Instalación de tubería PVC Aguas Lluvias Ø6"	m	76.56	36 días	lun 18/05/26	mar 23/06/26
27	4.5	Caja de inspección en concreto de 3000 PSI SECC(0,60*0,60*1,00 m) incluye tapa en concreto y refuerzo	Und.	4.00	16 días	mar 23/06/26	jue 9/07/26
28	4.6	Canal en lámina Galvanizada Cal.18 ancho=0.38 metros. H=0.20 metros (Sum. E Inst. Wash Primer + Esmalte + Anclaje	m	59.00	37 días	dom 2/08/26	mar 8/09/26

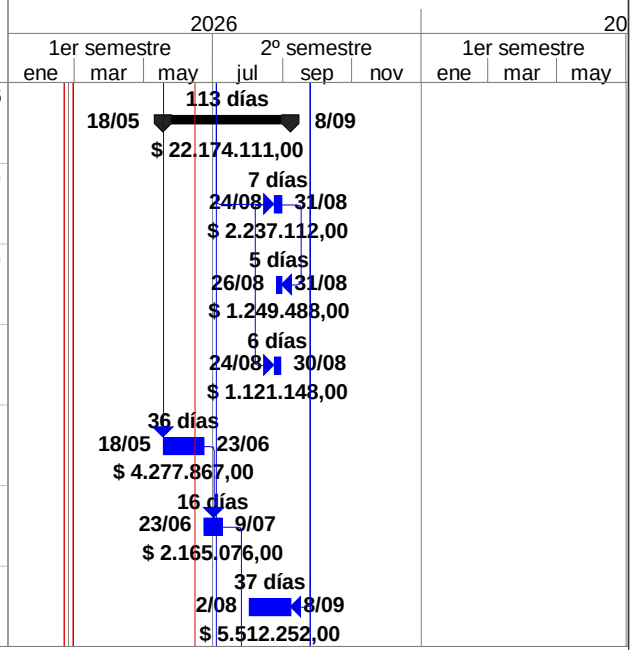

Proyecto: **CUBIERTAS ACEVEDO -H**
Fecha: mar 24/02/26

Tarea		División		Tarea manual	
Tarea crítica		Tareas externas		Sólo duración	
Hito		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual	
Tarea resumida		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin	
Hito resumido		Hito inactivo		Progreso	
Progreso resumido		Resumen inactivo		Fecha límite	


NIT: 900.693.242-3

PACOT INTEGRALES S.A.S
Proponente
Página 4

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal

PROGRAMA DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA
FONPACIFICO - PROCESO No OB-006-2026
FLUJO DE INVERSIÓN

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración	Comienzo	Fin
29	4.7	Suministro e instalaciòn tuberia pvc aguas lluvias de 8" CORRUGADA	M	24.00	25 días	dom 14/06/26	jue 9/07/26
30	4.9	Excavacion manual Tipo zanja </= 0.9 mts -- e=0,50 m	M3	45.25	18 días	mié 27/05/26	dom 14/06/26
31	4.10	Rellenos en recebo seleccionado de la misma excavacion compactado mecanico	M3	36.10	10 días	dom 14/06/26	mié 24/06/26
32	**5**	**PISOS Y ACABADOS**			**23 días**	**dom 16/08/26**	**mar 8/09/26**
33	5.1	Placa de contrapiso en concreto de 3000 psi e= 0,10 cm con malla electrosoldada de 0,15 x 0,15 de 5.0 mm	m2	43.40	23 días	dom 16/08/26	mar 8/09/26
34	**6**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**			**15 días**	**lun 10/08/26**	**mar 25/08/26**
35	6.1	Tuberia emt 3/4", incluye accesorios de fijación y ajustes para tubería.	m	89.60	3 días	lun 10/08/26	jue 13/08/26

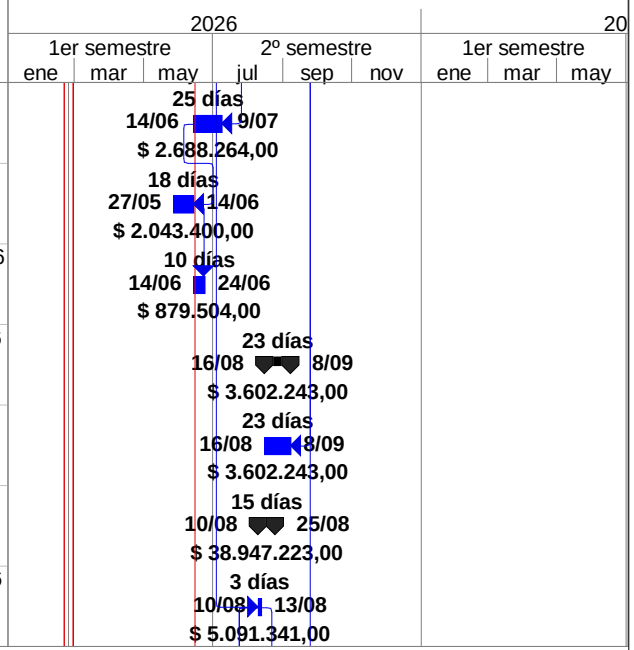

Proyecto: **CUBIERTAS ACEVEDO -H**
Fecha: mar 24/02/26

Tarea		División		Tarea manual	
Tarea crítica		Tareas externas		Sólo duración	
Hito		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual	
Tarea resumida		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin	
Hito resumido		Hito inactivo		Progreso	
Progreso resumido		Resumen inactivo		Fecha límite	


NIT: 900.693.242-3

PACOT INTEGRALES S.A.S
Proponente
Página 5

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal

PROGRAMA DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA
FONPACIFICO - PROCESO No OB-006-2026
FLUJO DE INVERSIÓN

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración	Comienzo	Fin
36	6.2	Cable eléctrico No 10 CU AWG Libre de halogeno. Incluye: 2 fases + 1 tierra	m	89.60	1 día	jue 13/08/26	vie 14/08/26
37	6.3	Lámpara SYLVANIA-SYLVEO LED 2000 LM NAR 4K Incluye: Una Caja metalica galvanizada 4x4", un Tomacorriente 15v, 15A,	Und.	8.00	2 días	vie 14/08/26	dom 16/08/26
38	6.4	Tablero eléctrico tipo exterior intemperie con Protección 2X40A y fotocontrol temporizado 220V, cumpliendo RETIE. Incluye elementos	Und.	1.00	2 días	dom 16/08/26	mar 18/08/26
39	6.5	Protección Termomagnética bipolar 2X20A 10 kA Tipo riel.	Und.	2.00	1 día	mar 18/08/26	mié 19/08/26
40	6.6	Alambrón de aluminio No 1/0. Incluye: Soporte plástico corto para alambrón y elementos de fijación y ajuste.	m	166.50	7 días	lun 10/08/26	lun 17/08/26
41	6.7	Cable de cobre desnudo No 2/0	m	110.00	1 día	lun 10/08/26	mar 11/08/26
42	6.8	Punta captadora aluminio 5/8" X 0,8m roscada Incluye: Base en aluminio, elementos de fijación y ajuste.	Und.	9.00	2 días	mié 19/08/26	vie 21/08/26

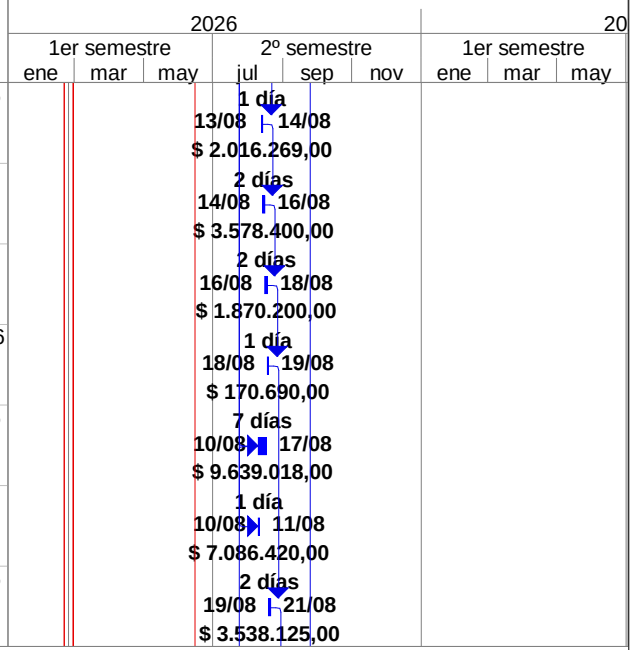

Proyecto: **CUBIERTAS ACEVEDO -H**
Fecha: mar 24/02/26

Tarea		División		Tarea manual	
Tarea crítica		Tareas externas		Sólo duración	
Hito		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual	
Tarea resumida		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin	
Hito resumido		Hito inactivo		Progreso	
Progreso resumido		Resumen inactivo		Fecha límite	


NIT: 900.693.242-3

PACOT INTEGRALES S.A.S
Proponente
Página 6

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal

PROGRAMA DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA
FONPACIFICO - PROCESO No OB-006-2026
FLUJO DE INVERSIÓN

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración	Comienzo	Fin
43	6.9	Grapa paralela bimetalica para alambrón 1/0. Inlcuye caja raweld 2400 con su respectiva tapa ciega.	Und.	4.00	1 día	vie 21/08/26	sáb 22/08/26
44	6.10	Sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 5/8" X 2,4m. Incluye: Caja de inspección premoldeada 40X40X40cm, Soldadura	Und.	5.00	3 días	sáb 22/08/26	mar 25/08/26
45	6.11	Suminsitro e localización de medidor bifasico trifilar.	Und.	1.00	1 día	lun 10/08/26	mar 11/08/26
46		**CUBIERTA No 2 CRISTO REY**			**171 días**	**mar 7/04/26**	**jue 24/09/26**
47	**1**	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**			**10 días**	**mar 7/04/26**	**vie 17/04/26**
48	1.1	Localización y replanteo	m2	540.00	9 días	mar 7/04/26	jue 16/04/26
49	1.2	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	m2	43.80	10 días	mar 7/04/26	vie 17/04/26

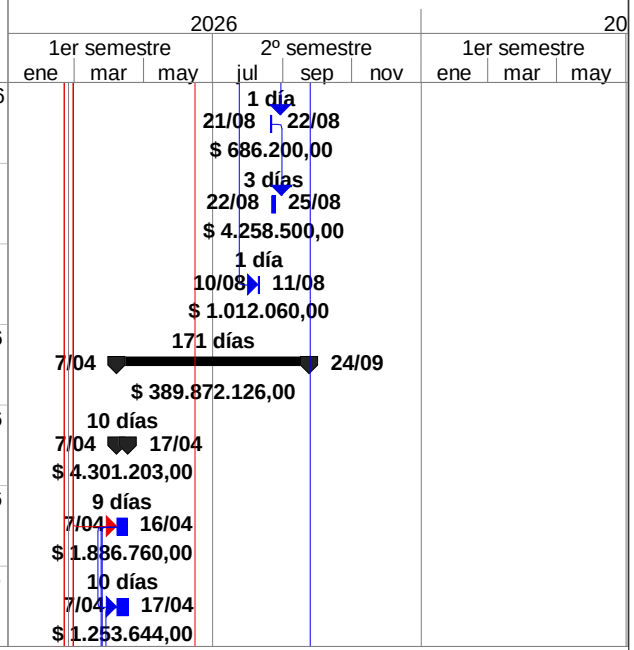

Proyecto: **CUBIERTAS ACEVEDO -H**
Fecha: mar 24/02/26

Tarea		División		Tarea manual	
Tarea crítica		Tareas externas		Sólo duración	
Hito		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual	
Tarea resumida		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin	
Hito resumido		Hito inactivo		Progreso	
Progreso resumido		Resumen inactivo		Fecha límite	


NIT: 900.693.242-3

PACOT INTEGRALES S.A.S
Proponente
Página 7

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal

PROGRAMA DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA
FONPACIFICO - PROCESO No OB-006-2026
FLUJO DE INVERSIÓN

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración	Comienzo	Fin
50	1.3	Desmonte marcos canchas existentes.	Und.	2.00	3 días	sáb 11/04/26	mar 14/04/26
51	1.4	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.	Und.	3.00	4 días	vie 10/04/26	mar 14/04/26
52	**2**	**CIMIENTOS**			**64 días**	**mar 14/04/26**	**mié 17/06/26**
53	2.1	Excavación manual para cimentaciónes </= 2 mts	m3	46.89	27 días	mar 14/04/26	lun 11/05/26
54	2.2	Rellenos compactados en recebo seleccionado al 95% PROCTOR	m3	21.12	18 días	jue 23/04/26	lun 11/05/26
55	2.4	Concreto de limpieza o solado E= 0,05 en concreto de 1.500 PSI	m2	27.00	7 días	mar 21/04/26	mar 28/04/26
56	2.5	Zapatas en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo	m3	14.85	25 días	mar 28/04/26	sáb 23/05/26

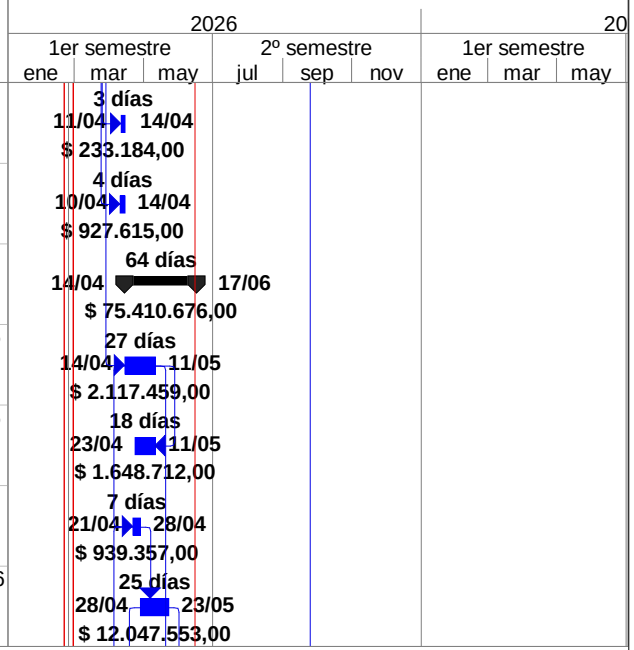

Proyecto: **CUBIERTAS ACEVEDO -H**
Fecha: mar 24/02/26

Tarea	División	Tarea manual	
Tarea crítica	Tareas externas	Sólo duración	
Hito	Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	
Resumen	Agrupar por síntesis	Resumen manual	
Tarea resumida	Tarea inactiva	Sólo el comienzo	
Tarea crítica resumida	Tarea inactiva	Sólo fin	
Hito resumido	Hito inactivo	Progreso	
Progreso resumido	Resumen inactivo	Fecha límite	


NIT: 900.693.242-3

PACOT INTEGRALES S.A.S
Proponente
Página 8

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal

PROGRAMA DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA
FONPACIFICO - PROCESO No OB-006-2026
FLUJO DE INVERSIÓN

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración	Comienzo	Fin
57	2.6	Columnas en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo	m3	5.88	25 días	sáb 23/05/26	mié 17/06/26
58	2.7	Viga de cimentación en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo	m3	6.00	16 días	mar 5/05/26	jue 21/05/26
59	2.8	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	Kg	5261.02	37 días	mar 21/04/26	jue 28/05/26
60	2.9	Retiros de material sobrante de excavaciones y escombros	m3	54.56	14 días	lun 11/05/26	lun 25/05/26
61	**3**	**ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA**			**104 días**	**sáb 13/06/26**	**jue 24/09/26**
62	3.1	Suministro e localización Estructura metálica según diseño estructural, en tubería estructural para columnas, domos y viga de	Kg	5906.05	90 días	sáb 13/06/26	vie 11/09/26
63	3.2	Correa en perfil metálico rectangular de 10x10 cm Cal.16. Incluye anticorrosivo y pintura esmalte.	m	570.00	76 días	sáb 27/06/26	vie 11/09/26

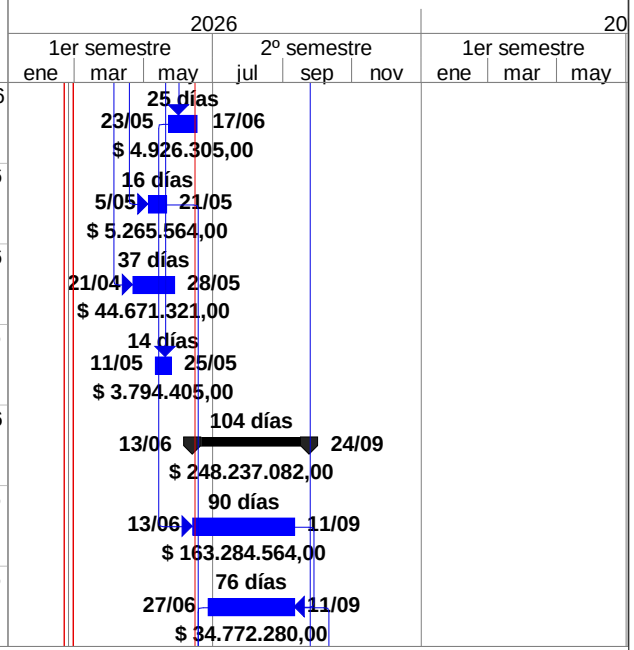

Proyecto: **CUBIERTAS ACEVEDO -H**
Fecha: mar 24/02/26

Tarea		División		Tarea manual	
Tarea crítica		Tareas externas		Sólo duración	
Hito		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual	
Tarea resumida		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin	
Hito resumido		Hito inactivo		Progreso	
Progreso resumido		Resumen inactivo		Fecha límite	


NIT: 900.693.242-3

PACOT INTEGRALES S.A.S
Proponente
Página 9

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal

PROGRAMA DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA
FONPACIFICO - PROCESO No OB-006-2026
FLUJO DE INVERSIÓN

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración	Comienzo	Fin
64	3.3	Suministro e instalación cubierta en teja galvanizada Cal.28 Tipo STANDING SEAM ó similar, incluye tornillos de sujeción, color	m2	561.39	56 días	vie 31/07/26	jue 24/09/26
65	3.4	Platinas de apoyos columnas de 0.50x0.50(m) cajón principal de cubierta en platina 1/2" y 12 pernos grado 8 Ø3/4", incluye, empalme de	Und.	12.00	30 días	sáb 11/07/26	lun 10/08/26
66	**4**	**INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS**			**99 días**	**jue 18/06/26**	**jue 24/09/26**
67	4.1	Suministro e instalaciòn Bajante PVC aguas lluvias de 4"	m	43.20	7 días	vie 11/09/26	jue 17/09/26
68	4.2	Abrazadera galvanizada 2" - 4"	Und.	36.00	5 días	sáb 12/09/26	jue 17/09/26
69	4.3	Codo de 45/90 4" PVC SANITARIO	Und.	36.00	6 días	vie 11/09/26	jue 17/09/26
70	4.4	Suministro e Instalación de tubería PVC Aguas Lluvias Ø6"	m	77.00	18 días	jue 18/06/26	lun 6/07/26

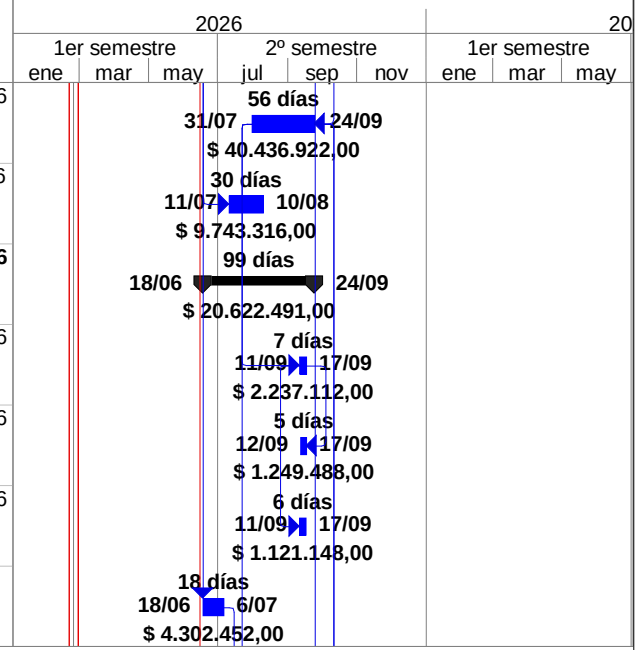

Proyecto: **CUBIERTAS ACEVEDO -H**
Fecha: mar 24/02/26

Tarea		División		Tarea manual	
Tarea crítica		Tareas externas		Sólo duración	
Hito		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual	
Tarea resumida		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin	
Hito resumido		Hito inactivo		Progreso	
Progreso resumido		Resumen inactivo		Fecha límite	


NIT: 900.693.242-3

PACOT INTEGRALES S.A.S
Proponente
Página 10

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal

PROGRAMA DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA
FONPACIFICO - PROCESO No OB-006-2026
FLUJO DE INVERSIÓN

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración	Comienzo	Fin
71	4.5	Caja de inspección en concreto de 3000 PSI SECC(0,60*0,60*1,00 m) incluye tapa en concreto y refuerzo	Und.	4.00	16 días	lun 6/07/26	mié 22/07/26
72	4.6	Canal en lámina Galvanizada Cal.18 ancho=0.40 metros. H=0.25 metros (Sum. E Inst. Wash Primer + Esmalte + Anclaje	m	60.00	38 días	mar 18/08/26	jue 24/09/26
73	4.7	Suministro e Instalación de tubería PVC Sanitaria Corrugada Ø8"	m	12.00	13 días	jue 9/07/26	mié 22/07/26
74	4.9	Excavacion manual Tipo zanja </= 0.9 mts -- e=0,50 m	M3	40.05	16 días	mar 23/06/26	jue 9/07/26
75	4.10	Rellenos en recebo seleccionado de la misma excavacion compactado mecanico	M3	32.38	9 días	jue 9/07/26	sáb 18/07/26
76	**5**	**PISOS Y ACABADOS**			**23 días**	**mié 2/09/26**	**jue 24/09/26**
77	5.1	Placa de contrapiso en concreto de 3000 psi e= 0,10 cm con malla electrosoldada de 0,15 x 0,15 de 5.0 mm	m2	43.80	23 días	mié 2/09/26	jue 24/09/26

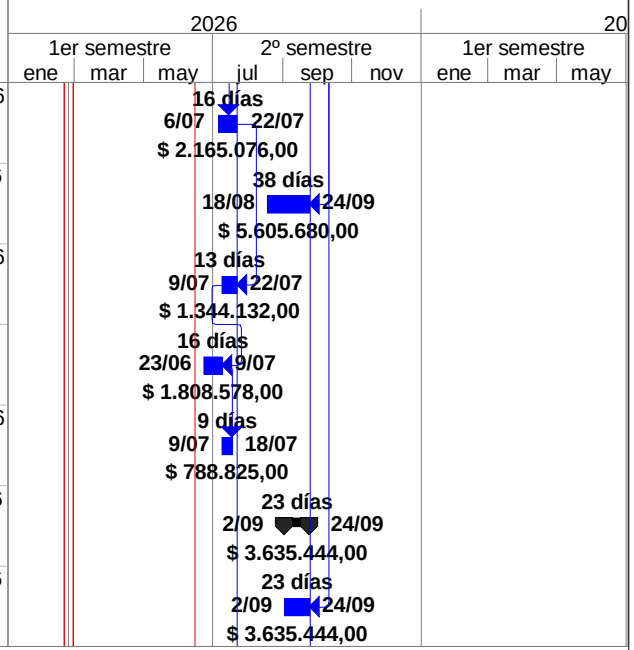

Proyecto: **CUBIERTAS ACEVEDO -H**
Fecha: mar 24/02/26

Tarea		División		Tarea manual	
Tarea crítica		Tareas externas		Sólo duración	
Hito		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual	
Tarea resumida		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin	
Hito resumido		Hito inactivo		Progreso	
Progreso resumido		Resumen inactivo		Fecha límite	


NIT: 900.693.242-3

PACOT INTEGRALES S.A.S
Proponente
Página 11

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal

PROGRAMA DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA
FONPACIFICO - PROCESO No OB-006-2026
FLUJO DE INVERSIÓN

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración	Comienzo	Fin
78	**6**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**			**23 días**	**vie 28/08/26**	**sáb 19/09/26**
79	6.1	Tuberia emt 3/4", incluye accesorios de fijación y ajustes para tubería.	m	70.72	3 días	vie 28/08/26	lun 31/08/26
80	6.2	Cable eléctrico No 10 CU AWG Libre de halogeno. Incluye: 2 fases + 1 tierra	m	70.72	1 día	lun 31/08/26	mar 1/09/26
81	6.3	Lámpara SYLVANIA-SYLVEO LED 2000 LM NAR 4K Incluye: Una Caja metalica galvanizada 4x4", un Tomacorriente 15v, 15A,	Und.	8.00	2 días	mar 1/09/26	jue 3/09/26
82	6.4	Tablero eléctrico tipo exterior intemperie con Protección 2X40A y fotocontrol temporizado 220V, cumpliendo RETIE. Incluye elementos	Und.	1.00	2 días	jue 3/09/26	sáb 5/09/26
83	6.5	Protección Termomagnética bipolar 2X20A 10 kA Tipo riel.	Und.	2.00	1 día	sáb 5/09/26	sáb 5/09/26
84	6.6	Alambrón de aluminio No 1/0. Incluye: Soporte plástico corto para alambrón y elementos de fijación y ajuste.	m	168.00	7 días	sáb 5/09/26	sáb 12/09/26

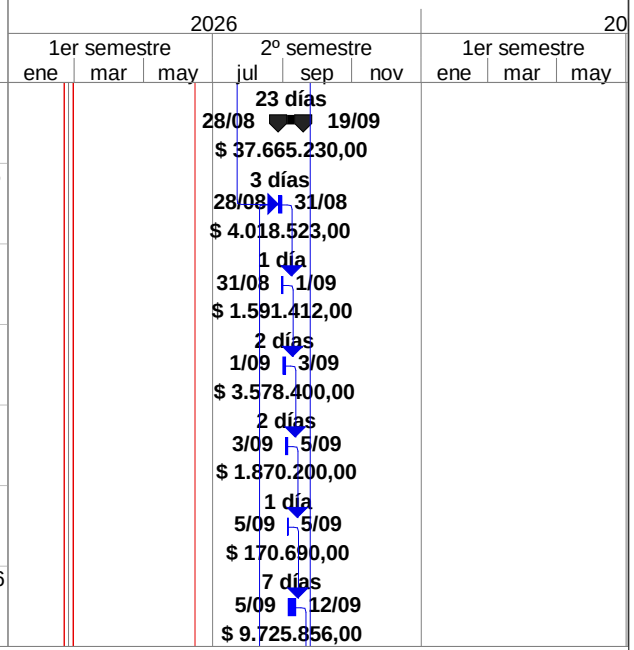

Proyecto: **CUBIERTAS ACEVEDO -H**
Fecha: mar 24/02/26

Tarea		División		Tarea manual	
Tarea crítica		Tareas externas		Sólo duración	
Hito		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual	
Tarea resumida		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin	
Hito resumido		Hito inactivo		Progreso	
Progreso resumido		Resumen inactivo		Fecha límite	


NIT: 900.693.242-3

PACOT INTEGRALES S.A.S
Proponente
Página 12

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal

PROGRAMA DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA
FONPACIFICO - PROCESO No OB-006-2026
FLUJO DE INVERSIÓN

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración	Comienzo	Fin
85	6.7	Cable de cobre desnudo No 2/0	m	112.00	1 día	sáb 12/09/26	lun 14/09/26
86	6.8	Punta captadora aluminio 5/8" X 0,8m roscada Incluye: Base en aluminio, elementos de fijación y ajuste.	Und.	9.00	2 días	lun 14/09/26	mié 16/09/26
87	6.9	Grapa paralela bimetalica para alambrón 1/0. Inlcuye caja raweld 2400 con su respectiva tapa ciega.	Und.	4.00	1 día	mié 16/09/26	jue 17/09/26
88	6.10	Sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 5/8" X 2,4m. Incluye: Caja de inspección premoldeada 40X40X40cm, Soldadura	Und.	5.00	3 días	jue 17/09/26	sáb 19/09/26
89	6.11	Suminsitro e localización de medidor bifasico trifilar.	Und.	1.00	1 día	vie 28/08/26	sáb 29/08/26
90		**CUBIERTA No 3 LA CARBONA**			**173 días**	**jue 7/05/26**	**lun 26/10/26**
91	**1**	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**			**10 días**	**jue 7/05/26**	**dom 17/05/26**

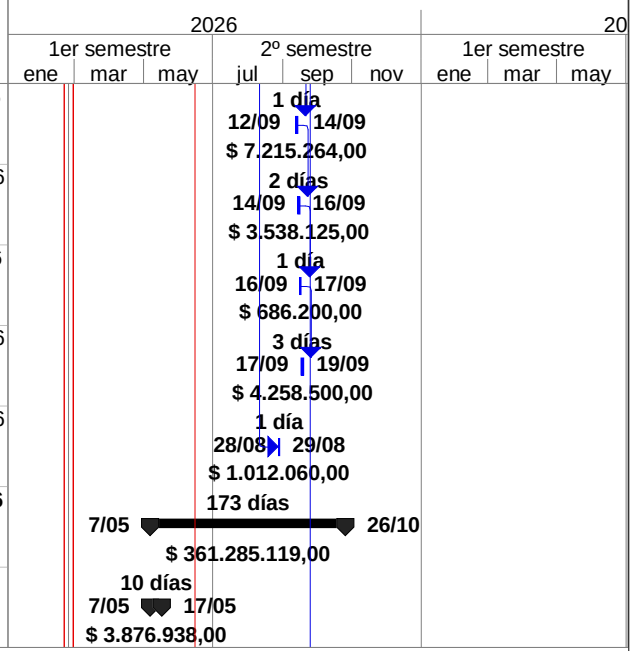

Proyecto: **CUBIERTAS ACEVEDO -H**
Fecha: mar 24/02/26

Tarea		División		Tarea manual	
Tarea crítica		Tareas externas		Sólo duración	
Hito		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual	
Tarea resumida		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin	
Hito resumido		Hito inactivo		Progreso	
Progreso resumido		Resumen inactivo		Fecha límite	


NIT: 900.693.242-3

PACOT INTEGRALES S.A.S
Proponente
Página 13

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal

PROGRAMA DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA
FONPACIFICO - PROCESO No OB-006-2026
FLUJO DE INVERSIÓN

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración	Comienzo	Fin
92	1.1	Localización y replanteo	m2	421.85	7 días	jue 7/05/26	jue 14/05/26
93	1.2	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	m2	43.40	10 días	jue 7/05/26	dom 17/05/26
94	1.3	Desmonte marcos canchas existentes.	Und.	2.00	3 días	lun 11/05/26	jue 14/05/26
95	1.4	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.	Und.	3.00	4 días	dom 10/05/26	jue 14/05/26
96	**2**	**CIMIENTOS**			**64 días**	**jue 14/05/26**	**vie 17/07/26**
97	2.1	Excavación manual para cimentaciónes </= 2 mts	m3	46.77	27 días	jue 14/05/26	mié 10/06/26
98	2.2	Rellenos compactados en recebo seleccionado al 95% PROCTOR	m3	21.12	18 días	sáb 23/05/26	mié 10/06/26

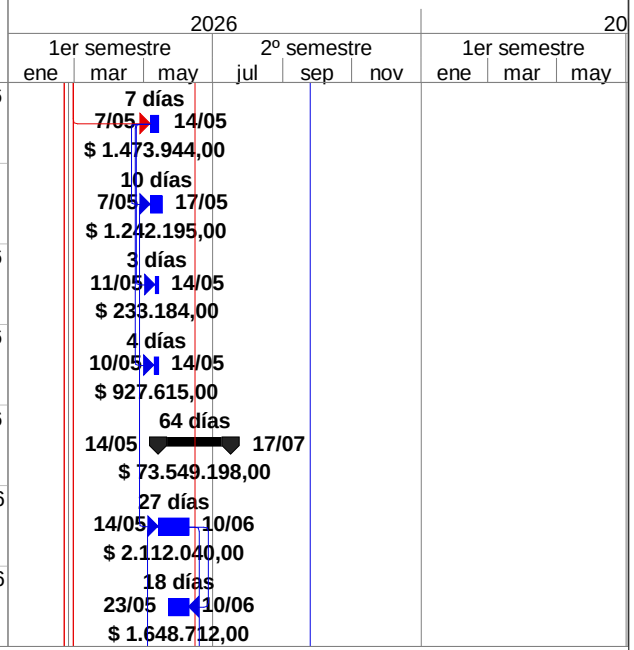

Proyecto: **CUBIERTAS ACEVEDO -H**
Fecha: mar 24/02/26

Tarea		División		Tarea manual	
Tarea crítica		Tareas externas		Sólo duración	
Hito		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual	
Tarea resumida		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin	
Hito resumido		Hito inactivo		Progreso	
Progreso resumido		Resumen inactivo		Fecha límite	


NIT: 900.693.242-3

PACOT INTEGRALES S.A.S
Proponente
Página 14

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal

PROGRAMA DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA
FONPACIFICO - PROCESO No OB-006-2026
FLUJO DE INVERSIÓN

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración	Comienzo	Fin
99	2.4	Concreto de limpieza o solado E= 0,05 en concreto de 1.500 PSI	m2	27.00	7 días	jue 21/05/26	jue 28/05/26
100	2.5	Zapatas en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo	m3	14.85	25 días	jue 28/05/26	lun 22/06/26
101	2.6	Columnas en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo	m3	5.88	25 días	lun 22/06/26	vie 17/07/26
102	2.7	Viga de cimentación en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo	m3	5.88	15 días	jue 4/06/26	vie 19/06/26
103	2.8	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	Kg	5068.64	37 días	jue 21/05/26	sáb 27/06/26
104	2.9	Retiros de material sobrante de excavaciones y escombros	m3	52.88	13 días	mié 10/06/26	mar 23/06/26
105	**3**	**ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA**			**106 días**	**lun 13/07/26**	**lun 26/10/26**

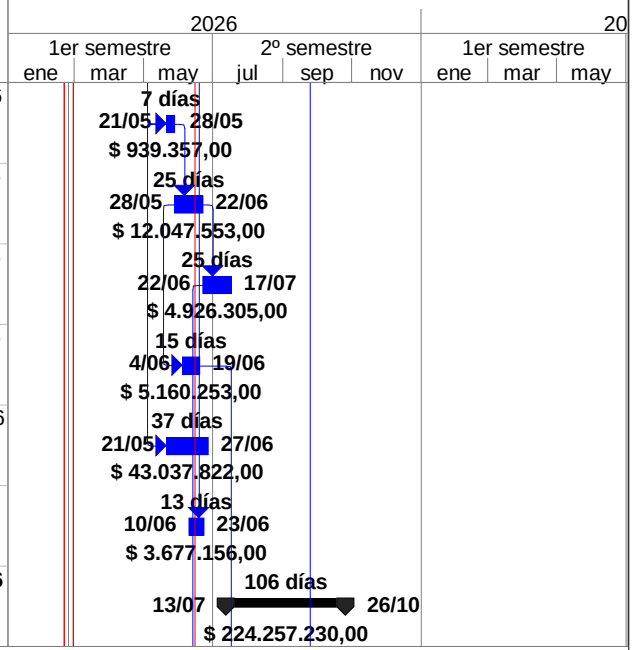

Proyecto: **CUBIERTAS ACEVEDO -H**
Fecha: mar 24/02/26

Tarea		División		Tarea manual	
Tarea crítica		Tareas externas		Sólo duración	
Hito		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual	
Tarea resumida		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin	
Hito resumido		Hito inactivo		Progreso	
Progreso resumido		Resumen inactivo		Fecha límite	


NIT: 900.693.242-3

PACOT INTEGRALES S.A.S
Proponente
Página 15

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal

PROGRAMA DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA
FONPACIFICO - PROCESO No OB-006-2026
FLUJO DE INVERSIÓN

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración	Comienzo	Fin
106	3.1	Suministro e localización Estructura metálica según diseño estructural, en tubería estructural para columnas, domos y viga de	Kg	5546.32	92 días	lun 13/07/26	lun 12/10/26
107	3.2	Correa en perfil metálico rectangular de 10x10 cm Cal.16. Incluye anticorrosivo y pintura esmalte.	m	450.00	72 días	dom 2/08/26	lun 12/10/26
108	3.3	Suministro e instalación cubierta en teja galvanizada Cal.28 Tipo STANDING SEAM ó similar, incluye tornillos de sujeción, color	m2	468.18	59 días	sáb 29/08/26	lun 26/10/26
109	3.4	Platinas de apoyos columnas de 0.50x0.50(m) cajón principal de cubierta en platina 1/2" y 12 pernos grado 8 Ø3/4", incluye, empalme de	Und.	12.00	30 días	dom 16/08/26	mar 15/09/26
110	**4**	**INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS**			**102 días**	**vie 17/07/26**	**lun 26/10/26**
111	4.1	Suministro e instalaciòn Bajante PVC aguas lluvias de 4"	m	43.20	7 días	vie 9/10/26	vie 16/10/26
112	4.2	Abrazadera galvanizada 2" - 4"	Und.	36.00	5 días	dom 11/10/26	vie 16/10/26

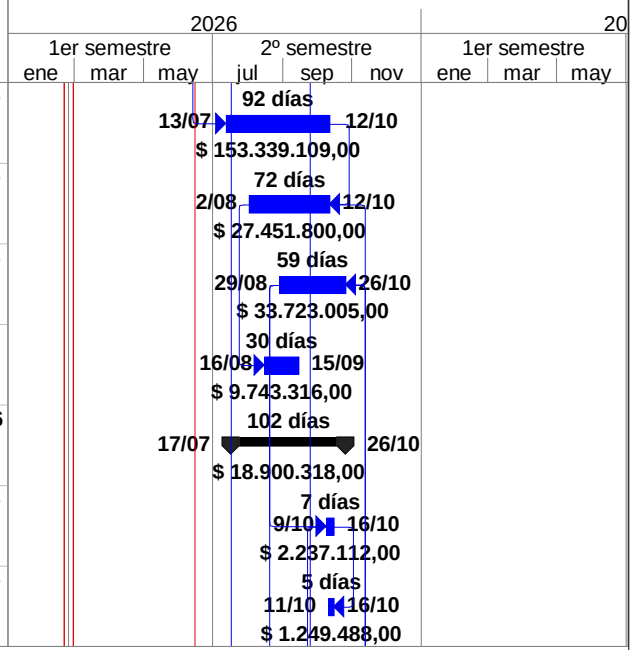

Proyecto: **CUBIERTAS ACEVEDO -H**
Fecha: mar 24/02/26

Tarea	División	Tarea manual	
Tarea crítica	Tareas externas	Sólo duración	
Hito	Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	
Resumen	Agrupar por síntesis	Resumen manual	
Tarea resumida	Tarea inactiva	Sólo el comienzo	
Tarea crítica resumida	Tarea inactiva	Sólo fin	
Hito resumido	Hito inactivo	Progreso	
Progreso resumido	Resumen inactivo	Fecha límite	


NIT: 900.693.242-3

PACOT INTEGRALES S.A.S
Proponente
Página 16

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal

PROGRAMA DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA
FONPACIFICO - PROCESO No OB-006-2026
FLUJO DE INVERSIÓN

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración	Comienzo	Fin
113	4.3	Codo de 45/90 4" PVC SANITARIO	Und.	36.00	6 días	vie 9/10/26	jue 15/10/26
114	4.4	Suministro e Instalación de tubería PVC Aguas Lluvias Ø6"	m	71.60	17 días	vie 17/07/26	lun 3/08/26
115	4.5	Caja de inspección en concreto de 3000 PSI SECC(0,60*0,60*1,00 m) incluye tapa en concreto y refuerzo	Und.	4.00	16 días	lun 3/08/26	mié 19/08/26
116	4.6	Canal en lámina Galvanizada Cal.18 ancho=0.40 metros. H=0.25 metros (Sum. E Inst. Wash Primer + Esmalte + Anclaje	m	60.00	38 días	vie 18/09/26	lun 26/10/26
117	4.7	Suministro e Instalación de tubería PVC Sanitaria Corrugada Ø8"	m	3.00	4 días	sáb 15/08/26	mié 19/08/26
118	4.9	Excavacion manual Tipo zanja </= 0.9 mts -- e=0,50 m	M3	33.57	13 días	dom 2/08/26	sáb 15/08/26
119	4.10	Rellenos en recebo seleccionado de la misma excavacion compactado mecanico	M3	27.46	7 días	sáb 15/08/26	sáb 22/08/26

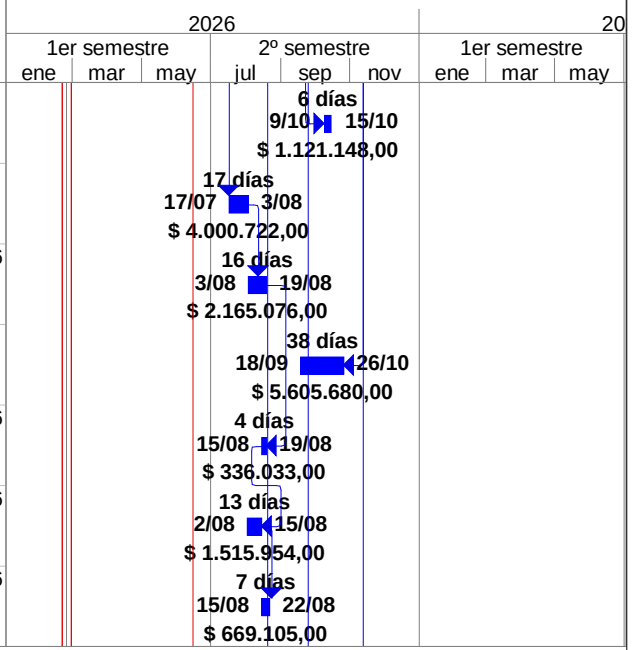

Proyecto: **CUBIERTAS ACEVEDO -H**
Fecha: mar 24/02/26

Tarea	División	Tarea manual	
Tarea crítica	Tareas externas	Sólo duración	
Hito	Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	
Resumen	Agrupar por síntesis	Resumen manual	
Tarea resumida	Tarea inactiva	Sólo el comienzo	
Tarea crítica resumida	Tarea inactiva	Sólo fin	
Hito resumido	Hito inactivo	Progreso	
Progreso resumido	Resumen inactivo	Fecha límite	


NIT: 900.693.242-3

PACOT INTEGRALES S.A.S
Proponente
Página 17

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal

PROGRAMA DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA
FONPACIFICO - PROCESO No OB-006-2026
FLUJO DE INVERSIÓN

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración	Comienzo	Fin
120	**5**	**PISOS Y ACABADOS**			**23 días**	**sáb 3/10/26**	**lun 26/10/26**
121	5.1	Placa de contrapiso en concreto de 3000 psi e= 0,10 cm con malla electrosoldada de 0,15 x 0,15 de 5.0 mm	m2	43.40	23 días	sáb 3/10/26	lun 26/10/26
122	**6**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**			**23 días**	**vie 25/09/26**	**dom 18/10/26**
123	6.1	Tuberia emt 3/4", incluye accesorios de fijación y ajustes para tubería.	m	76.12	3 días	vie 25/09/26	lun 28/09/26
124	6.2	Cable eléctrico No 10 CU AWG Libre de halogeno. Incluye: 2 fases + 1 tierra	m	76.12	1 día	mar 29/09/26	mar 29/09/26
125	6.3	Lámpara SYLVANIA-SYLVEO LED 2000 LM NAR 4K Incluye: Una Caja metalica galvanizada 4x4", un Tomacorriente 15v, 15A,	Und.	8.00	2 días	mar 29/09/26	jue 1/10/26
126	6.4	Tablero eléctrico tipo exterior intemperie con Protección 2X40A y fotocontrol temporizado 220V, cumpliendo RETIE. Incluye elementos	Und.	1.00	2 días	jue 1/10/26	sáb 3/10/26

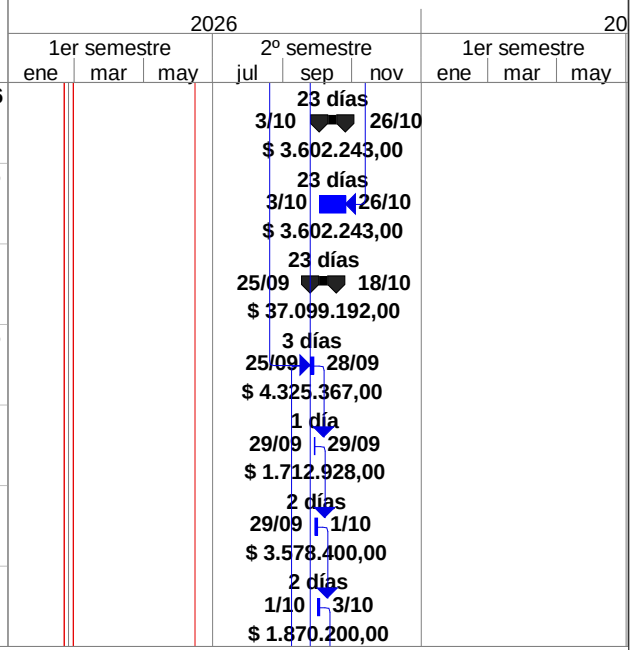

Proyecto: **CUBIERTAS ACEVEDO -H**
Fecha: mar 24/02/26

Tarea		División		Tarea manual	
Tarea crítica		Tareas externas		Sólo duración	
Hito		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual	
Tarea resumida		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin	
Hito resumido		Hito inactivo		Progreso	
Progreso resumido		Resumen inactivo		Fecha límite	


NIT: 900.693.242-3

PACOT INTEGRALES S.A.S
Proponente
Página 18

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal

PROGRAMA DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA
FONPACIFICO - PROCESO No OB-006-2026
FLUJO DE INVERSIÓN

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración	Comienzo	Fin
127	6.5	Protección Termomagnética bipolar 2X20A 10 kA Tipo riel.	Und.	2.00	1 día	sáb 3/10/26	dom 4/10/26
128	6.6	Alambrón de aluminio No 1/0. Incluye: Soporte plástico corto para alambrón y elementos de fijación y ajuste.	m	157.50	7 días	dom 4/10/26	dom 11/10/26
129	6.7	Cable de cobre desnudo No 2/0	m	106.00	1 día	dom 11/10/26	lun 12/10/26
130	6.8	Punta captadora aluminio 5/8" X 0,8m roscada Incluye: Base en aluminio, elementos de fijación y ajuste.	Und.	9.00	2 días	lun 12/10/26	mié 14/10/26
131	6.9	Grapa paralela bimetalica para alambrón 1/0. Inlcuye caja raweld 2400 con su respectiva tapa ciega.	Und.	4.00	1 día	mié 14/10/26	jue 15/10/26
132	6.10	Sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 5/8" X 2,4m. Incluye: Caja de inspección premoldeada 40X40X40cm, Soldadura	Und.	5.00	3 días	jue 15/10/26	dom 18/10/26
133	6.11	Suminsitro e localización de medidor bifasico trifilar.	Und.	1.00	1 día	vie 25/09/26	sáb 26/09/26

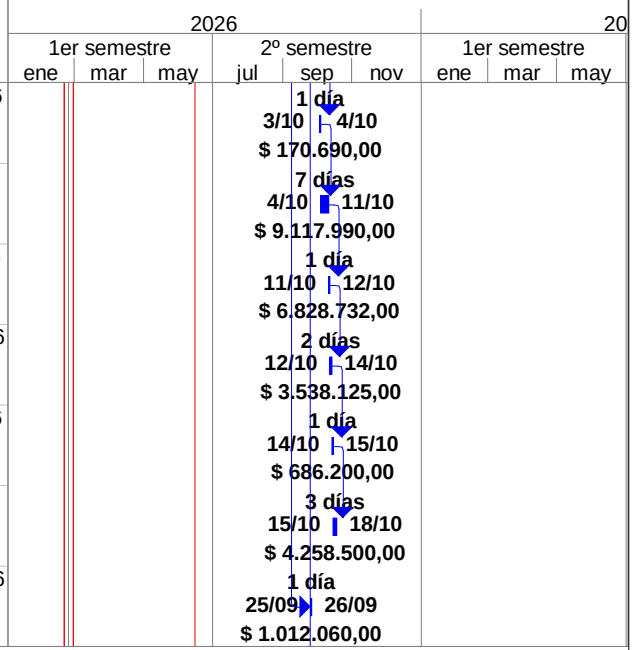

Proyecto: **CUBIERTAS ACEVEDO -H**
Fecha: mar 24/02/26

Tarea	División	Tarea manual
Tarea crítica	Tareas externas	Sólo duración
Hito	Resumen del proyecto	Informe de resumen manual
Resumen	Agrupar por síntesis	Resumen manual
Tarea resumida	Tarea inactiva	Sólo el comienzo
Tarea crítica resumida	Tarea inactiva	Sólo fin
Hito resumido	Hito inactivo	Progreso
Progreso resumido	Resumen inactivo	Fecha límite


NIT: 900.693.242-3

PACOT INTEGRALES S.A.S
Proponente
Página 19

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal

PROGRAMA DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA
FONPACIFICO - PROCESO No OB-006-2026
FLUJO DE INVERSIÓN

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración	Comienzo	Fin
134		**CUBIERTA No 4 VERSALLES**			**179 días**	**lun 15/06/26**	**jue 10/12/26**
135	**1**	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**			**19 días**	**lun 15/06/26**	**sáb 4/07/26**
136	1.1	Localización y replanteo	m2	540.00	9 días	lun 15/06/26	mié 24/06/26
137	1.2	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	m2	84.55	19 días	lun 15/06/26	sáb 4/07/26
138	1.3	Desmonte marcos canchas existentes.	Und.	2.00	3 días	vie 19/06/26	lun 22/06/26
139	1.4	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.	Und.	3.00	4 días	jue 18/06/26	lun 22/06/26
140	**2**	**CIMIENTOS**			**64 días**	**lun 22/06/26**	**mar 25/08/26**

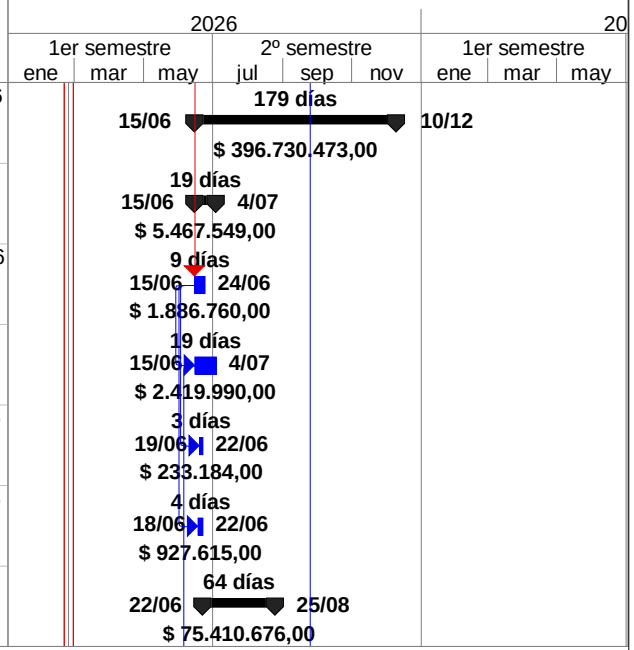

Proyecto: **CUBIERTAS ACEVEDO -H**
Fecha: mar 24/02/26

Tarea		División		Tarea manual	
Tarea crítica		Tareas externas		Sólo duración	
Hito		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual	
Tarea resumida		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin	
Hito resumido		Hito inactivo		Progreso	
Progreso resumido		Resumen inactivo		Fecha límite	


NIT: 900.693.242-3

PACOT INTEGRALES S.A.S
Proponente
Página 20

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal

PROGRAMA DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA
FONPACIFICO - PROCESO No OB-006-2026
FLUJO DE INVERSIÓN

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración	Comienzo	Fin
141	2.1	Excavación manual para cimentaciónes </= 2 mts	m3	46.89	27 días	lun 22/06/26	dom 19/07/26
142	2.2	Rellenos compactados en recebo seleccionado al 95% PROCTOR	m3	21.12	18 días	mié 1/07/26	dom 19/07/26
143	2.4	Concreto de limpieza o solado E= 0,05 en concreto de 1.500 PSI	m2	27.00	7 días	lun 29/06/26	lun 6/07/26
144	2.5	Zapatas en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo	m3	14.85	25 días	lun 6/07/26	vie 31/07/26
145	2.6	Columnas en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo	m3	5.88	25 días	vie 31/07/26	mar 25/08/26
146	2.7	Viga de cimentación en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo	m3	6.00	16 días	lun 13/07/26	mié 29/07/26
147	2.8	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	Kg	5261.02	38 días	lun 29/06/26	jue 6/08/26

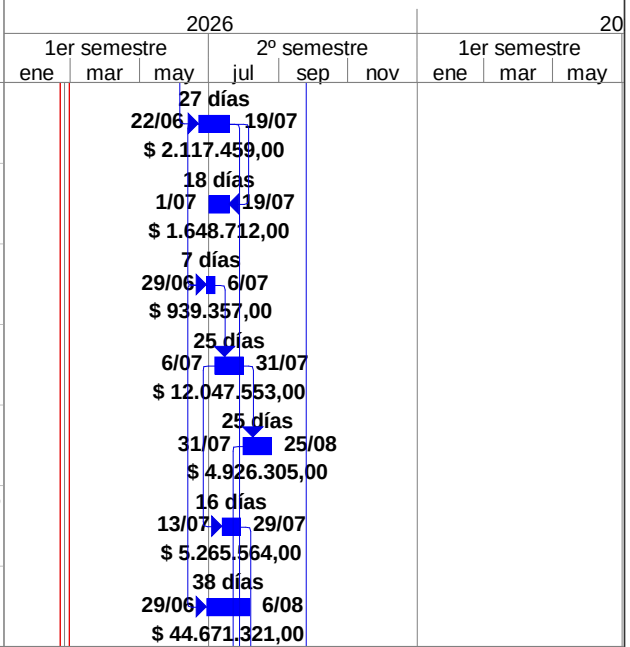

Proyecto: **CUBIERTAS ACEVEDO -H**
Fecha: mar 24/02/26

Tarea	División	Tarea manual
Tarea crítica	Tareas externas	Sólo duración
Hito	Resumen del proyecto	Informe de resumen manual
Resumen	Agrupar por síntesis	Resumen manual
Tarea resumida	Tarea inactiva	Sólo el comienzo
Tarea crítica resumida	Tarea inactiva	Sólo fin
Hito resumido	Hito inactivo	Progreso
Progreso resumido	Resumen inactivo	Fecha límite


NIT: 900.693.242-3

PACOT INTEGRALES S.A.S
Proponente
Página 21

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal

PROGRAMA DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA
FONPACIFICO - PROCESO No OB-006-2026
FLUJO DE INVERSIÓN

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración	Comienzo	Fin
148	2.9	Retiros de material sobrante de excavaciones y escombros	m3	54.56	14 días	dom 19/07/26	dom 2/08/26
149	**3**	**ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA**			**112 días**	**vie 21/08/26**	**jue 10/12/26**
150	3.1	Suministro e localización Estructura metálica según diseño estructural, en tubería estructural para columnas, domos y viga de	Kg	5906.05	98 días	vie 21/08/26	jue 26/11/26
151	3.2	Correa en perfil metálico rectangular de 10x10 cm Cal.16. Incluye anticorrosivo y pintura esmalte.	m	570.00	91 días	vie 28/08/26	jue 26/11/26
152	3.3	Suministro e instalación cubierta en teja galvanizada Cal.28 Tipo STANDING SEAM ó similar, incluye tornillos de sujeción, color	m2	561.39	56 días	jue 15/10/26	jue 10/12/26
153	3.4	Platinas de apoyos columnas de 0.50x0.50(m) cajón principal de cubierta en platina 1/2" y 12 pernos grado 8 Ø3/4", incluye, empalme de	Und.	12.00	30 días	mar 27/10/26	jue 26/11/26
154	**4**	**INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS**			**135 días**	**mié 29/07/26**	**jue 10/12/26**

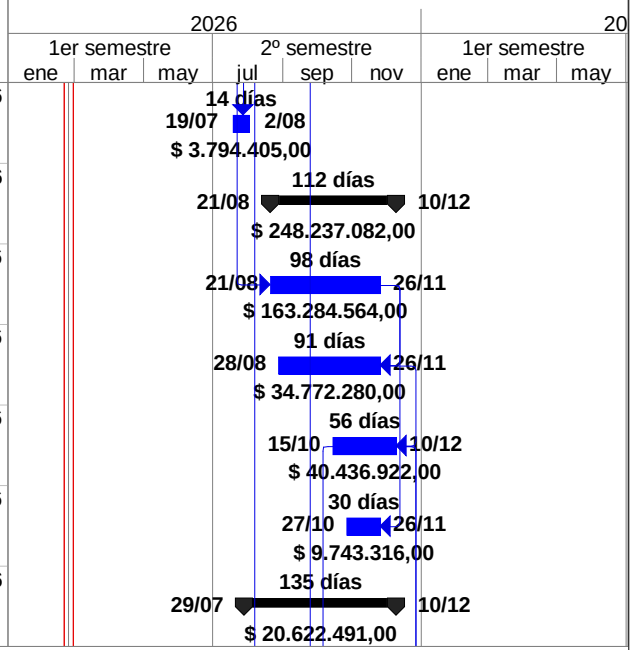

Proyecto: **CUBIERTAS ACEVEDO -H**
Fecha: mar 24/02/26

Tarea		División		Tarea manual	
Tarea crítica		Tareas externas		Sólo duración	
Hito		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual	
Tarea resumida		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin	
Hito resumido		Hito inactivo		Progreso	
Progreso resumido		Resumen inactivo		Fecha límite	


NIT: 900.693.242-3

PACOT INTEGRALES S.A.S
Proponente
Página 22

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal

PROGRAMA DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA
FONPACIFICO - PROCESO No OB-006-2026
FLUJO DE INVERSIÓN

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración	Comienzo	Fin
155	4.1	Suministro e instalaciòn Bajante PVC aguas lluvias de 4"	m	43.20	7 días	jue 26/11/26	jue 3/12/26
156	4.2	Abrazadera galvanizada 2" - 4"	Und.	36.00	5 días	sáb 28/11/26	jue 3/12/26
157	4.3	Codo de 45/90 4" PVC SANITARIO	Und.	36.00	6 días	jue 26/11/26	mié 2/12/26
158	4.4	Suministro e Instalación de tubería PVC Aguas Lluvias Ø6"	m	77.00	18 días	mié 29/07/26	dom 16/08/26
159	4.5	Caja de inspección en concreto de 3000 PSI SECC(0,60*0,60*1,00 m) incluye tapa en concreto y refuerzo	Und.	4.00	16 días	dom 16/08/26	mar 1/09/26
160	4.6	Canal en lámina Galvanizada Cal.18 ancho=0.40 metros. H=0.25 metros (Sum. E Inst. Wash Primer + Esmalte + Anclaje	m	60.00	38 días	lun 2/11/26	jue 10/12/26
161	4.7	Suministro e Instalación de tubería PVC Sanitaria Corrugada Ø8"	m	12.00	13 días	vie 27/11/26	jue 10/12/26

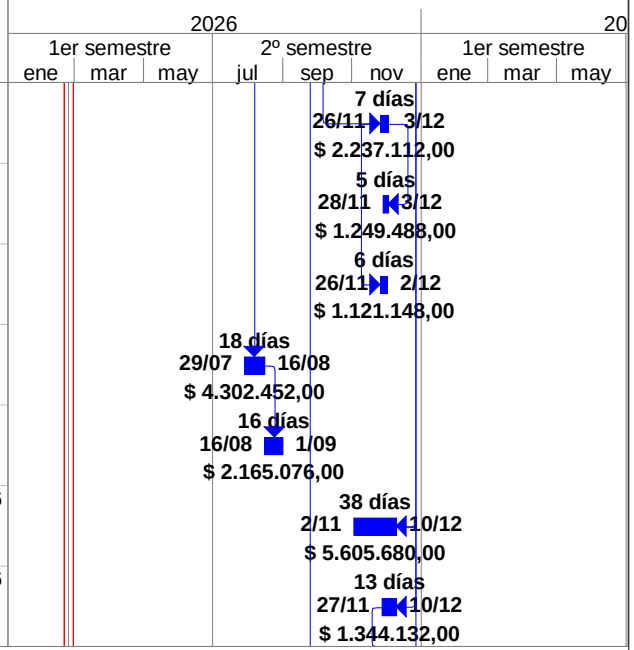

Proyecto: **CUBIERTAS ACEVEDO -H**
Fecha: mar 24/02/26

Tarea	División	Tarea manual	
Tarea crítica	Tareas externas	Sólo duración	
Hito	Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	
Resumen	Agrupar por síntesis	Resumen manual	
Tarea resumida	Tarea inactiva	Sólo el comienzo	
Tarea crítica resumida	Tarea inactiva	Sólo fin	
Hito resumido	Hito inactivo	Progreso	
Progreso resumido	Resumen inactivo	Fecha límite	


NIT: 900.693.242-3

PACOT INTEGRALES S.A.S
Proponente
Página 23

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal

PROGRAMA DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA
FONPACIFICO - PROCESO No OB-006-2026
FLUJO DE INVERSIÓN

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración	Comienzo	Fin
162	4.9	Excavacion manual Tipo zanja </= 0.9 mts -- e=0,50 m	M3	40.05	16 días	mié 11/11/26	vie 27/11/26
163	4.10	Rellenos en recebo seleccionado de la misma excavacion compactado mecanico	M3	32.38	9 días	vie 27/11/26	dom 6/12/26
164	**5**	**PISOS Y ACABADOS**			**57 días**	**mié 14/10/26**	**jue 10/12/26**
165	5.1	Placa de contrapiso en concreto de 3000 psi e= 0,10 cm con malla electrosoldada de 0,15 x 0,15 de 5.0 mm	m2	112.38	57 días	mié 14/10/26	jue 10/12/26
166	**6**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**			**23 días**	**sáb 5/09/26**	**lun 28/09/26**
167	6.1	Tuberia emt 3/4", incluye accesorios de fijación y ajustes para tubería.	m	70.72	3 días	sáb 5/09/26	mar 8/09/26
168	6.2	Cable eléctrico No 10 CU AWG Libre de halogeno. Incluye: 2 fases + 1 tierra	m	70.72	1 día	mar 8/09/26	mié 9/09/26

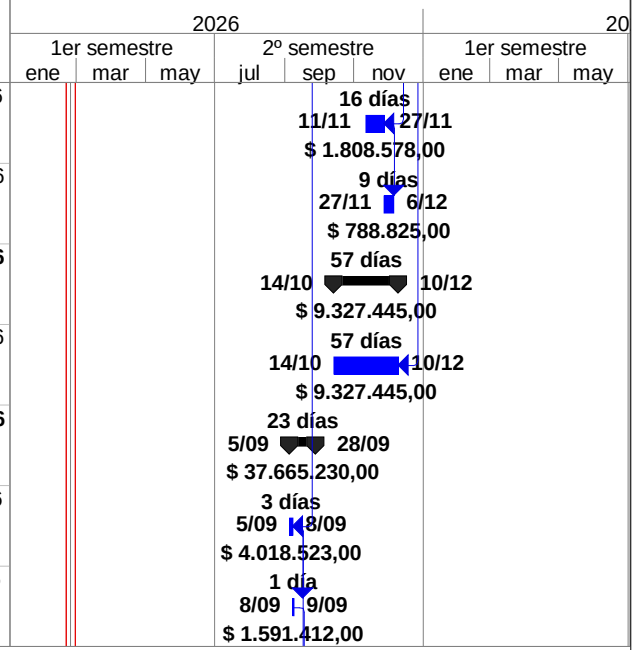

Proyecto: **CUBIERTAS ACEVEDO -H**
Fecha: mar 24/02/26

Tarea		División		Tarea manual	
Tarea crítica		Tareas externas		Sólo duración	
Hito		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual	
Tarea resumida		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin	
Hito resumido		Hito inactivo		Progreso	
Progreso resumido		Resumen inactivo		Fecha límite	


NIT: 900.693.242-3

PACOT INTEGRALES S.A.S
Proponente
Página 24

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal

PROGRAMA DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA
FONPACIFICO - PROCESO No OB-006-2026
FLUJO DE INVERSIÓN

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración	Comienzo	Fin
169	6.3	Lámpara SYLVANIA-SYLVEO LED 2000 LM NAR 4K Incluye: Una Caja metalica galvanizada 4x4", un Tomacorriente 15v, 15A,	Und.	8.00	2 días	mié 9/09/26	vie 11/09/26
170	6.4	Tablero eléctrico tipo exterior intemperie con Protección 2X40A y fotocontrol temporizado 220V, cumpliendo RETIE. Incluye elementos	Und.	1.00	2 días	vie 11/09/26	sáb 12/09/26
171	6.5	Protección Termomagnética bipolar 2X20A 10 kA Tipo riel.	Und.	2.00	1 día	sáb 12/09/26	lun 14/09/26
172	6.6	Alambrón de aluminio No 1/0. Incluye: Soporte plástico corto para alambrón y elementos de fijación y ajuste.	m	168.00	7 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26
173	6.7	Cable de cobre desnudo No 2/0	m	112.00	1 día	lun 21/09/26	mar 22/09/26
174	6.8	Punta captadora aluminio 5/8" X 0,8m roscada Incluye: Base en aluminio, elementos de fijación y ajuste.	Und.	9.00	2 días	mar 22/09/26	mié 23/09/26
175	6.9	Grapa paralela bimetalica para alambrón 1/0. Inlcuye caja raweld 2400 con su respectiva tapa ciega.	Und.	4.00	1 día	mié 23/09/26	jue 24/09/26

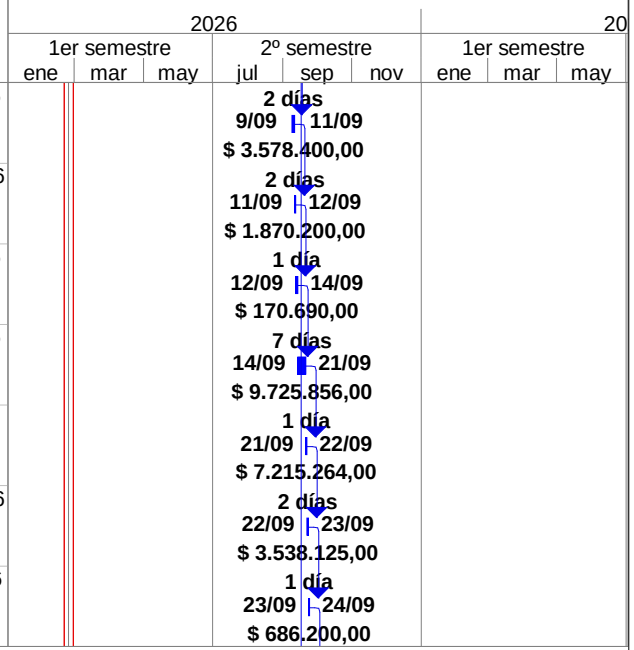

Proyecto: **CUBIERTAS ACEVEDO -H**
Fecha: mar 24/02/26

Tarea		División		Tarea manual	
Tarea crítica		Tareas externas		Sólo duración	
Hito		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual	
Tarea resumida		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin	
Hito resumido		Hito inactivo		Progreso	
Progreso resumido		Resumen inactivo		Fecha límite	


NIT: 900.693.242-3

PACOT INTEGRALES S.A.S
Proponente
Página 25

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal

PROGRAMA DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA
FONPACIFICO - PROCESO No OB-006-2026
FLUJO DE INVERSIÓN

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración	Comienzo	Fin
176	6.10	Sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 5/8" X 2,4m. Incluye: Caja de inspección premoldeada 40X40X40cm, Soldadura	Und.	5.00	3 días	jue 24/09/26	lun 28/09/26
177	6.11	Suminsitro e localización de medidor bifasico trifilar.	Und.	1.00	1 día	mar 8/09/26	mié 9/09/26
178		**CUBIERTA 5 PLAYITAS**			**206 días**	**lun 6/07/26**	**mié 27/01/27**
179	**1**	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**			**11 días**	**lun 6/07/26**	**vie 17/07/26**
180	1.1	Localización y replanteo	m2	518.10	9 días	lun 6/07/26	mié 15/07/26
181	1.2	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	m2	48.30	11 días	lun 6/07/26	vie 17/07/26
182	1.3	Desmonte marcos canchas existentes.	Und.	2.00	3 días	vie 10/07/26	lun 13/07/26

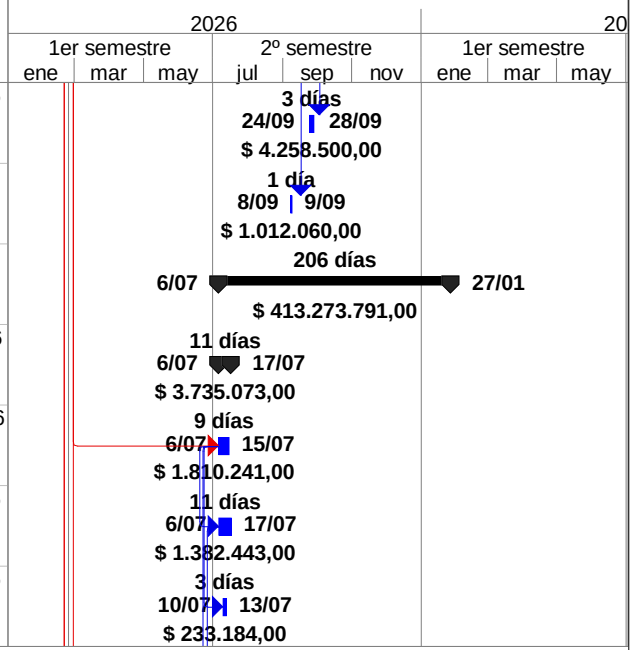

Proyecto: **CUBIERTAS ACEVEDO -H**
Fecha: mar 24/02/26

Tarea	División	Tarea manual
Tarea crítica	Tareas externas	Sólo duración
Hito	Resumen del proyecto	Informe de resumen manual
Resumen	Agrupar por síntesis	Resumen manual
Tarea resumida	Tarea inactiva	Sólo el comienzo
Tarea crítica resumida	Tarea inactiva	Sólo fin
Hito resumido	Hito inactivo	Progreso
Progreso resumido	Resumen inactivo	Fecha límite


NIT: 900.693.242-3

PACOT INTEGRALES S.A.S
Proponente
Página 26

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal

PROGRAMA DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA
FONPACIFICO - PROCESO No OB-006-2026
FLUJO DE INVERSIÓN

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración	Comienzo	Fin
183	1.4	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.	Und.	1.00	2 días	jue 9/07/26	sáb 11/07/26
184	**2**	**CIMIENTOS**			**72 días**	**lun 13/07/26**	**mié 23/09/26**
185	2.1	Excavación manual para cimentaciónes </= 2 mts	m3	53.87	31 días	lun 13/07/26	jue 13/08/26
186	2.2	Rellenos compactados en recebo seleccionado al 95% PROCTOR	m3	41.97	23 días	mar 21/07/26	jue 13/08/26
187	2.4	Concreto de limpieza o solado E= 0,05 en concreto de 1.500 PSI	m2	31.50	8 días	lun 20/07/26	mar 28/07/26
188	2.5	Zapatas en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo	m3	17.33	29 días	mar 28/07/26	mié 26/08/26
189	2.6	Columnas en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo	m3	6.86	28 días	mié 26/08/26	mié 23/09/26

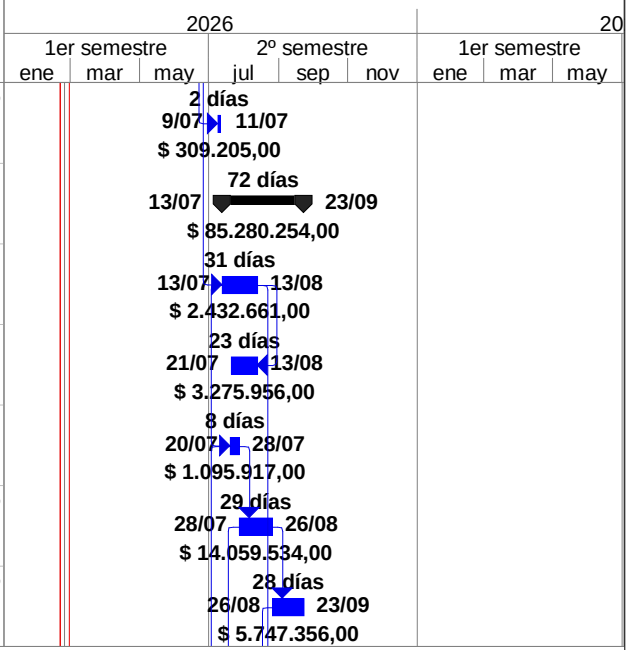


Proyecto: **CUBIERTAS ACEVEDO -H**
Fecha: mar 24/02/26

Tarea		División		Tarea manual	
Tarea crítica		Tareas externas		Sólo duración	
Hito		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual	
Tarea resumida		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin	
Hito resumido		Hito inactivo		Progreso	
Progreso resumido		Resumen inactivo		Fecha límite	

PROGRAMA DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA
FONPACIFICO - PROCESO No OB-006-2026
FLUJO DE INVERSIÓN

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración	Comienzo	Fin
190	2.7	Viga de cimentación en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo	m3	6.19	16 días	mar 4/08/26	jue 20/08/26
191	2.8	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	Kg	5774.35	41 días	lun 20/07/26	dom 30/08/26
192	2.9	Retiros de material sobrante de excavaciones y escombros	m3	60.49	15 días	jue 13/08/26	vie 28/08/26
193	**3**	**ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA**			**134 días**	**mié 16/09/26**	**mié 27/01/27**
194	3.1	Suministro e localización Estructura metálica según diseño estructural, en tubería estructural para columnas, domos y viga de	Kg	6397.63	106 días	mié 16/09/26	mié 30/12/26
195	3.2	Correa en perfil metálico rectangular de 10x10 cm Cal.16. Incluye anticorrosivo y pintura esmalte.	m	561.00	90 días	jue 15/10/26	mié 13/01/27
196	3.3	Suministro e instalación cubierta en teja galvanizada Cal.28 Tipo STANDING SEAM ó similar, incluye tornillos de sujeción, color	m2	537.04	67 días	sáb 21/11/26	mié 27/01/27

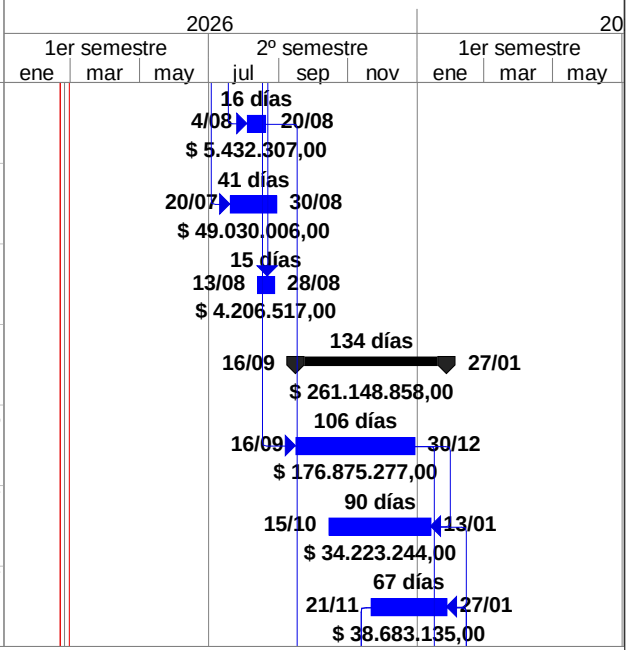

Proyecto: **CUBIERTAS ACEVEDO -H**
Fecha: mar 24/02/26

Tarea	División	Tarea manual
Tarea crítica	Tareas externas	Sólo duración
Hito	Resumen del proyecto	Informe de resumen manual
Resumen	Agrupar por síntesis	Resumen manual
Tarea resumida	Tarea inactiva	Sólo el comienzo
Tarea crítica resumida	Tarea inactiva	Sólo fin
Hito resumido	Hito inactivo	Progreso
Progreso resumido	Resumen inactivo	Fecha límite


NIT: 900.693.242-3

PACOT INTEGRALES S.A.S
Proponente
Página 28

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal

PROGRAMA DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA
FONPACIFICO - PROCESO No OB-006-2026
FLUJO DE INVERSIÓN

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración	Comienzo	Fin
197	3.4	Platinas de apoyos columnas de 0.50x0.50(m) cajón principal de cubierta en platina 1/2" y 12 pernos grado 8 Ø3/4", incluye, empalme de	Und.	14.00	35 días	mié 25/11/26	mié 30/12/26
198	**4**	**INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS**			**134 días**	**mié 16/09/26**	**mié 27/01/27**
199	4.1	Suministro e instalaciòn Bajante PVC aguas lluvias de 4"	m	57.60	10 días	sáb 2/01/27	mar 12/01/27
200	4.2	Abrazadera galvanizada 2" - 4"	Und.	34.59	5 días	jue 7/01/27	mar 12/01/27
201	4.3	Codo de 45/90 4" PVC SANITARIO	Und.	48.00	8 días	lun 4/01/27	mar 12/01/27
202	4.4	Suministro e Instalación de tubería PVC Aguas Lluvias Ø6"	m	78.00	18 días	jue 17/09/26	dom 4/10/26
203	4.5	Caja de inspección en concreto de 3000 PSI SECC(0,60*0,60*1,00 m) incluye tapa en concreto y refuerzo	Und.	4.00	16 días	dom 4/10/26	mar 20/10/26

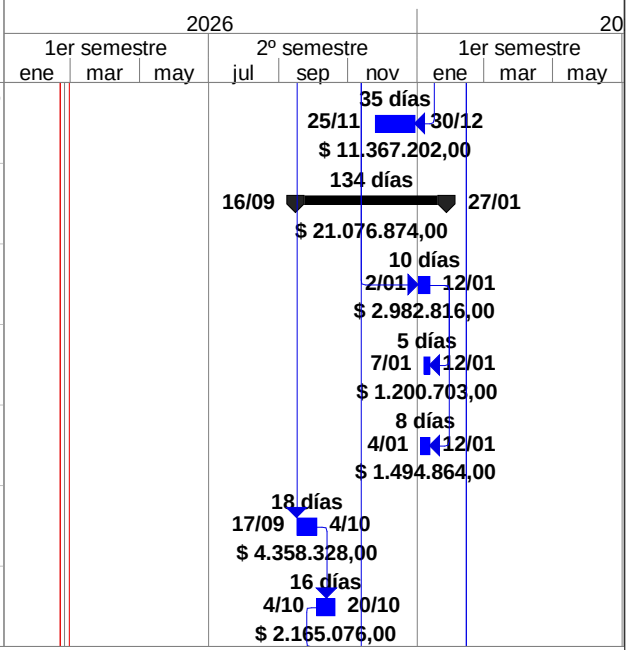

Proyecto: **CUBIERTAS ACEVEDO -H**
Fecha: mar 24/02/26

Tarea	División	Tarea manual	
Tarea crítica	Tareas externas	Sólo duración	
Hito	Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	
Resumen	Agrupar por síntesis	Resumen manual	
Tarea resumida	Tarea inactiva	Sólo el comienzo	
Tarea crítica resumida	Tarea inactiva	Sólo fin	
Hito resumido	Hito inactivo	Progreso	
Progreso resumido	Resumen inactivo	Fecha límite	


NIT: 900.693.242-3

PACOT INTEGRALES S.A.S
Proponente
Página 29

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal

PROGRAMA DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA
FONPACIFICO - PROCESO No OB-006-2026
FLUJO DE INVERSIÓN

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración	Comienzo	Fin
204	4.6	Canal en lámina Galvanizada Cal.18 ancho=0.40 metros. H=0.25 metros (Sum. E Inst. Wash Primer + Esmalte + Anclaje	m	66.00	41 días	jue 17/12/26	mié 27/01/27
205	4.7	Suministro e Instalación de tubería PVC Sanitaria Corrugada Ø8"	m	3.00	4 días	mié 30/09/26	dom 4/10/26
206	4.9	Excavacion manual Tipo zanja </= 0.9 mts -- e=0,50 m	M3	36.45	15 días	mié 16/09/26	mié 30/09/26
207	4.10	Rellenos en recebo seleccionado de la misma excavacion compactado mecanico	M3	29.83	8 días	mié 30/09/26	jue 8/10/26
208	**5**	**PISOS Y ACABADOS**			**25 días**	**sáb 2/01/27**	**mié 27/01/27**
209	5.1	Placa de contrapiso en concreto de 3000 psi e= 0,10 cm con malla electrosoldada de 0,15 x 0,15 de 5.0 mm	m2	48.30	25 días	sáb 2/01/27	mié 27/01/27
210	**6**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**			**23 días**	**sáb 19/12/26**	**lun 11/01/27**

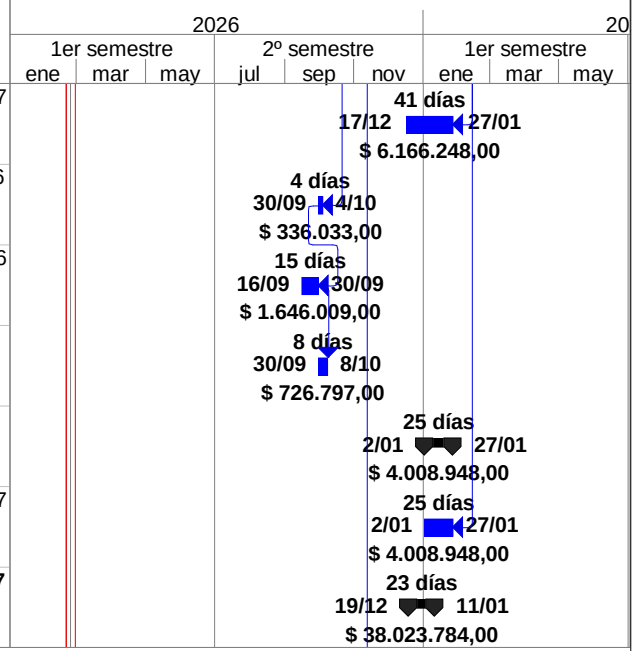

Proyecto: **CUBIERTAS ACEVEDO -H**
Fecha: mar 24/02/26

Tarea		División		Tarea manual	
Tarea crítica		Tareas externas		Sólo duración	
Hito		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual	
Tarea resumida		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin	
Hito resumido		Hito inactivo		Progreso	
Progreso resumido		Resumen inactivo		Fecha límite	


NIT: 900.693.242-3

PACOT INTEGRALES S.A.S
Proponente
Página 30

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal

PROGRAMA DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA
FONPACIFICO - PROCESO No OB-006-2026
FLUJO DE INVERSIÓN

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración	Comienzo	Fin
211	6.1	Tuberia emt 3/4", incluye accesorios de fijación y ajustes para tubería.	m	75.24	3 días	sáb 19/12/26	mar 22/12/26
212	6.2	Cable eléctrico No 10 CU AWG Libre de halogeno. Incluye: 2 fases + 1 tierra	m	75.24	1 día	mar 22/12/26	mié 23/12/26
213	6.3	Lámpara SYLVANIA-SYLVEO LED 2000 LM NAR 4K Incluye: Una Caja metalica galvanizada 4x4", un Tomacorriente 15v, 15A,	Und.	8.00	2 días	mié 23/12/26	vie 25/12/26
214	6.4	Tablero eléctrico tipo exterior intemperie con Protección 2X40A y fotocontrol temporizado 220V, cumpliendo RETIE. Incluye elementos	Und.	1.00	2 días	vie 25/12/26	dom 27/12/26
215	6.5	Protección Termomagnética bipolar 2X20A 10 kA Tipo riel.	Und.	2.00	1 día	dom 27/12/26	lun 28/12/26
216	6.6	Alambrón de aluminio No 1/0. Incluye: Soporte plástico corto para alambrón y elementos de fijación y ajuste.	m	168.00	7 días	lun 28/12/26	lun 4/01/27
217	6.7	Cable de cobre desnudo No 2/0	m	112.00	1 día	lun 4/01/27	mar 5/01/27

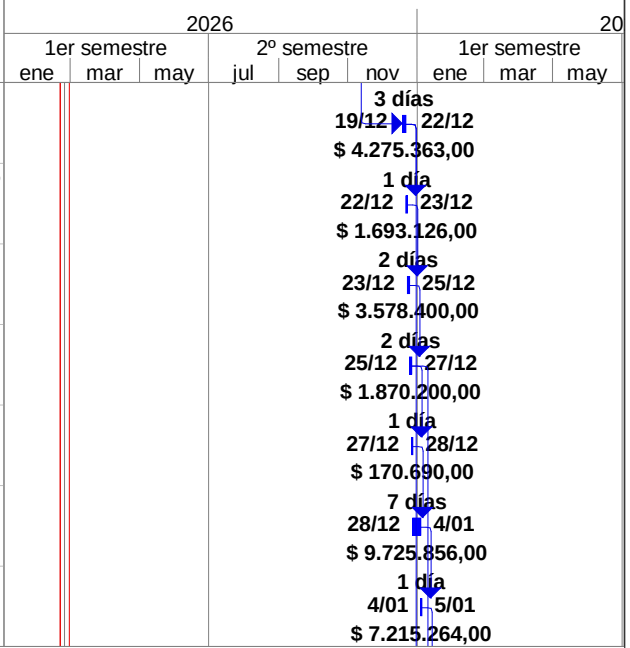

Proyecto: **CUBIERTAS ACEVEDO -H**
Fecha: mar 24/02/26

Tarea	División	Tarea manual
Tarea crítica	Tareas externas	Sólo duración
Hito	Resumen del proyecto	Informe de resumen manual
Resumen	Agrupar por síntesis	Resumen manual
Tarea resumida	Tarea inactiva	Sólo el comienzo
Tarea crítica resumida	Tarea inactiva	Sólo fin
Hito resumido	Hito inactivo	Progreso
Progreso resumido	Resumen inactivo	Fecha límite


NIT: 900.693.242-3

PACOT INTEGRALES S.A.S
Proponente
Página 31

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal

PROGRAMA DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA
FONPACIFICO - PROCESO No OB-006-2026
FLUJO DE INVERSIÓN

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración	Comienzo	Fin
218	6.8	Punta captadora aluminio 5/8" X 0,8m roscada Incluye: Base en aluminio, elementos de fijación y ajuste.	Und.	9.00	2 días	mar 5/01/27	jue 7/01/27
219	6.9	Grapa paralela bimetalica para alambrón 1/0. Inlcuye caja raweld 2400 con su respectiva tapa ciega.	Und.	4.00	1 día	jue 7/01/27	vie 8/01/27
220	6.10	Sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 5/8" X 2,4m. Incluye: Caja de inspección premoldeada 40X40X40cm, Soldadura	Und.	5.00	3 días	vie 8/01/27	lun 11/01/27
221	6.11	Suminsitro e localización de medidor bifasico trifilar.	Und.	1.00	1 día	mar 22/12/26	mié 23/12/26
222		**CUBIERTA No 6 REICITO**			**215 días**	**mié 5/08/26**	**dom 7/03/27**
223	**1**	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**			**9 días**	**mié 5/08/26**	**vie 14/08/26**
224	1.1	Localización y replanteo	m2	382.50	6 días	mié 5/08/26	mar 11/08/26

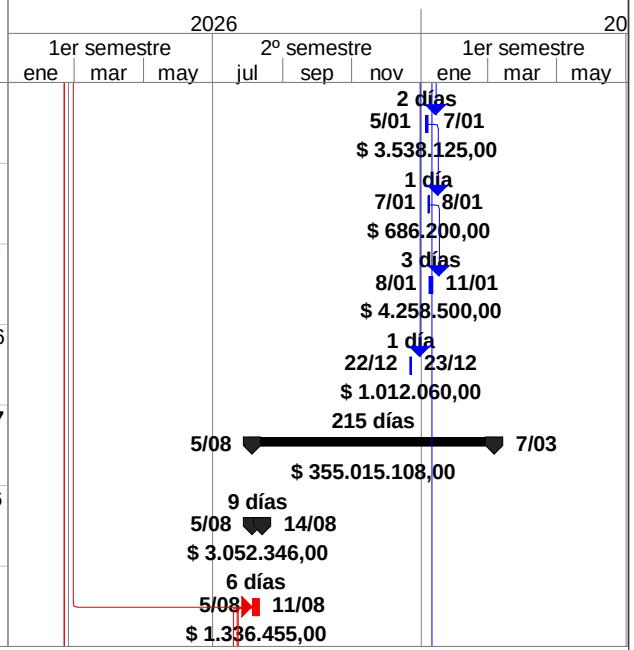

Proyecto: **CUBIERTAS ACEVEDO -H**
Fecha: mar 24/02/26

Tarea		División		Tarea manual	
Tarea crítica		Tareas externas		Sólo duración	
Hito		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual	
Tarea resumida		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin	
Hito resumido		Hito inactivo		Progreso	
Progreso resumido		Resumen inactivo		Fecha límite	


NIT: 900.693.242-3

PACOT INTEGRALES S.A.S
Proponente
Página 32

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal

PROGRAMA DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA
FONPACIFICO - PROCESO No OB-006-2026
FLUJO DE INVERSIÓN

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración	Comienzo	Fin
225	1.2	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	m2	41.00	9 días	mié 5/08/26	vie 14/08/26
226	1.3	Desmonte marcos canchas existentes.	Und.	2.00	3 días	dom 9/08/26	mié 12/08/26
227	1.4	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.	Und.	1.00	2 días	sáb 8/08/26	lun 10/08/26
228	**2**	**CIMIENTOS**			**64 días**	**mié 19/08/26**	**mié 21/10/26**
229	2.1	Excavación manual para cimentaciónes </= 2 mts	m3	46.05	26 días	mié 19/08/26	lun 14/09/26
230	2.2	Rellenos compactados en recebo seleccionado al 95% PROCTOR	m3	21.12	18 días	jue 27/08/26	lun 14/09/26
231	2.4	Concreto de limpieza o solado E= 0,05 en concreto de 1.500 PSI	m2	27.00	7 días	mié 26/08/26	mié 2/09/26

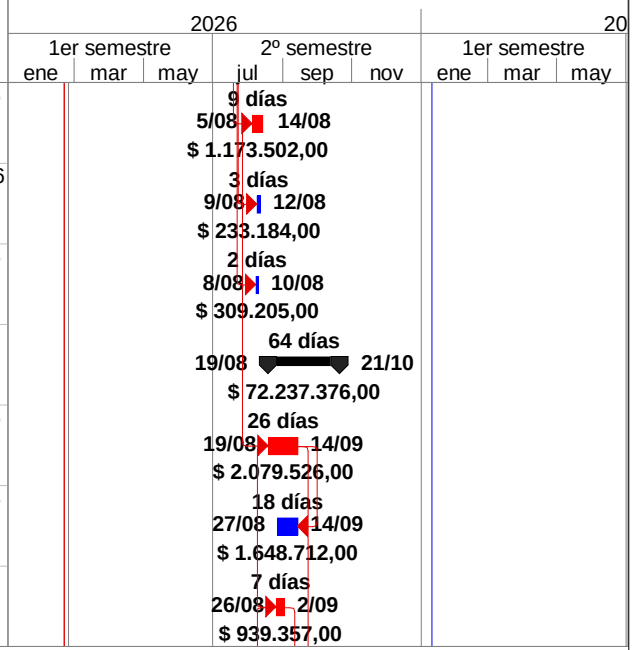

Proyecto: **CUBIERTAS ACEVEDO -H**
Fecha: mar 24/02/26

Tarea		División		Tarea manual	
Tarea crítica		Tareas externas		Sólo duración	
Hito		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual	
Tarea resumida		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin	
Hito resumido		Hito inactivo		Progreso	
Progreso resumido		Resumen inactivo		Fecha límite	


NIT: 900.693.242-3

PACOT INTEGRALES S.A.S
Proponente
Página 33

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal

PROGRAMA DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA
FONPACIFICO - PROCESO No OB-006-2026
FLUJO DE INVERSIÓN

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración	Comienzo	Fin
232	2.5	Zapatas en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo	m3	14.85	25 días	mié 2/09/26	sáb 26/09/26
233	2.6	Columnas en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo	m3	5.88	25 días	sáb 26/09/26	mié 21/10/26
234	2.7	Viga de cimentación en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo	m3	5.16	14 días	mié 9/09/26	mié 23/09/26
235	2.8	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	Kg	5000.58	36 días	mié 26/08/26	mié 30/09/26
236	2.9	Retiros de material sobrante de excavaciones y escombros	m3	51.88	13 días	lun 14/09/26	sáb 26/09/26
237	**3**	**ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA**			**134 días**	**sáb 24/10/26**	**dom 7/03/27**
238	3.1	Suministro e localización Estructura metálica según diseño estructural, en tubería estructural para columnas, domos y viga de	Kg	5443.88	90 días	sáb 24/10/26	vie 22/01/27

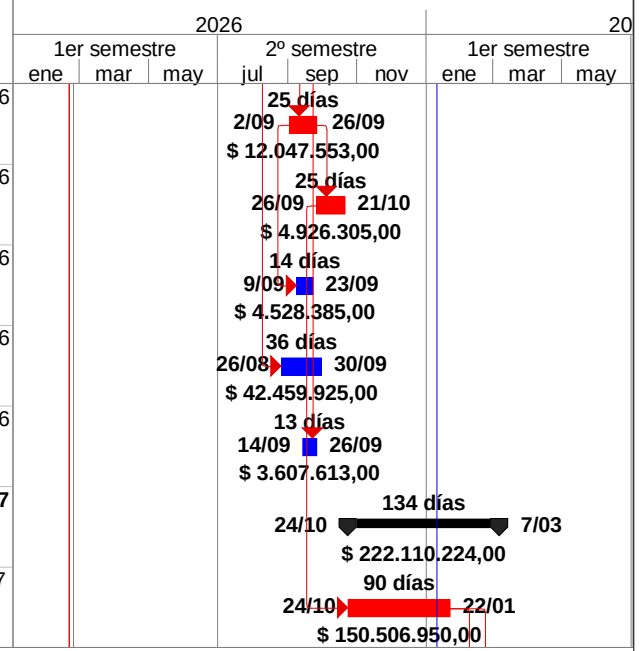

Proyecto: **CUBIERTAS ACEVEDO -H**
Fecha: mar 24/02/26

Tarea		División		Tarea manual	
Tarea crítica		Tareas externas		Sólo duración	
Hito		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual	
Tarea resumida		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin	
Hito resumido		Hito inactivo		Progreso	
Progreso resumido		Resumen inactivo		Fecha límite	


NIT: 900.693.242-3

PACOT INTEGRALES S.A.S
Proponente
Página 34

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal

PROGRAMA DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA
FONPACIFICO - PROCESO No OB-006-2026
FLUJO DE INVERSIÓN

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración	Comienzo	Fin
239	3.2	Correa en perfil metálico rectangular de 10x10 cm Cal.16. Incluye anticorrosivo y pintura esmalte.	m	476.00	76 días	sáb 21/11/26	vie 5/02/27
240	3.3	Suministro e instalación cubierta en teja galvanizada Cal.28 Tipo STANDING SEAM ó similar, incluye tornillos de sujeción, color	m2	455.67	57 días	sáb 9/01/27	dom 7/03/27
241	3.4	Platinas de apoyos columnas de 0.50x0.50(m) cajón principal de cubierta en platina 1/2" y 12 pernos grado 8 Ø3/4", incluye, empalme de	Und.	12.00	30 días	mié 23/12/26	vie 22/01/27
242	**4**	**INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS**			**69 días**	**lun 28/12/26**	**dom 7/03/27**
243	4.1	Suministro e instalaciòn Bajante PVC aguas lluvias de 4"	m	43.20	7 días	sáb 6/02/27	sáb 13/02/27
244	4.2	Abrazadera galvanizada 2" - 4"	Und.	36.00	5 días	lun 8/02/27	sáb 13/02/27
245	4.3	Codo de 45/90 4" PVC SANITARIO	Und.	36.00	6 días	dom 7/02/27	sáb 13/02/27

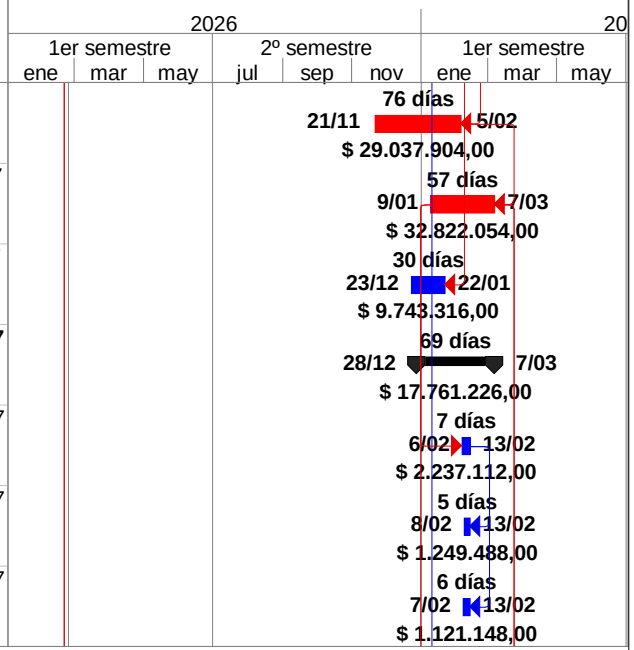

Proyecto: **CUBIERTAS ACEVEDO -H**
Fecha: mar 24/02/26

Tarea		División		Tarea manual	
Tarea crítica		Tareas externas		Sólo duración	
Hito		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual	
Tarea resumida		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin	
Hito resumido		Hito inactivo		Progreso	
Progreso resumido		Resumen inactivo		Fecha límite	


NIT: 900.693.242-3

PACOT INTEGRALES S.A.S
Proponente
Página 35

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal

PROGRAMA DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA
FONPACIFICO - PROCESO No OB-006-2026
FLUJO DE INVERSIÓN

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración	Comienzo	Fin
246	4.4	Suministro e Instalación de tubería PVC Aguas Lluvias Ø6"	m	68.10	16 días	dom 10/01/27	mar 26/01/27
247	4.5	Caja de inspección en concreto de 3000 PSI SECC(0,60*0,60*1,00 m) incluye tapa en concreto y refuerzo	Und.	4.00	16 días	dom 10/01/27	mar 26/01/27
248	4.6	Canal en lámina Galvanizada Cal.18 ancho=0.40 metros. H=0.25 metros (Sum. E Inst. Wash Primer + Esmalte + Anclaje	m	51.00	32 días	mié 3/02/27	dom 7/03/27
249	4.7	Suministro e Instalación de tubería PVC Sanitaria Corrugada Ø8"	m	3.00	4 días	mié 6/01/27	dom 10/01/27
250	4.9	Excavacion manual Tipo zanja </= 0.9 mts -- e=0,50 m	M3	32.00	13 días	lun 28/12/26	dom 10/01/27
251	4.10	Rellenos en recebo seleccionado de la misma excavacion compactado mecanico	M3	26.17	7 días	dom 10/01/27	dom 17/01/27
252	**5**	**PISOS Y ACABADOS**			**22 días**	**sáb 13/02/27**	**dom 7/03/27**

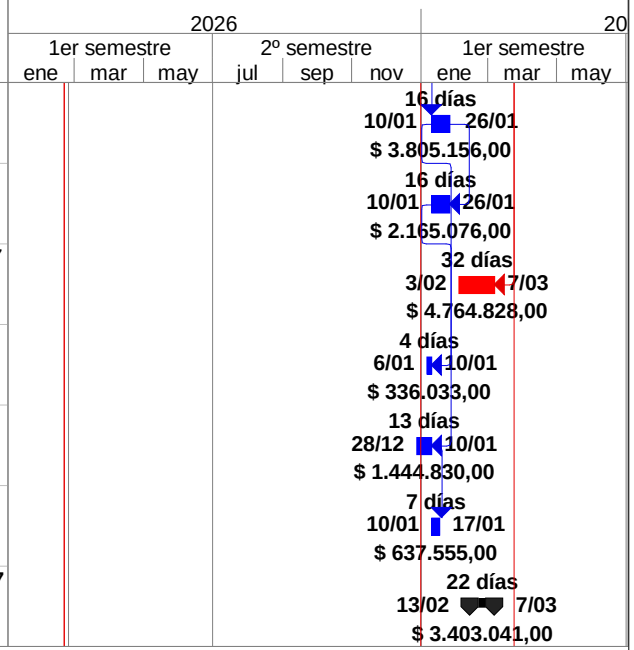

Proyecto: **CUBIERTAS ACEVEDO -H**
Fecha: mar 24/02/26

Tarea	División	Tarea manual	
Tarea crítica	Tareas externas	Sólo duración	
Hito	Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	
Resumen	Agrupar por síntesis	Resumen manual	
Tarea resumida	Tarea inactiva	Sólo el comienzo	
Tarea crítica resumida	Tarea inactiva	Sólo fin	
Hito resumido	Hito inactivo	Progreso	
Progreso resumido	Resumen inactivo	Fecha límite	


NIT: 900.693.242-3

PACOT INTEGRALES S.A.S
Proponente
Página 36

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal

PROGRAMA DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA
FONPACIFICO - PROCESO No OB-006-2026
FLUJO DE INVERSIÓN

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración	Comienzo	Fin
253	5.1	Placa de contrapiso en concreto de 3000 psi e= 0,10 cm con malla electrosoldada de 0,15 x 0,15 de 5.0 mm	m2	41.00	22 días	sáb 13/02/27	dom 7/03/27
254	**6**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**			**23 días**	**sáb 23/01/27**	**lun 15/02/27**
255	6.1	Tuberia emt 3/4", incluye accesorios de fijación y ajustes para tubería.	m	74.48	3 días	sáb 23/01/27	mar 26/01/27
256	6.2	Cable eléctrico No 10 CU AWG Libre de halogeno. Incluye: 2 fases + 1 tierra	m	74.48	1 día	mar 26/01/27	mié 27/01/27
257	6.3	Lámpara SYLVANIA-SYLVEO LED 2000 LM NAR 4K Incluye: Una Caja metalica galvanizada 4x4", un Tomacorriente 15v, 15A,	Und.	8.00	2 días	mié 27/01/27	vie 29/01/27
258	6.4	Tablero eléctrico tipo exterior intemperie con Protección 2X40A y fotocontrol temporizado 220V, cumpliendo RETIE. Incluye elementos	Und.	1.00	2 días	vie 29/01/27	dom 31/01/27
259	6.5	Protección Termomagnética bipolar 2X20A 10 kA Tipo riel.	Und.	2.00	1 día	dom 31/01/27	lun 1/02/27

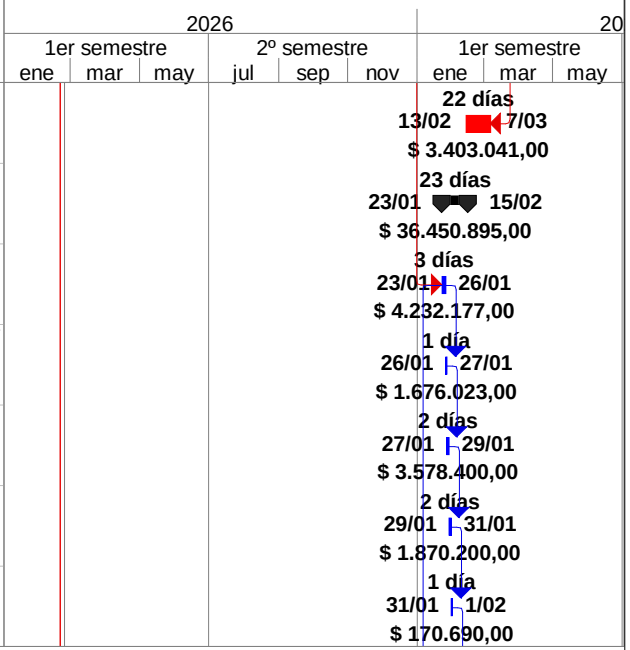

Proyecto: **CUBIERTAS ACEVEDO -H**
Fecha: mar 24/02/26

Tarea		División		Tarea manual	
Tarea crítica		Tareas externas		Sólo duración	
Hito		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual	
Tarea resumida		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin	
Hito resumido		Hito inactivo		Progreso	
Progreso resumido		Resumen inactivo		Fecha límite	


NIT: 900.693.242-3

PACOT INTEGRALES S.A.S
Proponente
Página 37

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal

PROGRAMA DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA
FONPACIFICO - PROCESO No OB-006-2026
FLUJO DE INVERSIÓN

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración	Comienzo	Fin
260	6.6	Alambrón de aluminio No 1/0. Incluye: Soporte plástico corto para alambrón y elementos de fijación y ajuste.	m	153.00	7 días	lun 1/02/27	lun 8/02/27
261	6.7	Cable de cobre desnudo No 2/0	m	102.00	1 día	lun 8/02/27	mar 9/02/27
262	6.8	Punta captadora aluminio 5/8" X 0,8m roscada Incluye: Base en aluminio, elementos de fijación y ajuste.	Und.	9.00	2 días	mar 9/02/27	jue 11/02/27
263	6.9	Grapa paralela bimetalica para alambrón 1/0. Inlcuye caja raweld 2400 con su respectiva tapa ciega.	Und.	4.00	1 día	jue 11/02/27	vie 12/02/27
264	6.10	Sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 5/8" X 2,4m. Incluye: Caja de inspección premoldeada 40X40X40cm, Soldadura	Und.	5.00	3 días	vie 12/02/27	lun 15/02/27
265	6.11	Suminsitro e localización de medidor bifasico trifilar.	Und.	1.00	1 día	sáb 23/01/27	dom 24/01/27
266		**A.I.U.**			**365 días**	**lun 9/03/26**	**dom 7/03/27**

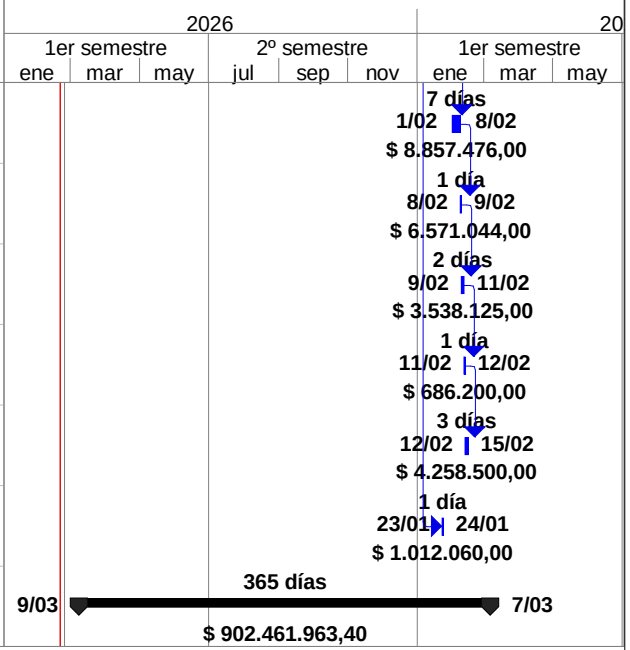

Proyecto: **CUBIERTAS ACEVEDO -H**
Fecha: mar 24/02/26

Tarea		División		Tarea manual	
Tarea crítica		Tareas externas		Sólo duración	
Hito		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual	
Tarea resumida		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin	
Hito resumido		Hito inactivo		Progreso	
Progreso resumido		Resumen inactivo		Fecha límite	


NIT: 900.693.242-3

PACOT INTEGRALES S.A.S
Proponente
Página 38

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal

PROGRAMA DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTRO EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA
FONPACIFICO - PROCESO No OB-006-2026
FLUJO DE INVERSIÓN

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración	Comienzo	Fin
267		ADMINISTRACIÓN		24%	364 días	lun 9/03/26	sáb 6/03/27
268		IMPREVISTOS		1%	364 días	lun 9/03/26	sáb 6/03/27
269		UTILIDAD		5%	364 días	lun 9/03/26	sáb 6/03/27
270		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y AMBIENTAL			365 días	lun 9/03/26	dom 7/03/27
271		**FIN DE LA TAREA**			0 días	lun 9/03/26	lun 9/03/26

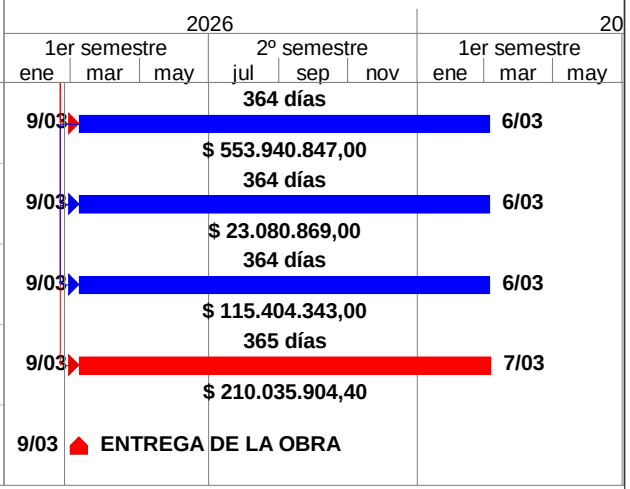

Proyecto: **CUBIERTAS ACEVEDO -H**
Fecha: mar 24/02/26

Tarea	División	Tarea manual
Tarea crítica	Tareas externas	Sólo duración
Hito	Resumen del proyecto	Informe de resumen manual
Resumen	Agrupar por síntesis	Resumen manual
Tarea resumida	Tarea inactiva	Sólo el comienzo
Tarea crítica resumida	Tarea inactiva	Sólo fin
Hito resumido	Hito inactivo	Progreso
Progreso resumido	Resumen inactivo	Fecha límite

NIT: 900.693.242-3

PACOT INTEGRALES S.A.S
Proponente
Página 39

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal

PROGRAMACIÓN DE OBRA - FLUJO DE INVERSION

"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA"

FONDO MIXTODE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL "FONPACIFICO"

PROCESO No. OB-006-2026

		año/2026										año/2027			Total general
Item	Tareas	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	
	CUBIERTA No 1 LA VICTORIA														
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1.1	Localización y replanteo	$ 1.865.621,00													$ 1.865.621,00
1.2	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	$ 1.904.222,00													$ 1.904.222,00
1.3	Desmonte marcos canchas existentes.	$ 233.184,00													$ 233.184,00
1.4	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.	$ 1.236.820,00													$ 1.236.820,00
2	**CIMIENTOS**														
2.1	Excavación manual para cimentaciónes </= 2 mts	$ 1.796.562,78	$ 315.477,22												$ 2.112.040,00
2.2	Rellenos compactados en recebo seleccionado al 95% PROCTOR	$ 1.388.760,84	$ 259.951,16												$ 1.648.712,00
2.4	Concreto de limpieza o solado E= 0,05 en concreto de 1.500 PSI	$ 939.357,00													$ 939.357,00
2.5	Zapatas en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo	$ 1.041.850,08	$ 11.005.702,92												$ 12.047.553,00
2.6	Columnas en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo		$ 73.345,81	$ 6.372.114,74	$ 943.997,46										$ 7.389.458,01
2.7	Viga de cimentación en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo		$ 5.160.253,00												$ 5.160.253,00
2.8	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	$ 11.008.292,68	$ 33.448.036,32												$ 44.456.329,00
2.9	Retiros de material sobrante de excavaciones y escombros		$ 3.252.526,00												$ 3.252.526,00
3	**ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA**														
3.1	Suministro e localización Estructura metálica según diseño estructural, en tubería estructural para columnas, domos y viga de amarre según diseño.			$ 17.356.295,35	$ 50.387.307,25	$ 52.107.493,72	$ 40.345.021,68								$ 160.196.118,00
3.2	Correa en perfil metálico rectangular de 10x10 cm Cal.16. Incluye anticorrosivo y pintura esmalte.				$ 4.592.726,91	$ 16.682.970,64	$ 12.917.044,45								$ 34.192.742,00
3.3	Suministro e instalación cubierta en teja galvanizada Cal.28 Tipo STANDING SEAM ó similar, incluye tornillos de sujeción, color según diseño.					$ 13.475.813,92	$ 22.225.338,55	$ 5.107.263,54							$ 40.808.416,01
3.4	Platinas de apoyos columnas de 0.50x0.50(m) cajón principal de cubierta en platina 1/2" y 12 pernos grado 8 Ø3/4", incluye, empalme de pernos, empalme de columna a platina, soldadura y montaje.					$ 1.891.054,90	$ 7.852.261,10								$ 9.743.316,00
4	**INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS**														
4.1	Suministro e instalaciòn Bajante PVC aguas lluvias de 4".						$ 2.237.112,00								$ 2.237.112,00
4.2	Abrazadera galvanizada 2" - 4"						$ 1.249.488,00								$ 1.249.488,00
4.3	Codo de 45/90 4" PVC SANITARIO						$ 1.121.148,00								$ 1.121.148,00
4.4	Suministro e Instalación de tubería PVC Aguas Lluvias Ø6"			$ 1.592.439,35	$ 2.685.427,65										$ 4.277.867,00

PROGRAMACIÓN DE OBRA - FLUJO DE INVERSION

"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA"

FONDO MIXTODE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL "FONPACIFICO"

PROCESO No. OB-006-2026

		año/2026										año/2027			Total general
Item	Tareas	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	
4.5	Caja de inspección en concreto de 3000 PSI SECC(0,60*0,60*1,00 m) incluye tapa en concreto y refuerzo				$ 1.027.924,10	$ 1.137.151,90									$ 2.165.076,00
4.6	Canal en lámina Galvanizada Cal.18 ancho=0.38 metros. H=0.20 metros (Sum. E Inst. Wash Primer + Esmalte + Anclaje estructura metalica)						$ 4.449.478,48	$ 1.062.773,52							$ 5.512.252,00
4.7	Suministro e instalaciòn tuberia pvc aguas lluvias de 8" CORRUGADA				$ 1.784.620,30	$ 903.643,70									$ 2.688.264,00
4.9	Excavacion manual Tipo zanja </= 0.9 mts -- e=0,50 m			$ 499.614,51	$ 1.543.785,49										$ 2.043.400,00
4.10	Rellenos en recebo seleccionado de la misma excavacion compactado mecanico				$ 879.504,00										$ 879.504,00
5	**PISOS Y ACABADOS**														
5.1	Placa de contrapiso en concreto de 3000 psi e= 0,10 cm con malla electrosoldada de 0,15 x 0,15 de 5.0 mm						$ 2.484.971,92	$ 1.117.271,08							$ 3.602.243,00
6	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**														
6.1	Tuberia emt 3/4", incluye accesorios de fijación y ajustes para tubería.						$ 5.091.341,00								$ 5.091.341,00
6.2	Cable eléctrico No 10 CU AWG Libre de halogeno. Incluye: 2 fases + 1 tierra						$ 2.016.269,00								$ 2.016.269,00
6.3	Lámpara SYLVANIA-SYLVEO LED 2000 LM NAR 4K Incluye: Una Caja metalica galvanizada 4x4", un Tomacorriente 15v, 15A, con PT, una Clavija aerea 125V 15A con PT, conector terminal para tubo EMT 1/2" con contra tuerca, Elementos de fijación y ajuste, Marcación						$ 3.578.400,00								$ 3.578.400,00
6.4	Tablero eléctrico tipo exterior intemperie con Protección 2X40A y fotocontrol temporizado 220V, cumpliendo RETIE. Incluye elementos de fijación y ajuste.						$ 1.870.200,00								$ 1.870.200,00
6.5	Protección Termomagnética bipolar 2X20A 10 kA Tipo riel.						$ 170.690,00								$ 170.690,00
6.6	Alambrón de aluminio No 1/0. Incluye: Soporte plástico corto para alambrón y elementos de fijación y ajuste.						$ 9.639.018,00								$ 9.639.018,00
6.7	Cable de cobre desnudo No 2/0						$ 7.086.420,00								$ 7.086.420,00
6.8	Punta captadora aluminio 5/8" X 0,8m roscada Incluye: Base en aluminio, elementos de fijación y ajuste.						$ 3.538.125,00								$ 3.538.125,00
6.9	Grapa paralela bimetalica para alambrón 1/0. Inlcuye caja raweld 2400 con su respectiva tapa ciega.						$ 686.200,00								$ 686.200,00
6.10	Sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 5/8" X 2,4m. Incluye: Caja de inspección premoldeada 40X40X40cm, Soldadura exotermica 115g.						$ 4.258.500,00								$ 4.258.500,00

PROGRAMACIÓN DE OBRA - FLUJO DE INVERSION

"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA"

FONDO MIXTODE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL "FONPACIFICO"

PROCESO No. OB-006-2026

		año/2026										año/2027			Total general
Item	Tareas	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	
6.11	Suminsitro e localización de medidor bifasico trifilar.						$ 1.012.060,00								$ 1.012.060,00
	CUBIERTA No 2 CRISTO REY														
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1.1	Localización y replanteo		$ 1.886.760,00												$ 1.886.760,00
1.2	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.		$ 1.253.644,00												$ 1.253.644,00
1.3	Desmonte marcos canchas existentes.		$ 233.184,00												$ 233.184,00
1.4	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.		$ 927.615,00												$ 927.615,00
2	**CIMIENTOS**														$ 0,00
2.1	Excavación manual para cimentaciónes </= 2 mts		$ 1.282.813,64	$ 834.645,36											$ 2.117.459,00
2.2	Rellenos compactados en recebo seleccionado al 95% PROCTOR		$ 673.895,14	$ 974.816,86											$ 1.648.712,00
2.4	Concreto de limpieza o solado E= 0,05 en concreto de 1.500 PSI		$ 939.357,00												$ 939.357,00
2.5	Zapatas en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo		$ 1.136.000,63	$ 10.911.552,37											$ 12.047.553,00
2.6	Columnas en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo			$ 1.655.441,10	$ 3.270.863,90										$ 4.926.305,00
2.7	Viga de cimentación en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo			$ 5.265.564,00											$ 5.265.564,00
2.8	Acero de refuerzo de 60.000 PSI		$ 11.297.409,05	$ 33.373.911,95											$ 44.671.321,00
2.9	Retiros de material sobrante de excavaciones y escombros			$ 3.794.405,00											$ 3.794.405,00
3	**ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA**														
3.1	Suministro e localización Estructura metálica según diseño estructural, en tubería estructural para columnas, domos y viga de amarre según diseño.				$ 31.924.674,11	$ 56.652.887,72	$ 56.321.747,93	$ 18.385.254,25							$ 163.284.564,01
3.2	Correa en perfil metálico rectangular de 10x10 cm Cal.16. Incluye anticorrosivo y pintura esmalte.				$ 1.645.461,36	$ 14.286.932,93	$ 14.203.424,88	$ 4.636.460,82							$ 34.772.279,99
3.3	Suministro e instalación cubierta en teja galvanizada Cal.28 Tipo STANDING SEAM ó similar, incluye tornillos de sujeción, color según diseño.					$ 594.005,46	$ 22.416.281,22	$ 17.426.635,32							$ 40.436.922,00
3.4	Platinas de apoyos columnas de 0.50x0.50(m) cajón principal de cubierta en platina 1/2" y 12 pernos grado 8 Ø3/4", incluye, empalme de pernos, empalme de columna a platina, soldadura y montaje.					$ 6.762.712,90	$ 2.980.603,10								$ 9.743.316,00
4	**INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS**														
4.1	Suministro e instalaciòn Bajante PVC aguas lluvias de 4"							$ 2.237.112,00							$ 2.237.112,00
4.2	Abrazadera galvanizada 2" - 4"							$ 1.249.488,00							$ 1.249.488,00
4.3	Codo de 45/90 4" PVC SANITARIO							$ 1.121.148,00							$ 1.121.148,00

PROGRAMACIÓN DE OBRA - FLUJO DE INVERSION

"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA"

FONDO MIXTODE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL "FONPACIFICO"

PROCESO No. OB-006-2026

		año/2026										año/2027			Total general
Item	Tareas	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	
4.4	Suministro e Instalación de tubería PVC Aguas Lluvias Ø6"				$ 3.010.856,16	$ 1.291.595,84									$ 4.302.452,00
4.5	Caja de inspección en concreto de 3000 PSI SECC(0,60*0,60*1,00 m) incluye tapa en concreto y refuerzo					$ 2.165.076,00									$ 2.165.076,00
4.6	Canal en lámina Galvanizada Cal.18 ancho=0.40 metros. H=0.25 metros (Sum. E Inst. Wash Primer + Esmalte + Anclaje estructura metalica)						$ 2.045.530,91	$ 3.560.149,09							$ 5.605.680,00
4.7	Suministro e Instalación de tubería PVC Sanitaria Corrugada Ø8"					$ 1.344.132,00									$ 1.344.132,00
4.9	Excavacion manual Tipo zanja </= 0.9 mts -- e=0,50 m				$ 858.667,74	$ 949.910,26									$ 1.808.578,00
4.10	Rellenos en recebo seleccionado de la misma excavacion compactado mecanico					$ 788.825,00									$ 788.825,00
5	**PISOS Y ACABADOS**														$ 0,00
5.1	Placa de contrapiso en concreto de 3000 psi e= 0,10 cm con malla electrosoldada de 0,15 x 0,15 de 5.0 mm							$ 3.635.444,00							$ 3.635.444,00
6	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**														
6.1	Tuberia emt 3/4", incluye accesorios de fijación y ajustes para tubería.						$ 4.018.523,00								$ 4.018.523,00
6.2	Cable eléctrico No 10 CU AWG Libre de halogeno. Incluye: 2 fases + 1 tierra						$ 1.378.678,26	$ 212.733,74							$ 1.591.412,00
6.3	Lámpara SYLVANIA-SYLVEO LED 2000 LM NAR 4K Incluye: Una Caja metalica galvanizada 4x4", un Tomacorriente 15v, 15A, con PT, una Clavija aerea 125V 15A con PT, conector terminal para tubo EMT 1/2" con contra tuerca, Elementos de fijación y ajuste, Marcación							$ 3.578.400,00							$ 3.578.400,00
6.4	Tablero eléctrico tipo exterior intemperie con Protección 2X40A y fotocontrol temporizado 220V, cumpliendo RETIE. Incluye elementos de fijación y ajuste.							$ 1.870.200,00							$ 1.870.200,00
6.5	Protección Termomagnética bipolar 2X20A 10 kA Tipo riel.							$ 170.690,00							$ 170.690,00
6.6	Alambrón de aluminio No 1/0. Incluye: Soporte plástico corto para alambrón y elementos de fijación y ajuste.							$ 9.725.856,00							$ 9.725.856,00
6.7	Cable de cobre desnudo No 2/0							$ 7.215.264,00							$ 7.215.264,00
6.8	Punta captadora aluminio 5/8" X 0,8m roscada Incluye: Base en aluminio, elementos de fijación y ajuste.							$ 3.538.125,00							$ 3.538.125,00
6.9	Grapa paralela bimetalica para alambrón 1/0. Inlcuye caja raweld 2400 con su respectiva tapa ciega.							$ 686.200,00							$ 686.200,00

PROGRAMACIÓN DE OBRA - FLUJO DE INVERSION

"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA"

FONDO MIXTODE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL "FONPACIFICO"

PROCESO No. OB-006-2026

		año/2026										año/2027			Total general
Item	Tareas	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	
6.10	Sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 5/8" X 2,4m. Incluye: Caja de inspección premoldeada 40X40X40cm, Soldadura exotermica 115g.							$ 4.258.500,00							$ 4.258.500,00
6.11	Suminsitro e localización de medidor bifasico trifilar.						$ 1.012.060,00								$ 1.012.060,00
	CUBIERTA No 3 LA CARBONA														
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1.1	Localización y replanteo			$ 1.473.944,00											$ 1.473.944,00
1.2	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.			$ 1.242.195,00											$ 1.242.195,00
1.3	Desmonte marcos canchas existentes.			$ 233.184,00											$ 233.184,00
1.4	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.			$ 927.615,00											$ 927.615,00
2	**CIMIENTOS**														$ 0,00
2.1	Excavación manual para cimentaciónes </= 2 mts			$ 1.361.172,88	$ 750.867,12										$ 2.112.040,00
2.2	Rellenos compactados en recebo seleccionado al 95% PROCTOR			$ 769.493,12	$ 879.218,88										$ 1.648.712,00
2.4	Concreto de limpieza o solado E= 0,05 en concreto de 1.500 PSI			$ 939.357,00											$ 939.357,00
2.5	Zapatas en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo			$ 1.638.962,74	$ 10.408.590,26										$ 12.047.553,00
2.6	Columnas en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo				$ 1.693.939,73	$ 3.232.365,27									$ 4.926.305,00
2.7	Viga de cimentación en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo				$ 5.160.253,00										$ 5.160.253,00
2.8	Acero de refuerzo de 60.000 PSI			$ 12.098.313,61	$ 30.939.508,39										$ 43.037.822,00
2.9	Retiros de material sobrante de excavaciones y escombros				$ 3.677.156,00										$ 3.677.156,00
3	**ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA**														
3.1	Suministro e localización Estructura metálica según diseño estructural, en tubería estructural para columnas, domos y viga de amarre según diseño.					$ 31.372.218,51	$ 51.741.451,89	$ 50.327.516,89	$ 19.897.921,71						$ 153.339.109,00
3.2	Correa en perfil metálico rectangular de 10x10 cm Cal.16. Incluye anticorrosivo y pintura esmalte.						$ 11.387.282,65	$ 11.512.740,75	$ 4.551.776,61						$ 27.451.800,01
3.3	Suministro e instalación cubierta en teja galvanizada Cal.28 Tipo STANDING SEAM ó similar, incluye tornillos de sujeción, color según diseño.						$ 1.638.322,97	$ 17.258.961,12	$ 14.825.720,90						$ 33.723.004,99
3.4	Platinas de apoyos columnas de 0.50x0.50(m) cajón principal de cubierta en platina 1/2" y 12 pernos grado 8 Ø3/4", incluye, empalme de pernos, empalme de columna a platina, soldadura y montaje.						$ 5.153.020,25	$ 4.590.295,75							$ 9.743.316,00
4	**INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS**														

PROGRAMACIÓN DE OBRA - FLUJO DE INVERSION

"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA"

FONDO MIXTODE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL "FONPACIFICO"

PROCESO No. OB-006-2026

		año/2026										año/2027			Total general
Item	Tareas	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	
4.1	Suministro e instalaciòn Bajante PVC aguas lluvias de 4"								$ 2.237.112,00						$ 2.237.112,00
4.2	Abrazadera galvanizada 2" - 4"								$ 1.249.488,00						$ 1.249.488,00
4.3	Codo de 45/90 4" PVC SANITARIO								$ 1.121.148,00						$ 1.121.148,00
4.4	Suministro e Instalación de tubería PVC Aguas Lluvias Ø6"					$ 3.488.305,32	$ 512.416,68								$ 4.000.722,00
4.5	Caja de inspección en concreto de 3000 PSI SECC(0,60*0,60*1,00 m) incluye tapa en concreto y refuerzo						$ 2.165.076,00								$ 2.165.076,00
4.6	Canal en lámina Galvanizada Cal.18 ancho=0.40 metros. H=0.25 metros (Sum. E Inst. Wash Primer + Esmalte + Anclaje estructura metalica)							$ 1.779.316,10	$ 3.826.363,90						$ 5.605.680,00
4.7	Suministro e Instalación de tubería PVC Sanitaria Corrugada Ø8"						$ 336.033,00								$ 336.033,00
4.9	Excavacion manual Tipo zanja </= 0.9 mts -- e=0,50 m						$ 1.515.954,00								$ 1.515.954,00
4.10	Rellenos en recebo seleccionado de la misma excavacion compactado mecanico						$ 669.105,00								$ 669.105,00
5	**PISOS Y ACABADOS**														
5.1	Placa de contrapiso en concreto de 3000 psi e= 0,10 cm con malla electrosoldada de 0,15 x 0,15 de 5.0 mm								$ 3.602.243,00						$ 3.602.243,00
6	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**														
6.1	Tuberia emt 3/4", incluye accesorios de fijación y ajustes para tubería.							$ 4.325.367,00							$ 4.325.367,00
6.2	Cable eléctrico No 10 CU AWG Libre de halogeno. Incluye: 2 fases + 1 tierra							$ 1.712.928,00							$ 1.712.928,00
6.3	Lámpara SYLVANIA-SYLVEO LED 2000 LM NAR 4K Incluye: Una Caja metalica galvanizada 4x4", un Tomacorriente 15v, 15A, con PT, una Clavija aerea 125V 15A con PT, conector terminal para tubo EMT 1/2" con contra tuerca, Elementos de fijación y ajuste, Marcación							$ 1.899.587,66	$ 1.678.812,34						$ 3.578.400,00
6.4	Tablero eléctrico tipo exterior intemperie con Protección 2X40A y fotocontrol temporizado 220V, cumpliendo RETIE. Incluye elementos de fijación y ajuste.								$ 1.870.200,00						$ 1.870.200,00
6.5	Protección Termomagnética bipolar 2X20A 10 kA Tipo riel.						$ 0,00	$ 0,00	$ 170.690,00			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 170.690,00
6.6	Alambrón de aluminio No 1/0. Incluye: Soporte plástico corto para alambrón y elementos de fijación y ajuste.								$ 9.117.990,00						$ 9.117.990,00
6.7	Cable de cobre desnudo No 2/0								$ 6.828.732,00						$ 6.828.732,00
6.8	Punta captadora aluminio 5/8" X 0,8m roscada Incluye: Base en aluminio, elementos de fijación y ajuste.								$ 3.538.125,00						$ 3.538.125,00

PROGRAMACIÓN DE OBRA - FLUJO DE INVERSION

"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA"

FONDO MIXTODE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL "FONPACIFICO"

PROCESO No. OB-006-2026

		año/2026										año/2027			Total general
Item	Tareas	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	
6.9	Grapa paralela bimetalica para alambrón 1/0. Inlcuye caja raweld 2400 con su respectiva tapa ciega.								$ 686.200,00						$ 686.200,00
6.10	Sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 5/8" X 2,4m. Incluye: Caja de inspección premoldeada 40X40X40cm, Soldadura exotermica 115g.								$ 4.258.500,00						$ 4.258.500,00
6.11	Suminsitro e localización de medidor bifasico trifilar.							$ 1.012.060,00							$ 1.012.060,00
	CUBIERTA No 4 VERSALLES														
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1.1	Localización y replanteo				$ 1.886.760,00										$ 1.886.760,00
1.2	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.				$ 1.986.480,76	$ 433.509,24									$ 2.419.990,00
1.3	Desmonte marcos canchas existentes.				$ 233.184,00										$ 233.184,00
1.4	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.				$ 927.615,00										$ 927.615,00
2	**CIMIENTOS**														
2.1	Excavación manual para cimentaciónes </= 2 mts				$ 674.167,66	$ 1.443.291,34									$ 2.117.459,00
2.2	Rellenos compactados en recebo seleccionado al 95% PROCTOR					$ 1.648.712,00									$ 1.648.712,00
2.4	Concreto de limpieza o solado E= 0,05 en concreto de 1.500 PSI				$ 214.227,21	$ 725.129,79									$ 939.357,00
2.5	Zapatas en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo					$ 12.047.553,00									$ 12.047.553,00
2.6	Columnas en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo					$ 162.099,50	$ 4.764.205,50								$ 4.926.305,00
2.7	Viga de cimentación en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo					$ 5.265.564,00									$ 5.265.564,00
2.8	Acero de refuerzo de 60.000 PSI				$ 1.876.666,92	$ 36.708.330,14	$ 6.086.323,94								$ 44.671.321,00
2.9	Retiros de material sobrante de excavaciones y escombros					$ 3.475.301,53	$ 319.103,47								$ 3.794.405,00
3	**ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA**														
3.1	Suministro e localización Estructura metálica según diseño estructural, en tubería estructural para columnas, domos y viga de amarre según diseño.						$ 18.105.132,26	$ 50.310.594,64	$ 52.028.162,19	$ 42.840.674,92					$ 163.284.564,01
3.2	Correa en perfil metálico rectangular de 10x10 cm Cal.16. Incluye anticorrosivo y pintura esmalte.						$ 1.477.372,50	$ 11.538.043,47	$ 11.931.943,99	$ 9.824.920,04					$ 34.772.280,00
3.3	Suministro e instalación cubierta en teja galvanizada Cal.28 Tipo STANDING SEAM ó similar, incluye tornillos de sujeción, color según diseño.								$ 11.761.308,20	$ 21.671.918,12	$ 7.003.695,68				$ 40.436.922,00

PROGRAMACIÓN DE OBRA - FLUJO DE INVERSION

"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA"

FONDO MIXTODE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL "FONPACIFICO"

PROCESO No. OB-006-2026

		año/2026										año/2027			Total general
Item	Tareas	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	
3.4	Platinas de apoyos columnas de 0.50x0.50(m) cajón principal de cubierta en platina 1/2" y 12 pernos grado 8 Ø3/4", incluye, empalme de pernos, empalme de columna a platina, soldadura y montaje.								$ 1.392.617,92	$ 8.350.698,08					$ 9.743.316,00
4	**INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS**														
4.1	Suministro e instalaciòn Bajante PVC aguas lluvias de 4"									$ 1.374.472,41	$ 862.639,59				$ 2.237.112,00
4.2	Abrazadera galvanizada 2" - 4"									$ 574.957,20	$ 674.530,80				$ 1.249.488,00
4.3	Codo de 45/90 4" PVC SANITARIO									$ 803.633,51	$ 317.514,49				$ 1.121.148,00
4.4	Suministro e Instalación de tubería PVC Aguas Lluvias Ø6"					$ 674.677,56	$ 3.627.774,44								$ 4.302.452,00
4.5	Caja de inspección en concreto de 3000 PSI SECC(0,60*0,60*1,00 m) incluye tapa en concreto y refuerzo						$ 2.146.987,32	$ 18.088,68							$ 2.165.076,00
4.6	Canal en lámina Galvanizada Cal.18 ancho=0.40 metros. H=0.25 metros (Sum. E Inst. Wash Primer + Esmalte + Anclaje estructura metalica)									$ 4.174.870,19	$ 1.430.809,81				$ 5.605.680,00
4.7	Suministro e Instalación de tubería PVC Sanitaria Corrugada Ø8"									$ 341.282,48	$ 1.002.849,52				$ 1.344.132,00
4.9	Excavacion manual Tipo zanja </= 0.9 mts -- e=0,50 m									$ 1.808.578,00					$ 1.808.578,00
4.10	Rellenos en recebo seleccionado de la misma excavacion compactado mecanico									$ 289.303,43	$ 499.521,57				$ 788.825,00
5	**PISOS Y ACABADOS**														
5.1	Placa de contrapiso en concreto de 3000 psi e= 0,10 cm con malla electrosoldada de 0,15 x 0,15 de 5.0 mm								$ 2.828.984,24	$ 4.911.284,91	$ 1.587.175,84				$ 9.327.444,99
6	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**														
6.1	Tuberia emt 3/4", incluye accesorios de fijación y ajustes para tubería.							$ 4.018.523,00							$ 4.018.523,00
6.2	Cable eléctrico No 10 CU AWG Libre de halogeno. Incluye: 2 fases + 1 tierra							$ 1.591.412,00							$ 1.591.412,00
6.3	Lámpara SYLVANIA-SYLVEO LED 2000 LM NAR 4K Incluye: Una Caja metalica galvanizada 4x4", un Tomacorriente 15v, 15A, con PT, una Clavija aerea 125V 15A con PT, conector terminal para tubo EMT 1/2" con contra tuerca, Elementos de fijación y ajuste, Marcación							$ 3.578.400,00							$ 3.578.400,00
6.4	Tablero eléctrico tipo exterior intemperie con Protección 2X40A y fotocontrol temporizado 220V, cumpliendo RETIE. Incluye elementos de fijación y ajuste.							$ 1.870.200,00							$ 1.870.200,00
6.5	Protección Termomagnética bipolar 2X20A 10 kA Tipo riel.							$ 170.690,00							$ 170.690,00
6.6	Alambrón de aluminio No 1/0. Incluye: Soporte plástico corto para alambrón y elementos de fijación y ajuste.							$ 9.725.856,00							$ 9.725.856,00

PROGRAMACIÓN DE OBRA - FLUJO DE INVERSION

"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA"

FONDO MIXTODE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL "FONPACIFICO"

PROCESO No. OB-006-2026

		año/2026										año/2027			Total general
Item	Tareas	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	
6.7	Cable de cobre desnudo No 2/0							$ 7.215.264,00							$ 7.215.264,00
6.8	Punta captadora aluminio 5/8" X 0,8m roscada Incluye: Base en aluminio, elementos de fijación y ajuste.							$ 3.538.125,00							$ 3.538.125,00
6.9	Grapa paralela bimetalica para alambrón 1/0. Inlcuye caja raweld 2400 con su respectiva tapa ciega.							$ 686.200,00							$ 686.200,00
6.10	Sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 5/8" X 2,4m. Incluye: Caja de inspección premoldeada 40X40X40cm, Soldadura exotermica 115g.							$ 4.258.500,00							$ 4.258.500,00
6.11	Suminsitro e localización de medidor bifasico trifilar.							$ 1.012.060,00							$ 1.012.060,00
	CUBIERTA 5 PLAYITAS														
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1.1	Localización y replanteo					$ 1.810.241,00									$ 1.810.241,00
1.2	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.					$ 1.382.443,00									$ 1.382.443,00
1.3	Desmonte marcos canchas existentes.					$ 233.184,00									$ 233.184,00
1.4	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.					$ 309.205,00									$ 309.205,00
2	**CIMIENTOS**														
2.1	Excavación manual para cimentaciónes </= 2 mts					$ 1.477.066,41	$ 955.594,59								$ 2.432.661,00
2.2	Rellenos compactados en recebo seleccionado al 95% PROCTOR					$ 1.541.497,12	$ 1.734.458,88								$ 3.275.956,00
2.4	Concreto de limpieza o solado E= 0,05 en concreto de 1.500 PSI					$ 1.095.917,00									$ 1.095.917,00
2.5	Zapatas en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo					$ 1.853.251,22	$ 12.206.282,78								$ 14.059.534,00
2.6	Columnas en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo						$ 1.204.137,57	$ 4.543.218,43							$ 5.747.356,00
2.7	Viga de cimentación en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo						$ 5.432.307,00								$ 5.432.307,00
2.8	Acero de refuerzo de 60.000 PSI					$ 14.138.127,63	$ 34.891.878,37								$ 49.030.006,00
2.9	Retiros de material sobrante de excavaciones y escombros						$ 4.206.517,00								$ 4.206.517,00
3	**ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA**														
3.1	Suministro e localización Estructura metálica según diseño estructural, en tubería estructural para columnas, domos y viga de amarre según diseño.							$ 25.132.469,51	$ 52.105.155,69	$ 50.080.488,41	$ 49.557.163,39				$ 176.875.277,00
3.2	Correa en perfil metálico rectangular de 10x10 cm Cal.16. Incluye anticorrosivo y pintura esmalte.								$ 6.193.615,37	$ 11.412.635,64	$ 11.874.028,70	$ 4.742.964,29			$ 34.223.244,00

PROGRAMACIÓN DE OBRA - FLUJO DE INVERSION

"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA"

FONDO MIXTODE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL "FONPACIFICO"

PROCESO No. OB-006-2026

		año/2026										año/2027			Total general
Item	Tareas	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	
3.3	Suministro e instalación cubierta en teja galvanizada Cal.28 Tipo STANDING SEAM ó similar, incluye tornillos de sujeción, color según diseño.									$ 5.369.895,35	$ 18.028.777,99	$ 15.284.461,66			$ 38.683.135,00
3.4	Platinas de apoyos columnas de 0.50x0.50(m) cajón principal de cubierta en platina 1/2" y 12 pernos grado 8 Ø3/4", incluye, empalme de pernos, empalme de columna a platina, soldadura y montaje.									$ 1.721.569,63	$ 9.645.632,37				$ 11.367.202,00
4	**INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS**											$ 0,00			$ 0,00
4.1	Suministro e instalaciòn Bajante PVC aguas lluvias de 4"											$ 2.982.816,00			$ 2.982.816,00
4.2	Abrazadera galvanizada 2" - 4"											$ 1.200.703,00			$ 1.200.703,00
4.3	Codo de 45/90 4" PVC SANITARIO											$ 1.494.864,00			$ 1.494.864,00
4.4	Suministro e Instalación de tubería PVC Aguas Lluvias Ø6"							$ 3.404.749,24	$ 953.578,76						$ 4.358.328,00
4.5	Caja de inspección en concreto de 3000 PSI SECC(0,60*0,60*1,00 m) incluye tapa en concreto y refuerzo								$ 2.165.076,00						$ 2.165.076,00
4.6	Canal en lámina Galvanizada Cal.18 ancho=0.40 metros. H=0.25 metros (Sum. E Inst. Wash Primer + Esmalte + Anclaje estructura metalica)										$ 2.184.805,78	$ 3.981.442,22			$ 6.166.248,00
4.7	Suministro e Instalación de tubería PVC Sanitaria Corrugada Ø8"							$ 5.183,03	$ 330.849,97						$ 336.033,00
4.9	Excavacion manual Tipo zanja </= 0.9 mts -- e=0,50 m							$ 1.646.009,00							$ 1.646.009,00
4.10	Rellenos en recebo seleccionado de la misma excavacion compactado mecanico							$ 5.605,12	$ 721.191,88						$ 726.797,00
5	**PISOS Y ACABADOS**														
5.1	Placa de contrapiso en concreto de 3000 psi e= 0,10 cm con malla electrosoldada de 0,15 x 0,15 de 5.0 mm											$ 4.008.948,00			$ 4.008.948,00
6	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**														
6.1	Tuberia emt 3/4", incluye accesorios de fijación y ajustes para tubería.										$ 4.275.363,00				$ 4.275.363,00
6.2	Cable eléctrico No 10 CU AWG Libre de halogeno. Incluye: 2 fases + 1 tierra										$ 1.693.126,00				$ 1.693.126,00
6.3	Lámpara SYLVANIA-SYLVEO LED 2000 LM NAR 4K Incluye: Una Caja metalica galvanizada 4x4", un Tomacorriente 15v, 15A, con PT, una Clavija aerea 125V 15A con PT, conector terminal para tubo EMT 1/2" con contra tuerca, Elementos de fijación y ajuste, Marcación										$ 3.578.400,00				$ 3.578.400,00
6.4	Tablero eléctrico tipo exterior intemperie con Protección 2X40A y fotocontrol temporizado 220V, cumpliendo RETIE. Incluye elementos de fijación y ajuste.										$ 1.870.200,00				$ 1.870.200,00

PROGRAMACIÓN DE OBRA - FLUJO DE INVERSION

"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA"

FONDO MIXTODE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL "FONPACIFICO"

PROCESO No. OB-006-2026

		año/2026										año/2027			Total general
Item	Tareas	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	
6.5	Protección Termomagnética bipolar 2X20A 10 kA Tipo riel.										$ 170.690,00				$ 170.690,00
6.6	Alambrón de aluminio No 1/0. Incluye: Soporte plástico corto para alambrón y elementos de fijación y ajuste.										$ 4.900.431,30	$ 4.825.424,70			$ 9.725.856,00
6.7	Cable de cobre desnudo No 2/0											$ 7.215.264,00			$ 7.215.264,00
6.8	Punta captadora aluminio 5/8" X 0,8m roscada Incluye: Base en aluminio, elementos de fijación y ajuste.											$ 3.538.125,00			$ 3.538.125,00
6.9	Grapa paralela bimetalica para alambrón 1/0. Inlcuye caja raweld 2400 con su respectiva tapa ciega.											$ 686.200,00			$ 686.200,00
6.10	Sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 5/8" X 2,4m. Incluye: Caja de inspección premoldeada 40X40X40cm, Soldadura exotermica 115g.											$ 4.258.500,00			$ 4.258.500,00
6.11	Suminsitro e localización de medidor bifasico trifilar.										$ 1.012.060,00				$ 1.012.060,00
	CUBIERTA No 6 REICITO														
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1.1	Localización y replanteo						$ 1.336.455,00								$ 1.336.455,00
1.2	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.						$ 1.173.502,00								$ 1.173.502,00
1.3	Desmonte marcos canchas existentes.						$ 233.184,00								$ 233.184,00
1.4	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.						$ 309.205,00								$ 309.205,00
2	**CIMIENTOS**														
2.1	Excavación manual para cimentaciónes </= 2 mts						$ 1.029.071,35	$ 1.050.454,65							$ 2.079.526,00
2.2	Rellenos compactados en recebo seleccionado al 95% PROCTOR						$ 445.731,48	$ 1.202.980,52							$ 1.648.712,00
2.4	Concreto de limpieza o solado E= 0,05 en concreto de 1.500 PSI						$ 787.224,63	$ 152.132,37							$ 939.357,00
2.5	Zapatas en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo							$ 12.047.553,00							$ 12.047.553,00
2.6	Columnas en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo							$ 800.366,26	$ 4.125.938,74						$ 4.926.305,00
2.7	Viga de cimentación en concreto de 3,000 PSI. No incluye refuerzo							$ 4.528.385,00							$ 4.528.385,00
2.8	Acero de refuerzo de 60.000 PSI						$ 6.918.990,92	$ 35.540.934,08							$ 42.459.925,00
2.9	Retiros de material sobrante de excavaciones y escombros							$ 3.607.613,00							$ 3.607.613,00
3	**ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA**														
3.1	Suministro e localización Estructura metálica según diseño estructural, en tubería estructural para columnas, domos y viga de amarre según diseño.								$ 12.187.580,78	$ 50.190.478,18	$ 52.219.592,16	$ 35.909.298,87			$ 150.506.949,99

PROGRAMACIÓN DE OBRA - FLUJO DE INVERSION

"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA"

FONDO MIXTODE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL "FONPACIFICO"

PROCESO No. OB-006-2026

		año/2026										año/2027			Total general
Item	Tareas	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	
3.2	Correa en perfil metálico rectangular de 10x10 cm Cal.16. Incluye anticorrosivo y pintura esmalte.									$ 3.553.617,12	$ 11.930.842,24	$ 11.861.105,69	$ 1.692.338,95		$ 29.037.904,00
3.3	Suministro e instalación cubierta en teja galvanizada Cal.28 Tipo STANDING SEAM ó similar, incluye tornillos de sujeción, color según diseño.											$ 12.996.781,41	$ 16.200.088,35	$ 3.625.184,24	$ 32.822.054,00
3.4	Platinas de apoyos columnas de 0.50x0.50(m) cajón principal de cubierta en platina 1/2" y 12 pernos grado 8 Ø3/4", incluye, empalme de pernos, empalme de columna a platina, soldadura y montaje.										$ 2.769.372,68	$ 6.973.943,32			$ 9.743.316,00
4	**INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS**														
4.1	Suministro e instalaciòn Bajante PVC aguas lluvias de 4"												$ 2.237.112,00		$ 2.237.112,00
4.2	Abrazadera galvanizada 2" - 4"												$ 1.249.488,00		$ 1.249.488,00
4.3	Codo de 45/90 4" PVC SANITARIO												$ 1.121.148,00		$ 1.121.148,00
4.4	Suministro e Instalación de tubería PVC Aguas Lluvias Ø6"											$ 3.805.156,00			$ 3.805.156,00
4.5	Caja de inspección en concreto de 3000 PSI SECC(0,60*0,60*1,00 m) incluye tapa en concreto y refuerzo											$ 2.165.076,00			$ 2.165.076,00
4.6	Canal en lámina Galvanizada Cal.18 ancho=0.40 metros. H=0.25 metros (Sum. E Inst. Wash Primer + Esmalte + Anclaje estructura metalica)											$ 0,00	$ 3.827.403,21	$ 937.424,79	$ 4.764.828,00
4.7	Suministro e Instalación de tubería PVC Sanitaria Corrugada Ø8"											$ 336.033,00			$ 336.033,00
4.9	Excavacion manual Tipo zanja </= 0.9 mts -- e=0,50 m										$ 391.992,64	$ 1.052.837,36			$ 1.444.830,00
4.10	Rellenos en recebo seleccionado de la misma excavacion compactado mecanico											$ 637.555,00			$ 637.555,00
5	**PISOS Y ACABADOS**														
5.1	Placa de contrapiso en concreto de 3000 psi e= 0,10 cm con malla electrosoldada de 0,15 x 0,15 de 5.0 mm												$ 2.429.209,80	$ 973.831,20	$ 3.403.041,00
6	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**														
6.1	Tuberia emt 3/4", incluye accesorios de fijación y ajustes para tubería.											$ 4.232.177,00			$ 4.232.177,00
6.2	Cable eléctrico No 10 CU AWG Libre de halogeno. Incluye: 2 fases + 1 tierra											$ 1.676.023,00			$ 1.676.023,00
6.3	Lámpara SYLVANIA-SYLVEO LED 2000 LM NAR 4K Incluye: Una Caja metalica galvanizada 4x4", un Tomacorriente 15v, 15A, con PT, una Clavija aerea 125V 15A con PT, conector terminal para tubo EMT 1/2" con contra tuerca, Elementos de fijación y ajuste, Marcación											$ 3.578.400,00			$ 3.578.400,00

PROGRAMACIÓN DE OBRA - FLUJO DE INVERSION

"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA"

FONDO MIXTODE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL "FONPACIFICO"

PROCESO No. OB-006-2026

		año/2026										año/2027			Total general
Item	Tareas	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	
6.4	Tablero eléctrico tipo exterior intemperie con Protección 2X40A y fotocontrol temporizado 220V, cumpliendo RETIE. Incluye elementos de fijación y ajuste.											$ 1.870.200,00			$ 1.870.200,00
6.5	Protección Termomagnética bipolar 2X20A 10 kA Tipo riel.											$ 97.411,77	$ 73.278,23		$ 170.690,00
6.6	Alambrón de aluminio No 1/0. Incluye: Soporte plástico corto para alambrón y elementos de fijación y ajuste.												$ 8.857.476,00		$ 8.857.476,00
6.7	Cable de cobre desnudo No 2/0												$ 6.571.044,00		$ 6.571.044,00
6.8	Punta captadora aluminio 5/8" X 0,8m roscada Incluye: Base en aluminio, elementos de fijación y ajuste.												$ 3.538.125,00		$ 3.538.125,00
6.9	Grapa paralela bimetalica para alambrón 1/0. Inlcuye caja raweld 2400 con su respectiva tapa ciega.												$ 686.200,00		$ 686.200,00
6.10	Sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 5/8" X 2,4m. Incluye: Caja de inspección premoldeada 40X40X40cm, Soldadura exotermica 115g.												$ 4.258.500,00		$ 4.258.500,00
6.11	Suminsitro e localización de medidor bifasico trifilar.											$ 1.012.060,00			$ 1.012.060,00
	A.I.U.														
	ADMINISTRACIÓN	$ 35.248.220,51	$ 45.951.786,69	$ 47.242.787,00	$ 45.951.786,69	$ 47.520.547,67	$ 47.242.787,00	$ 45.951.786,69	$ 47.520.547,67	$ 45.674.026,02	$ 47.520.547,67	$ 47.242.787,00	$ 42.814.264,74	$ 8.058.971,62	$ 553.940.846,97
	IMPREVISTOS	$ 1.468.675,88	$ 1.914.657,81	$ 1.968.449,49	$ 1.914.657,81	$ 1.980.022,85	$ 1.968.449,49	$ 1.914.657,81	$ 1.980.022,85	$ 1.903.084,45	$ 1.980.022,85	$ 1.968.449,49	$ 1.783.927,73	$ 335.790,49	$ 23.080.869,00
	UTILIDAD	$ 7.343.379,27	$ 9.573.288,88	$ 9.842.247,28	$ 9.573.288,88	$ 9.900.114,09	$ 9.842.247,28	$ 9.573.288,88	$ 9.900.114,09	$ 9.515.422,08	$ 9.900.114,09	$ 9.842.247,28	$ 8.919.638,48	$ 1.678.952,42	$ 115.404.343,00
	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y AMBIENTAL	$ 13.328.333,97	$ 17.375.650,48	$ 17.863.813,65	$ 17.375.650,48	$ 17.968.842,70	$ 17.863.813,65	$ 17.375.650,48	$ 17.968.842,70	$ 17.270.621,43	$ 17.968.842,70	$ 17.863.813,65	$ 16.189.266,03	$ 3.622.762,47	$ 210.035.904,39
	Interventoría Técnica, Administrativa, Juridica, Ambiental	$ 78.803.280,01	$ 147.961.354,75	$ 180.232.335,36	$ 240.679.835,22	$ 372.921.723,78	$ 499.633.336,34	$ 453.228.735,49	$ 315.556.554,50	$ 293.658.431,60	$ 266.850.742,86	$ 219.341.068,71	$ 122.448.508,52	$ 19.232.917,23	$ 3.210.548.824,37
	Total General mes/mes	**$ 78.803.280,01**	**$ 147.961.354,75**	**$ 180.232.335,36**	**$ 240.679.835,22**	**$ 372.921.723,78**	**$ 499.633.336,34**	**$ 453.228.735,49**	**$ 315.556.554,50**	**$ 293.658.431,60**	**$ 266.850.742,86**	**$ 219.341.068,71**	**$ 122.448.508,52**	**$ 19.232.917,23**	**$ 3.210.548.824,40**
	Total Acumulado mes/mes	**$ 78.803.280,01**	**$ 226.764.634,76**	**$ 406.996.970,12**	**$ 647.676.805,34**	**$ 1.020.598.529,12**	**$ 1.520.231.865,46**	**$ 1.973.460.600,95**	**$ 2.289.017.155,45**	**$ 2.582.675.587,05**	**$ 2.849.526.329,91**	**$ 3.068.867.398,62**	**$ 3.191.315.907,14**	**$ 3.210.548.824,40**	**3.210.548.824,40**
	Porcentaje General mes/mes	**2,45%**	**4,61%**	**5,61%**	**7,50%**	**11,62%**	**15,56%**	**14,12%**	**9,83%**	**9,15%**	**8,31%**	**6,83%**	**3,81%**	**0,60%**	
	Porcentaje Acumulado mes/mes	**2,45%**	**7,06%**	**12,68%**	**20,17%**	**31,79%**	**47,35%**	**61,47%**	**71,30%**	**80,44%**	**88,76%**	**95,59%**	**99,40%**	**100,00%**	

PROGRAMACIÓN DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT

CALENDARIO A UTILIZAR

JORNADA DE TRABAJO A UTILIZAR

"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA

PROCESO No. OB-006-2026 - "FONPACIFICO"

La semana laboral Comienza	**El Domingo**
El año fiscal Comienza	**ENERO**
Comienzo de Hora Predeterminada :	**8:00 a. m.**
Fin de Hora Predeterminada:	**5:00 p. m.**
Jornada Laboral:	**8,00 Horas**
Semana Laboral:	**48,00 Horas**
Días por Mes:	**30 Días**
Comienzo de la Tarea	**9/03/2026**
Fin de la Tarea	**7/03/2026**
Duración de la Tarea en Dias	**365 Dias**
Duración de la Tarea en Meses	**12 Meses**
Días de Excepciones:	**2**
Total Días de Excepciones:	**2**

Diego Mauricio Calderon Obando

PACOT INTEGRALES S.A.S
Nit: 900.693.242-3
Proponente
DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
Representante Legal

PACOT S.A.S
PROFESIONALES EN ASESORIAS, CAPACITACIONES, OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES INTEGRALES S.A.S
NIT 900.693.242-3

Manifestación Clara Y Expresa Aceptación De Términos

Dirección: carrera 5 N° 10 – 36 oficina 503 – Tel: 320 801 7654
Email: pacotingn2020@gmail.com

PACOT S.A.S
PROFESIONALES EN ASESORIAS, CAPACITACIONES, OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES INTEGRALES S.A.S
NIT 900.693.242-3

ANEXO No. 12
MANIFESTACIÓN CLARA Y EXPRESA

Señores
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL "FONPACÍFICO"
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Director Ejecutivo FONPACÍFICO
E.S.D

Yo, **PROFESIONALES EN ASESORIAS CAPACITACIONES OBRAS CIVILES Y TRANSPORTE INTEGRALES S.A.S**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.075.298.785 expedida en el municipio de Neiva, departamento de Huila, en mi calidad de persona natural, manifiesto clara y expresamente que conozco y acepto los términos del proceso No. **OB-006-2026**, de la contratación derivada del fondo **CONTRATACIÓN NIVEL 1,** con objeto **"CONSTRUCCION DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO – HUILA"**

Nombre del Asociado técnico: **PROFESIONALES EN ASESORIAS CAPACITACIONES OBRAS CIVILES Y TRANSPORTE INTEGRALES S.A.**

FIRMA Diego Mauricio Calderon Obando.
DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
C.C. No. 1.075.298.785 de Neiva
Representante Legal
PACOT INTEGRALES S.A.S.
Nit. 900.693.242-3

PACOT S.A.S
PROFESIONALES EN ASESORIAS, CAPACITACIONES, OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES INTEGRALES S.A.S
NIT 900.693.242-3

Apoyo A La Industria Nacional

Dirección: carrera 5 N° 10 – 36 oficina 503 – Tel: 320 801 7654
Email: pacotingn2020@gmail.com

PACOT S.A.S
PROFESIONALES EN ASESORIAS, CAPACITACIONES, OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES INTEGRALES S.A.S
NIT 900.693.242-3

ANEXO No. 13
ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA

Señores
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL "FONPACÍFICO"
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Director Ejecutivo FONPACÍFICO
E.S.D

OBJETO: "CONSTRUCCION DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO – HUILA"

DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.075.298.785 de Neiva, actuando en condición de representante legal de **PROFESIONALES EN ASESORIAS CAPACITACIONES OBRAS CIVILES Y TRANSPORTE INTEGRALES S.A.S**, en adelante el "Asociado técnico", presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o contratistas colombianos.

En constancia, se firma en Neiva, a los 25 días del mes de febrero de 2026.

FIRMA Diego Mauricio Calderon Obando.
DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
C.C. No. 1.075.298.785 de Neiva
Representante Legal
PACOT INTEGRALES S.A.S.
Nit. 900.693.242-3
Teléfono: 320 801 7654
Neiva

PACOT S.A.S
PROFESIONALES EN ASESORIAS, CAPACITACIONES, OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES INTEGRALES S.A.S
NIT 900.693.242-3

Anexo 3
Multas, Sanciones

Dirección: carrera 5 N° 10 – 36 oficina 503 – Tel: 320 801 7654
Email: pacotingn2020@gmail.com

PACOT S.A.S
PROFESIONALES EN ASESORIAS, CAPACITACIONES, OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES INTEGRALES S.A.S
NIT 900.693.242-3

ANEXO No. 3
DECLARACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES

PROCESO: OB-006-2026

Señores
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL "FONPACÍFICO"
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Director Ejecutivo FONPACÍFICO
E.S.D

El suscrito **PROFESIONALES EN ASESORIAS CAPACITACIONES OBRAS CIVILES Y TRANSPORTE INTEGRALES** en calidad de persona natural, comedidamente me permito manifestarles a ustedes que durante los últimos cinco (5) años NO he sido sancionado y multado de conformidad con el siguiente detalle:

No.	ENTIDAD	CONCEPTO DE LA SANCIÓN Y/O MULTA	VALOR DE LA SANCIÓN Y/O MULTA	FECHA Y PERIODO DE LA SANCIÓN Y/O MULTA
N/A				

FIRMA Diego Mauricio Calderon Obando.
DIEGO MAURICIO CALDERON OBANDO
C.C. No. 1.075.298.785 de Neiva
Representante Legal
PACOT INTEGRALES S.A.S.
Nit. 900.693.242-3
