CONTRATO NÚMERO: 1.310-19.13-1010 **FECHA:** 15/01/2026

CONTRATANTE: Departamento del Valle del Cauca.

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y FOMENTO DEL EMPLEO

CONTRATISTA: MARIA ISABEL ARIAS TREJOS

VALOR: VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($24.000.000)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 5500006845 **DE FECHA:**06/01/2026

REGISTRO PRESUPUESTAL: 5600100647 **DE FECHA:** 15/01/2026

FUENTE DE FINANCIACIÓN: LIBRE DESTINACIÓN

PLAZO: 30 de Junio de 2026

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: JUAN JOSÉ VALENZUELA HURTADO

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL COMO ADMINISTRADOR(A) DE EMPRESAS ESPECIALISTA EN GESTION PUBLICA EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y FOMENTO DEL EMPLEO EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ECONOMICAS DEL VALLE DEL CAUCA

Los suscritos JUAN JOSÉ VALENZUELA HURTADO identificado con cédula de ciudadanía número 1.125.641.727, actuando como SUPERVISOR o INTERVENTOR, MARIA ISABEL ARIAS TREJOS portador de la cédula de ciudadanía 27.373.988, obrando como CONTRATISTA, nos reunimos en las instalaciones de LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y FOMENTO DEL EMPLEO con el objetivo de suscribir el acta final de cumplimiento de ejecución del contrato.

Que en cumplimiento del objeto contractual se establecieron las obligaciones a cargo del Contratista los cuales se determinaron en:

1. Realizar, conforme a indicaciones del líder de programa, la formulación de los proyectos que contribuyan al desarrollo del proceso M2-P2 "y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca", que le sean asignados por el jefe inmediato y/o supervisor del contrato. 2. Brindar acompañamiento en el diseño de los formatos y herramientas para facilitar el seguimiento a las acciones desarrolladas en torno al proceso M2-P2 y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca. 3. Realizar seguimiento a la inversión pública adelantada por la dependencia en el marco del proceso M2-P2 "y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca". 4. Realizar seguimiento al avance en el cumplimiento de los indicadores de producto y de gestión definidos para los proyectos de inversión a cargo de la dependencia. 5. Elaborar informes periódicos del avance de ejecución de los proyectos de inversión a cargo de la dependencia. 6. Participar activamente en actividades incluidas las de fortalecimiento, como capacitaciones, reuniones desarrolladas por la Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, así como las que otras dependencias de la Gobernación Valle del Cauca lleven a cabo. Igualmente, asistir y participar en las mesas de trabajo y otras instancias en las que sea designado, conforme a la instrucción impartida por el Jefe y/o Supervisor, o las que convoquen de otras dependencias de la Gobernación del Valle. 7. Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato o jefe inmediato, para el cumplimiento del objeto contractual y estén acorde con la naturaleza del contrato. 8. Apoyar la difusión de los contenidos de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Desarrollo Económico cada vez que se realice una publicación, en las plataformas Instagram, Facebook, X y YouTube, realizando por cada publicación acciones de interacción tales como dar "me gusta" y comentar y/o compartir los contenidos en sus redes sociales personales, con el fin de fortalecer el alcance y el engagement institucional.

Que, de conformidad con lo anterior, el **CONTRATISTA** cumplió totalmente con todas las obligaciones del contrato, así:

ACTIVIDADES REALIZADAS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 1.310.19.13.1010-2026 DEL MES DE ENERO DE VIG.2026

1.Realizar, conforme a indicaciones del líder de programa, la formulación de los proyectos que contribuyan al desarrollo del proceso M2-P2 "y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca", que le sean asignados por el jefe inmediato y/o supervisor del contrato.

Brindé acompañamiento en la formulación de los proyectos asignados, conforme a las indicaciones del líder de programa, contribuyendo al desarrollo del proceso M2-P2 y al fortalecimiento económico del departamento del Valle del Cauca.

Asimismo, realicé el proceso de ajuste de recursos de gestión en la plataforma PIIP y la actualización de los valores POAI 2026, en conjunto con la formuladora Dra. Luz Mery Ocampo, lider del area de planeacion SEDEC, garantizando la coherencia técnica y financiera de los

proyectos así:

1. PI37-102465 BPIN 2024003760151 No. Proceso en PIIP EJ-AJ-TER-0376-0750
2. PI37-102481 BPIN 2024003760096 No. Proceso en PIIP EJ-AJ-TER-0376-0733
3. PI38-102556 BPIM 2024003760152 No. Proceso en PIIP EJ-AJ-TER-0376-0753
4. PI39-102571 BPIN 2024003760150 No. Proceso en PIIP EJ-AJ-TER-0376-0851
5. P37-102499 BPIN 2024003760114 No. Proceso en PIIP EJ-AJ- TER-0376-0849
6. PI39-102462 BPIN 202500000023888 No. Proceso en PIIP EJ-AJ-TER-0376-0829
7. PI38-102756 BPIN 202500000045486 No. Proceso en PIIP EJ-AJ-TER-0376-0870
8. PI38-102555 BPIN 202500000007106 No. Proceso en PIIP EJ-AJ TER-0376-0757

2. Brindar acompañamiento en el diseño de los formatos y herramientas para facilitar el seguimiento a las acciones desarrolladas en torno al proceso M2-P2 y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca.

Realice en conjunto con la dra. Luz Mery Ocampo Benitez, lider del area de planeacion SEDEC, el digenciamiento del Formato de Plan de Accion Unico Institicuonal -PAUI 2026. En el cual se registraron y organizaron las actividades, metas y recursos de los proyectos de inversion que se ejecutaran en la vigencia 2026 – de la Secretaria de Desarrollo Economico, Competitividad y Fomento del Empleo, diferenciando entre gasto de inversión y gasto de funcionamiento. El cual es un insumo técnico que se articula con el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) y con las directrices del Departamento Nacional de Planeación (DNP), y plataforma PIIP.

3. Realizar seguimiento a la inversión pública adelantada por la dependencia en el marco del proceso M2-P2 "y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca".

Realicé el seguimiento a la inversión pública adelantada por la dependencia, garantizando transparencia y control en el marco del proceso M2-P2.

1. PI37-102465 BPIN 2024003760151
2. PI37-102481 BPIN 2024003760096
3. PI38-102556 BPIM 2024003760152
4. PI39-102571 BPIN 2024003760150
5. P37-102499 BPIN 2024003760114
6. PI39-102462 BPIN 202500000023888
7. PI38-102756 BPIN 202500000045486
8. PI38-102555 BPIN 202500000007106

4. Realizar seguimiento al avance en el cumplimiento de los indicadores de producto y de gestión definidos para los proyectos de inversión a cargo de la dependencia.

Llevé a cabo el seguimiento al avance en el cumplimiento de los indicadores de producto y de gestión definidos para los proyectos de inversión a cargo de la dependencia, con la finalidad de realizar el reporte de avance de los proyectos en plataforma PIIP.

5. Elaborar informes periódicos del avance de ejecución de los proyectos de inversión a cargo de la dependencia.

Revisé los informes periódicos de ejecución de los proyectos de inversión, remitidos por las Subsecretarías de Emprendimiento, Internacionalización y Competitividad de la Secretaría de Desarrollo Económico y Fomento del Empleo.

La información contenida en dichos informes la consolidé en una matriz de seguimiento, la cual sirvió como base para:

- Elaborar el reporte en la plataforma PIIP.
- Generar insumos complementarios para la plataforma EVAPLAN

6. Participar activamente en actividades incluidas las de fortalecimiento, como capacitaciones, reuniones desarrolladas por la Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, así como las que otras dependencias de la Gobernación Valle del Cauca lleven a cabo. Igualmente, asistir y participar en las mesas de trabajo y otras instancias en las que sea designado, conforme a la instrucción impartida por el Jefe y/o Supervisor, o las que convoquen de otras dependencias de la Gobernación del Valle.

Participé activamente en capacitaciones, reuniones, mesas de trabajo y demás actividades de fortalecimiento convocadas por la Secretaría de Desarrollo Económico y otras dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca, conforme a las instrucciones impartidas por el jefe inmediato y/o supervisor.

7. Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato o jefe inmediato, para el cumplimiento del objeto contractual y estén acorde con la naturaleza del contrato.

Cumplí con las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato o jefe inmediato, asegurando coherencia con la naturaleza del objeto contractual.

8. Apoyar la difusión de los contenidos de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Desarrollo Económico cada vez que se realice una publicación, en las plataformas Instagram, Facebook, X y YouTube, realizando por cada publicación acciones de interacción tales como dar "me gusta" y comentar y/o compartir los contenidos en sus redes sociales personales, con el fin de fortalecer el alcance y el engagement institucional.

Apoyé la difusión de contenidos en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Desarrollo Económico, realizando acciones de interacción como dar "me gusta", comentar y compartir publicaciones en mis redes personales, fortaleciendo el alcance y el engagement institucional.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

DE LA ACTIVIDAD 1: se adjunta Print procesos llevados a cabo en plataforma PIIP, referente al ajuste de recursos de gestión y actualización valores POAI 2026

- PI37-102465 BPIN 2024003760151 No. Proceso en PIIP EJ-AJ-TER-0376-0750

972958 **2024003760151** En Ejecucion	Fortalecimiento de los clústeres y las apuestas productivas en el Valle	Ejecución **Ajustes sin trámite presupuestal ET** EJ-AJ-TER-0376-0750 **Completado**

- PI37-102481 BPIN 2024003760096 No. Proceso en PIIP EJ-AJ-TER-0376-0733

1000368 **2024003760096** En Ejecucion **Comercio. industria v**	Fortalecimiento del tejido empresarial y desarrollo de estrategias de negociación en el	Ejecución **Ajustes sin trámite presupuestal ET** EJ-AJ-TER-0376-0733 **Completado**

- PI38-102556 BPIM 2024003760152 No. Proceso en PIIP EJ-AJ-TER-0376-0753

977196 **2024003760152** En Ejecucion	Mejoramiento de la formalidad laboral en el Valle del Cauca	Ejecución **Ajustes sin trámite presupuestal ET** EJ-AJ-TER-0376-0753 **Completado**

- PI39-102571 BPIN 2024003760150 No. Proceso en PIIP EJ-AJ-TER-0376-0851

1082695 **2024003760150** En Ejecucion	Fortalecimiento de la innovación para el tejido empresarial del Valle	Ejecución **Ajustes sin trámite presupuestal ET** EJ-AJ-TER-0376-0851 **Completado**

- P37-102499 BPIN 2024003760114 No. Proceso en PIIP EJ-AJ- TER-0376-0849

1004794 **2024003760114** En Ejecucion **Comercio. industria v**	Fortalecimiento De Las Unidades Económicas En El Valle Del Cauca. Valle del Cauca	Ejecución **Ajustes sin trámite presupuestal ET** EJ-AJ-TER-0376-0849 **Completado**

- PI39-102462 BPIN 202500000023888 No. Proceso en PIIP EJ-AJ-TER-0376-0829

1429461 **202500000023888** En Ejecucion **Ciencia, tecnología e**	Adecuación y dotación de un centro de innovación e inteligencia artificial para la competitividad, el desarrollo económico y la inclusión social en el	Ejecución **Ajustes sin trámite presupuestal ET** EJ-AJ-TER-0376-0829 **Completado**


- PI38-102756 BPIN 202500000045486 No. Proceso en PIIP EJ-AJ-TER-0376-0870


1636065 **202500000045486** En Ejecucion **Comercio. industria v**	Incremento de las capacidades institucionales de cooperación internacional en el departamento	Ejecución **Ajustes sin trámite presupuestal ET** EJ-AJ-TER-0376-0870 **Completado**


- PI38-102555 BPIN 202500000007106 No. Proceso en PIIP EJ-AJ TER-0376-0757

1318299 **202500000007106** En Ejecucion	Mejoramiento de competencias técnicas y humanas en el sector manufacturero en el departamento	Ejecución **Ajustes sin trámite presupuestal ET** EJ-AJ-TER-0376-0757 **Completado**


DE LA ACTIVIDADES 2: Adjunto Print sobre seguimiento a las acciones desarrolladas en torno al proceso M2-P2

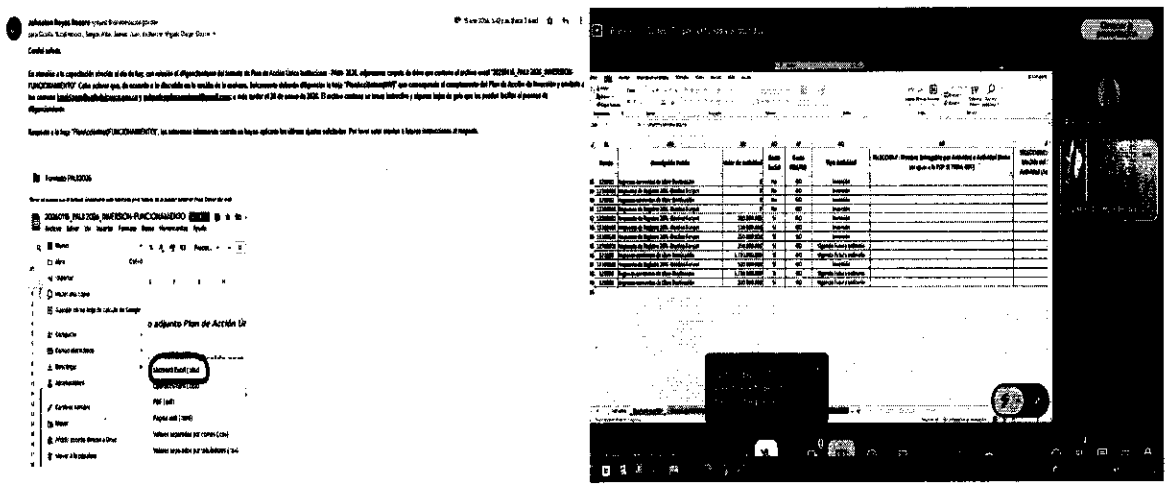

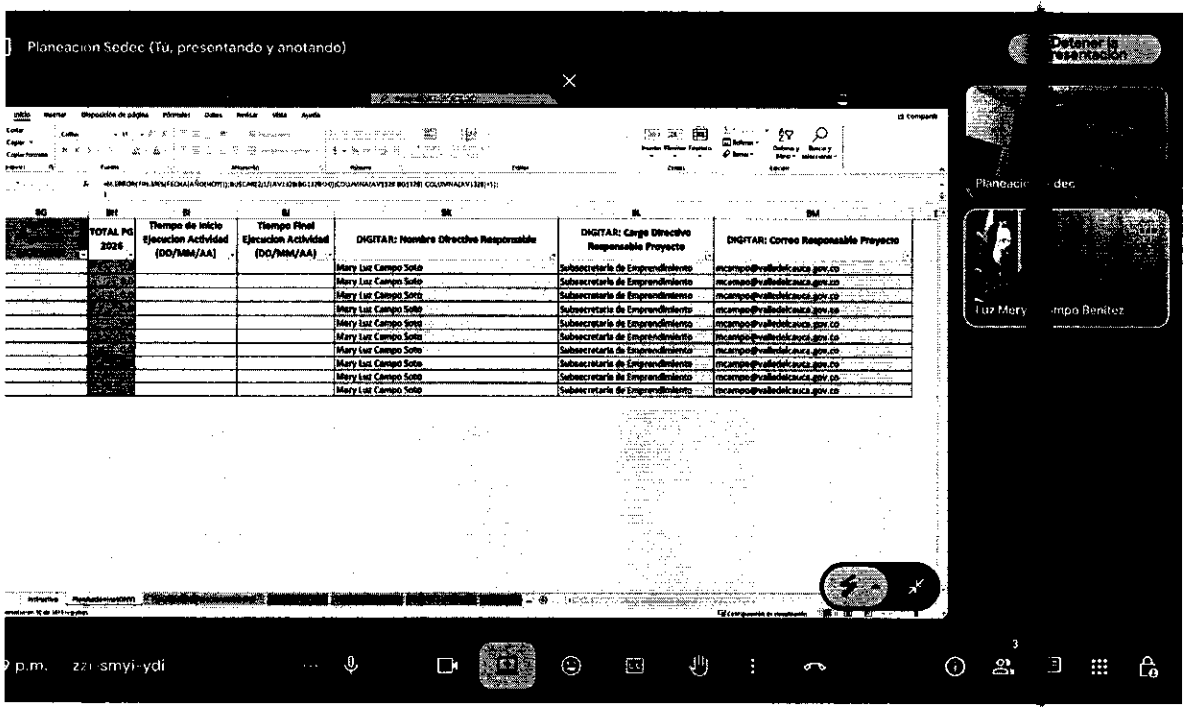
Planeacion Sedec (Tú, presentando y anotando)
Detener la presentación
Planeación Sedec
Luz Mery Campo Benitez
TOTAL PG 2026
Tiempo de Inicio Ejecucion Actividad (DD/MM/AA)
Tiempo Final Ejecucion Actividad (DD/MM/AA)
DIGITAR: Nombre Directivo Responsable
DIGITAR: Cargo Directivo Responsable Proyecto
DIGITAR: Correo Responsable Proyecto
Mary Luz Campo Soto
Subsecretaria de Emprendimiento
mcampo@valledelcauca.gov.co


Buenas tardes Dr. Juan Jose, el equipo de Planeación, esta trabajando en el Plan de acción de inversión y funcionamiento vigencia fiscal 2026.
7:00 p.m.
Gracias a todos !!!
7:02 p.m.
20260115_PAUI 2026_INVERSION_
Buenas noches compañeros: @Julio César Gómez Narváez Sedec, jhon Jairo, @Paula SEDEC 102499, @Lina María Hernández Formuladora Sedec, @Alejandro BussamanteSedec. Se solicita comedidamente la revisión de la programación del Formato de Plan de acción 2026 de cada uno de sus proyectos con el fin de que si estiman un cambio lo hagamos el lunes a primera hora .Muchas gracias
7:45 p.m.
Escribe un mensaje

DE LA ACTIVIDAD 6: adjunto Print, sobre las capacitaciones, reuniones desarrolladas por la Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, así como las que otras dependencias de la Gobernación Valle del Cauca

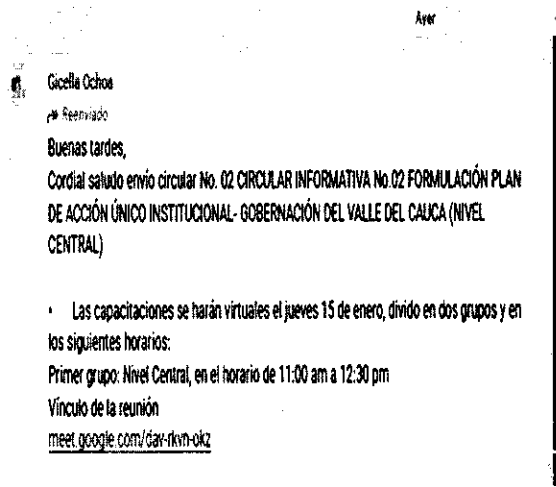

Ayer

Gicella Ochoa

Reenviado

Buenas tardes,


Cordial saludo envío circular No. 02 CIRCULAR INFORMATIVA No.02 FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN ÚNICO INSTITUCIONAL- GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA (NIVEL CENTRAL)


- Las capacitaciones se harán virtuales el jueves 15 de enero, divido en dos grupos y en los siguientes horarios:


Primer grupo: Nivel Central, en el horario de 11:00 am a 12:30 pm


Vínculo de la reunión

meet.google.com/dav-rkvn-okz





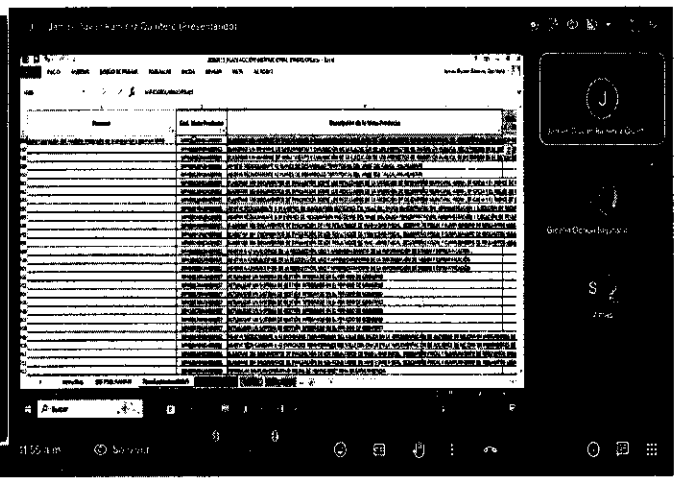



GOBERNACIÓN Departamento del Valle del Cauca
Departamento Administrativo de Planeación

paraíso de todos

CAPACITACIÓN -PLAN DE ACCIÓN ÚNICO INSTITUCIONAL -PAUI- 2026

Capacitación organizada por el Departamento Administrativo de Planeación, Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional y el equipo MIPG MIPG

9 de enero de 2026

Acceder a Forms para guardar el progreso. Más información


* Indica que la pregunta es obligatoria

Con el fin de dar cumplimiento al Manual de Política de Protección de Datos personales de la Gobernación del Valle del Cauca, la Ley 1581 de 2012 , el Decreto 1377 de 2013, y la Ley 1712 de 2014, la Gobernación del Valle del Cauca NIT 890.399.029-8, email contactenos@valledelcauca.gov.co, con domicilio principal en la Carrera 6 entre Calles 9 y 10 Edificio Palacio de San Francisco en la ciudad de Cali, le indica que la información por usted suministrada será recolectada, con la finalidad mejorar el servicio al ciudadano a través de los servicios, trámites, OPAS y PQRSD que ofrece la entidad.

Si

Nombre completo *

MARIA ISABEL ARIAS TREJOS

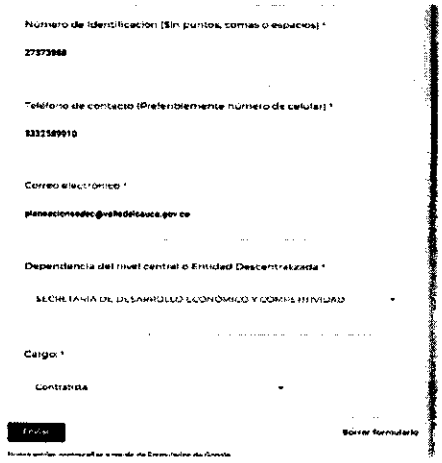

Número de identificación (Sin puntos, comas o espacios) *

27373988

Teléfono de contacto (Preferiblemente número de celular) *

3332589910

Correo electrónico *

planeacionsedec@valledelcauca.gov.co

Dependencia del nivel central o Entidad Descentralizada *


SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Cargo *

Contratista

Enviar

Borrar formulario



GOBERNACIÓN Departamento del Valle del Cauca
Departamento Administrativo de Planeación


paraíso de todos


CAPACITACIÓN -PLAN DE ACCIÓN ÚNICO INSTITUCIONAL -PAUI- 2026


Gracias por su participación.


El formulario se creó en Gobernación del Valle.
¿El formulario parece sospechoso? Informar

Google Formularios

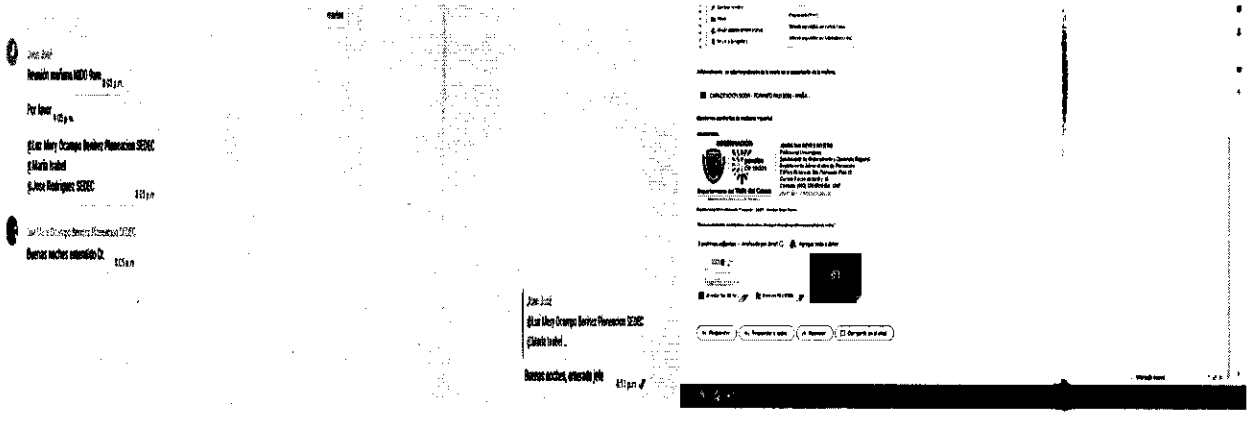


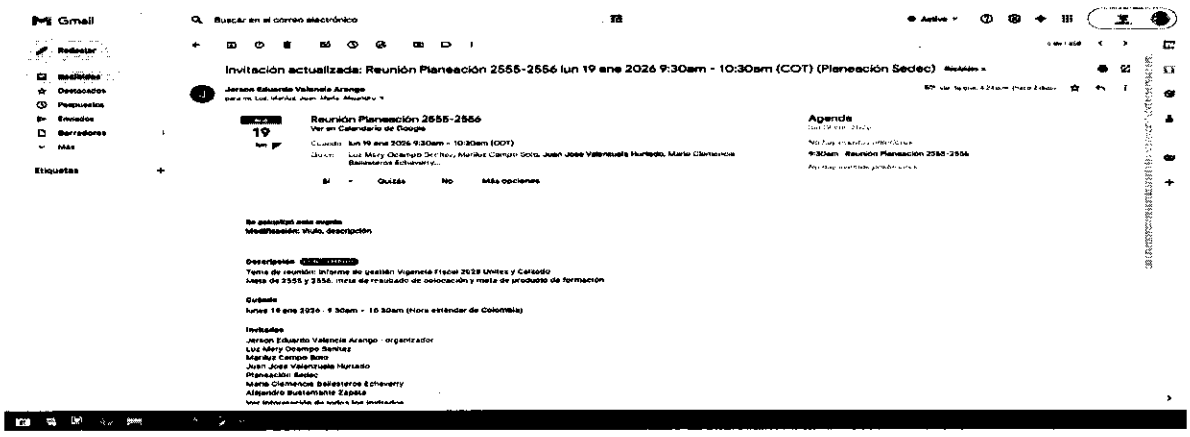
Gmail
Buscar en el correo electrónico
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más
Etiquetas
Invitación actualizada: Reunión Planeación 2555-2556 lun 19 ene 2026 9:30am - 10:30am (COT) (Planeación Sedec)
Jerson Eduardo Valencia Arango
para mí, Luz, Maritza, Juan, María, Alejandro
Reunión Planeación 2555-2556
Ver en Calendario de Google
Cuando lun 19 ene 2026 9:30am – 10:30am (COT)
Quizás
No
Más opciones
Se solicitó este cambio
Modificación: título, descripción
Descripción
Tema de reunión: Informe de gestión Vigencia Fiscal 2025 Unitas y Carlosito
Mesa de 2555 y 2556. mirar de resultado de colocación y meta de producto de formación
Cuando
lunes 19 ene 2026 · 9:30am – 10:30am (Hora estándar de Colombia)
Invitados
Jerson Eduardo Valencia Arango - organizador
Luz Mery Ocampo Sanchez
Maritza Campo Soto
Juan Jose Valenzuela Hurtado
Planeación Sedec
María Clemencia Ballesteros Echeverry
Alejandro Bustamante Zapata
Agenda
9:30am Reunión Planeación 2555-2556

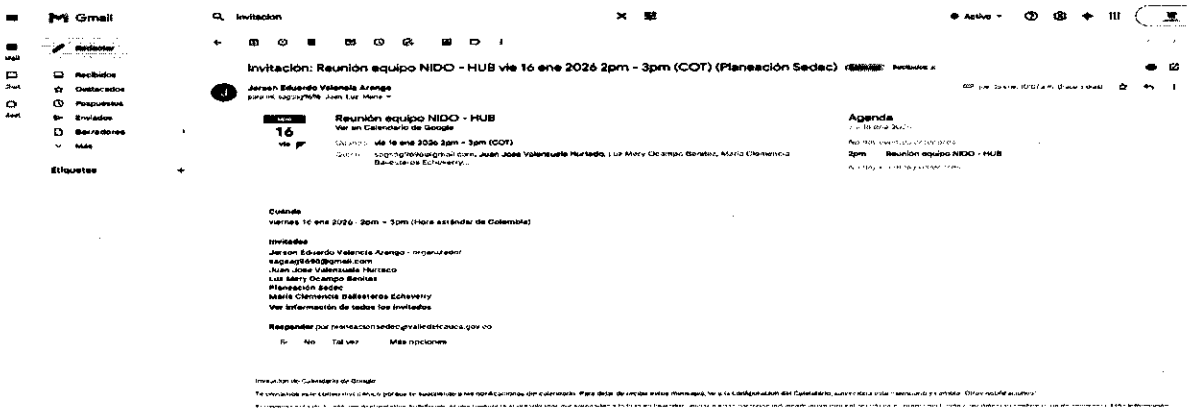
Gmail
Invitación
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más
Etiquetas
Invitación: Reunión equipo NIDO - HUB vie 16 ene 2026 2pm - 3pm (COT) (Planeación Sedec)
Jerson Eduardo Valencia Arango
Reunión equipo NIDO - HUB
Ver en Calendario de Google
Cuándo vie 16 ene 2026 2pm – 3pm (COT)
Juan Jose Valenzuela Hurtado, Luz Mery Ocampo Sanchez, María Clemencia Ballesteros Echeverry...
Agenda
2pm Reunión equipo NIDO - HUB
Cuando
viernes 16 ene 2026 · 2pm – 3pm (Hora estándar de Colombia)
Invitados
Jerson Eduardo Valencia Arango - organizador
Juan Jose Valenzuela Hurtado
Luz Mery Ocampo Sanchez
Planeación Sedec
María Clemencia Ballesteros Echeverry
Ver información de todos los invitados
Responder por planeacionsedec@valledelcauca.gov.co
Sí
No
Tal vez
Más opciones

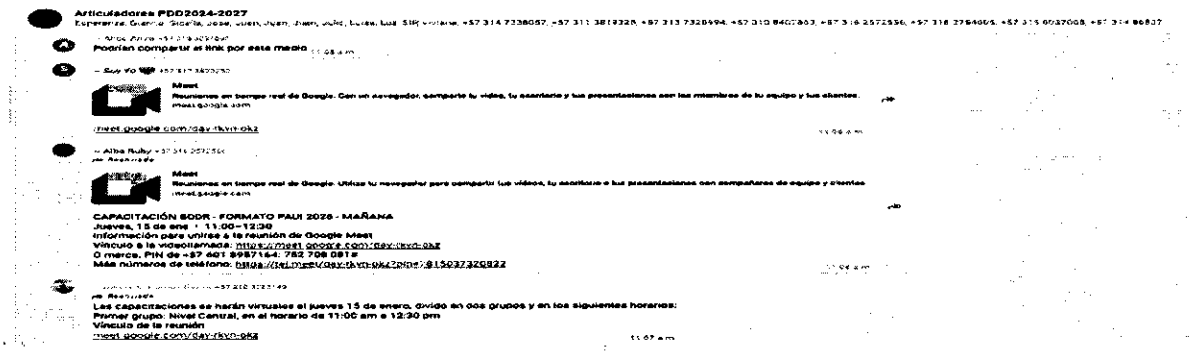
Articuladores PDD2024-2027
Podrían compartir el link por este medio
Meet
Reuniones en tiempo real de Google. Con un navegador, comparte tu video, tu escritorio y tus presentaciones con los miembros de tu equipo y tus clientes.
meet.google.com
meet.google.com/day-rkvn-okz
Alba Ruby
Meet
Reuniones en tiempo real de Google. Utiliza tu navegador para compartir tus videos, tu escritorio e tus presentaciones con compañeros de equipo y clientes
meet.google.com
CAPACITACIÓN SGDR - FORMATO PAUI 2026 - MAÑANA
Jueves, 15 de ene · 11:00 – 12:30
Información para unirse a la reunión de Google Meet
Vínculo a la videollamada: https://meet.google.com/day-rkvn-okz
O marque. PIN de +57 601 8957164: 782 708 081#
Más números de teléfono: https://tel.meet/day-rkvn-okz?pin=8150373709822
Las capacitaciones se harán virtuales el jueves 15 de enero. Dividio en dos grupos y en los siguientes horarios:
Primer grupo: Nivel Central, en el horario de 11:00 am a 12:30 pm
Vínculo de la reunión
meet.google.com/day-rkvn-okz

Mesa de trabajo con la profesional Lina Hernández de la subsecretaria de Emprendimiento y la Dra. Luz Mery Ocampo Benítez, líder área planeación de la Subdirección Técnica de Apoyo a la Gestión, para la revisión del proyecto PI37-102499 en su fase inicial para la vigencia 2026.

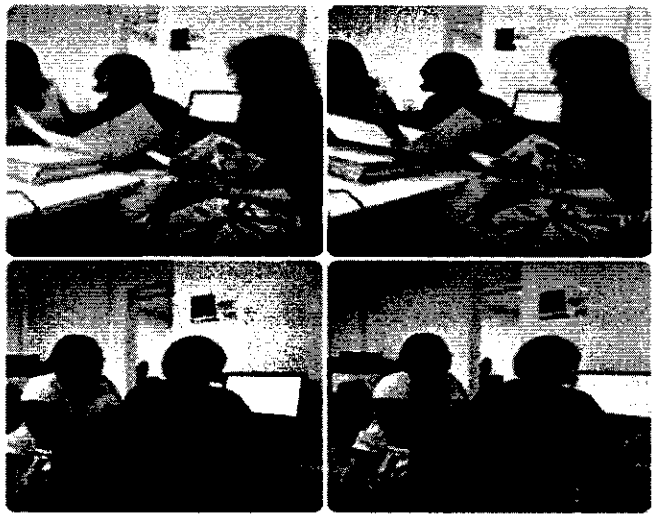

ACTIVIDADES REALIZADAS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 1.310.19.13.1010-2026 DEL MES DE FEBRERO DE VIG.2026

1. Realizar, conforme a indicaciones del líder de programa, la formulación de los proyectos que contribuyan al desarrollo del proceso M2-P2 "y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca", que le sean asignados por el jefe inmediato y/o supervisor del contrato.

Durante el periodo asignado atendí las indicaciones del líder de programa en relación con la formulación de proyectos del proceso M2-P2 y la promoción del desarrollo económico del Valle del Cauca. Revisé lineamientos y criterios para asegurar la coherencia con los objetivos institucionales, manteniendo disposición para la formulación de iniciativas, aunque en este lapso no se generaron proyectos específicos bajo mi gestión.

2. Brindar acompañamiento en el diseño de los formatos y herramientas para facilitar el seguimiento a las acciones desarrolladas en torno al proceso M2-P2 y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca.

En conjunto con mi compañero José Rodríguez elaboramos el ajuste a la data correspondiente a la matriz de "Reporte de avance de ejecución PIIP – EVAPLAN". La finalidad de este trabajo fue socializar la información ante el equipo de trabajo, liderado por las Subsecretarías de Emprendimiento, Competitividad e Internacionalización, con el propósito de que se replicara entre

los apoyos responsables de la supervisión, seguimiento y análisis del alcance de las metas de los proyectos SEDEC 2026.

3. Realizar seguimiento a la inversión pública adelantada por la dependencia en el marco del proceso M2-P2 "y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca".

Realicé seguimiento a la inversión pública adelantada por la dependencia en el marco del proceso M2-P2, orientado a promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca. El seguimiento se efectuó sobre tres proyectos, con el fin de consolidar la información para su reporte financiero. No se realizó seguimiento técnico, dado que la ejecución de estos proyectos se encuentra actualmente en fase precontractual.

4. Realizar seguimiento al avance en el cumplimiento de los indicadores de producto y de gestión definidos para los proyectos de inversión a cargo de la dependencia.

Se realizo el seguimiento en plataforma PIIP de los suguientes proyectos en su etapa incial.

- ID: 1004794 BPIN: 2024003760114 Periodo(S) Abierto(S): 2026 Enero(05/01/2026 - 06/02/2026), BPIN 2024003760114 -FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL VALLE DEL CAUCA. VALLE DEL CAUCA
- PI37-102481-BPIN2024003760096 ID: 1000368 BPIN: 2024003760096 Periodo(S) Abierto(S): 2026 Enero(05/01/2026 - 06/02/2026), FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN EN EL VALLE DEL CAUCA
- PI39-102571 BPON 2024003760150: 1082695 BPIN: 2024003760150 Periodo(S) Abierto(S): 2026 Enero (05/01/2026 - 06/02/2026), FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN PARA EL TEJIDO EMPRESARIAL DEL VALLE DEL CAUCA
- De Los Proyectos PI39102642, PI37-102756, PI38-102556, PI38-102555 No Se Generó Movimiento Financiero En El Mes De enero 2026 Por Lo Tanto No Se Reporta En Plataforma PIIP.
- PI37-102756 BPIN 202500000045486 COOPERACION INTERNACIONAL, no se genero reporte en el mes de Enero 2026, dado que es un proyecto nuevo.

5. Elaborar informes periódicos del avance de ejecución de los proyectos de inversión a cargo de la dependencia.

Recibí y revisé los informes periódicos remitidos por los enlaces responsables de reportar el avance de actividades, consolidando la información para garantizar su adecuada incorporación en los registros institucionales y apoyar el análisis del cumplimiento de metas.

6. Participar activamente en actividades incluidas las de fortalecimiento, como capacitaciones, reuniones desarrolladas por la Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, así como las que otras dependencias de la Gobernación Valle del Cauca lleven a cabo. Igualmente, asistir y participar en las mesas de trabajo y otras instancias en las que sea designado, conforme a la instrucción impartida por el Jefe y/o Supervisor, o las que convoquen de otras dependencias de la Gobernación del Valle.

Participé en las capacitaciones programadas para el mes de febrero de 2026, impartidas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Dirección de Planeación Departamental, relacionadas con el reporte de avance de ejecución de actividades. En este espacio se abordaron temas como la elaboración de línea base cero para proyectos nuevos y línea base uno para proyectos en vigencia 2026, tomando como referencia los ajustes normativos aplicados a los proyectos. En este marco, asistí y tomé parte activa en las sesiones, contribuyendo al proceso de actualización y fortalecimiento institucional

- Invitación Webinar Orientaciones para fortalecer los Reportes Territoriales: CUIPO y FUT Recibidos
- La PIIP nos conecta, SIPLina Sarria Repote de avance en la PIIP
- COMITE DE CONTRATACIÓN VIGENCIA FISCAL 2026 vie 23 ene 2026 9am - 10am (COT) (Planeación Sedec)

7. Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato o jefe inmediato, para el cumplimiento del objeto contractual y estén acorde con la naturaleza del contrato.

Participé activamente en las actividades de fortalecimiento convocadas por la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, así como en las instancias designadas por otras dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.

8. Apoyar la difusión de los contenidos de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Desarrollo Económico cada vez que se realice una publicación, en las plataformas Instagram, Facebook, X y YouTube, realizando por cada publicación acciones de interacción tales como dar "me gusta" y comentar y/o compartir los contenidos en sus redes sociales personales, con el fin de fortalecer el alcance y el engagement institucional.


Mi participación se centró en la interacción con las publicaciones realizadas en las plataformas institucionales, a través de acciones como la lectura, el seguimiento constante y la generación de "me gusta", fortaleciendo así el alcance y el engagement institucional.


EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS


ACTIVIDADES 4


REPORTE DE AVANCE DE ACTIVIADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026


ID: 1004794 BPIN: 2024003760114 Periodo(s) abierto(s): 2026 Enero(05/01/2026 - 06/02/2026), BPIN 2024003760114 -FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL VALLE DEL CAUCA. VALLE DEL CAUCA

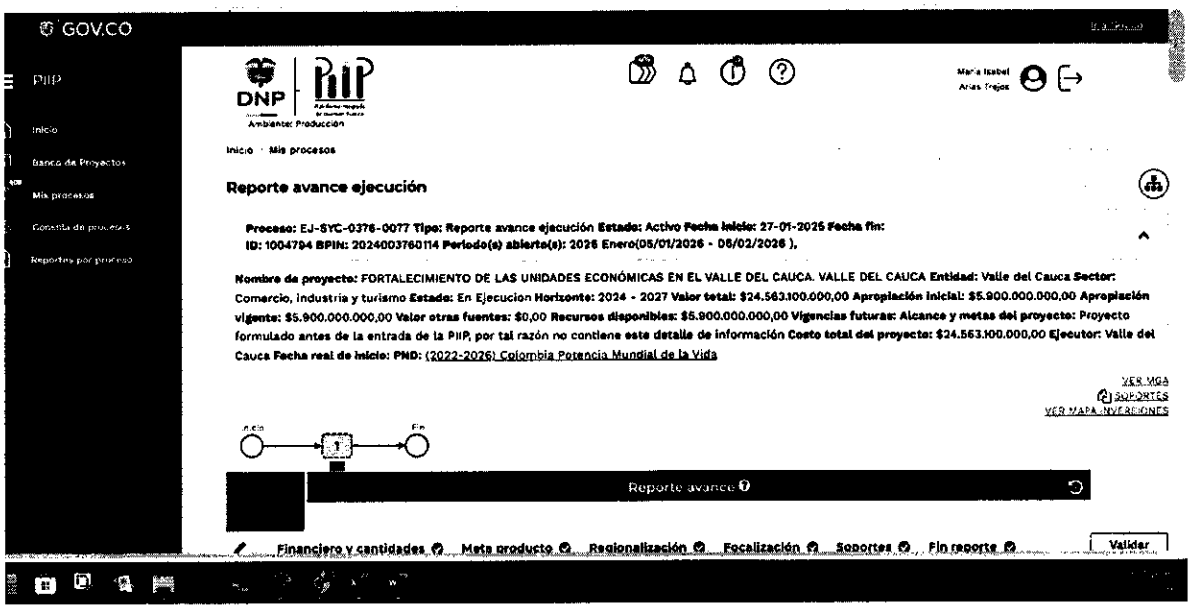

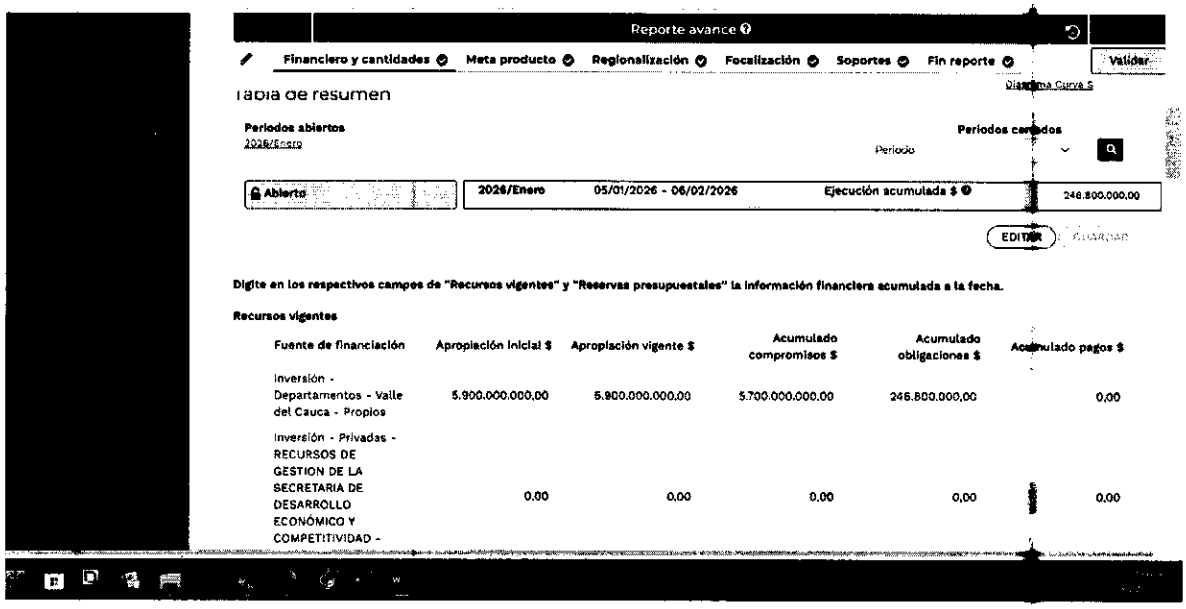

Reporte avance
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Tabla de resumen
Periodos abiertos
2026/Enero
Periodos cerrados
Periodo
Abierto
2026/Enero
05/01/2026 - 06/02/2026
Ejecución acumulada $
246.800.000,00
EDITAR
Digite en los respectivos campos de "Recursos vigentes" y "Reservas presupuestales" la información financiera acumulada a la fecha.
Recursos vigentes
Fuente de financiación
Apropiación inicial $
Apropiación vigente $
Acumulado compromisos $
Acumulado obligaciones $
Acumulado pagos $
Inversión - Departamentos - Valle del Cauca - Propios
5.900.000.000,00
5.900.000.000,00
5.700.000.000,00
246.800.000,00
0,00
Inversión - Privadas - RECURSOS DE GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD -
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

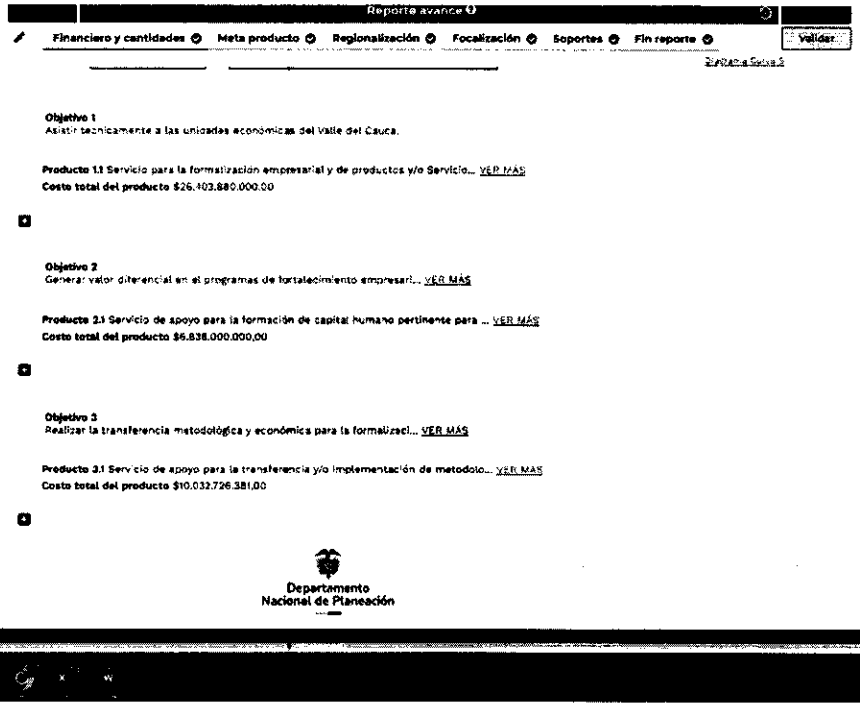
Reporte avance
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Objetivo 1
Asistir técnicamente a las unidades económicas del Valle del Cauca.
Producto 1.1 Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio... VER MAS
Costo total del producto $26.403.880.000,00
Objetivo 2
Generar valor diferencial en el programas de fortalecimiento empresari... VER MAS
Producto 2.1 Servicio de apoyo para la formación de capital humano pertinente para ... VER MAS
Costo total del producto $6.838.000.000,00
Objetivo 3
Realizar la transferencia metodológica y económica para la formalizaci... VER MAS
Producto 3.1 Servicio de apoyo para la transferencia y/o implementación de metodolo... VER MAS
Costo total del producto $10.032.726.381,00
Departamento Nacional de Planeación

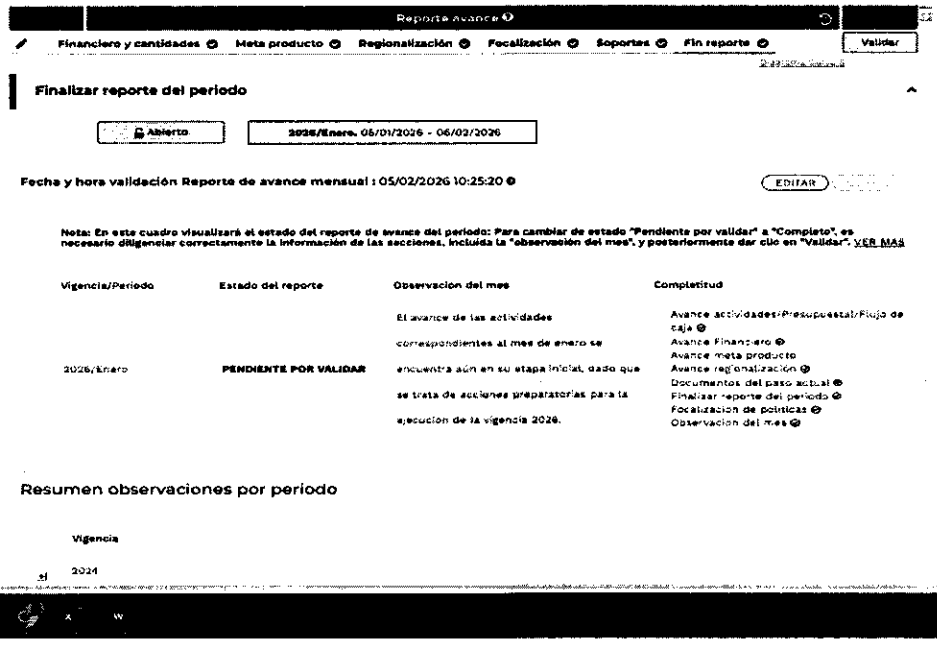
Reporta Avance
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2026/Enero. 05/01/2026 - 06/02/2026
Fecha y hora validación Reporte de avance mensual : 05/02/2026 10:25:20
EDITAR
Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". VER MAS
Vigencia/Periodo
Estado del reporte
Observación del mes
Completitud
2026/Enero
PENDIENTE POR VALIDAR
El avance de las actividades correspondientes al mes de enero se encuentra aún en su etapa inicial, dado que se trata de acciones preparatorias para la ejecución de la vigencia 2026.
Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja
Avance Financiero
Avance meta producto
Avance regionalización
Documentos del paso actual
Finalizar reporte del periodo
Focalización de políticas
Observación del mes
Resumen observaciones por periodo
Vigencia
2024

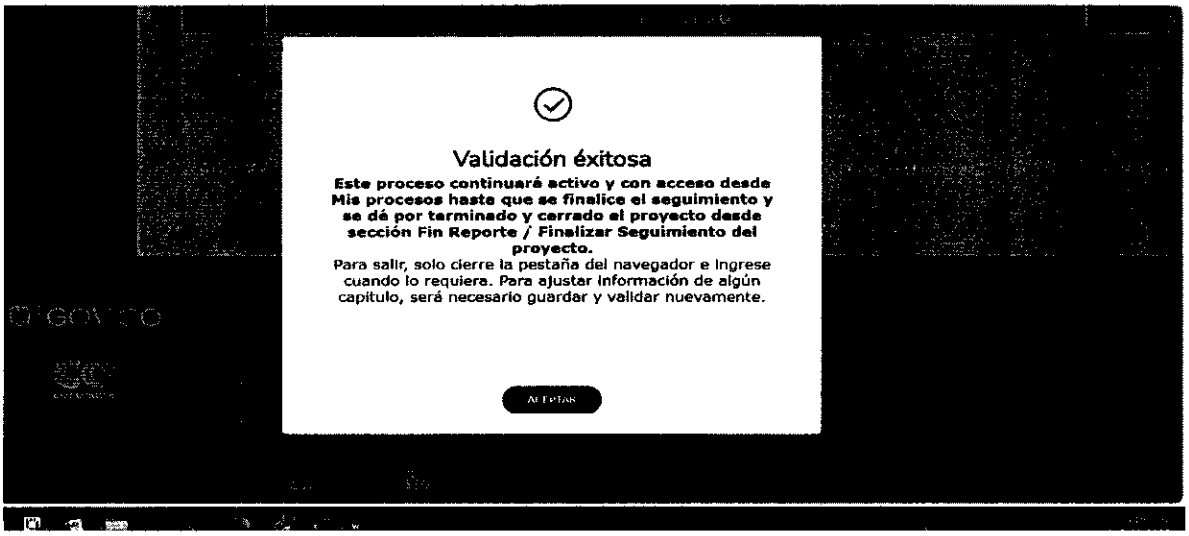
Validación éxitosa
Este proceso continuará activo y con acceso desde Mis procesos hasta que se finalice el seguimiento y se dé por terminado y cerrado el proyecto desde sección Fin Reporte / Finalizar Seguimiento del proyecto.
Para salir, solo cierre la pestaña del navegador e ingrese cuando lo requiera. Para ajustar información de algún capítulo, será necesario guardar y validar nuevamente.
Aceptar

PI37-102481 BPIN 2024003760096 - ID: 1000368 BPIN: 2024003760096 Periodo(s) abierto(s): 2026 Enero(05/01/2026 - 06/02/2026), FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN EN EL VALLE DEL CAUCA

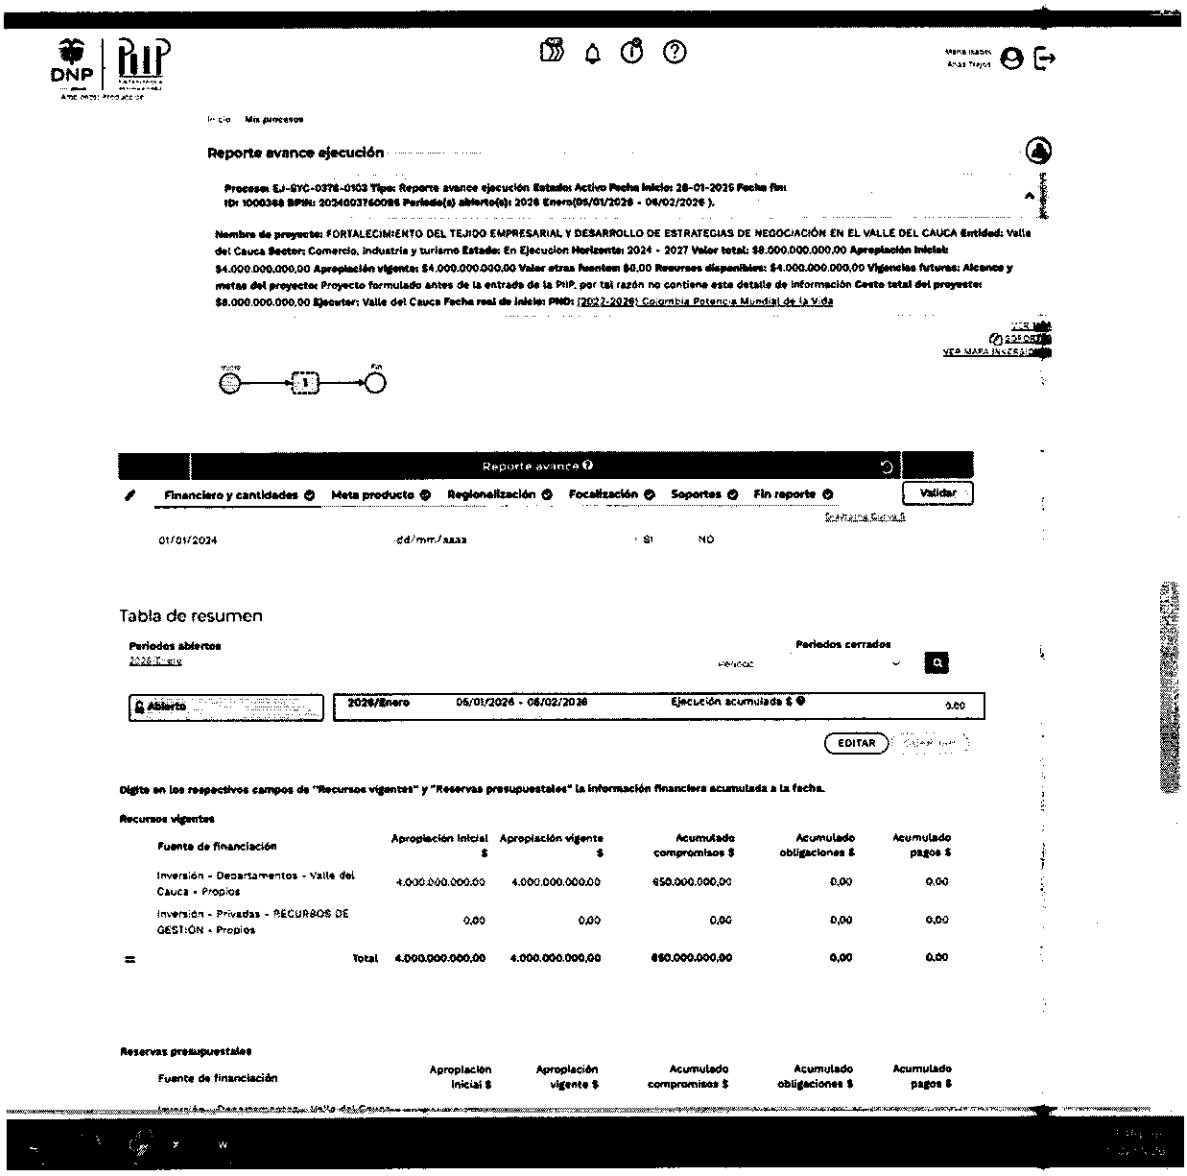

DNP | PIIP

Inicio Mis procesos

Reporte avance ejecución

Proceso: EJ-SYC-0378-0103 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 28-01-2026 Fecha fin:
ID: 1000368 BPIN: 2024003760096 Periodo(s) abierto(s): 2026 Enero(05/01/2026 - 06/02/2026).

Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN EN EL VALLE DEL CAUCA **Entidad:** Valle del Cauca **Sector:** Comercio, industria y turismo **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2024 - 2027 **Valor total:** $8.000.000.000,00 **Apropiación inicial:** $4.000.000.000,00 **Apropiación vigente:** $4.000.000.000,00 **Valor otras fuentes** $0,00 **Recursos disponibles:** $4.000.000.000,00 **Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto:** $8.000.000.000,00 **Ejecutor:** Valle del Cauca **Fecha real de inicio: PND:** [2022-2026] Colombia Potencia Mundial de la Vida

VER MAPA INVERSIONES

Inicio 1 Fin

Reporte avance

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte | Validar

01/01/2024 dd/mm/aaaa SI NO

Tabla de resumen

Periodos abiertos 2026 Enero

Periodos cerrados Periodo

Abierto | 2026/Enero | 05/01/2026 - 06/02/2026 | Ejecución acumulada $ | 0,00

EDITAR


Digite en los respectivos campos de "Recursos vigentes" y "Reservas presupuestales" la información financiera acumulada a la fecha.

Recursos vigentes


Fuente de financiación		Apropiación inicial $	Apropiación vigente $	Acumulado compromisos $	Acumulado obligaciones $	Acumulado pagos $
Inversión - Departamentos - Valle del Cauca - Propios		4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00
Inversión - Privadas - RECURSOS DE GESTIÓN - Propios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Total	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00

Reservas presupuestales


Fuente de financiación	Apropiación inicial $	Apropiación vigente $	Acumulado compromisos $	Acumulado obligaciones $	Acumulado pagos $

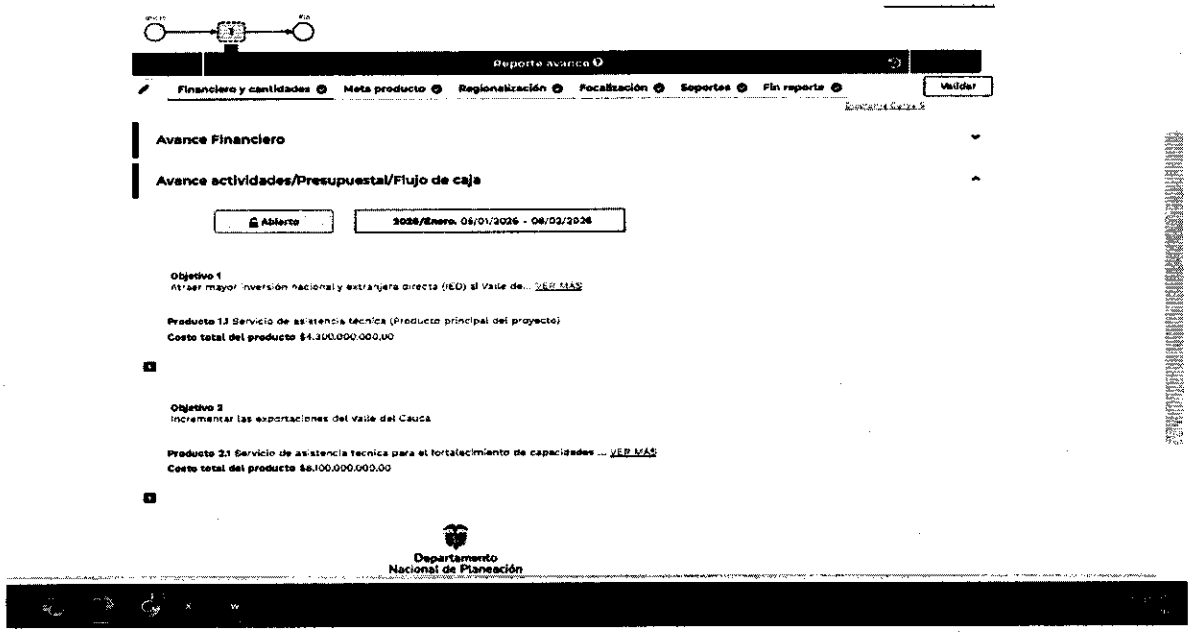


PI37-102756 BPIN 202500000045486 COOPERACION INTERNACIONAL, no dejo reportar se debe generar línea base cero

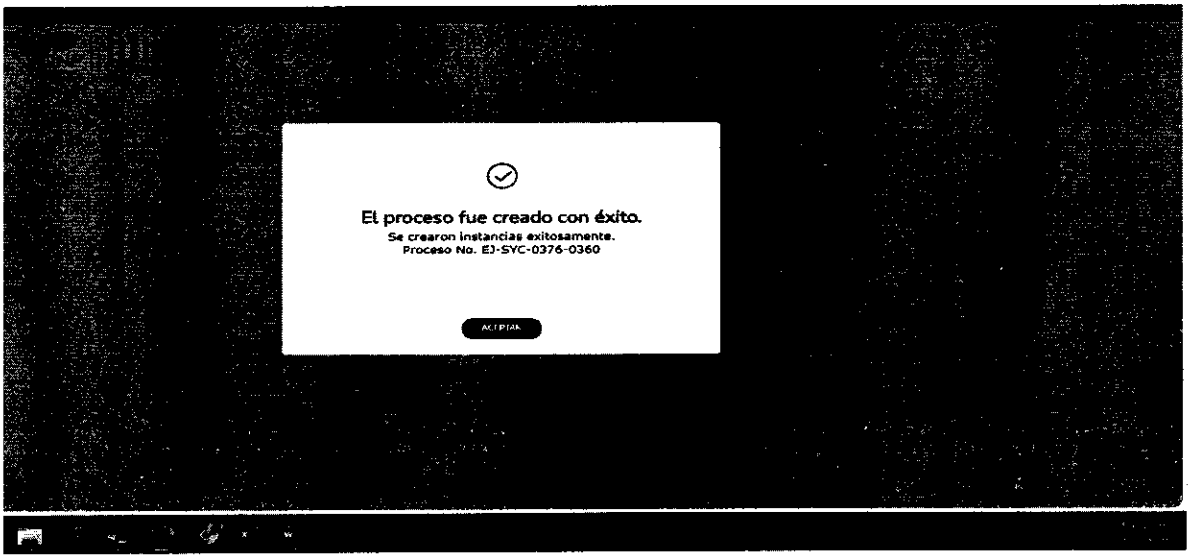



PI39-102571 BPON 2024003760150 **ID:** 1082695 **BPIN:** 2024003760150 **Periodo(s) abierto(s):** 2026 Enero(05/01/2026 - 06/02/2026), FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN PARA EL TEJIDO EMPRESARIAL DEL VALLE DEL CAUCA

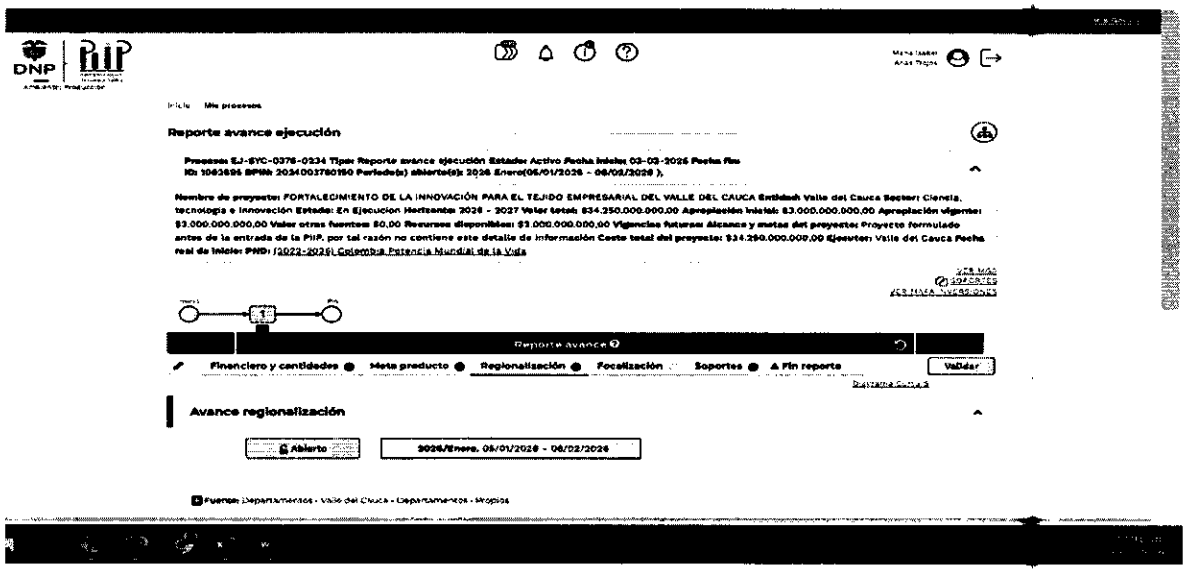





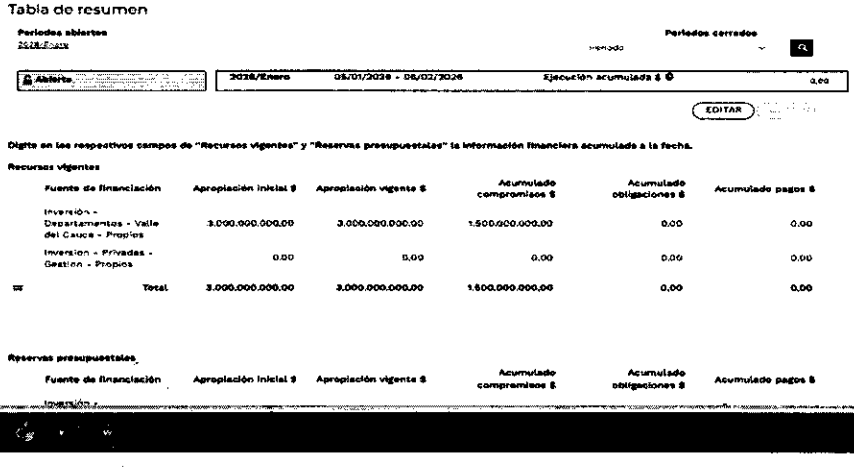

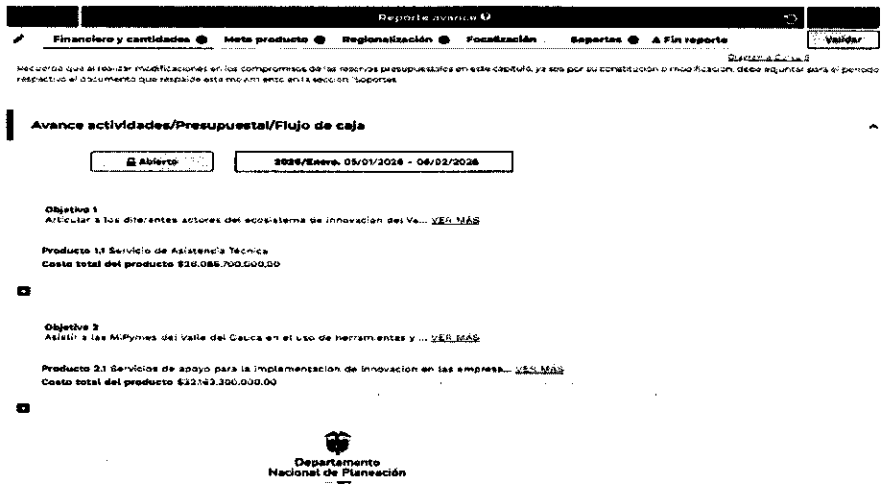
Reporte avance
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja
Abierto
2026/Enero. 05/01/2026 - 06/02/2026
Objetivo 1
Articular a los diferentes actores del ecosistema de innovación del Va... VER MÁS
Producto 1.1 Servicio de Asistencia Técnica
Costo total del producto $26.086.700.000,00
Objetivo 2
Asistir a las MiPymes del Valle del Cauca en el uso de herramientas y ... VER MÁS
Producto 2.1 Servicios de apoyo para la implementación de innovación en las empresa... VER MÁS
Costo total del producto $32.163.300.000,00
Departamento Nacional de Planeación

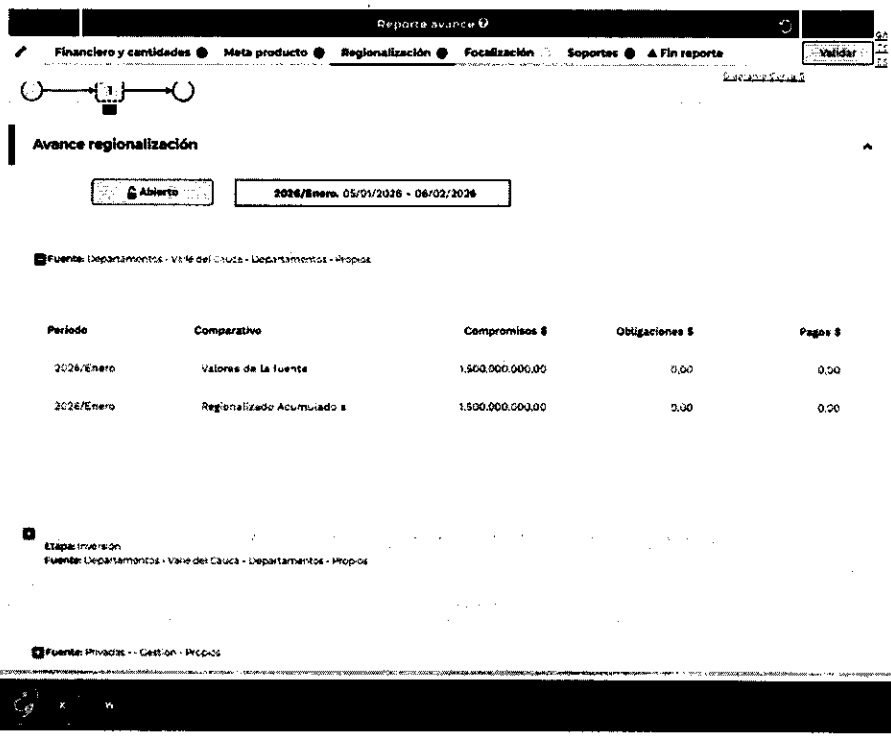

Reporte avance
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Avance regionalización
Abierto
2026/Enero. 05/01/2026 - 06/02/2026
Fuente: Departamentos - Valle del Cauca - Departamentos - Propios
Periodo
Comparativo
Compromisos $
Obligaciones $
Pagos $
2026/Enero
Valores de la fuente
1.500.000.000,00
0,00
0,00
2026/Enero
Regionalizado Acumulado $
1.500.000.000,00
0,00
0,00
Etapa: Inversión
Fuente: Departamentos - Valle del Cauca - Departamentos - Propios
Fuente: Privados - - Gestión - Propios

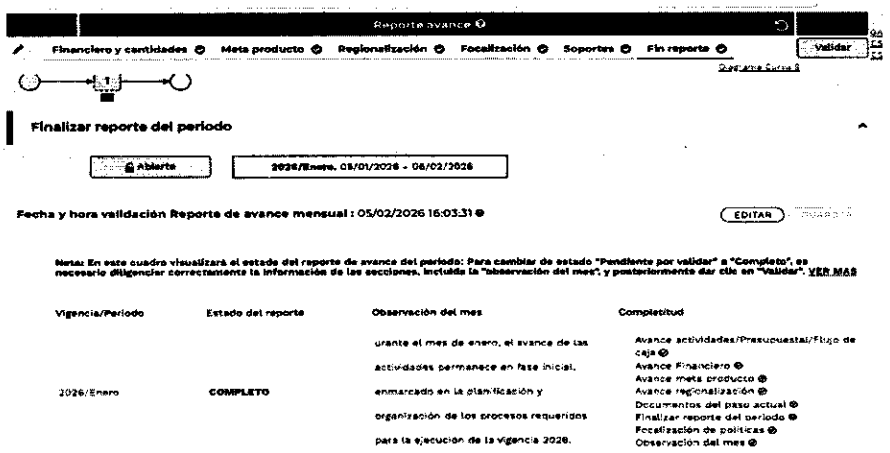

Reporte avance
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2026/Enero. 05/01/2026 - 06/02/2026
Fecha y hora validación Reporte de avance mensual : 05/02/2026 16:03:31
EDITAR
Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". VER MAS
Vigencia/Periodo
Estado del reporte
Observación del mes
Completitud
2026/Enero
COMPLETO
urante el mes de enero, el avance de las actividades permanece en fase inicial, enmarcado en la planificación y organización de los procesos requeridos para la ejecución de la vigencia 2026.
Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja
Avance Financiero
Avance meta producto
Avance regionalización
Documentos del paso actual
Finalizar reporte del periodo
Focalización de políticas
Observación del mes
Resumen observaciones por periodo
Vigencia

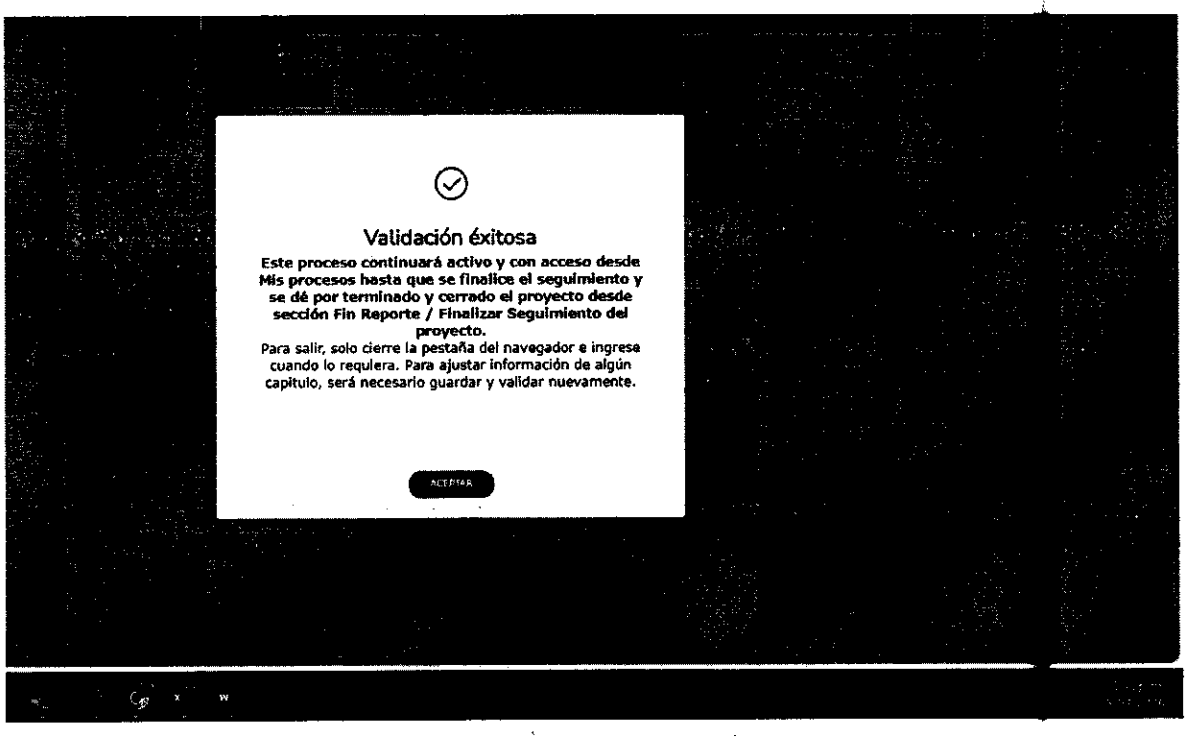

Validación éxitosa
Este proceso continuará activo y con acceso desde Mis procesos hasta que se finalice el seguimiento y se dé por terminado y cerrado el proyecto desde sección Fin Reporte / Finalizar Seguimiento del proyecto.
Para salir, solo cierre la pestaña del navegador e ingrese cuando lo requiera. Para ajustar información de algún capítulo, será necesario guardar y validar nuevamente.
ACEPTAR


De los proyectos PI39102642, PI37-102756, PI38-102556, PI38-102555 no se genero movimiento financiero en el mes de enero 2026 por lo tanto no se reporta en plataforma PIIP.


ACTIVIDADES 6

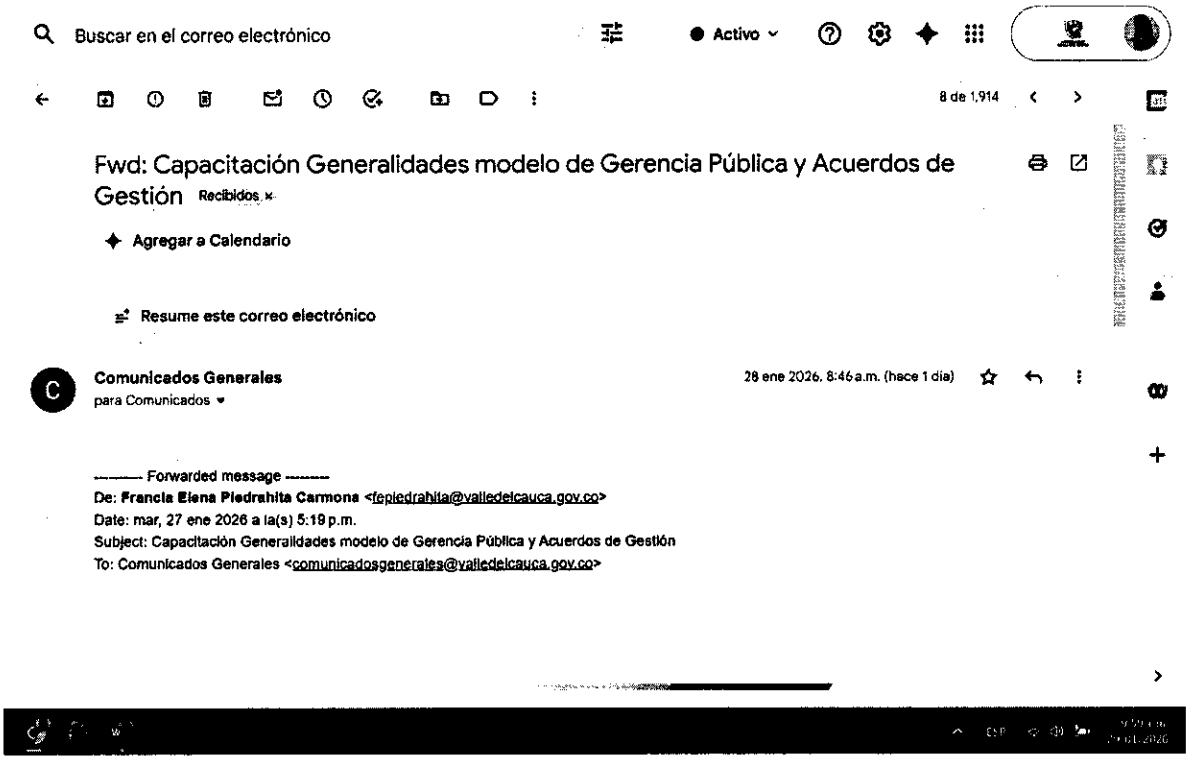


37:25
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
T
SF
DC
AP
SG
SJ
GR
FH
AR
1/5

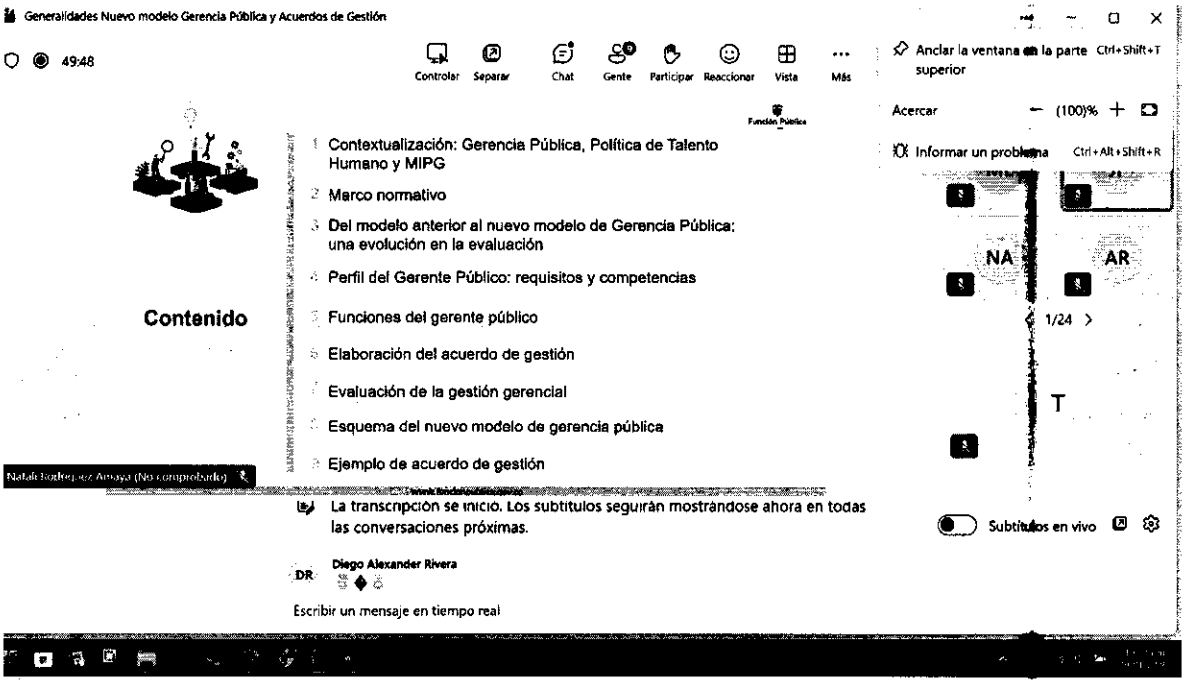
Generalidades Nuevo modelo Gerencia Pública y Acuerdos de Gestión
49:48
Controlar
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Más
Anclar la ventana en la parte superior Ctrl+Shift+T
Acercar (100)%
Informar un problema Ctrl+Alt+Shift+R
Contenido
1 Contextualización: Gerencia Pública, Política de Talento Humano y MIPG
2 Marco normativo
3 Del modelo anterior al nuevo modelo de Gerencia Pública: una evolución en la evaluación
4 Perfil del Gerente Público: requisitos y competencias
5 Funciones del gerente público
6 Elaboración del acuerdo de gestión
7 Evaluación de la gestión gerencial
8 Esquema del nuevo modelo de gerencia pública
9 Ejemplo de acuerdo de gestión
NA
AR
1/24
T
La transcripción se inició. Los subtítulos seguirán mostrándose ahora en todas las conversaciones próximas.
Subtítulos en vivo
DR
Diego Alexander Rivera
Escribir un mensaje en tiempo real

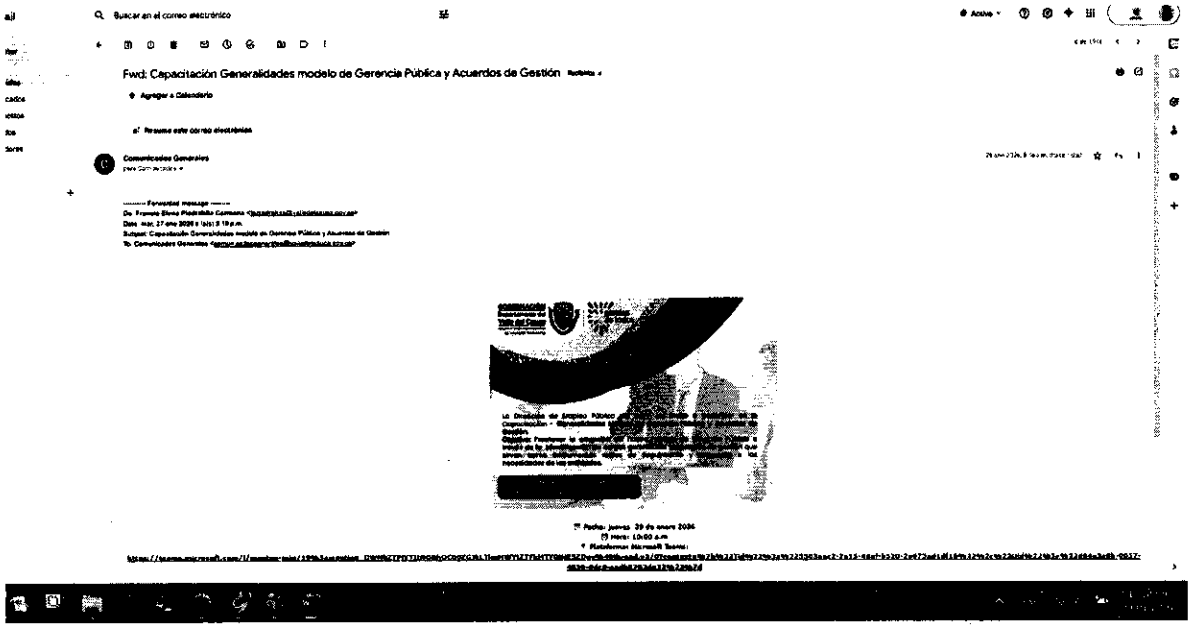

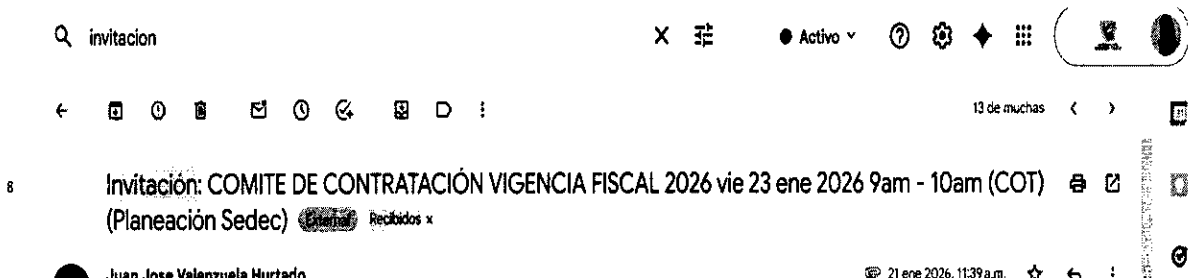

Cordial saludo,

Cordial saludo,

Por medio de la presente se cita al comité interno de contratación de la Secretaría con el objetivo de abordar principalmente los dos siguientes puntos:

1. Debemos verificar que el alcance de las obligaciones específicas pactadas para cada contrato guarden relación con la cadena de valor del proyecto de inversión asociado, de tal manera que cubramos las metas establecidas para la vigencia 2026 con estas contrataciones previas al inicio de las restricciones impuestas por la ley de garantías electorales.
2. Regionalización de las convocatorias, para reportes de cumplimiento PIIP y EVAPLAN

Agradecemos a los equipos técnicos preparar la información necesaria para presentar de manera breve la relación entre las obligaciones contractuales y las actividades, subactividades y metas de los proyectos de inversión en los que se enmarca cada contrato realizado; asimismo, agradecemos al equipo de planeación de la subdirección técnica verificar los soportes de cada contratación compartidos de manera previa

Cuándo
viernes 23 ene 2026 · 9am – 10am (Hora estándar de Colombia)

Invitados
Juan Jose Valenzuela Hurtado - organizador
adrianachinguel@gmail.com
Maritiz Campo Soto
Luz Mery Ocampo Benitez
Jerson Eduardo Valencia Arango
Planeación Sedec
Maria Clemencia Ballesteros Echeverry
Valentina Morales Ospina
paulaandreagalvis83@gmail.com
davidmontoya09@hotmail.com
lina.internacionalizacion@gmail.com
daniela.aguirre.ada@gmail.com
maedarson@gmail.com
manom96@gmail.com
Julio Cesar Gomez Narvaez
linarestrosog@gmail.com
hlinaconsultor@gmail.com
josero-92@hotmail.com
Ver información de todos los invitados

ACTIVIDADES REALIZADAS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 1.310.19.13.1010-2026 DEL MES DE MARZO DE VIG.2026

1.Realizar, conforme a indicaciones del líder de programa, la formulación de los proyectos que contribuyan al desarrollo del proceso M2-P2 "y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca", que le sean asignados por el jefe inmediato y/o supervisor del contrato.

Durante el periodo asignado atendí las indicaciones del líder de programa en relación con la formulación de proyectos del proceso M2-P2 y la promoción del desarrollo económico del Valle del Cauca. Revisé lineamientos y criterios para asegurar la coherencia con los objetivos institucionales, manteniendo disposición para la formulación de iniciativas, aunque en este lapso no se generaron proyectos específicos bajo mi gestión.

2. Brindar acompañamiento en el diseño de los formatos y herramientas para facilitar el seguimiento a las acciones desarrolladas en torno al proceso M2-P2 y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca.

Elaboré el ajuste a la data correspondiente a la matriz de "Reporte de avance de ejecución PIIP – EVAPLAN". La finalidad de este trabajo fue socializar la información ante el equipo de trabajo, liderado por las Subsecretarías de Emprendimiento, Competitividad e Internacionalización, con el propósito de que se replicara entre los apoyos responsables de la supervisión, seguimiento y análisis del alcance de las metas de los proyectos SEDEC 2026.

3. Realizar seguimiento a la inversión pública adelantada por la dependencia en el marco del proceso M2-P2 "y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca".

Realicé seguimiento a la inversión pública adelantada por la dependencia en el marco del proceso M2-P2, promoviendo el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca y garantizando

la transparencia en el cumplimiento de las metas establecidas.

4. Realizar seguimiento al avance en el cumplimiento de los indicadores de producto y de gestión definidos para los proyectos de inversión a cargo de la dependencia.

Realicé seguimiento al avance en el cumplimiento de los indicadores de producto y de gestión definidos para los proyectos de inversión a cargo de la dependencia, con el propósito de garantizar la transparencia en la ejecución, identificar oportunidades de mejora y contribuir al logro de las metas establecidas en el marco del plan de desarrollo.

5. Elaborar informes periódicos del avance de ejecución de los proyectos de inversión a cargo de la dependencia.

Elaboré informes periódicos del avance de ejecución de los proyectos de inversión a cargo de la dependencia. Adicionalmente, realicé el cargue de dichos informes en la plataforma PIIP, acorde con las instrucciones impartidas por el Departamento Administrativo de Planeación del Valle (DAPV) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), garantizando la transparencia y el cumplimiento de los lineamientos institucionales.

- Proceso: EJ-SYC-0376-0264 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 13-05-2025 Fecha fin: ID: 1318299 BPIN: 202500000007106 Periodo(s) abierto(s): 2026 Febrero (09/02/2026 - 06/03/2026).
- Proceso: EJ-SYC-0376-0230 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 27-02-2025 Fecha fin: ID: 977196 BPIN: 2024003760152 Periodo(s) abierto(s): 2026 Febrero(09/02/2026 - 06/03/2026).
- Proceso: EJ-SYC-0376-0363 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 27-02-2026 Fecha fin: ID: 1636065 BPIN: 202500000045486 Periodo(s) abierto(s): 2026 Febrero (09/02/2026 - 06/03/2026),
- Proceso: EJ-SYC-0376-0307 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 29-10-2025 Fecha fin: ID: 1429461 BPIN: 202500000023888 Periodo(s) abierto(s): 2026 Febrero(09/02/2026 - 06/03/2026).
- Proceso: EJ-SYC-0376-0234 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 03-03-2025 Fecha fin: ID: 1082695 BPIN: 2024003760150 Periodo(s) abierto(s): 2026 Febrero (09/02/2026 - 06/03/2026),
- Proceso: EJ-SYC-0376-0077 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 27-01-2025 Fecha fin: ID: 1004794 BPIN: 2024003760114 Periodo(s) abierto(s): 2026 Febrero (09/02/2026 - 06/03/2026),
- Proceso: EJ-SYC-0376-0103 Tipo: Report avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 28-01-2025 Fecha fin: ID: 1000368 BPIN: 2024003760096

6. Participar activamente en actividades incluidas las de fortalecimiento, como capacitaciones, reuniones desarrolladas por la Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, así como las que otras dependencias de la Gobernación Valle del Cauca lleven a cabo.

Igualmente, asistir y participar en las mesas de trabajo y otras instancias en las que sea designado, conforme a la instrucción impartida por el Jefe y/o Supervisor, o las que convoquen de otras dependencias de la Gobernación del Valle.

Participé activamente en las actividades de fortalecimiento organizadas por la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, incluyendo capacitaciones y reuniones, así como en aquellas convocadas por otras dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca. Igualmente, asistí y aporté en las mesas de trabajo y demás instancias en las que fui designada, siguiendo las instrucciones impartidas por mi Supervisor y atendiendo las convocatorias realizadas desde otras áreas de la Gobernación a continuacion se describen:

- CAPACITACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS INICIA 03 FEBRERO 2026

Tema	Fecha y Hora
Generalidades del SGR y normatividad	3 de febrero - 9:30am
Ajuste a los proyectos del SGR	3 de febrero - 10:30am
Matriz de Riesgos y Seguimiento a la ejecución de proyectos del SGR y lecciones aprendidas en la formulación y seguimiento de proyectos financiados con el SGR	4 de febrero - 10:00am
Índice de Gestión de Proyectos – IGPR y GESPROY	5 de febrero - 9:30am
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías – SPGR y cierre a proyectos del SGR	5 de febrero - 10:30am

- Memorias jornada de capacitación Regalias día 1jornada de capacitación 1, realizada el día 3 de febrero de 2026, en: 1. Ajustes a los proyectos de inversión financiados o cofinanciados con recursos del SGR 2. Generalidades y Normativas del SGR- Enlace de grabación: https://drive.google.com/file/d/1KlrRNlkHQLw1_YRTJCvOoS-QtVeGf3Xa/view?usp=drivesdk
- Memorias jornada de capacitación Regalías día 3 Cierre de proyectos del SGR
  Monitoreo y seguimiento de los proyectos del SGR
  Sistema de presupuesto y giro de regalías SPGR y SAP Enlace de grabación:
- https://drive.google.com/file/d/1sRN0pEmoMlnwqXpkJVjGe-N9VASOpVOG/view?usp=sharing
- Webinar Orientaciones para fortalecer los Reportes Territoriales: CUIPO y FUT- El Departamento Nacional de Planeación (DNP) junto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y la Contraloría General de la República (CGR) invitan a las entidades

territoriales a participar en un nuevo episodio del ciclo Webinar Juntos por el Territorio, bajo la coordinación de la Dirección de Estrategia Regional y la Dirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal del DNP Lunes 9 de febrero de 2026 10:00 a.m. a 12:00 m. Transmisión en vivo por YouTube NP: https://www.youtube.com/live/ISoU7bogcqk

- Mesa técnica sobre proyecto de cooperación internacional ... vie 20 feb 2026 2pm - 3pm (COT) (Planeación Sedec)
- Mesas de trabajo proyectos SGR – Homologación al PDD y reporte de avances | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y FOMENTO DEL EMPLEO.

7. Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato o jefe inmediato, para el cumplimiento del objeto contractual y estén acorde con la naturaleza del contrato.


Participé activamente en las actividades de fortalecimiento convocadas por la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, así como en las instancias designadas por otras dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.

8. Apoyar la difusión de los contenidos de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Desarrollo Económico cada vez que se realice una publicación, en las plataformas Instagram, Facebook, X y YouTube, realizando por cada publicación acciones de interacción tales como dar "me gusta" y comentar y/o compartir los contenidos en sus redes sociales personales, con el fin de fortalecer el alcance y el engagement institucional.

Mi participación se centró en la interacción con las publicaciones realizadas en las plataformas institucionales, a través de acciones como la lectura, el seguimiento constante y la generación de "me gusta", fortaleciendo así el alcance y el engagement institucional.


EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS


DE LA ACTIVIDAD 2

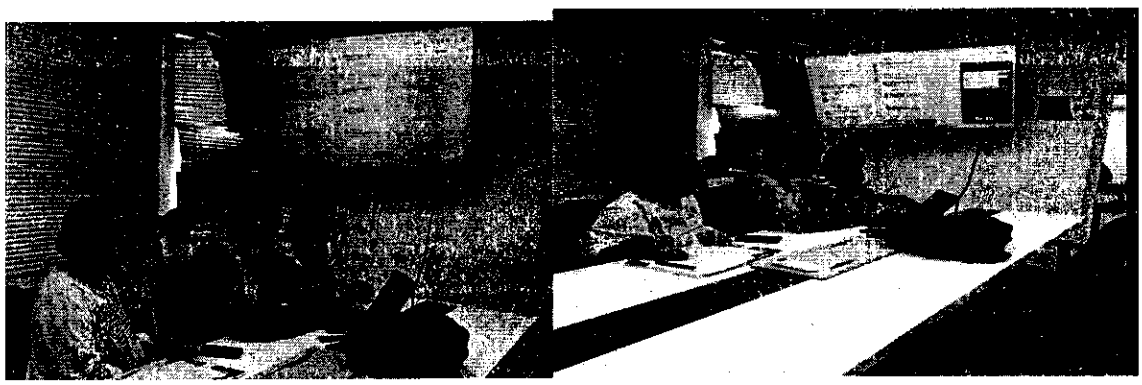


Mesa de trabajo virtual, con Fundacion Univalle- referente a elaboración Matriz homologación proyectos SGR.


DE LA ACTIVIDADE 5 -Print reporte de cada uno de los 7 proyectos de inversión de SEDECFE, reportados en plataforma PIIP.

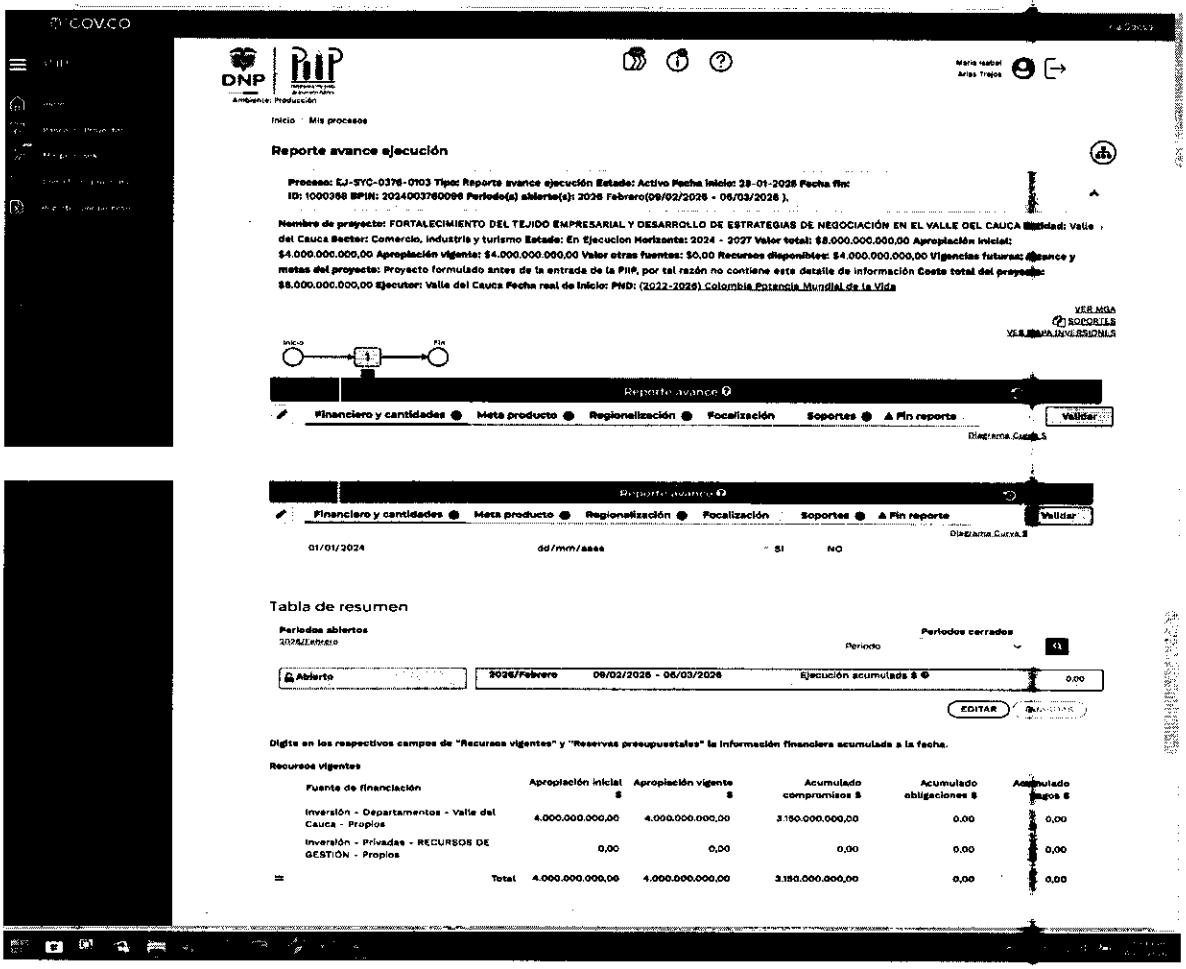

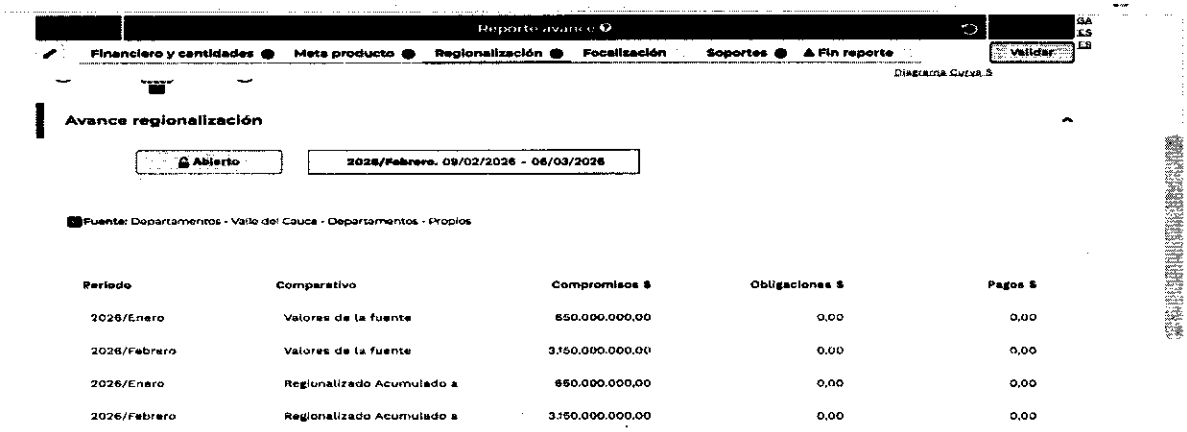


Periodo	Comparativo	Compromisos $	Obligaciones $	Pagos $
2026/Enero	Valores de la fuente	650.000.000,00	0,00	0,00
2026/Febrero	Valores de la fuente	3.150.000.000,00	0,00	0,00
2026/Enero	Regionalizado Acumulado a	650.000.000,00	0,00	0,00
2026/Febrero	Regionalizado Acumulado a	3.150.000.000,00	0,00	0,00

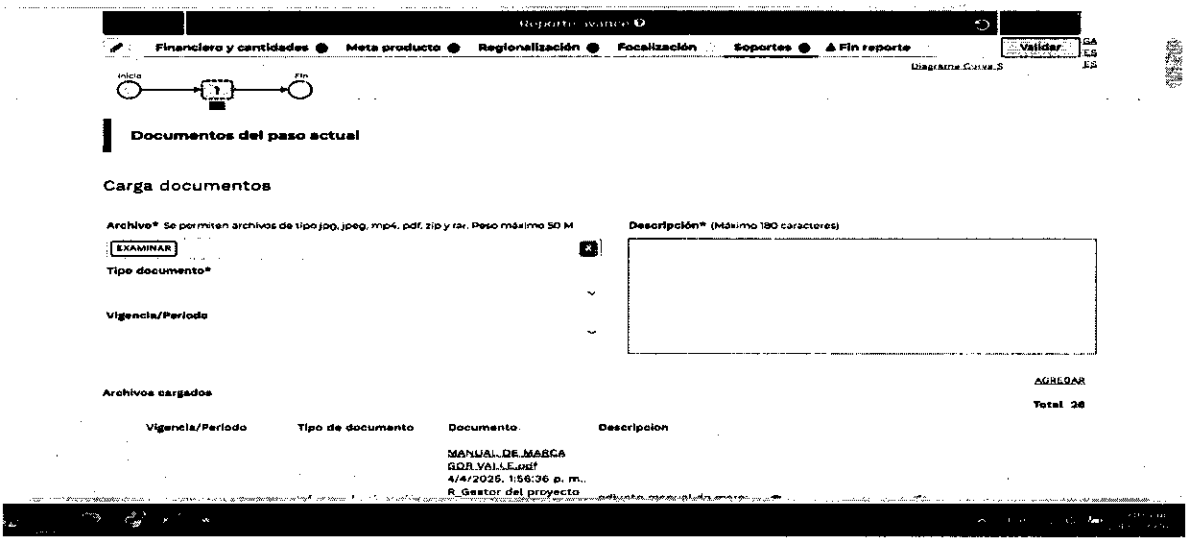

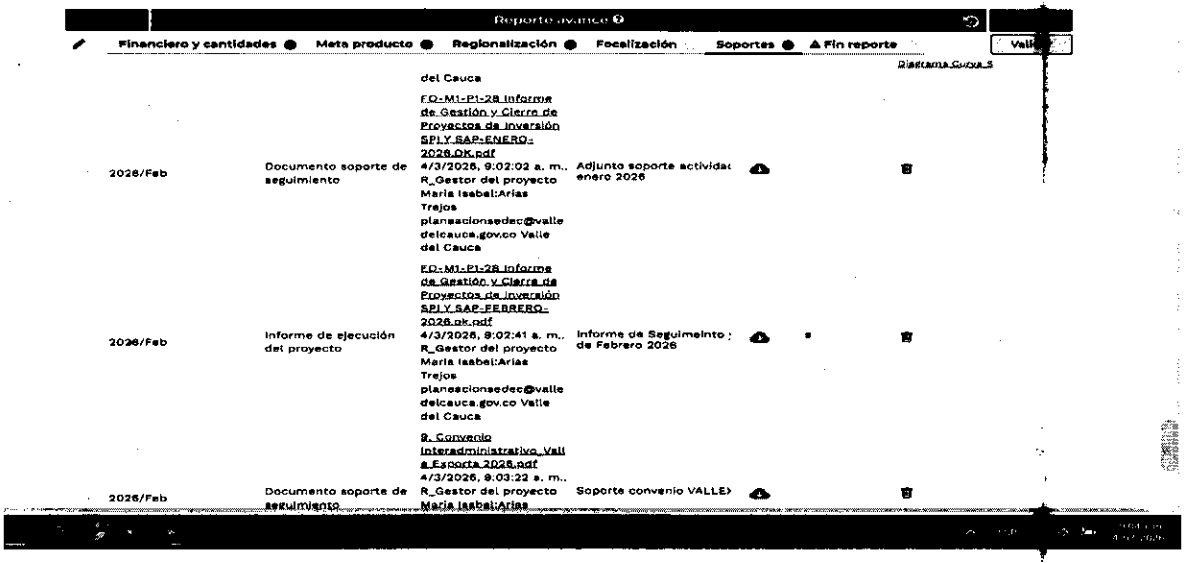



Reporte avance


	Financiero y cantidades	Meta producto	Regionalización	Focalización	Soportes	Fin reporte	Validar
			del Cauca				Plantilla Cuenta S
2026/Feb		Documento soporte de seguimiento	FO-M1-P1-28 Informe de Gestión y Cierre de Proyectos de Inversión SPI Y SAP-ENERO-2026.OK.pdf 4/3/2026, 9:02:02 a. m.. R_Gestor del proyecto Maria Isabel:Arias Trejos planesacionsedec@valledelcauca.gov.co Valle del Cauca	Adjunto soporte actividad enero 2026			
2026/Feb		Informe de ejecución del proyecto	FO-M1-P1-28 Informe de Gestión y Cierre de Proyectos de Inversión SPI Y SAP-FEBRERO-2026.ok.pdf 4/3/2026, 9:02:41 a. m.. R_Gestor del proyecto Maria Isabel:Arias Trejos planesacionsedec@valledelcauca.gov.co Valle del Cauca	Informe de Seguimeinto : de Febrero 2026			
2026/Feb		Documento soporte de seguimiento	9. Convenio Interadministrativo_Valle Esporta 2026.pdf 4/3/2026, 9:03:22 a. m.. R_Gestor del proyecto Maria Isabel:Arias	Soporte convenio VALLE>			

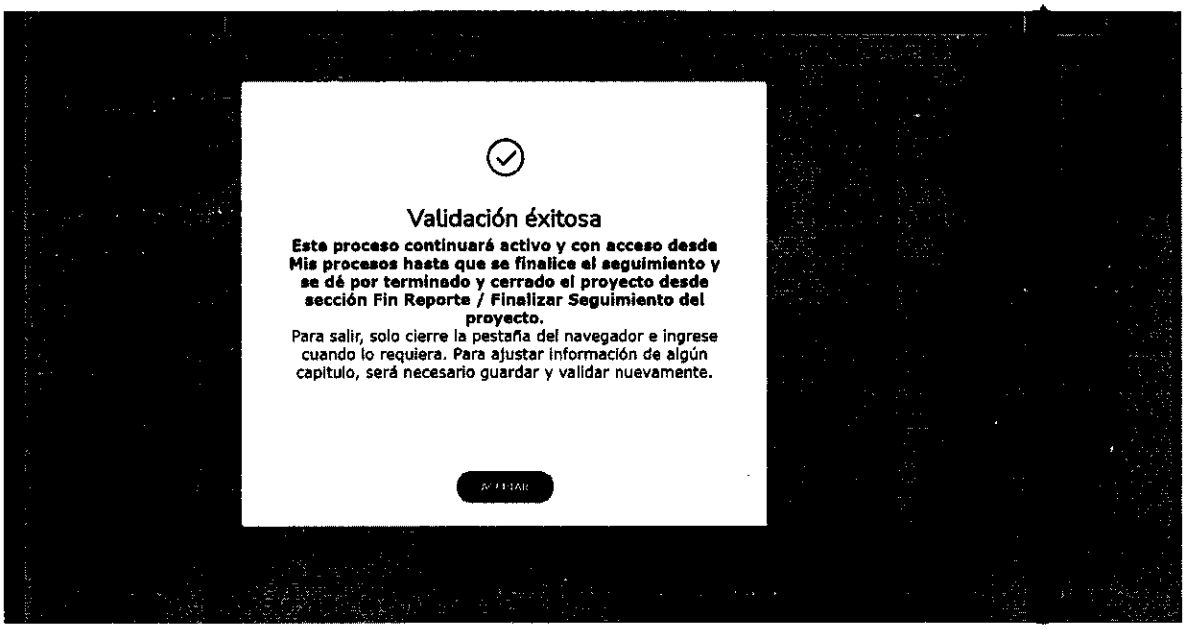

Proceso: EJ-SYC-0376-0264 **Tipo:** Reporteavance - Ejecución **Estado:** Activo **Fecha inicio:** 13-05-2025 **Fecha fin ID:** 1318299 **BPIN:** 202500000007106 **Periodo(s) abierto(s):** 2026 Febrero(09/02/2026 - 06/03/2026),

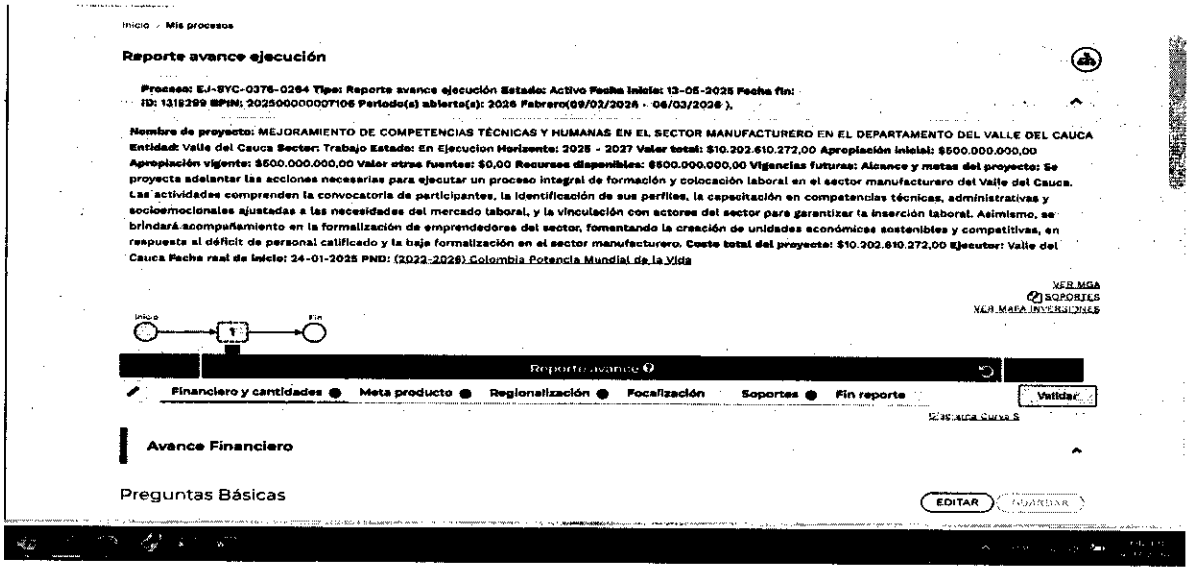

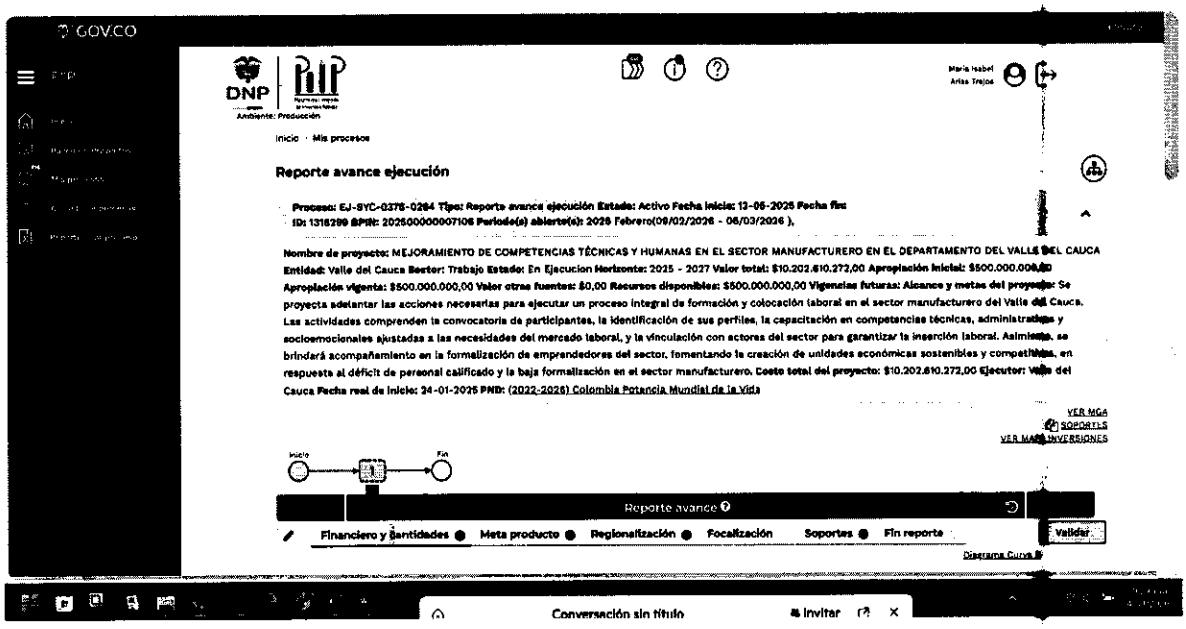




Digite en los respectivos campos de "Recursos vigentes" y "Reservas presupuestales" la información financiera acumulada a la fecha.

Recursos vigentes

Fuente de financiación	Apropiación inicial $	Apropiación vigente $	Acumulado compromisos $	Acumulado obligaciones $	Acumulado pagos $
Inversión - Departamentos - Valle del Cauca - Propios	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
Inversión - Privadas - GESTIÓN - Propios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00

Reservas presupuestales

Fuente de financiación	Apropiación inicial $	Apropiación vigente $	Acumulado compromisos $	Acumulado obligaciones $	Acumulado pagos $
Inversión - Departamentos - Valle del Cauca - Propios	0,00	0,00	3.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
Inversión - Privadas - GESTIÓN - Propios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

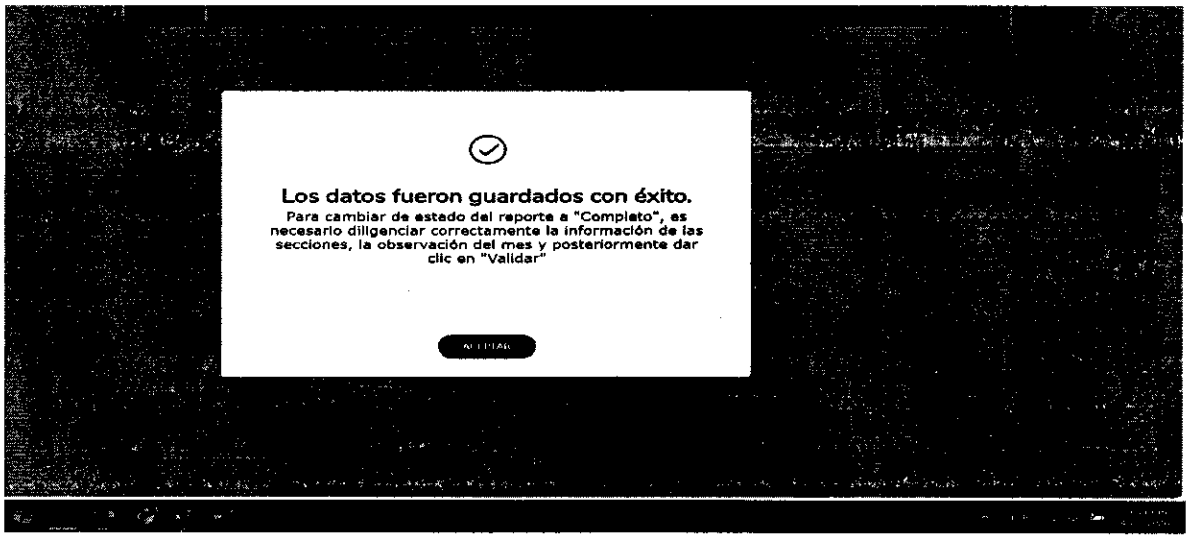

Reporte avance


Financiero y cantidades ● Meta producto ● Regionalización ● Focalización Soportes ● Fin reporte Validar

Diagrama Curva S


Periodo	Comparativo	Compromisos $	Obligaciones $	Pagos $
2026/Enero	Valores de la fuente	0,00	0,00	0,00
2026/Febrero	Valores de la fuente	500.000.000,00	0,00	0,00
2026/Enero	Regionalizado Acumulado a	0,00	0,00	0,00
2026/Febrero	Regionalizado Acumulado a	500.000.000,00	0,00	0,00


Etapa: Inversión
Fuente: Departamentos - Valle del Cauca - Propios


Periodo	Acumulado por periodo	Compromisos $	Obligaciones $	Pagos $
2026/Enero	Regionalizado Acumulado a Enero	0,00	0,00	0,00
2026/Febrero	Regionalizado Acumulado a Febrero	500.000.000,00	0,00	0,00

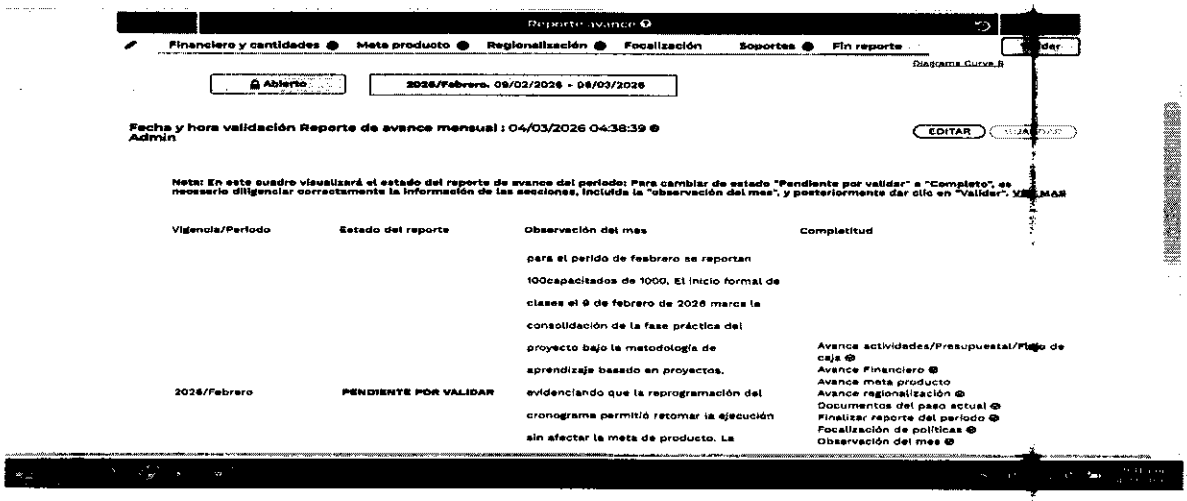


Proceso: EJ-SYC-0376-0230 **Tipo:** Reporte avance jecución **Estado:** Activo **Fecha inicio:** 27-02-2025 **Fecha fin: ID:** 977196 **BPIN:** 2024003760152 **Periodo(s) abierto(s):** 2026 Febrero(09/02/2026 - 06/03/2026),

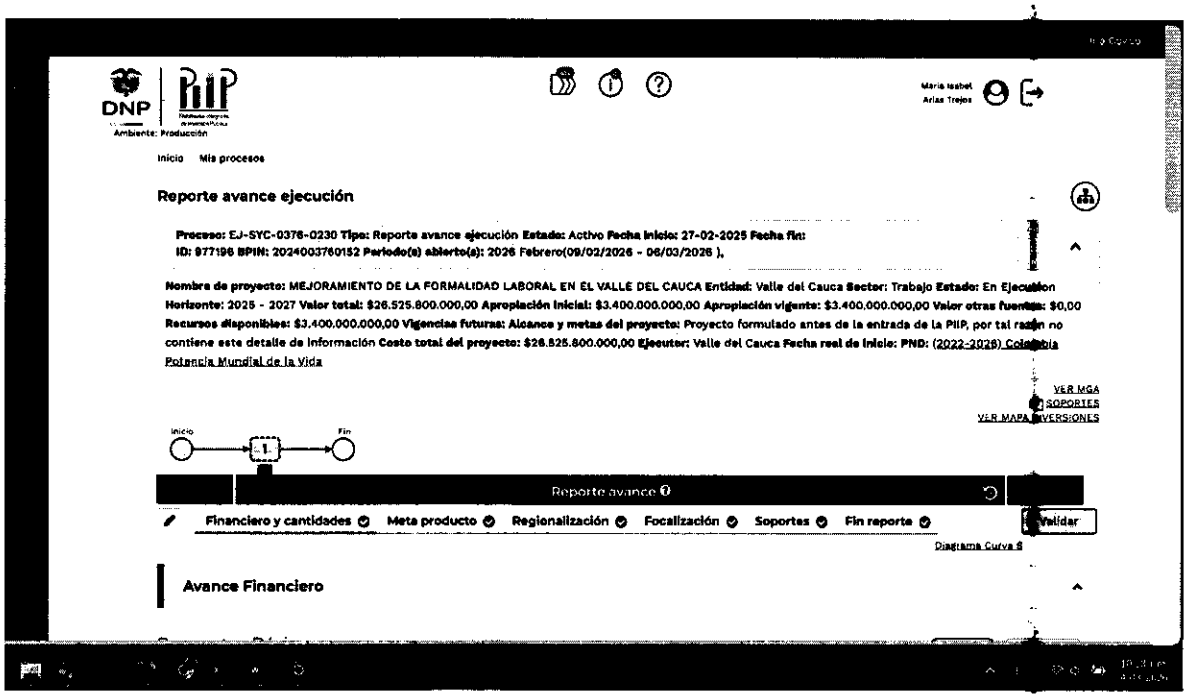

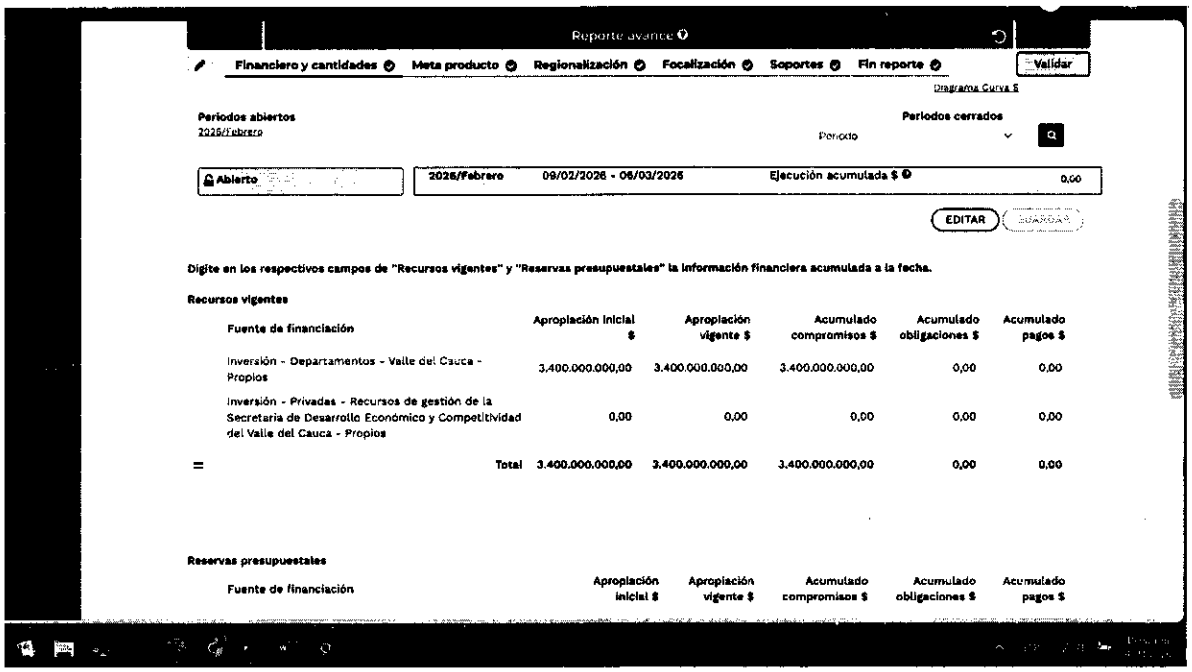
Reporte avance
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Periodos abiertos
2026/Febrero
Periodos cerrados
Periodo
Abierto
2026/Febrero
09/02/2026 - 06/03/2026
Ejecución acumulada $
0,00
EDITAR
GUARDAR
Digite en los respectivos campos de "Recursos vigentes" y "Reservas presupuestales" la información financiera acumulada a la fecha.
Recursos vigentes
Fuente de financiación
Apropiación inicial $
Apropiación vigente $
Acumulado compromisos $
Acumulado obligaciones $
Acumulado pagos $
Inversión - Departamentos - Valle del Cauca - Propios
3.400.000.000,00
3.400.000.000,00
3.400.000.000,00
0,00
0,00
Inversión - Privadas - Recursos de gestión de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad del Valle del Cauca - Propios
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
=
Total
3.400.000.000,00
3.400.000.000,00
3.400.000.000,00
0,00
0,00
Reservas presupuestales
Fuente de financiación
Apropiación inicial $
Apropiación vigente $
Acumulado compromisos $
Acumulado obligaciones $
Acumulado pagos $

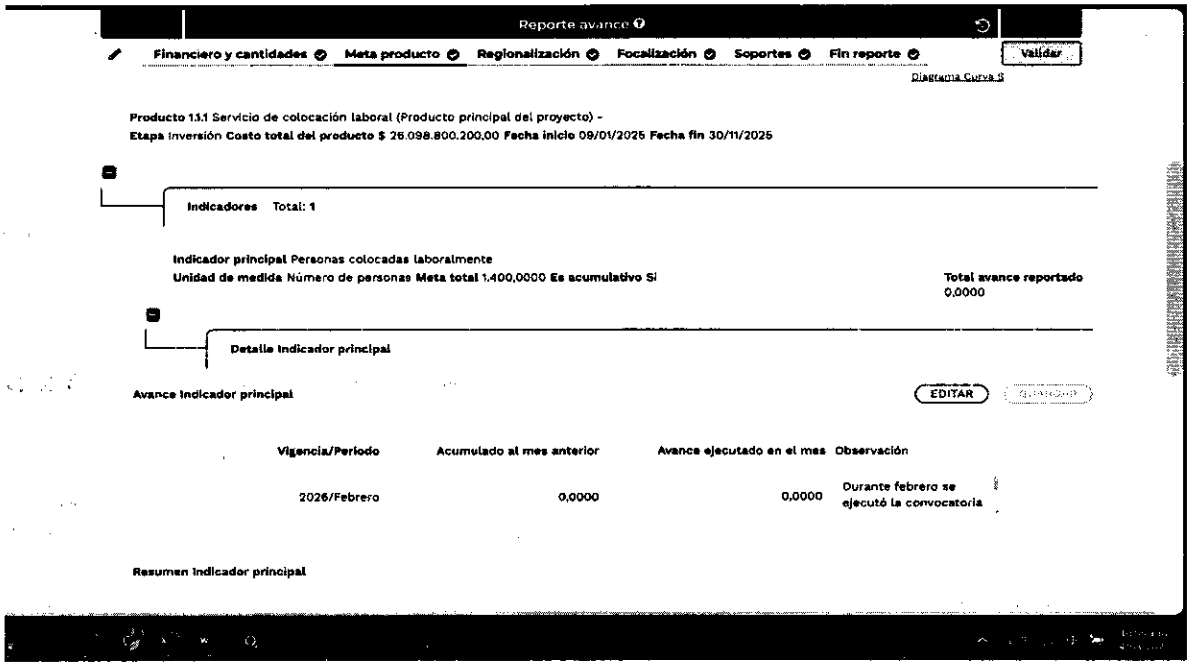
Reporte avance
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Producto 1.1.1 Servicio de colocación laboral (Producto principal del proyecto) -
Etapa Inversión Costo total del producto $ 26.098.800.200,00 Fecha inicio 09/01/2025 Fecha fin 30/11/2025
Indicadores Total: 1
Indicador principal Personas colocadas laboralmente
Unidad de medida Número de personas Meta total 1.400,0000 Es acumulativo Si
Total avance reportado
0,0000
Detalle indicador principal
Avance indicador principal
EDITAR
GUARDAR
Vigencia/Periodo
Acumulado al mes anterior
Avance ejecutado en el mes
Observación
2026/Febrero
0,0000
0,0000
Durante febrero se ejecutó la convocatoria
Resumen indicador principal

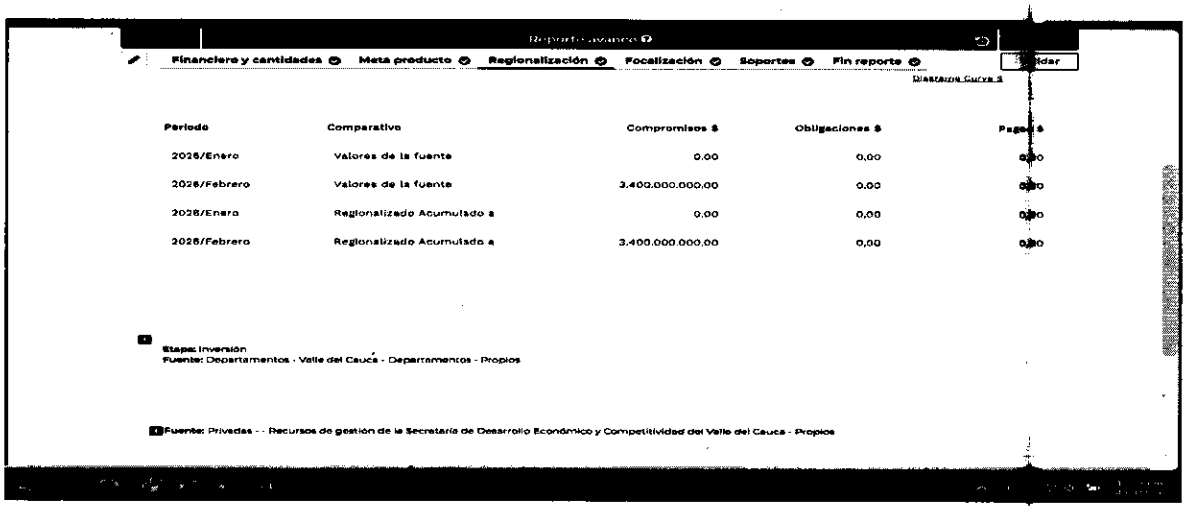

Reporte avance

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte


Validar

Diagrama Curva S

Periodo	Comparativo	Compromisos $	Obligaciones $	Pagos $
2026/Enero	Valores de la fuente	0.00	0.00	0.00
2026/Febrero	Valores de la fuente	3.400.000.000,00	0.00	0.00
2026/Enero	Regionalizado Acumulado a	0.00	0.00	0.00
2026/Febrero	Regionalizado Acumulado a	3.400.000.000,00	0.00	0.00

Etapa: Inversión
Fuente: Departamentos - Valle del Cauca - Departamentos - Propios

Fuente: Privadas - - Recursos de gestión de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad del Valle del Cauca - Propios

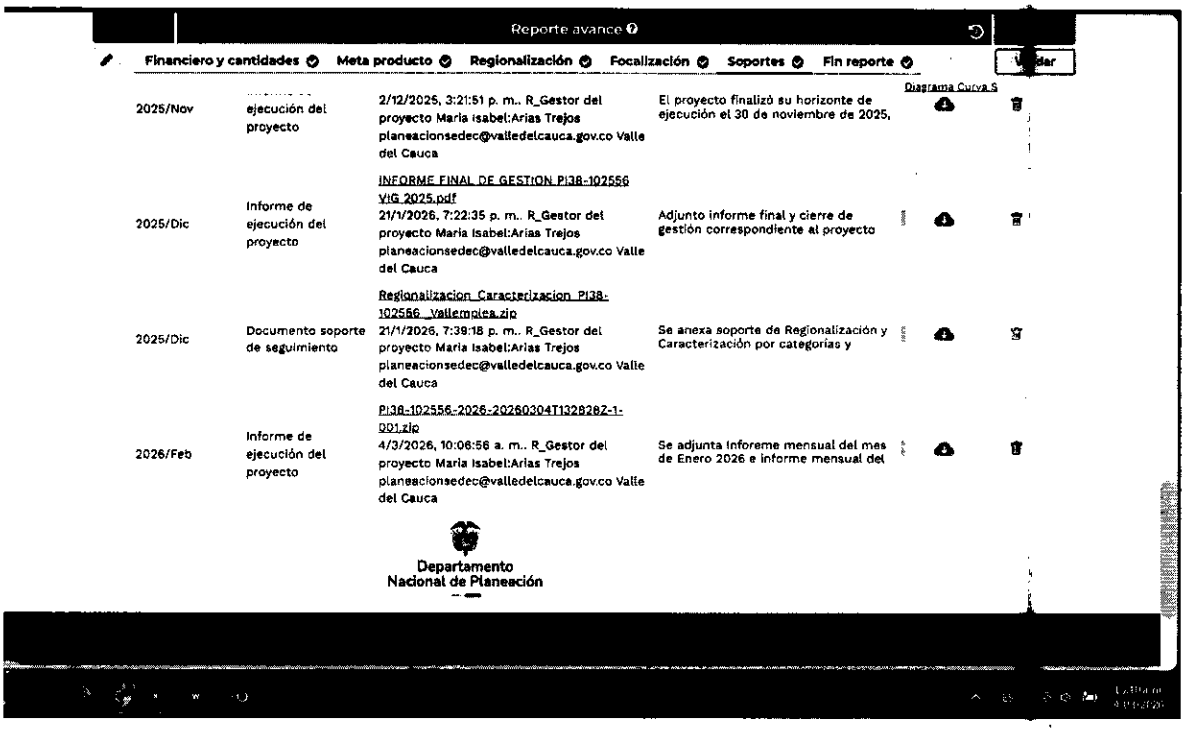

Reporte avance


Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte

Validar


Diagrama Curva S


2025/Nov	ejecución del proyecto	2/12/2025, 3:21:51 p. m.. R_Gestor del proyecto Maria Isabel:Arias Trejos planeacionsedec@valledelcauca.gov.co Valle del Cauca	El proyecto finalizó su horizonte de ejecución el 30 de noviembre de 2025,		
2025/Dic	Informe de ejecución del proyecto	INFORME FINAL DE GESTION PI38-102556 VIG 2025.pdf 21/1/2026, 7:22:35 p. m.. R_Gestor del proyecto Maria Isabel:Arias Trejos planeacionsedec@valledelcauca.gov.co Valle del Cauca	Adjunto informe final y cierre de gestión correspondiente al proyecto		
2025/Dic	Documento soporte de seguimiento	Regionalizacion_Caracterizacion_PI38-102556_Vallemoreno.zip 21/1/2026, 7:39:18 p. m.. R_Gestor del proyecto Maria Isabel:Arias Trejos planeacionsedec@valledelcauca.gov.co Valle del Cauca	Se anexa soporte de Regionalización y Caracterización por categorías y		
2026/Feb	Informe de ejecución del proyecto	PI38-102556-2026-20260304T132826Z-1-001.zip 4/3/2026, 10:06:56 a. m.. R_Gestor del proyecto Maria Isabel:Arias Trejos planeacionsedec@valledelcauca.gov.co Valle del Cauca	Se adjunta Inforeme mensual del mes de Enero 2026 e informe mensual del		

Departamento Nacional de Planeación

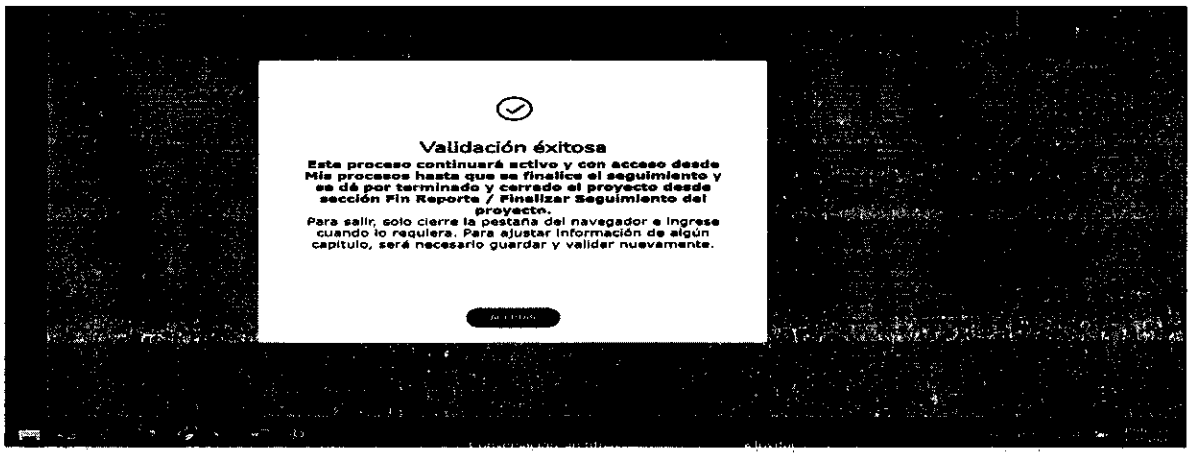

Proceso: EJ-SYC-0376-0363 **Tipo:** Reporte avance ejecución **Estado:** Activo **Fecha inicio:** 27-02-2026 **Fecha fin: ID:** 1636065 **BPIN:** 202500000045486 **Periodo(s) abierto(s):** 2026 Febrero(09/02/2026 - 06/03/2026),

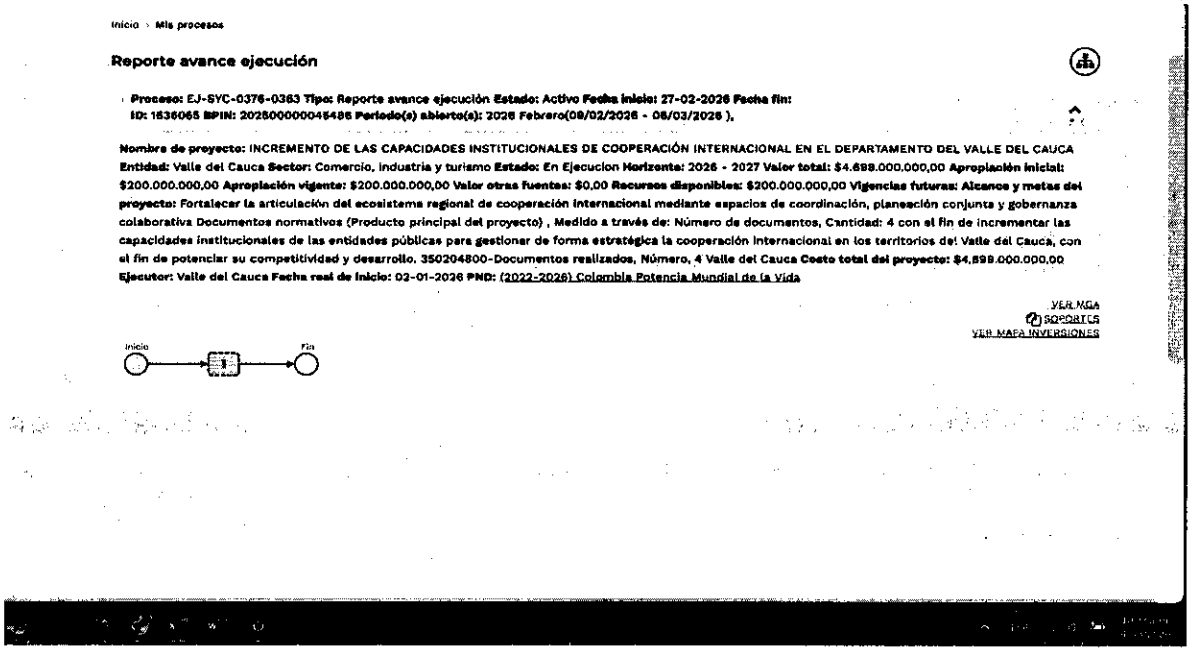

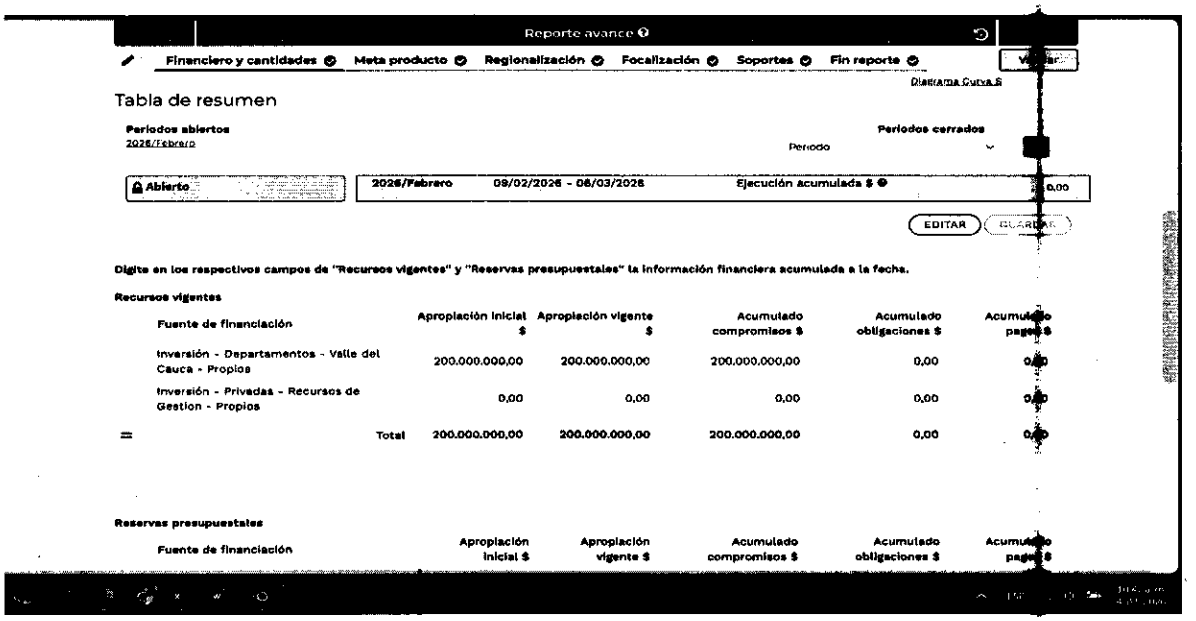

Reporte avance

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte | Validar

Diagrama Curva S

Tabla de resumen

Periodos abiertos: 2026/Febrero

Periodos cerrados: Periodo

Abierto | 2026/Febrero | 09/02/2026 - 06/03/2026 | Ejecución acumulada $ | 0,00

EDITAR | GUARDAR


Digite en los respectivos campos de "Recursos vigentes" y "Reservas presupuestales" la información financiera acumulada a la fecha.

Recursos vigentes

Fuente de financiación	Apropiación inicial $	Apropiación vigente $	Acumulado compromisos $	Acumulado obligaciones $	Acumulado pagos $
Inversión - Departamentos - Valle del Cauca - Propios	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
Inversión - Privadas - Recursos de Gestion - Propios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00

Reservas presupuestales

Fuente de financiación	Apropiación inicial $	Apropiación vigente $	Acumulado compromisos $	Acumulado obligaciones $	Acumulado pagos $

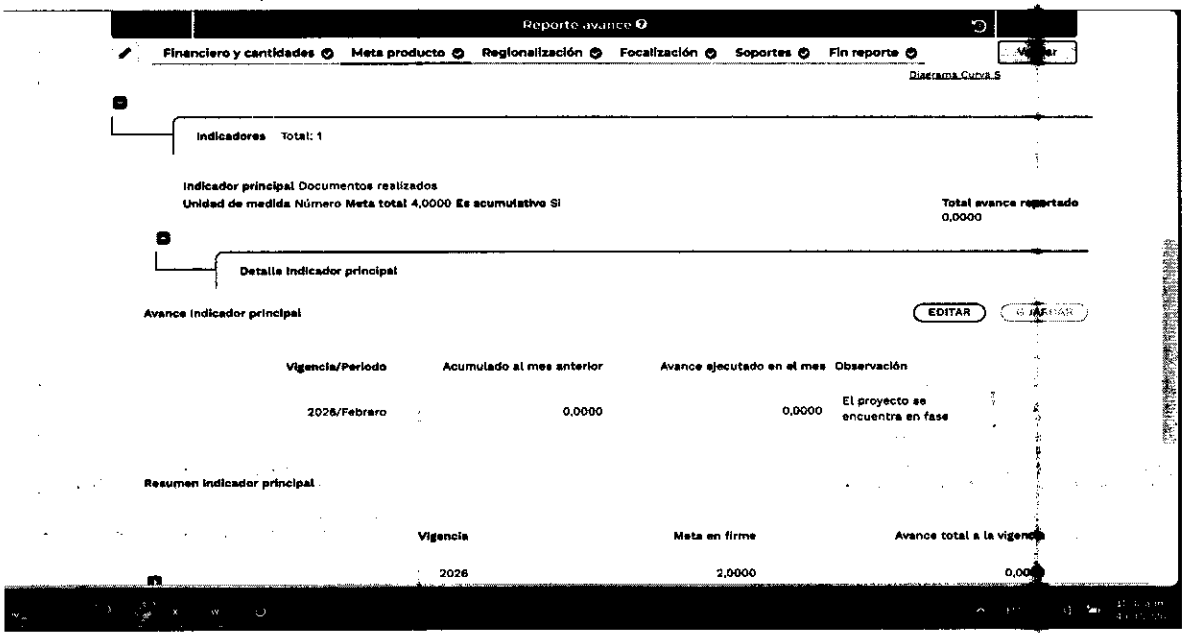

Reporte avance

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte | Validar

Diagrama Curva S

Indicadores Total: 1

Indicador principal Documentos realizados
Unidad de medida Número Meta total 4,0000 Es acumulativo SI

Total avance reportado 0,0000

Detalle indicador principal


Avance indicador principal


EDITAR | GUARDAR


Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior	Avance ejecutado en el mes	Observación
2026/Febraro	0,0000	0,0000	El proyecto se encuentra en fase


Resumen indicador principal

Vigencia	Meta en firme	Avance total a la vigencia
2026	2,0000	0,0000

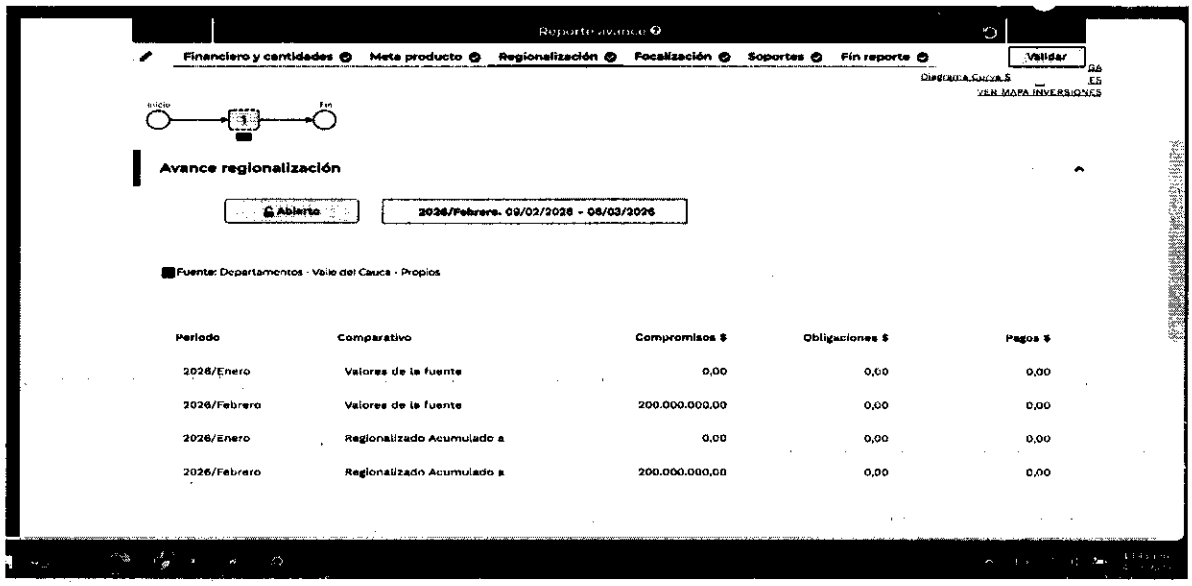
Reporte avance
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
Avance regionalización
Abierto
2026/Febrero. 09/02/2026 - 06/03/2026
Fuente: Departamentos - Valle del Cauca - Propios
Periodo
Comparativo
Compromisos $
Obligaciones $
Pagos $
2026/Enero
Valores de la fuente
0,00
0,00
0,00
2026/Febrero
Valores de la fuente
200.000.000,00
0,00
0,00
2026/Enero
Regionalizado Acumulado a
0,00
0,00
0,00
2026/Febrero
Regionalizado Acumulado a
200.000.000,00
0,00
0,00

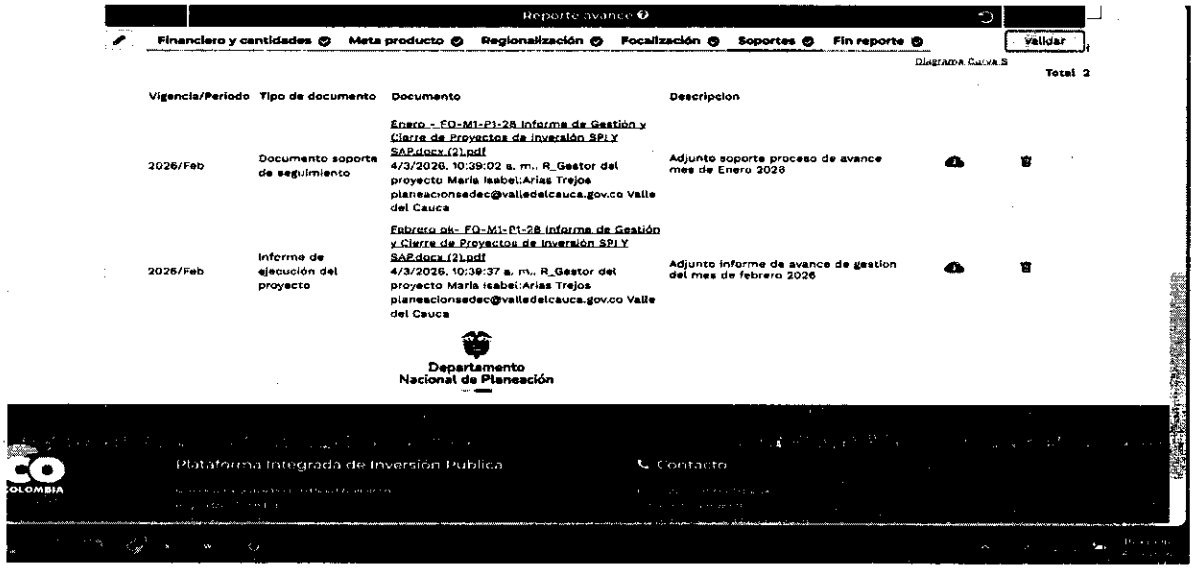

Reporte avance
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Total 2
Vigencia/Periodo
Tipo de documento
Documento
Descripcion
2026/Feb
Documento soporte de seguimiento
Enero - FO-M1-P1-28 Informe de Gestión y Cierre de Proyectos de Inversión SPI Y SAP.docx (2).pdf
4/3/2026, 10:39:02 a. m., R_Gestor del proyecto Maria Isabel:Arias Trejos planeacionsedec@valledelcauca.gov.co Valle del Cauca
Adjunto soporte proceso de avance mes de Enero 2026
2026/Feb
Informe de ejecución del proyecto
Febrero ok- FO-M1-P1-28 Informe de Gestión y Cierre de Proyectos de Inversión SPI Y SAP.docx (2).pdf
4/3/2026, 10:39:37 a. m., R_Gestor del proyecto Maria Isabel:Arias Trejos planeacionsedec@valledelcauca.gov.co Valle del Cauca
Adjunto informe de avance de gestion del mes de febrero 2026
Departamento Nacional de Planeación
Plataforma Integrada de Inversión Publica
Contacto

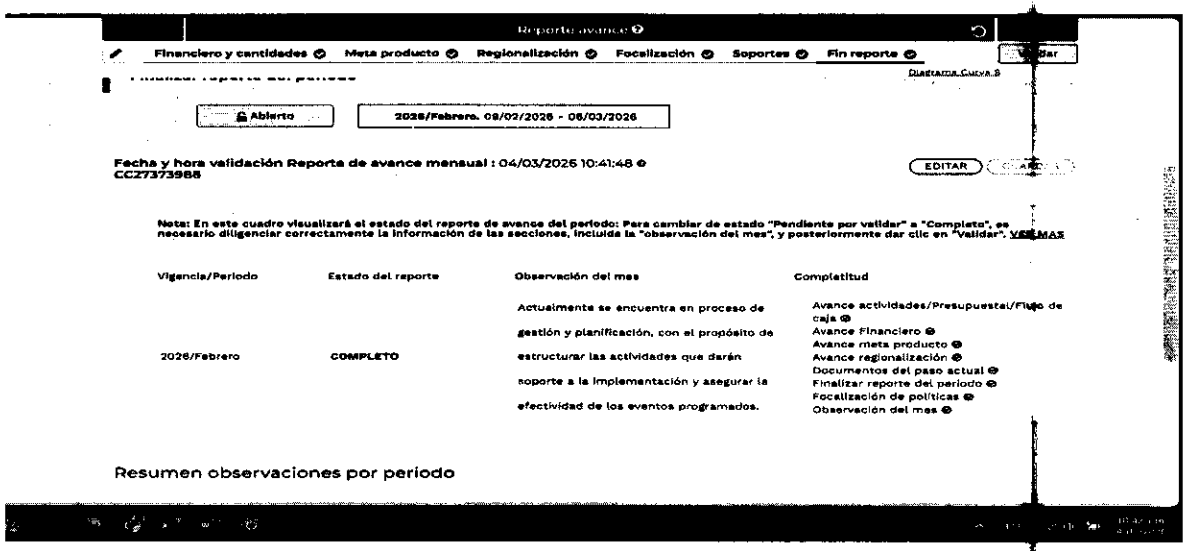


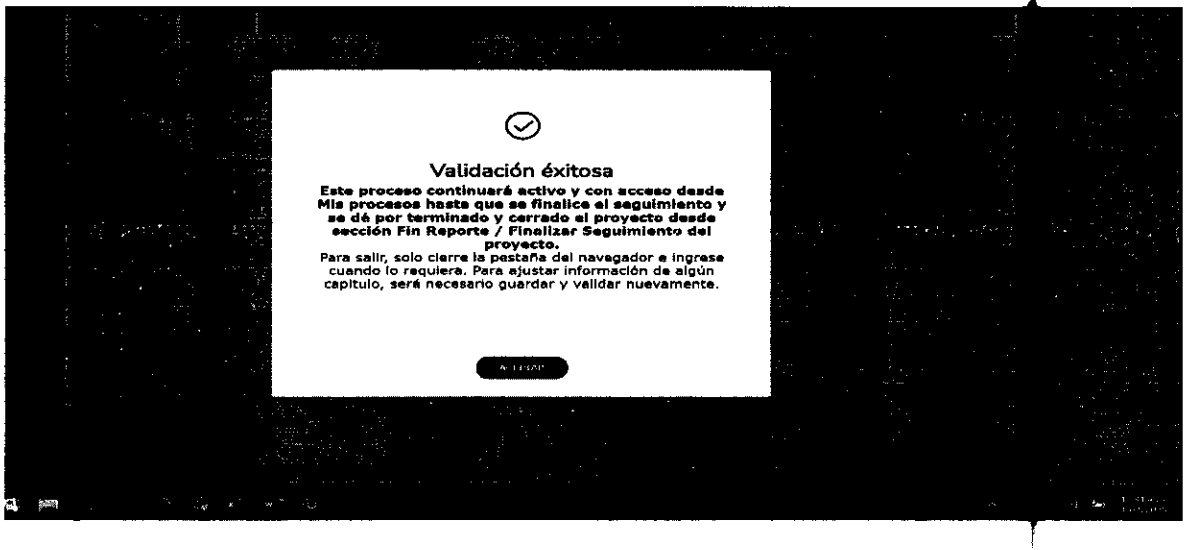

Reporte avance ejecución

Proceso: EJ-SYC-0376-0307 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 29-10-2025 Fecha fin: ID: 1429461 BPIN: 202500000023888 Periodo(s) abierto(s): 2026 Febrero(09/02/2026 - 06/03/2026),

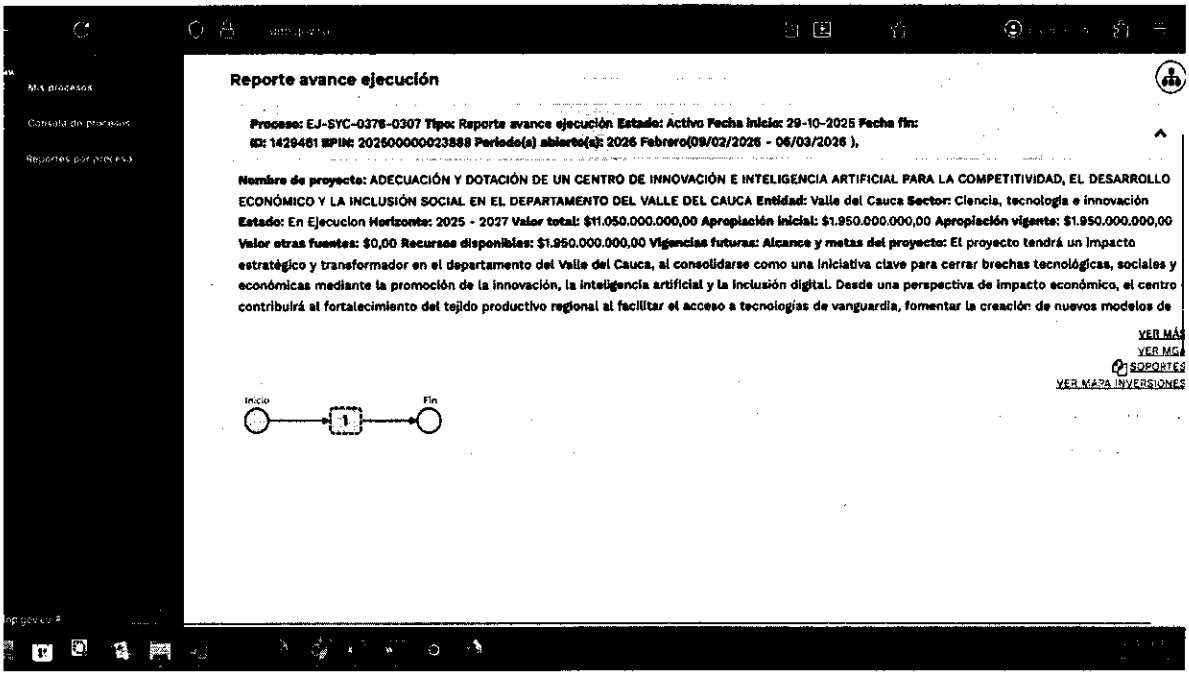
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-0378-0307 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 29-10-2025 Fecha fin:
ID: 1429461 BPIN: 20250000023888 Periodo(s) abierto(s): 2026 Febrero(09/02/2026 - 06/03/2026),
Nombre de proyecto: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE INNOVACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA COMPETITIVIDAD, EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA INCLUSIÓN SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Entidad: Valle del Cauca Sector: Ciencia, tecnología e innovación Estado: En Ejecucion Horizonte: 2025 - 2027 Valor total: $11.050.000.000,00 Apropiación inicial: $1.950.000.000,00 Apropiación vigente: $1.950.000.000,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $1.950.000.000,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: El proyecto tendrá un impacto estratégico y transformador en el departamento del Valle del Cauca, al consolidarse como una iniciativa clave para cerrar brechas tecnológicas, sociales y económicas mediante la promoción de la innovación, la inteligencia artificial y la inclusión digital. Desde una perspectiva de impacto económico, el centro contribuirá al fortalecimiento del tejido productivo regional al facilitar el acceso a tecnologías de vanguardia, fomentar la creación de nuevos modelos de
VER MÁS
SOPORTES
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
1
Fin

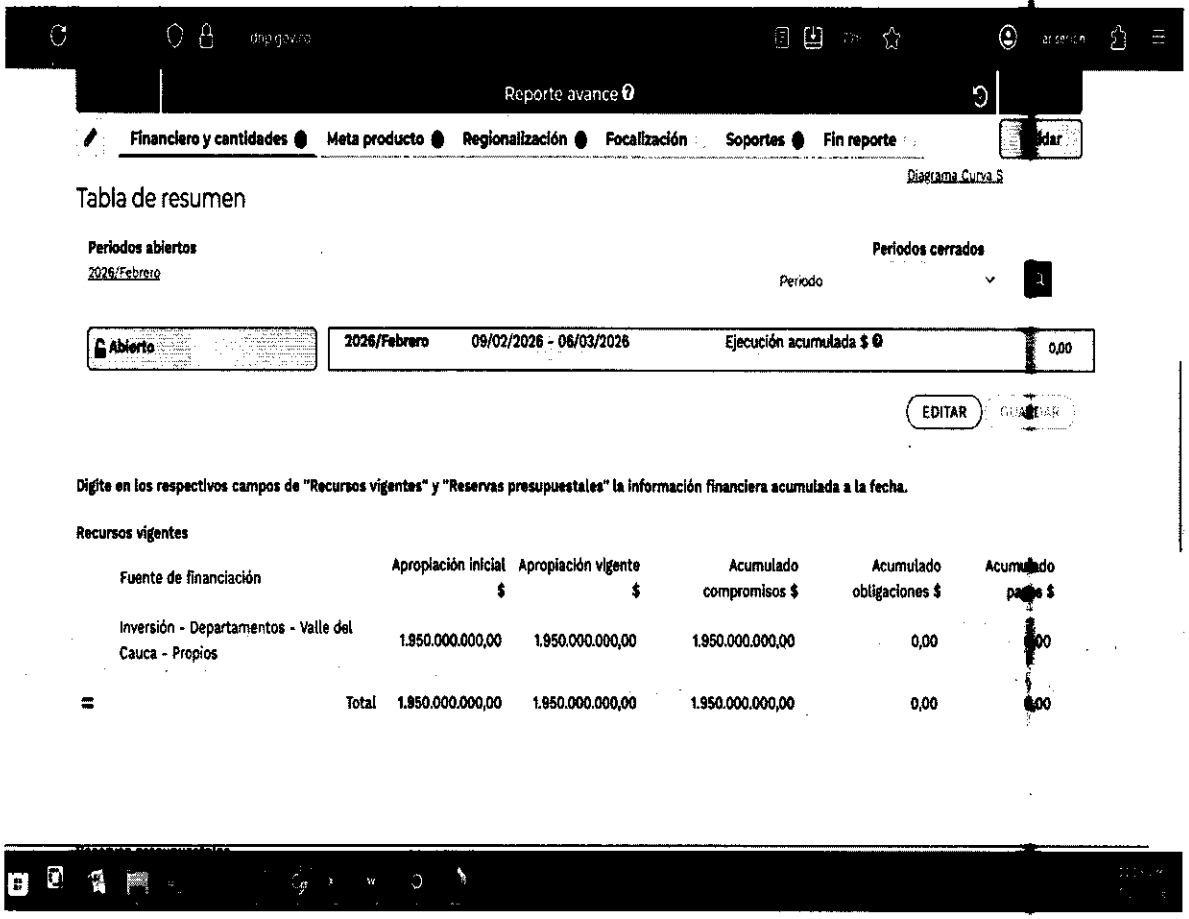

Reporte avance

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte

Diagrama Curva S

Tabla de resumen

Periodos abiertos

2026/Febrero

Periodos cerrados

Periodo


Abierto | 2026/Febrero | 09/02/2026 - 06/03/2026 | Ejecución acumulada $ | 0,00


EDITAR

Digite en los respectivos campos de "Recursos vigentes" y "Reservas presupuestales" la información financiera acumulada a la fecha.


Recursos vigentes

Fuente de financiación	Apropiación inicial $	Apropiación vigente $	Acumulado compromisos $	Acumulado obligaciones $	Acumulado pago $
Inversión - Departamentos - Valle del Cauca - Propios	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	0,00	0,00
Total	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	0,00	0,00

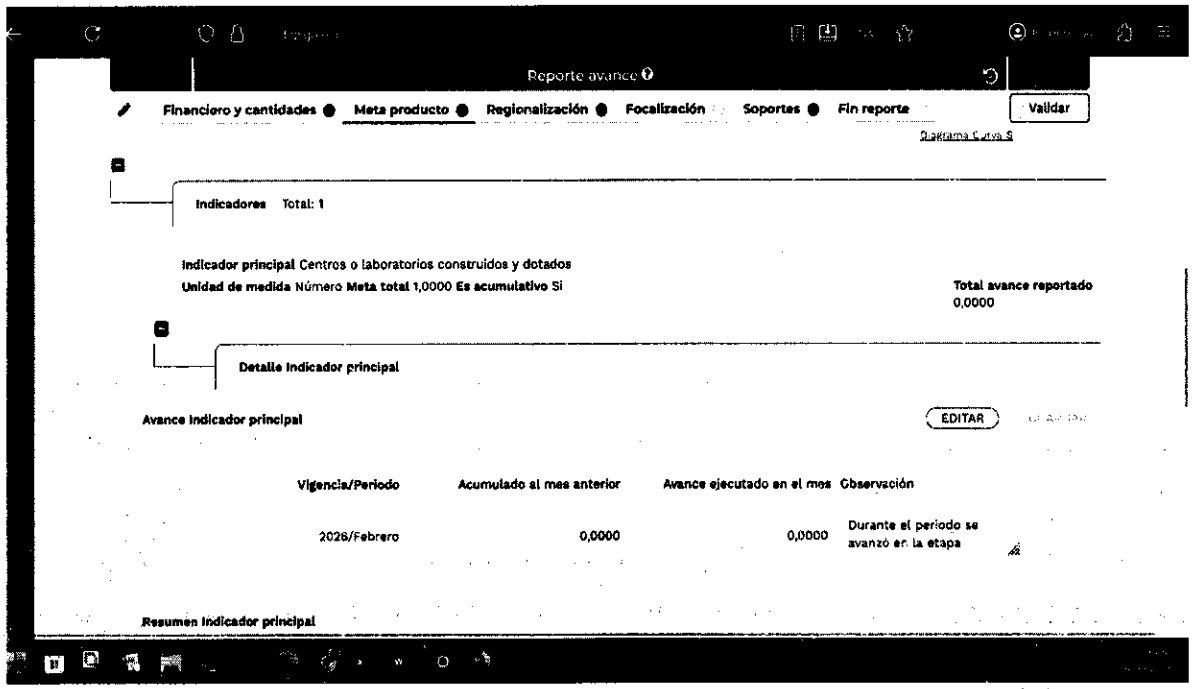

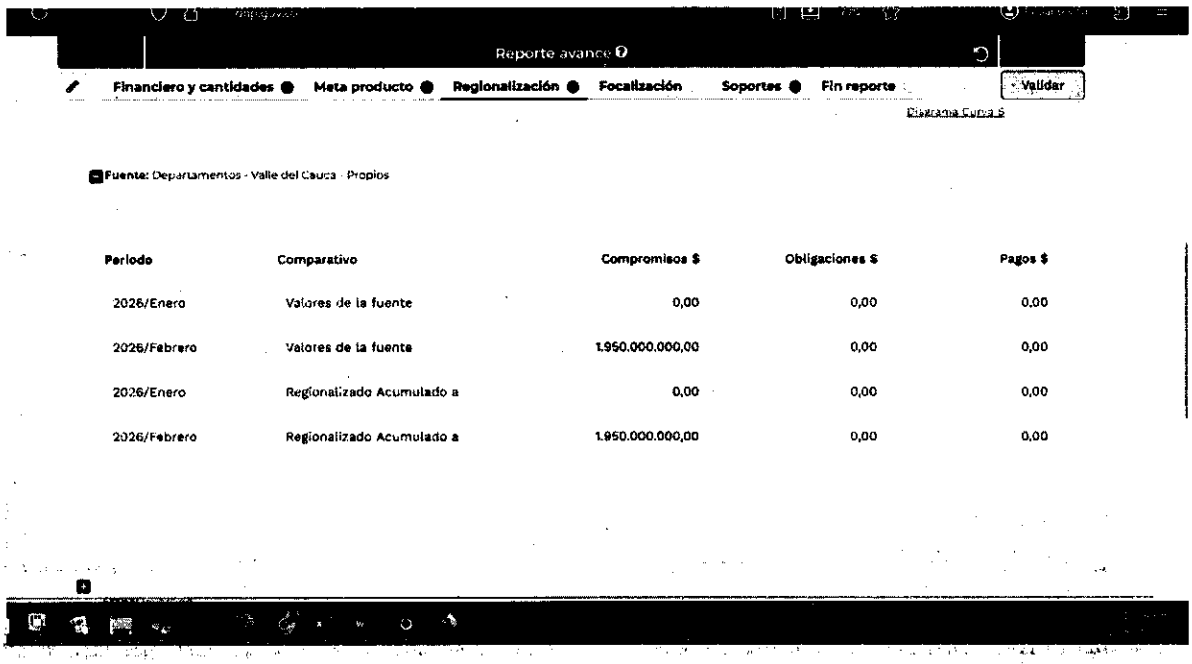

Periodo	Comparativo	Compromisos $	Obligaciones $	Pagos $
2026/Enero	Valores de la fuente	0,00	0,00	0,00
2026/Febrero	Valores de la fuente	1.950.000.000,00	0,00	0,00
2026/Enero	Regionalizado Acumulado a	0,00	0,00	0,00
2026/Febrero	Regionalizado Acumulado a	1.950.000.000,00	0,00	0,00

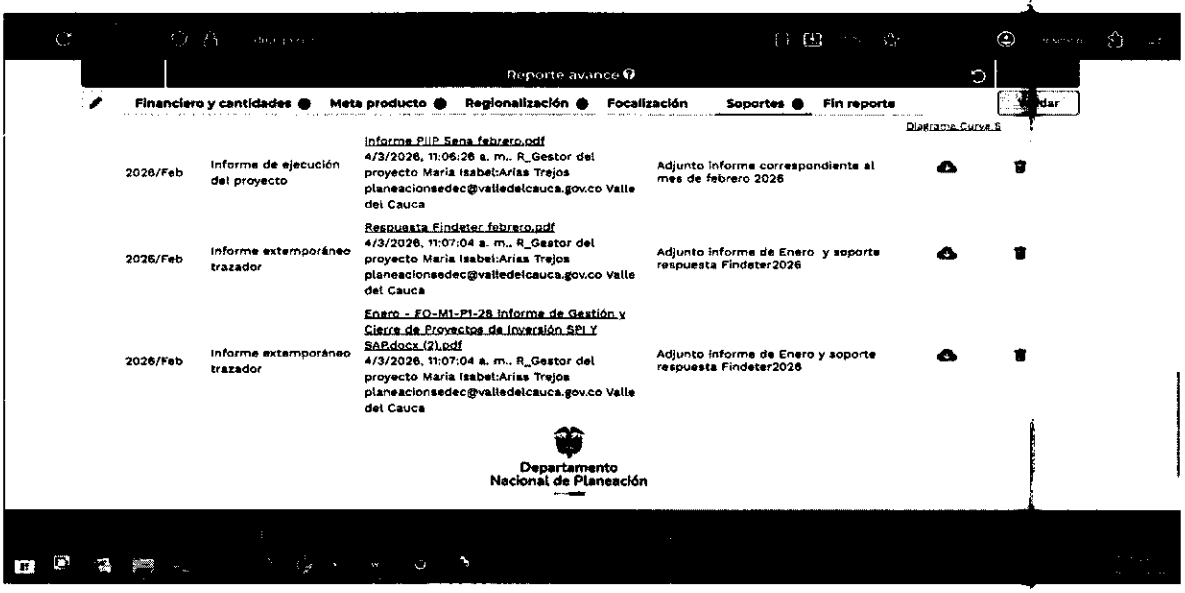


Reporte avance

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte

Diagrama Curva S

2026/Feb	Informe de ejecución del proyecto	Informe PIIP Sena febrero.pdf 4/3/2026, 11:06:26 a. m.. R_Gestor del proyecto Maria Isabel:Arias Trejos planeacionsedec@valledelcauca.gov.co Valle del Cauca	Adjunto informe correspondiente al mes de febrero 2026	
2026/Feb	Informe extemporáneo trazador	Respuesta Findeter febrero.pdf 4/3/2026, 11:07:04 a. m.. R_Gestor del proyecto Maria Isabel:Arias Trejos planeacionsedec@valledelcauca.gov.co Valle del Cauca	Adjunto informe de Enero y soporte respuesta Findeter2026	
2026/Feb	Informe extemporáneo trazador	Enero - FO-M1-P1-28 Informe de Gestión y Cierre de Proyectos de Inversión SPI Y SAP.docx (2).pdf 4/3/2026, 11:07:04 a. m.. R_Gestor del proyecto Maria Isabel:Arias Trejos planeacionsedec@valledelcauca.gov.co Valle del Cauca	Adjunto informe de Enero y soporte respuesta Findeter2026	

Departamento Nacional de Planeación

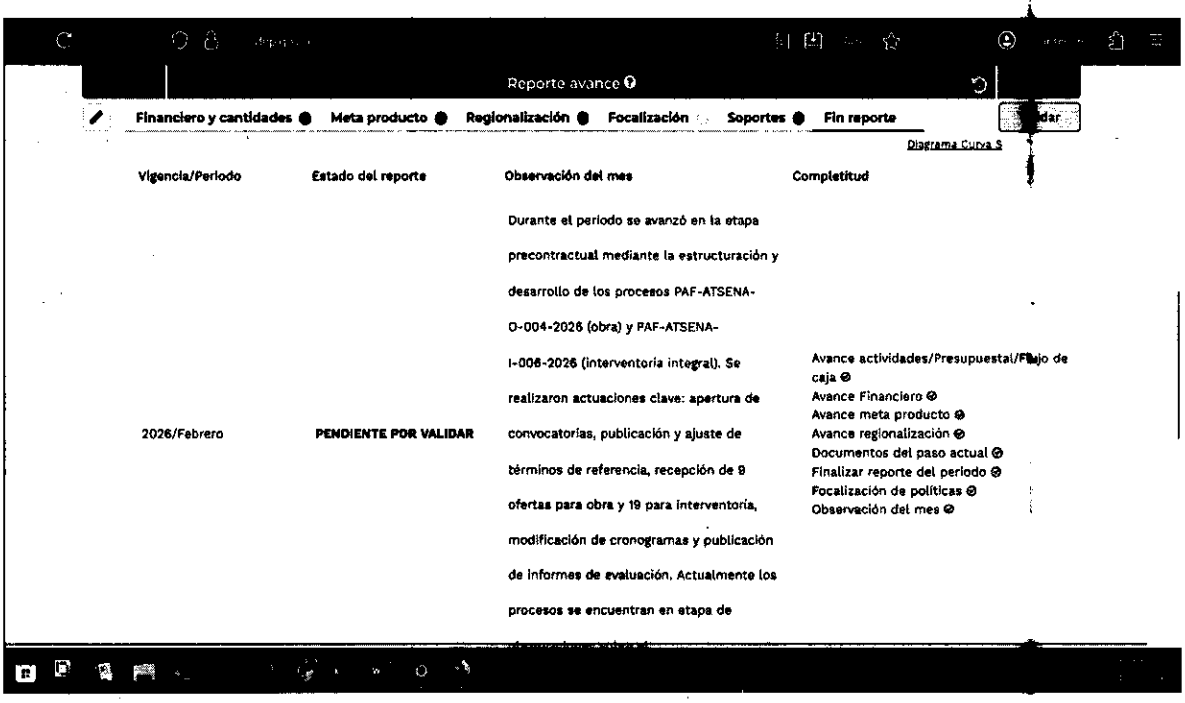

Reporte avance

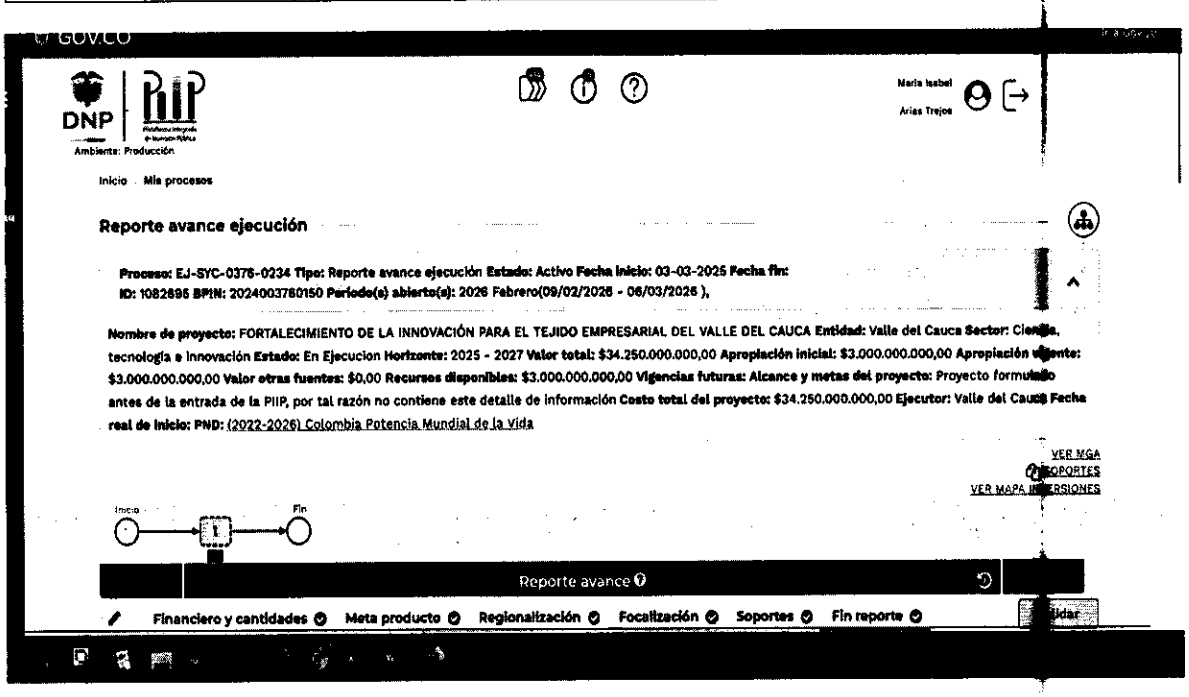
Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte


Diagrama Curva S

Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Completitud
2026/Febrero	**PENDIENTE POR VALIDAR**	Durante el periodo se avanzó en la etapa precontractual mediante la estructuración y desarrollo de los procesos PAF-ATSENA-O-004-2026 (obra) y PAF-ATSENA-I-006-2026 (interventoría integral). Se realizaron actuaciones clave: apertura de convocatorias, publicación y ajuste de términos de referencia, recepción de 9 ofertas para obra y 19 para interventoría, modificación de cronogramas y publicación de informes de evaluación. Actualmente los procesos se encuentran en etapa de	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja Avance Financiero Avance meta producto Avance regionalización Documentos del paso actual Finalizar reporte del periodo Focalización de políticas Observación del mes



Proceso: EJ-SYC-0376-0234 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 03-03-2025 Fecha fin: ID: 1082695 BPIN: 2024003760150 Periodo(s) abierto(s): 2026 Febrero (09/02/2026 - 06/03/2026),


GOV.CO
DNP
PIIP
Ambiente: Producción
María Isabel
Arias Trejos
Inicio
Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-0376-0234 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 03-03-2025 Fecha fin:
ID: 1082895 BPIN: 2024003760150 Periodo(s) abierto(s): 2026 Febrero(09/02/2026 - 06/03/2026),
Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN PARA EL TEJIDO EMPRESARIAL DEL VALLE DEL CAUCA Entidad: Valle del Cauca Sector: Ciencia, tecnología e innovación Estado: En Ejecucion Horizonte: 2025 - 2027 Valor total: $34.250.000.000,00 Apropiación inicial: $3.000.000.000,00 Apropiación vigente: $3.000.000.000,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $3.000.000.000,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $34.250.000.000,00 Ejecutor: Valle del Cauca Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
SOPORTES
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
Reporte avance
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte

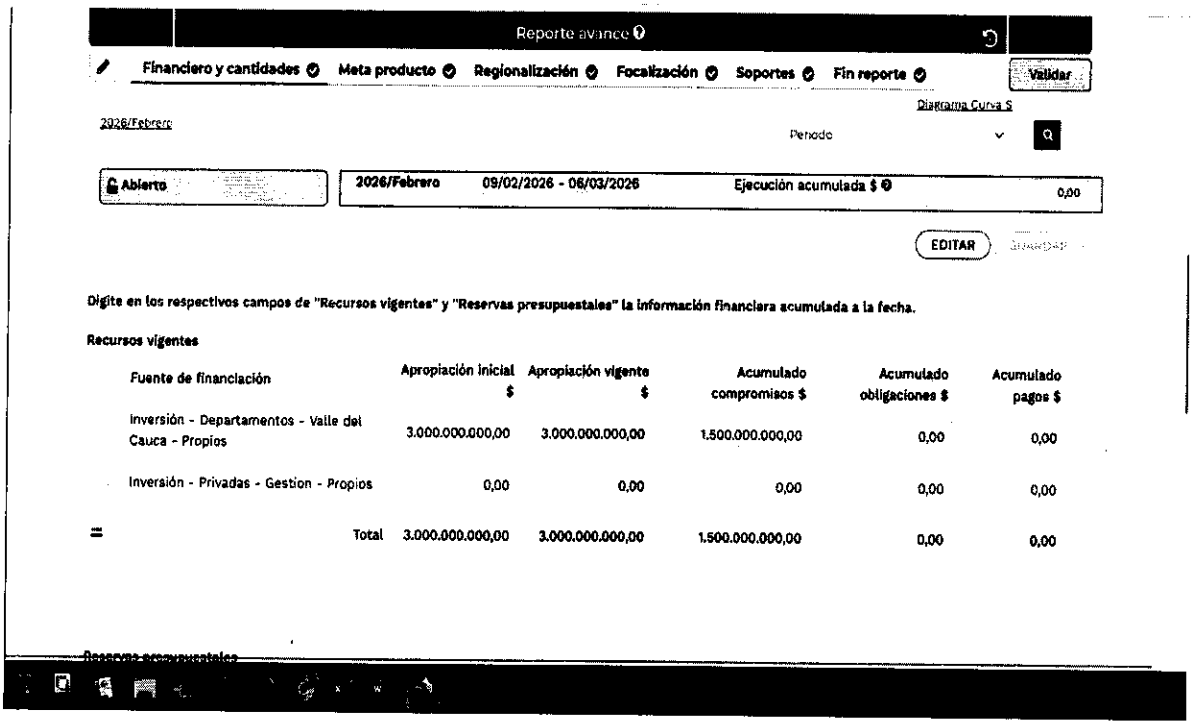

Reporte avance

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte | Validar

Diagrama Curva S

2026/Febrero — Periodo

Abierto | 2026/Febrero | 09/02/2026 - 06/03/2026 | Ejecución acumulada $ | 0,00


EDITAR


Digite en los respectivos campos de "Recursos vigentes" y "Reservas presupuestales" la información financiera acumulada a la fecha.


Recursos vigentes

Fuente de financiación	Apropiación inicial $	Apropiación vigente $	Acumulado compromisos $	Acumulado obligaciones $	Acumulado pagos $
Inversión - Departamentos - Valle del Cauca - Propios	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
Inversión - Privadas - Gestion - Propios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00

Reservas presupuestales

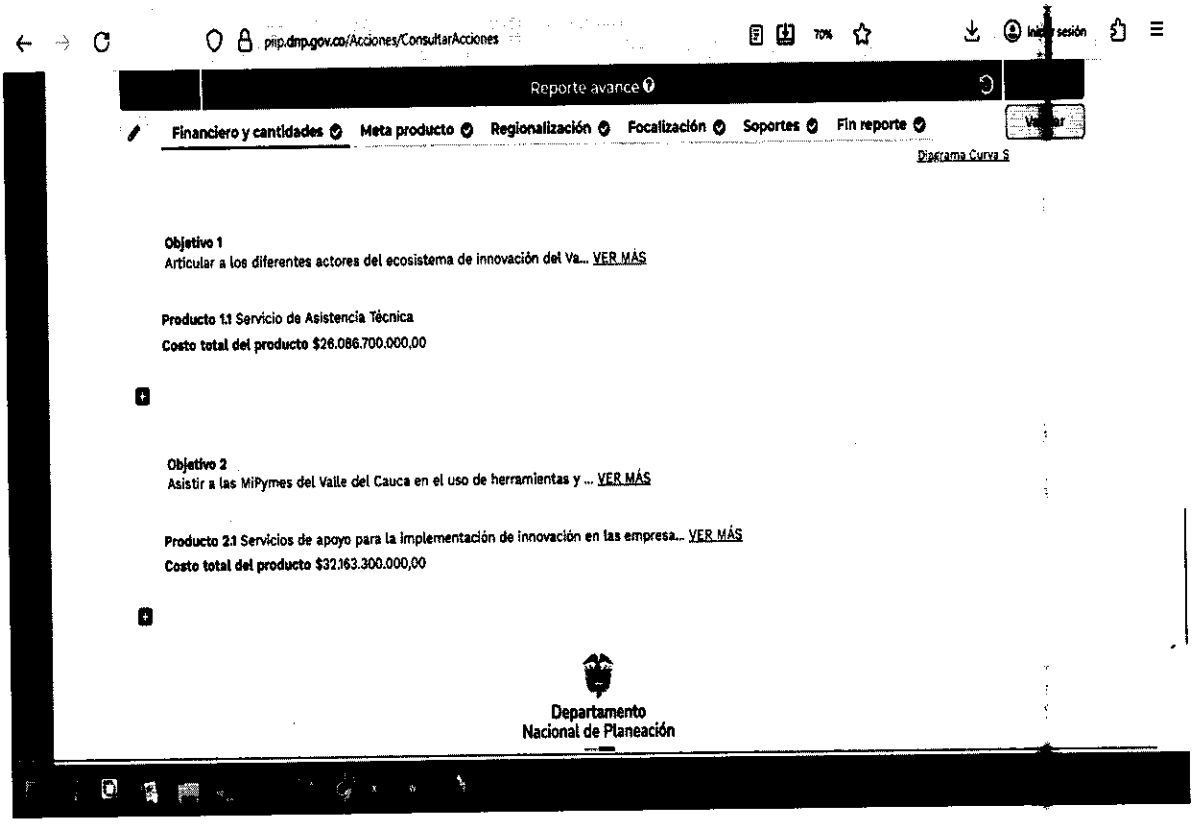
pip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Reporte avance
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Diagrama Curva S
Objetivo 1
Articular a los diferentes actores del ecosistema de innovación del Va... VER MÁS
Producto 1.1 Servicio de Asistencia Técnica
Costo total del producto $26.086.700.000,00
Objetivo 2
Asistir a las MiPymes del Valle del Cauca en el uso de herramientas y ... VER MÁS
Producto 2.1 Servicios de apoyo para la implementación de innovación en las empresa... VER MÁS
Costo total del producto $32.163.300.000,00
Departamento
Nacional de Planeación

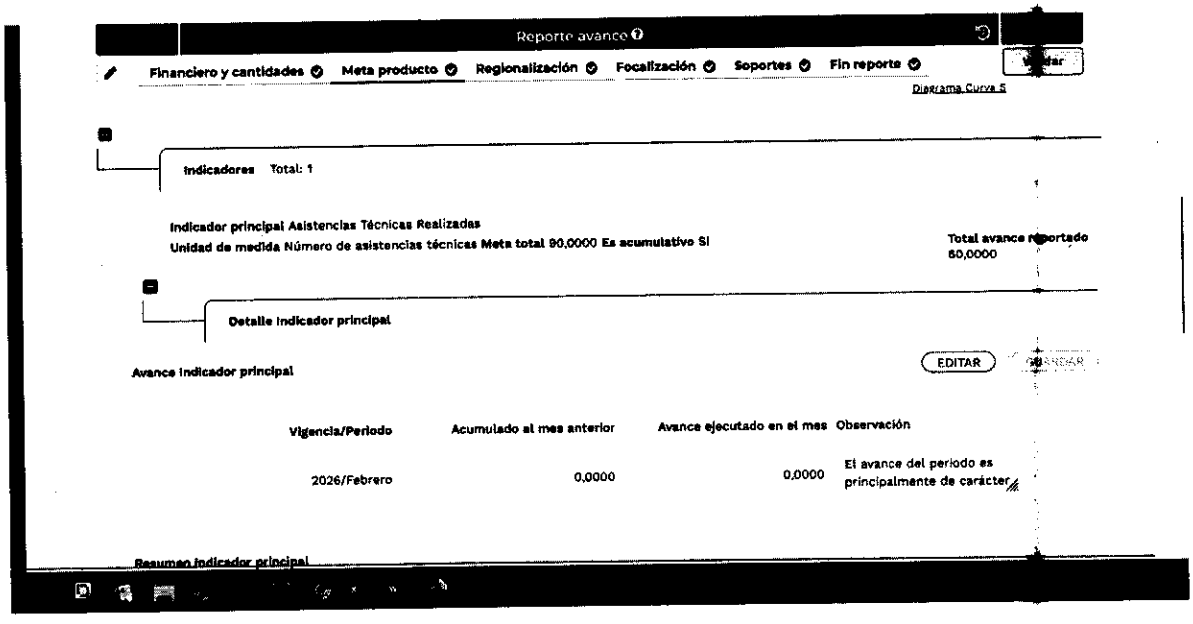
Reporte avance
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Diagrama Curva S
Indicadores Total: 1
Indicador principal Asistencias Técnicas Realizadas
Unidad de medida Número de asistencias técnicas Meta total 90,0000 Es acumulativo SI
Total avance reportado
50,0000
Detalle indicador principal
Avance indicador principal
EDITAR
Vigencia/Periodo
Acumulado al mes anterior
Avance ejecutado en el mes
Observación
2026/Febrero
0,0000
0,0000
El avance del periodo es principalmente de carácter
Resumen indicador principal



Periodo	Comparativo	Compromisos $	Obligaciones $	Pagos $
2026/Enero	Valores de la fuente	1.500.000.000,00	0,00	0,00
2026/Febrero	Valores de la fuente	1.500.000.000,00	0,00	0,00
2026/Enero	Regionalizado Acumulado a	1.500.000.000,00	0,00	0,00
2026/Febrero	Regionalizado Acumulado a	1.500.000.000,00	0,00	0,00

Reporte avance

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte | Validar

Diagrama Curva S

2026/Feb	Informe de ejecución del proyecto	FO-M1-P1-28 Informe PIIP febrero NIDO HUB 2026.pdf 4/3/2026, 2:27:01 p. m., R_Gestor del proyecto Maria Isabel:Arias Trejos planeacionsedec@valledelcauca.gov.co Valle del Cauca	adjunto informe correspondiente al mes de febrero de 2026	


Departamento Nacional de Planeación

Reporte avance


Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte | Validar


Diagrama Curva S

Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Completitud
2026/Febrero	COMPLETO	El avance del periodo es principalmente de carácter estratégico y preparatorio, enfocado en consolidar la estructura técnica y operativa del proyecto. Aunque aún no se registran unidades productivas atendidas, se cuenta con el equipo contratado y las metodologías definidas, lo que permite garantizar una ejecución organizada y con calidad técnica en los próximos meses, asegurando el cumplimiento progresivo de la meta.	Avance actividades/Presupuesta / Flujo de caja Avance Financiero Avance meta producto Avance regionalización Documentos del paso actual Finalizar reporte del periodo Focalización de políticas Observación del mes

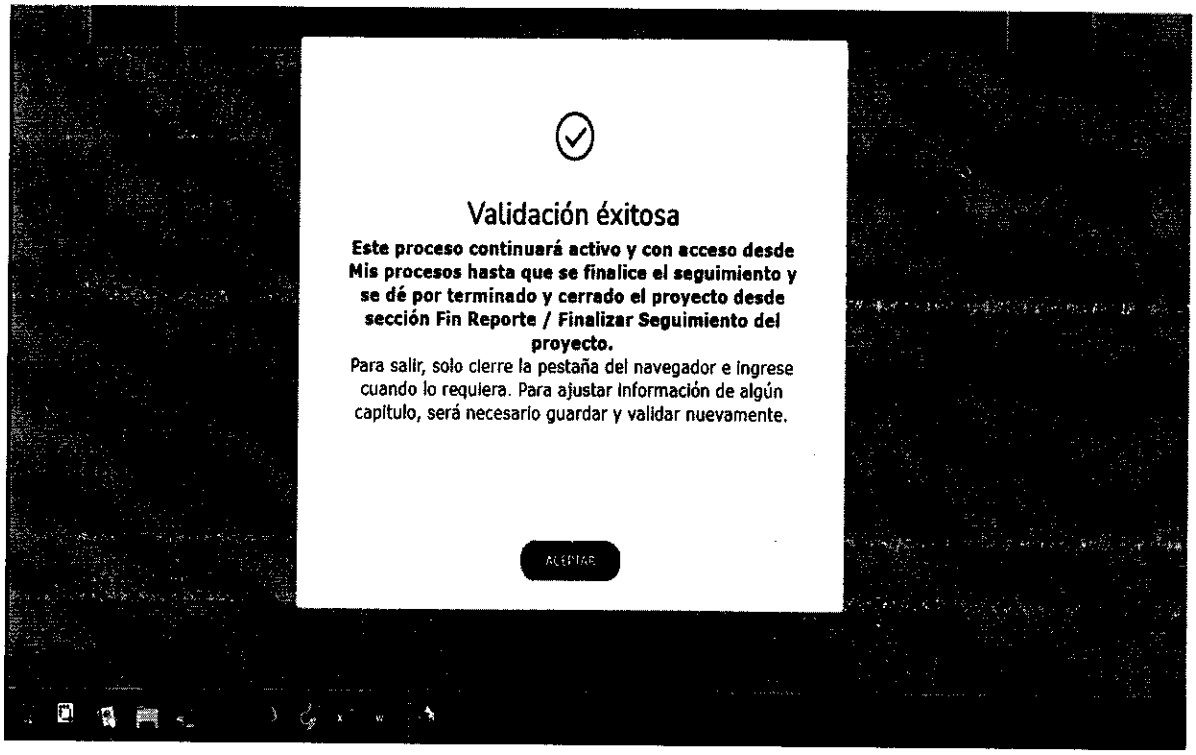

Proceso: EJ-SYC-0376-0077 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 27-01-2025 Fecha fin: ID: 1004794 BPIN: 2024003760114 Periodo(s) abierto(s): 2026 Febrero(09/02/2026 - 06/03/2026),

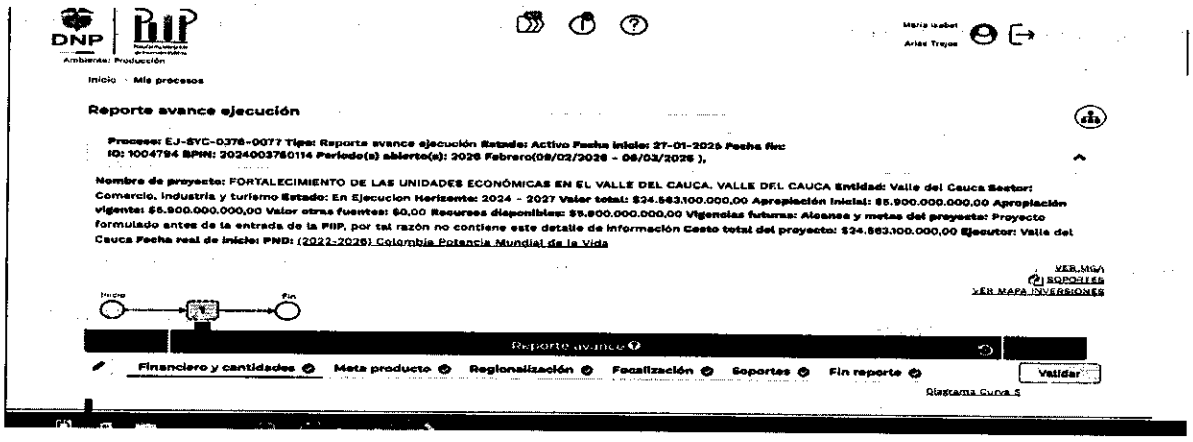

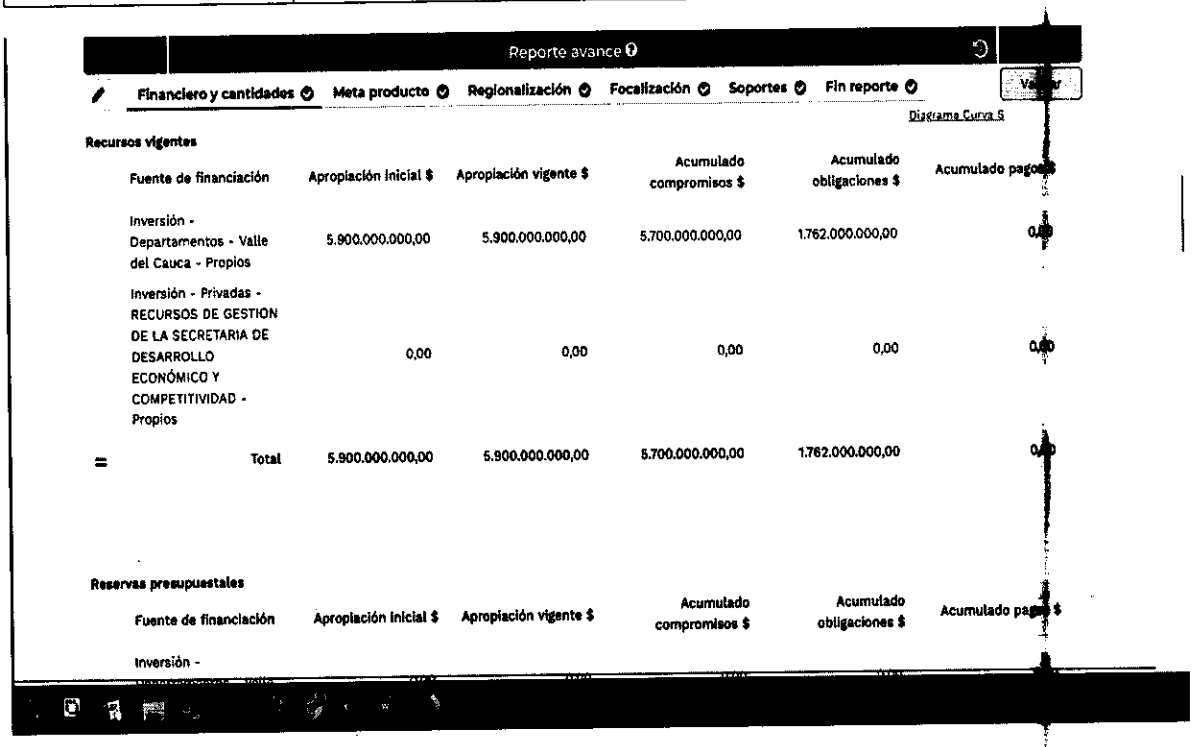

Reporte avance

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte | Validar


Diagrama Curva S

Recursos vigentes

Fuente de financiación	Apropiación inicial $	Apropiación vigente $	Acumulado compromisos $	Acumulado obligaciones $	Acumulado pagos $
Inversión - Departamentos - Valle del Cauca - Propios	5.900.000.000,00	5.900.000.000,00	5.700.000.000,00	1.762.000.000,00	0,00
Inversión - Privadas - RECURSOS DE GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD - Propios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Total	5.900.000.000,00	5.900.000.000,00	5.700.000.000,00	1.762.000.000,00	0,00

Reservas presupuestales

Fuente de financiación	Apropiación inicial $	Apropiación vigente $	Acumulado compromisos $	Acumulado obligaciones $	Acumulado pagos $
Inversión -					

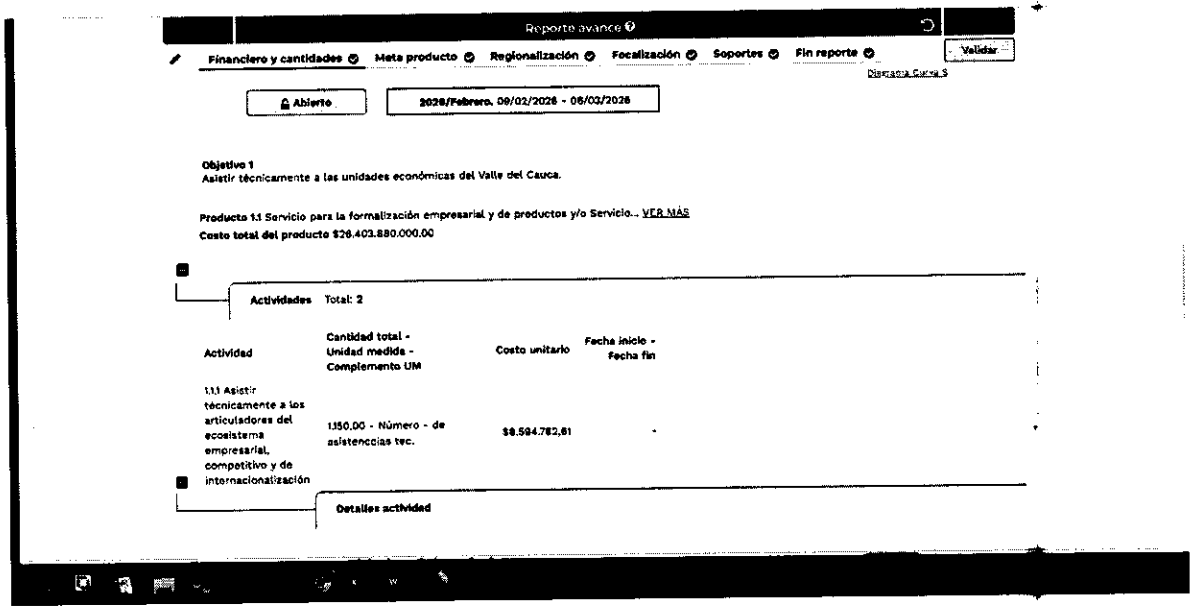

Reporte avance

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte | Validar

Diagrama Curva S

Abierto | 2026/Febrero, 09/02/2026 - 06/03/2026


Objetivo 1
Asistir técnicamente a las unidades económicas del Valle del Cauca.

Producto 1.1 Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio... VER MÁS
Costo total del producto $26.403.880.000,00


Actividades Total: 2


Actividad	Cantidad total - Unidad medida - Complemento UM	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
1.1.1 Asistir técnicamente a los articuladores del ecosistema empresarial, competitivo y de internacionalización	1.350,00 - Número - de asistenccias tec.	$9.594.782,61	-

Detalles actividad

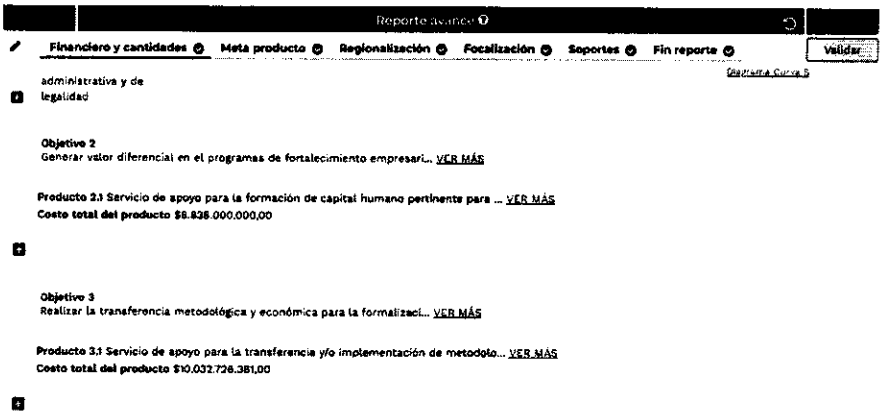

Departamento
Nacional de Planeación

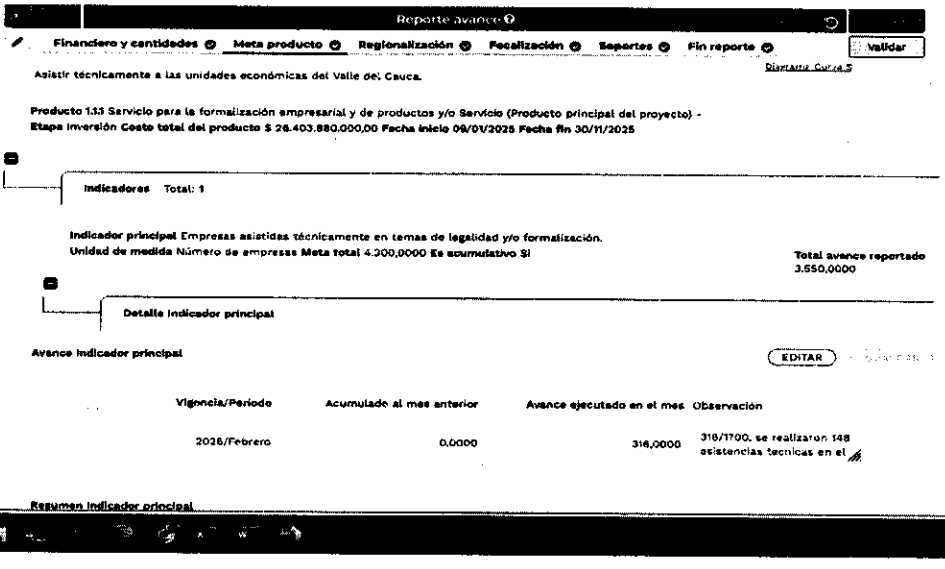

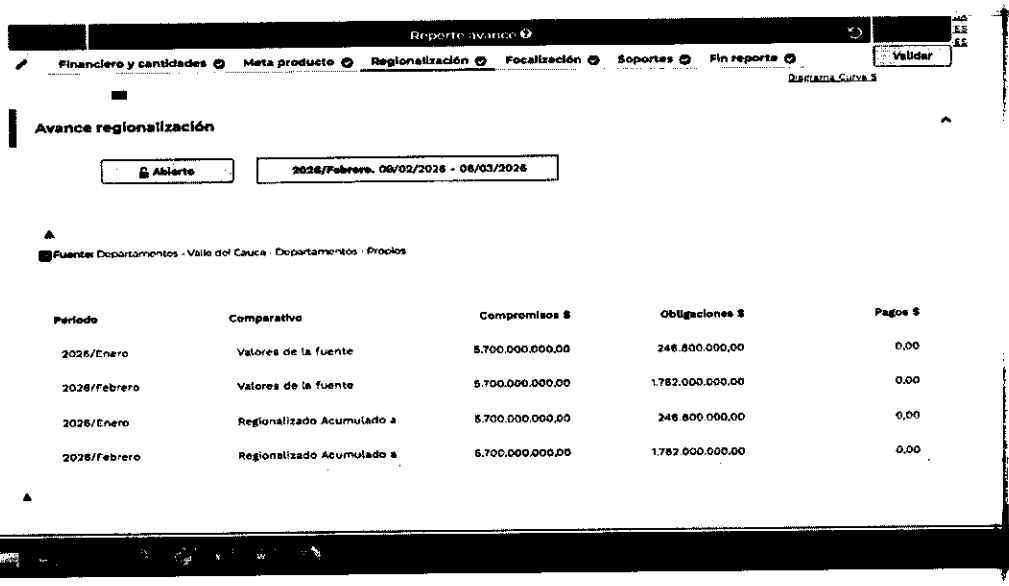

Reporte avance

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte | Validar


Diagrama Curva S

Avance regionalización

Abierto | 2026/Febrero. 06/02/2026 - 06/03/2026

Fuente: Departamentos - Valle del Cauca - Departamentos - Propios

Periodo	Comparativo	Compromisos $	Obligaciones $	Pagos $
2026/Enero	Valores de la fuente	5.700.000.000,00	246.800.000,00	0,00
2026/Febrero	Valores de la fuente	5.700.000.000,00	1.782.000.000,00	0,00
2026/Enero	Regionalizado Acumulado a	5.700.000.000,00	246.800.000,00	0,00
2026/Febrero	Regionalizado Acumulado a	5.700.000.000,00	1.782.000.000,00	0,00

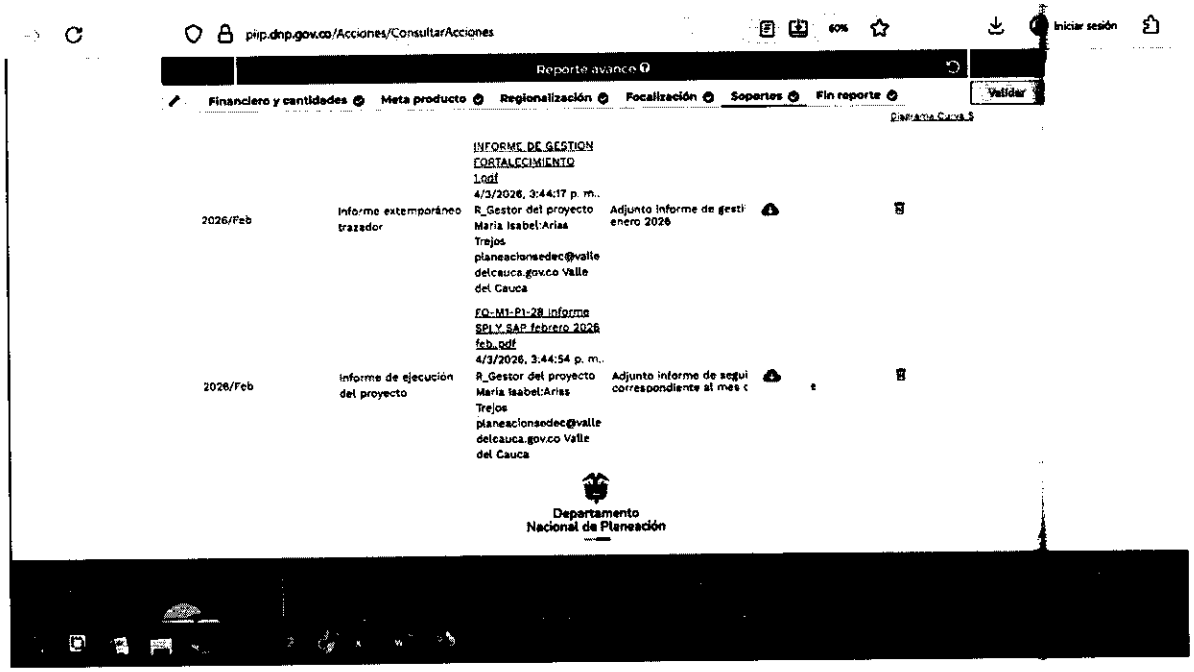

pifp.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones — 60% — Iniciar sesión


Reporte avance


Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte | Validar

Diagrama Curva S




2026/Feb	Informe extemporáneo trazador	INFORME DE GESTION FORTALECIMIENTO 1.pdf 4/3/2026, 3:44:17 p. m.. R_Gestor del proyecto Maria Isabel:Arias Trejos planeacionsedec@valledelcauca.gov.co Valle del Cauca	Adjunto informe de gesti enero 2026		
2026/Feb	Informe de ejecución del proyecto	FO-M1-P1-28 informe SPI Y SAP febrero 2026 feb..pdf 4/3/2026, 3:44:54 p. m.. R_Gestor del proyecto Maria Isabel:Arias Trejos planeacionsedec@valledelcauca.gov.co Valle del Cauca	Adjunto informe de segui correspondiente al mes c	e	




Departamento Nacional de Planeación

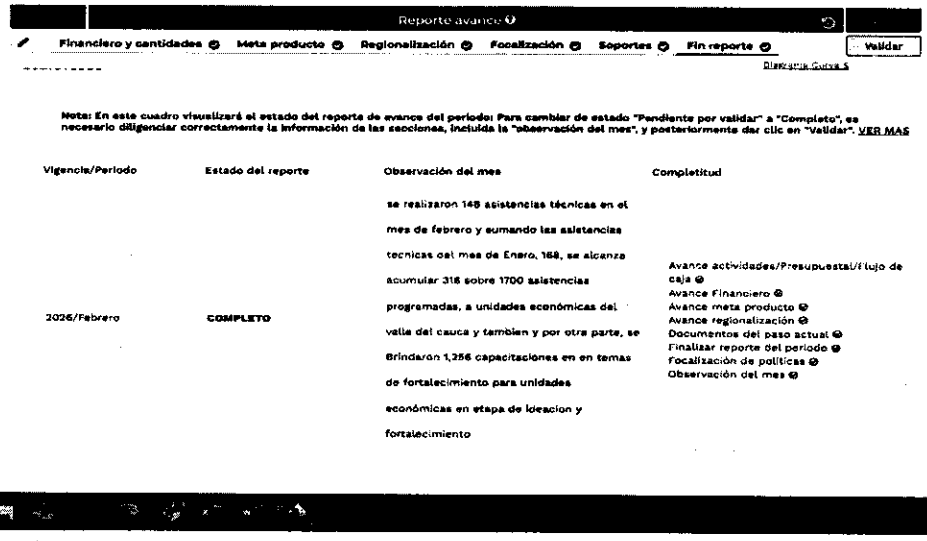





Print evidencia reporte avance técnico financiero Proyectos Inversión SEDEFE, con corte a febrero 28 de 2026-completado

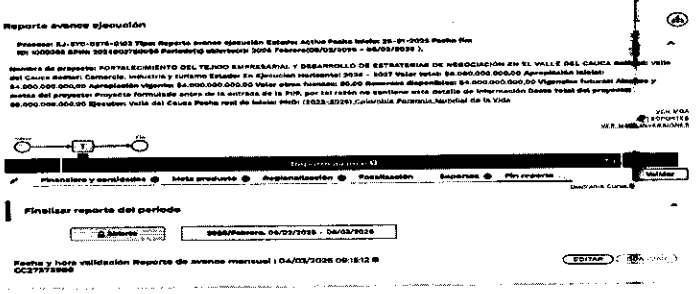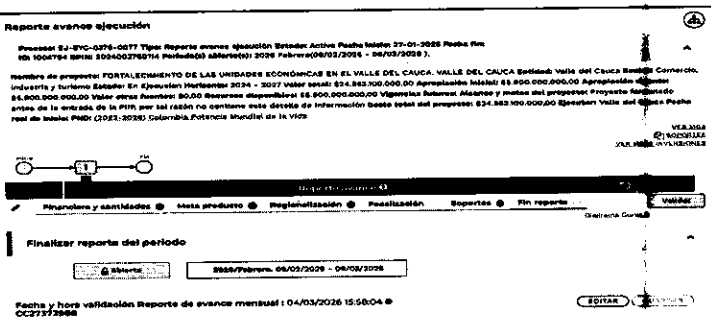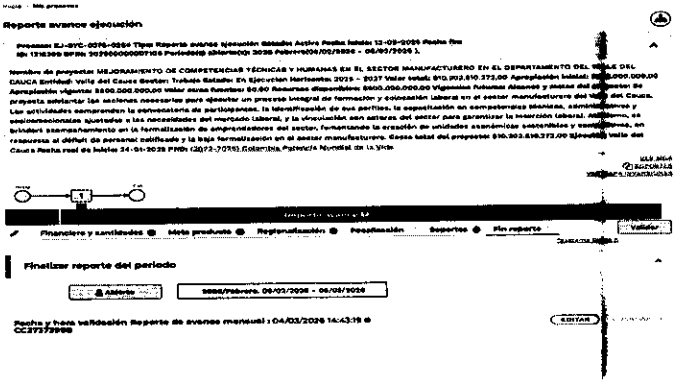PI37-102481	
PI37-102499	
PI38-102555	

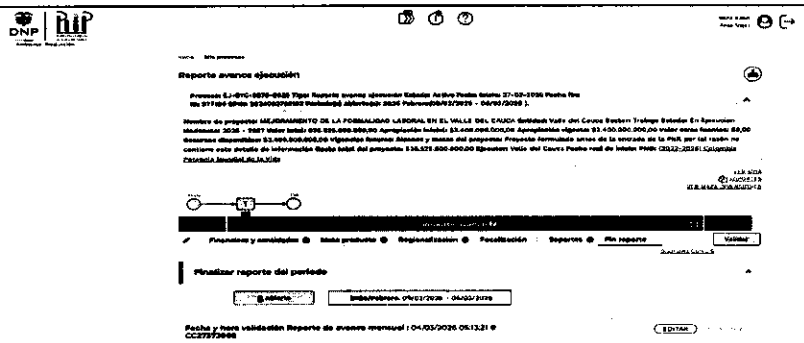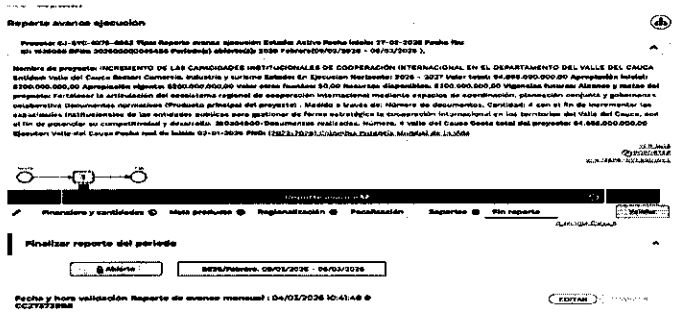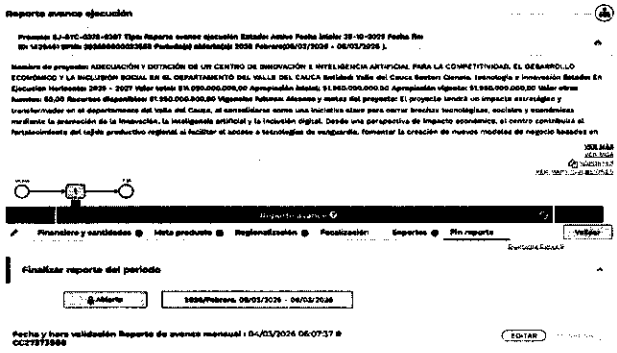PI38-102556	
PI38-102756	
PI39-102642	

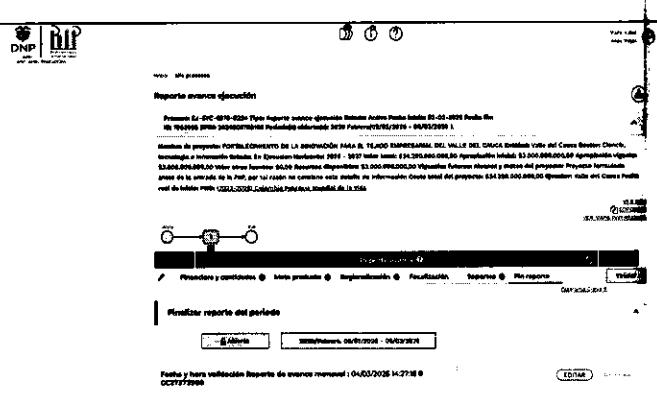PI39-102571	

DE LA ACTIVIDAD 6:

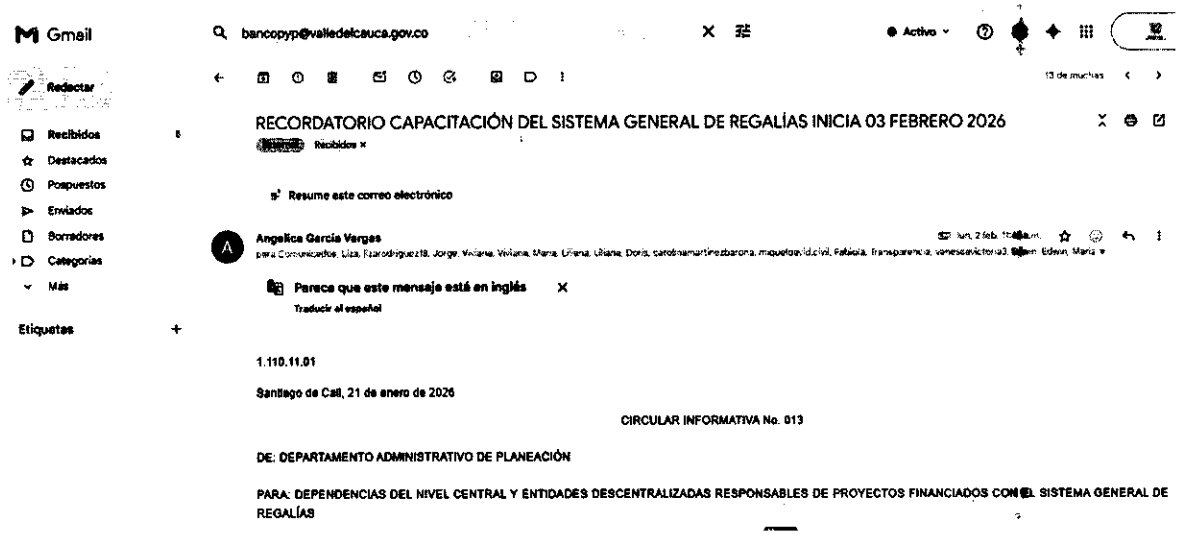

Gmail

bancopyp@valledelcauca.gov.co

Activo

Redactar

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

Categorías

Más

Etiquetas

RECORDATORIO CAPACITACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS INICIA 03 FEBRERO 2026

Recibidos ×

Resume este correo electrónico

Angelica García Vargas

Parece que este mensaje está en inglés

Traducir al español

1.110.11.01

Santiago de Cali, 21 de enero de 2026

CIRCULAR INFORMATIVA No. 013

DE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

PARA: DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS RESPONSABLES DE PROYECTOS FINANCIADOS CON EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

Memoraias jornada de capacitación Regalias dia 1 [redacted] Recibidos ×

Resume este correo electrónico

Maria del Carmen Bahos Ortiz <mbahos@valledelcauca.gov.co> jue, 5 feb, 8:47 a.m.
para Luz, stephanycollazoscruz, Carolina, lorena.zapata.molina, HUGONES1026, Ingrid, Sandra, supervision3d, planeacionsedec, ahs, Jose, Claudia Maria, franciscopatodierra, Cesar, jhorhenao.p

Parece que este mensaje está en inglés ×
Traducir al español

Cordial saludo,

Me permito compartir las memorias de la jornada de capacitación 1, realizada el día 3 de febrero de 2026, en:

1. Ajustes a los proyectos de inversión financiados o cofinanciados con recursos del SGR
2. Generalidades y Normativas del SGR

Enlace de grabación:
https://drive.google.com/file/d/1KlrRNtkHQLw1_YRTJCvQqS-QtVeGf3Xa/view?usp=drivesdk

10 de muchas

Memorias jornada de capacitación Regalías dia 3 [redacted] Recibidos ×

Resume este correo electrónico

Maria del Carmen Bahos Ortiz <mbahos@valledelcauca.gov.co> vie, 6 feb, 9:47 a.m.
para Proyectosregalias10, gizeh.cardozo, jenyfer.martinez, Edwin, Juan, Marlon, Sebas_polania, Jesus, dianaconp, becas.doctorados, aldemarmonta, lizeth, fatgor70, profesional.tecnologico sgr, dti

Parece que este mensaje está en inglés ×
Traducir al español

Cordial saludo,

Me permito compartir las memorias de la jornada de capacitación 3, realizada el día 5 de febrero de 2026, en:

- Cierre de proyectos del SGR
- Monitoreo y seguimiento de los proyectos del SGR
- Sistema de presupuesto y giro de regalías SPGR y SAP

Enlace de grabación:
https://drive.google.com/file/d/1sRN6eFmoMmwoXzk-IVGe-N9VASOnVOG/view?usp=sharing

Fwd: Invitación Webinar Orientaciones para fortalecer los Reportes Territoriales: CUIPO y FUT Recibidos

Agregar a Calendario

Resume este correo electrónico

Comunicados Generales vie, 6 feb, 3:44 p.m.
para Comunicados

Parece que este mensaje está en inglés
Traducir al español

---------- Forwarded message ---------
De: Lina Maria Sarria Duarte <lmsarria@valledelcauca.gov.co>
Date: vie, 6 feb 2026 a la(s) 1:51 p.m.
Subject: Invitación Webinar Orientaciones para fortalecer los Reportes Territoriales: CUIPO y FUT
To: Comunicados Generales <comunicadosgenerales@valledelcauca.gov.co>, Angelica Garcia Vargas <agarciav@valledelcauca.gov.co>

Buenas tardes,

Invitación: Mesa técnica sobre proyecto de cooperación internacional ... vie 20 feb 2026 2pm - 3pm (COT) (Planeación Sedec) Recibidos

Valentina Morales Ospina mié, 18 feb, 8:23 a.m.
para mí, delgadoasociados83, sagsag9696, Lina, Luz, Juan, Elkin, Gice?a, Marcela, Maria, mvasdaewsor, Sergio, mariomj06, Audrey, josero 92

Parece que este mensaje está en inglés
Traducir al español

feb 20 vie

Mesa técnica sobre proyecto de cooperación internacional - CAMOES
Ver en Calendario de Google

Cuándo: vie 20 feb 2026 2pm – 3pm (COT)
Dónde: Gobernación del Valle del Cauca Piso 3 (Tesorería)
Quién: delgadoasociados83@gmail.com, sagsag9696@gmail.com, Lina Maria Sarria Duarte, Luz Mery Ocampo Benitez...

Agenda
vie 20 feb 2026


No hay eventos anteriores

2pm Mesa técnica sobre proyecto de cooperación internacional - CAMOES

No hay eventos posteriores

DE LA ACTIVIDAD 7 registros fotográficos reuniones y socialización entrega de informes plataforma PIIP y EVAPLAN











ACTIVIDADES REALIZADAS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 1.310.19.13.1010-2026 DEL MES DE ABRIL DE VIG.2026

1.Realizar, conforme a indicaciones del líder de programa, la formulación de los proyectos que contribuyan al desarrollo del proceso M2-P2 "y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca", que le sean asignados por el jefe inmediato y/o supervisor del contrato.

Durante el periodo asignado atendí las indicaciones del líder de programa en relación con la formulación de proyectos del proceso M2-P2 y la promoción del desarrollo económico del Valle del Cauca. Revisé lineamientos y criterios para asegurar la coherencia con los objetivos institucionales, manteniendo disposición para la formulación de iniciativas, aunque en este lapso no se generaron proyectos específicos bajo mi gestión.

2. Brindar acompañamiento en el diseño de los formatos y herramientas para facilitar el seguimiento a las acciones desarrolladas en torno al proceso M2-P2 y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca.

Se brindó acompañamiento en el diseño de los formatos y herramientas orientados a facilitar el seguimiento de las acciones desarrolladas en torno al proceso M2-P2. Asimismo, se promovió la articulación de lineamientos que aportan al desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca, garantizando que los instrumentos respondieran a las necesidades institucionales.Adicional a ello se participo en la preparacion del documento denominado Control Politico, para la sesion plenaria ordinaria de la Honorable Asamblea Departamental del Valle del Cauca, acorde con la Ley 2200 de 2022 y la ordenanza No. 003 de 2025.

3. Realizar seguimiento a la inversión pública adelantada por la dependencia en el marco del proceso M2-P2 "y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca".

Realicé seguimiento a la inversión pública adelantada por la dependencia en el marco del proceso M2-P2, promoviendo el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca y garantizando la transparencia en el cumplimiento de las metas establecidas.

4. Realizar seguimiento al avance en el cumplimiento de los indicadores de producto y de gestión definidos para los proyectos de inversión a cargo de la dependencia.

Realicé seguimiento al avance en el cumplimiento de los indicadores de producto y de gestión definidos para los proyectos de inversión a cargo de la dependencia, con el propósito de garantizar la transparencia en la ejecución, identificar oportunidades de mejora y contribuir al logro de las metas establecidas en el marco del plan de desarrollo.

5. Elaborar informes periódicos del avance de ejecución de los proyectos de inversión a cargo de la dependencia.

Se elaboró y presentó el reporte de avance en la plataforma PIIP correspondiente al mes de marzo – 2026, cumpliendo con los lineamientos establecidos y asegurando la actualización de la información requerida para el seguimiento institucional.

PROYECTO	BPIN	DESCRIPCION PROYECTO
PI37-102465	2024003760151	Fortalecimiento de los clústeres y las apuestas productivas en el Valle del Cauca.
PI37-102481	2024003760096	Fortalecimiento de Tejido Empresarial y Desarrollo de Estrategias de Negociaciion en el Valle del Cauca
PI37-102499	2024003760114	Fortalecimiento de las Unidades Economicas en el Valle del Cauca
PI38-102555	20250000007106	Mejoramiento de competencias técnicas y humanas en el sector manufacturero, en el departamento del Valle del Cauca
PI38-102556	2024003760152	Mejoramiento de la formalidad laboral en el Valle del Cauca
PI39-102571	2024003760150	Fortalecimiento de la innovación para el tejido empresarial del Valle del Cauca.
PI39-102642	2025000000023880	Adecuación y dotación de un centro de innovación e inteligencia artificial para la competitividad, el desarrollo económico y la incl usión social en el departamento del Valle del Cauca
PI37-102756	202500000045486	Incremento de las capacidades institucionales de cooperación internacional en el departamento del Valle del Cauca

6. Participar activamente en actividades incluidas las de fortalecimiento, como capacitaciones, reuniones desarrolladas por la Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, así como las que otras dependencias de la Gobernación Valle del Cauca lleven a cabo. Igualmente, asistir y participar en las mesas de trabajo y otras instancias en las que sea designado, conforme a la instrucción impartida por el Jefe y/o Supervisor, o las que convoquen de otras dependencias de la Gobernación del Valle.

Participé activamente en las actividades de fortalecimiento organizadas por la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, incluyendo capacitaciones y reuniones, así como en aquellas convocadas por otras dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca. Igualmente, asistí y aporté en las mesas de trabajo y demás instancias en las que fui designada, siguiendo las instrucciones impartidas por mi Supervisor y atendiendo las convocatorias realizadas desde otras áreas de la Gobernación a continuacion se describen:

- Capacitación 2026 - Entidades del Orden Territorial

Plataforma Integrada de Inversión (PIIP):
https://piip.dnp.gov.co/

Guía orientadora del Modelo Integral de Seguimiento:
https://mgaayuda.dnp.gov.co/Recursos/Guia_modelo_integral_seguimiento.pdf

Instructivo: Planear la ejecución (línea base 0 y línea base 1):
https://mgaayuda.dnp.gov.co/Recursos/Instructivo_Planear_la_Ejecucion_Lineas_0_1.pdf

Instructivo: Reporte de avance de ejecución:
https://mgaayuda.dnp.gov.co/Recursos/Instructivo_Reporte_avance_ejecucion_PIIP.pdf

7. Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato o jefe inmediato, para el cumplimiento del objeto contractual y estén acorde con la naturaleza del contrato.

Participé activamente en las actividades de fortalecimiento convocadas por la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, así como en las instancias designadas por otras dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.


8. Apoyar la difusión de los contenidos de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Desarrollo Económico cada vez que se realice una publicación, en las plataformas Instagram, Facebook, X y

YouTube, realizando por cada publicación acciones de interacción tales como dar "me gusta" y comentar y/o compartir los contenidos en sus redes sociales personales, con el fin de fortalecer el alcance y el engagement institucional.

Mi participación se centró en la interacción con las publicaciones realizadas en las plataformas institucionales, a través de acciones como la lectura, el seguimiento constante y la generación de "me gusta", fortaleciendo así el alcance y el engagement institucional.


EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS


DE LA ACTIVIDAD 2- Mesa de trabajo realizada en la oficina del Secretario de Desarrollo Economico, Competitividad y Fomento del Empleo, cuyo objetivo fue revisión y verificación de información referene al preparatorio para documento denominado Control Politico, para la sesion plenaria ordinaria de la Honorable Asamblea Departamental del Valle del Cauca, acorde con la Ley 2200 de 2022 y la ordenanza No. 003 de 2025.








DE LA ACTIVIDAD 4 – Adjunto Print evidencia reporte en plataforma PIIP avance de ejecución técnica y financiera.

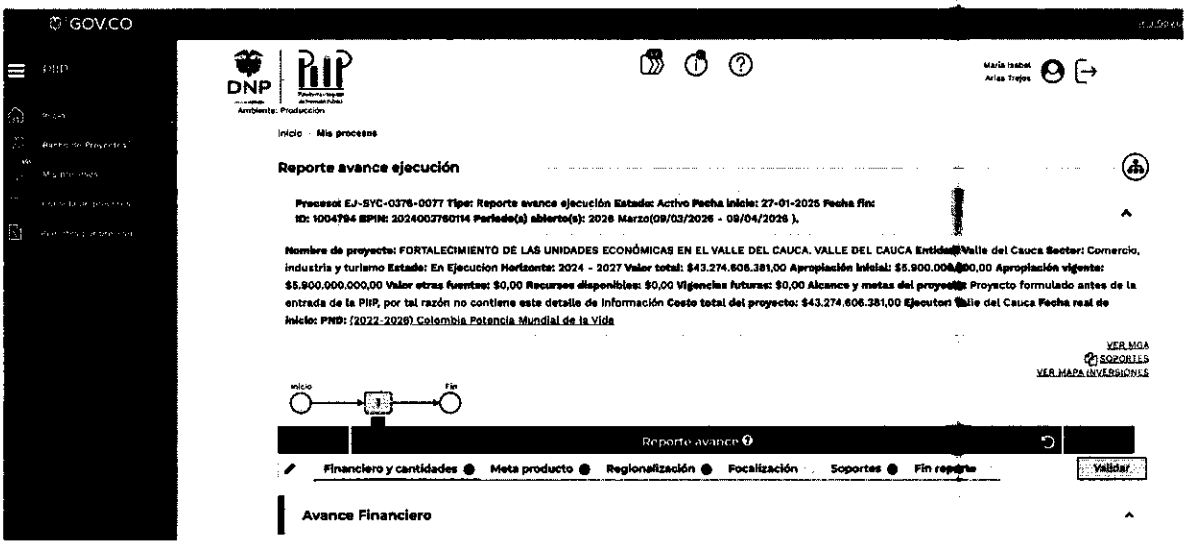


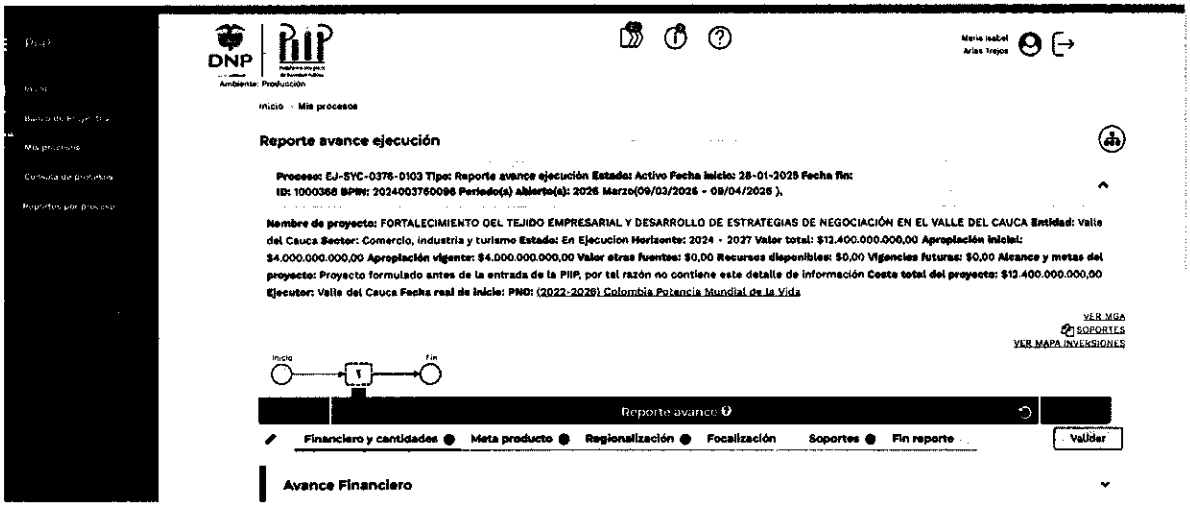
DNP
PIIP
Ambiente: Producción
Inicio · Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-0376-0103 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 28-01-2025 Fecha fin:
ID: 1000368 BPIN: 2024003760096 Periodo(s) abierto(s): 2026 Marzo(09/03/2026 - 08/04/2026).
Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN EN EL VALLE DEL CAUCA Entidad: Valle del Cauca Sector: Comercio, industria y turismo Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $12.400.000.000,00 Apropiación inicial: $4.000.000.000,00 Apropiación vigente: $4.000.000.000,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $0,00 Vigencias futuras: $0,00 Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $12.400.000.000,00 Ejecutor: Valle del Cauca Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
SOPORTES
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
Reporte avance
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Avance Financiero

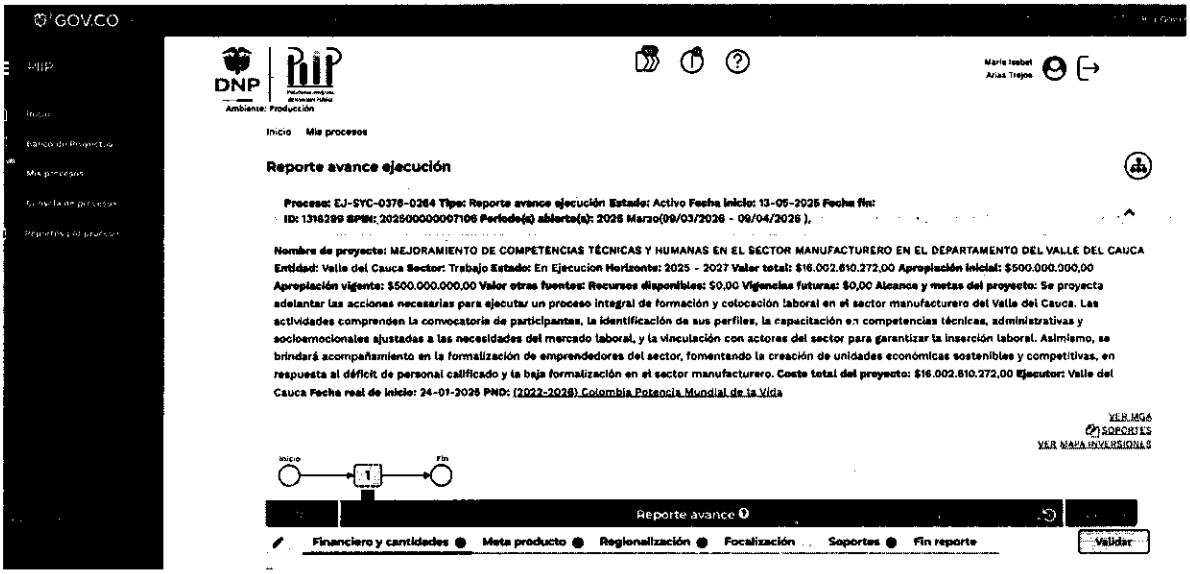
GOV.CO
PIIP
DNP
Ambiente: Producción
Inicio Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-0376-0264 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 13-05-2025 Fecha fin:
ID: 1316299 BPIN: 20250000007106 Periodo(s) abierta(s): 2026 Marzo(09/03/2026 - 08/04/2026).
Nombre de proyecto: MEJORAMIENTO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS Y HUMANAS EN EL SECTOR MANUFACTURERO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Entidad: Valle del Cauca Sector: Trabajo Estado: En Ejecucion Horizonte: 2025 - 2027 Valor total: $16.002.610.272,00 Apropiación inicial: $500.000.000,00 Apropiación vigente: $500.000.000,00 Valor otras fuentes: Recursos disponibles: $0,00 Vigencias futuras: $0,00 Alcance y metas del proyecto: Se proyecta adelantar las acciones necesarias para ejecutar un proceso integral de formación y colocación laboral en el sector manufacturero del Valle del Cauca. Las actividades comprenden la convocatoria de participantes, la identificación de sus perfiles, la capacitación en competencias técnicas, administrativas y socioemocionales ajustadas a las necesidades del mercado laboral, y la vinculación con actores del sector para garantizar la inserción laboral. Asimismo, se brindará acompañamiento en la formalización de emprendedores del sector, fomentando la creación de unidades económicas sostenibles y competitivas, en respuesta al déficit de personal calificado y la baja formalización en el sector manufacturero. Costo total del proyecto: $16.002.610.272,00 Ejecutor: Valle del Cauca Fecha real de inicio: 24-01-2025 PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
SOPORTES
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
Reporte avance
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar

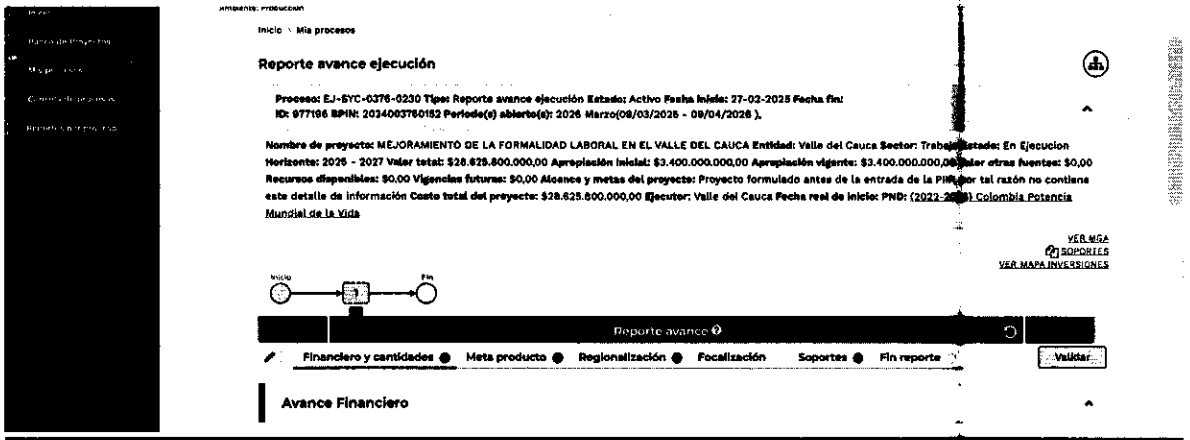
Inicio \ Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-0376-0230 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 27-02-2025 Fecha fin:
ID: 977196 BPIN: 20240037601S2 Periodo(s) abierto(s): 2026 Marzo(08/03/2026 - 08/04/2026),
Nombre de proyecto: MEJORAMIENTO DE LA FORMALIDAD LABORAL EN EL VALLE DEL CAUCA Entidad: Valle del Cauca Sector: Trabajo Estado: En Ejecucion
Horizonte: 2025 - 2027 Valor total: $28.625.800.000,00 Apropiación inicial: $3.400.000.000,00 Apropiación vigente: $3.400.000.000,00 Valor otras fuentes: $0,00
Recursos disponibles: $0,00 Vigencias futuras: $0,00 Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene
este detalle de información Costo total del proyecto: $28.625.800.000,00 Ejecutor: Valle del Cauca Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia
Mundial de la Vida
VER MGA
SOPORTES
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
Reporte avance
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Avance Financiero

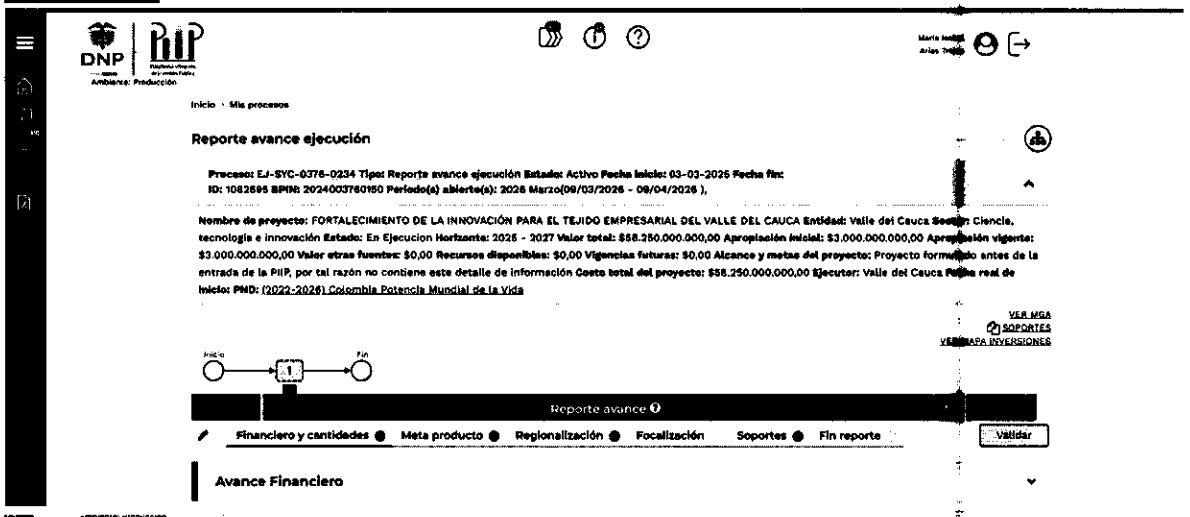
DNP
PIIP
Ambiente: Producción
Inicio \ Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-0376-0234 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 03-03-2026 Fecha fin:
ID: 1082895 BPIN: 20240037601S0 Periodo(s) abierto(s): 2026 Marzo(08/03/2026 - 08/04/2026),
Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN PARA EL TEJIDO EMPRESARIAL DEL VALLE DEL CAUCA Entidad: Valle del Cauca Sector: Ciencia,
tecnología e innovación Estado: En Ejecucion Horizonte: 2025 - 2027 Valor total: $58.250.000.000,00 Apropiación inicial: $3.000.000.000,00 Apropiación vigente:
$3.000.000.000,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $0,00 Vigencias futuras: $0,00 Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la
entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $58.250.000.000,00 Ejecutor: Valle del Cauca Fecha real de
inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
SOPORTES
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
Reporte avance
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Avance Financiero

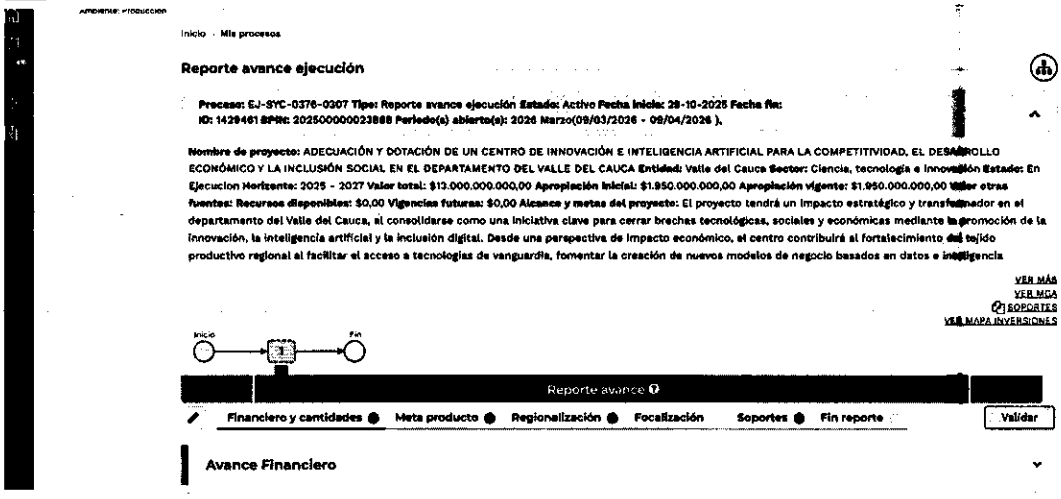
Ambiente: Producción
Inicio \ Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-0376-0307 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 28-10-2025 Fecha fin:
ID: 1429461 BPIN: 20250000023868 Periodo(s) abierto(s): 2026 Marzo(09/03/2026 - 09/04/2026),
Nombre de proyecto: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE INNOVACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA COMPETITIVIDAD, EL DESARROLLO
ECONÓMICO Y LA INCLUSIÓN SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Entidad: Valle del Cauca Sector: Ciencia, tecnología e innovación Estado: En
Ejecucion Horizonte: 2025 - 2027 Valor total: $13.000.000.000,00 Apropiación inicial: $1.950.000.000,00 Apropiación vigente: $1.950.000.000,00 Valor otras
fuentes: Recursos disponibles: $0,00 Vigencias futuras: $0,00 Alcance y metas del proyecto: El proyecto tendrá un impacto estratégico y transformador en el
departamento del Valle del Cauca, al consolidarse como una iniciativa clave para cerrar brechas tecnológicas, sociales y económicas mediante la promoción de la
innovación, la inteligencia artificial y la inclusión digital. Desde una perspectiva de impacto económico, el centro contribuirá al fortalecimiento del tejido
productivo regional al facilitar el acceso a tecnologías de vanguardia, fomentar la creación de nuevos modelos de negocio basados en datos e inteligencia
VER MÁS
VER MGA
SOPORTES
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
Reporte avance
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Avance Financiero

DE LA ACTIVIDADES 6

Memorias jornada de capacitación día 3 Cultura de Proyectos External

Maria del Carmen Bahos Ortiz <mbahos@valledelcauca.gov.co>
para krios0128, Doris, anunez, gober8760, manuarango1505, carolinamartinezbarona, v1cardel, legoeconomia, Daniel, luferegu.

Parece que este mensaje está en inglés ×
Traducir al español


Cordial saludo,


Me permito remitir las memorias correspondientes a la jornada de capacitación No. 3, llevada a ca


- Planificación y matriz de riesgos
- Seguimiento y Planear la Ejecución en la plataforma PIIP


Documentos complementarios:


- El principio de la planeación en la contratación pública en Colombia
- Documento Conpes del riesgo previsible en el marco de la política de contratación públ

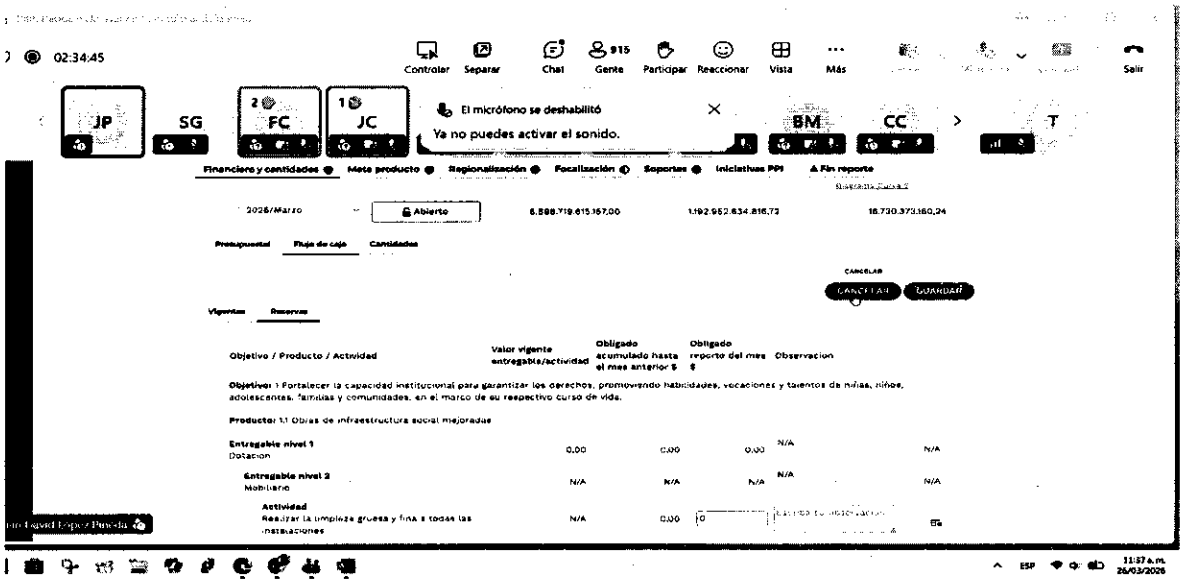

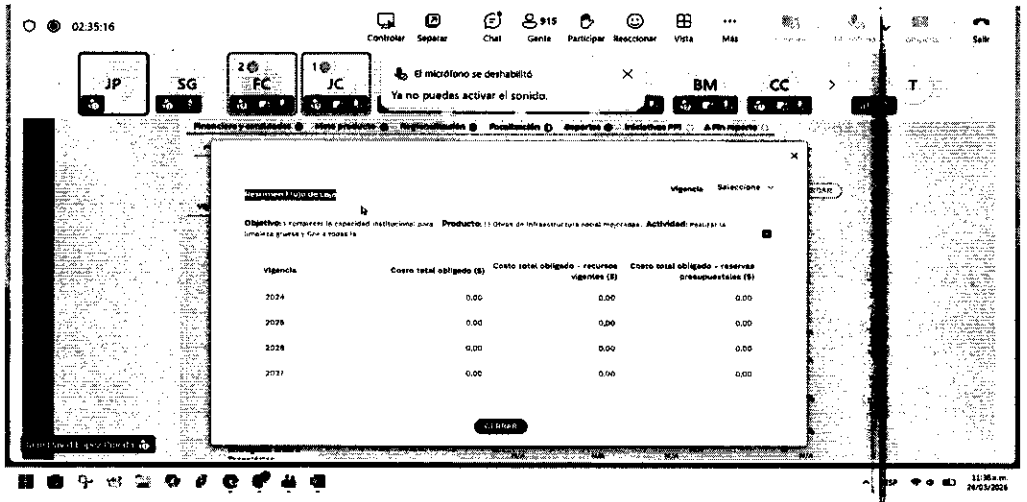

02:35:16
Controlar
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Más
Salir
JP
SG
FC
JC
El micrófono se deshabilitó
Ya no puedes activar el sonido.
BM
CC
T
Vigencia
Costo total obligado ($)
Costo total obligado - recursos vigentes ($)
Costo total obligado - reservas presupuestales ($)
2024
2025
2026
2027
0,00
CERRAR

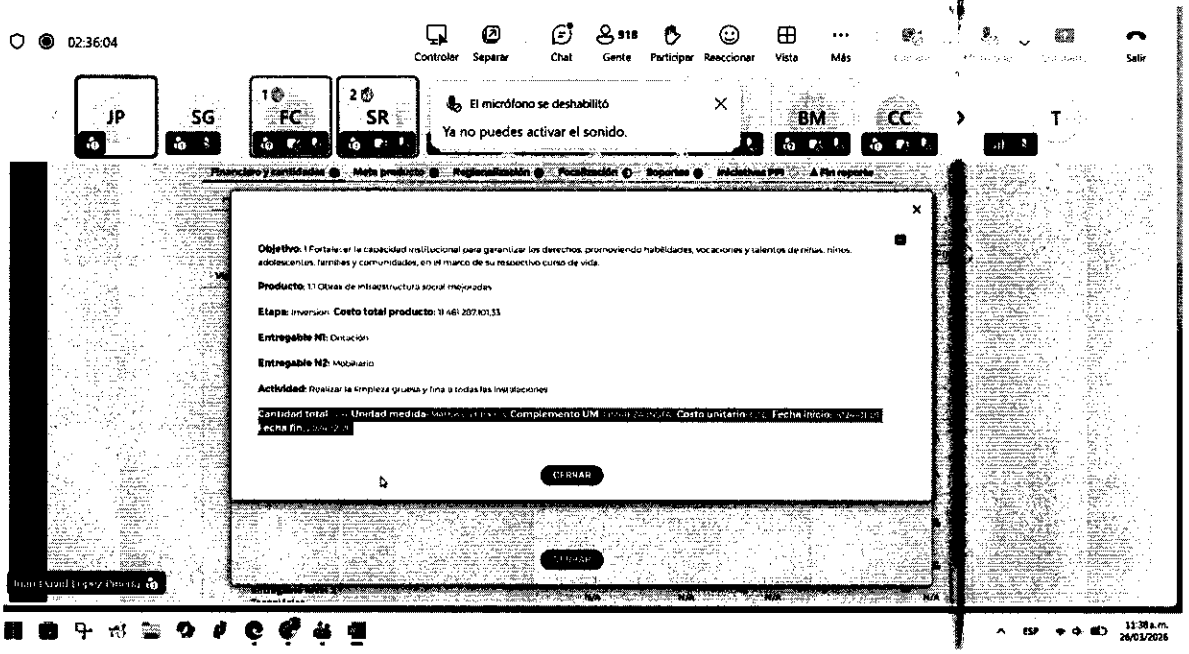
02:36:04
Controlar
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Más
Salir
JP
SG
FC
SR
El micrófono se deshabilitó
Ya no puedes activar el sonido.
BM
CC
T
Objetivo:
Producto:
Etapa:
Costo total producto:
Entregable N1:
Entregable N2:
Actividad:
Cantidad total
Unidad medida
Complemento UM
Costo unitario
Fecha inicio
Fecha fin
CERRAR

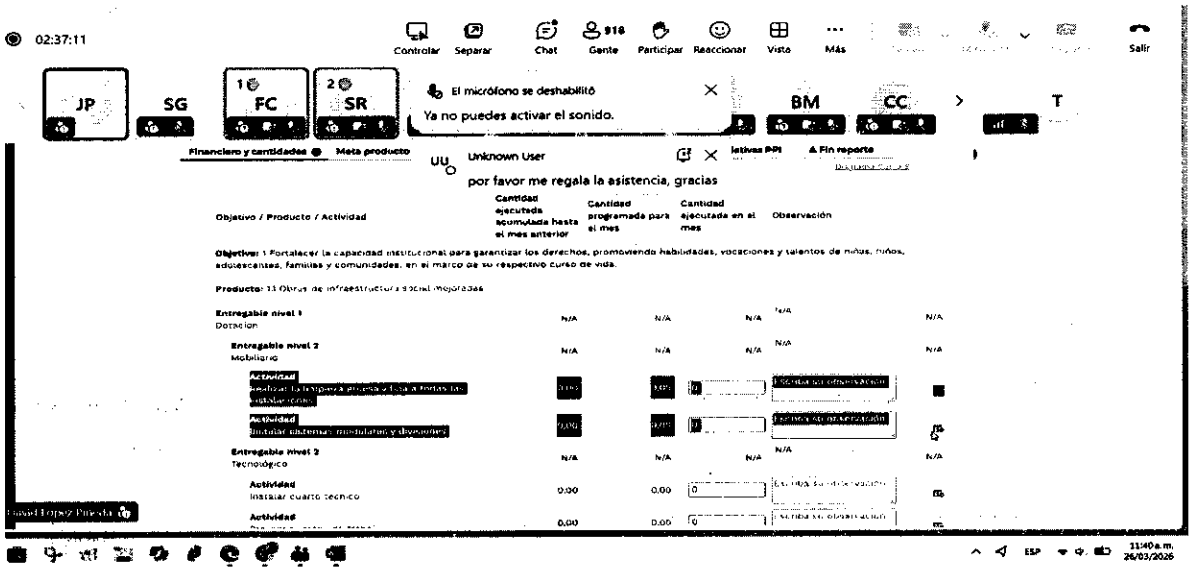


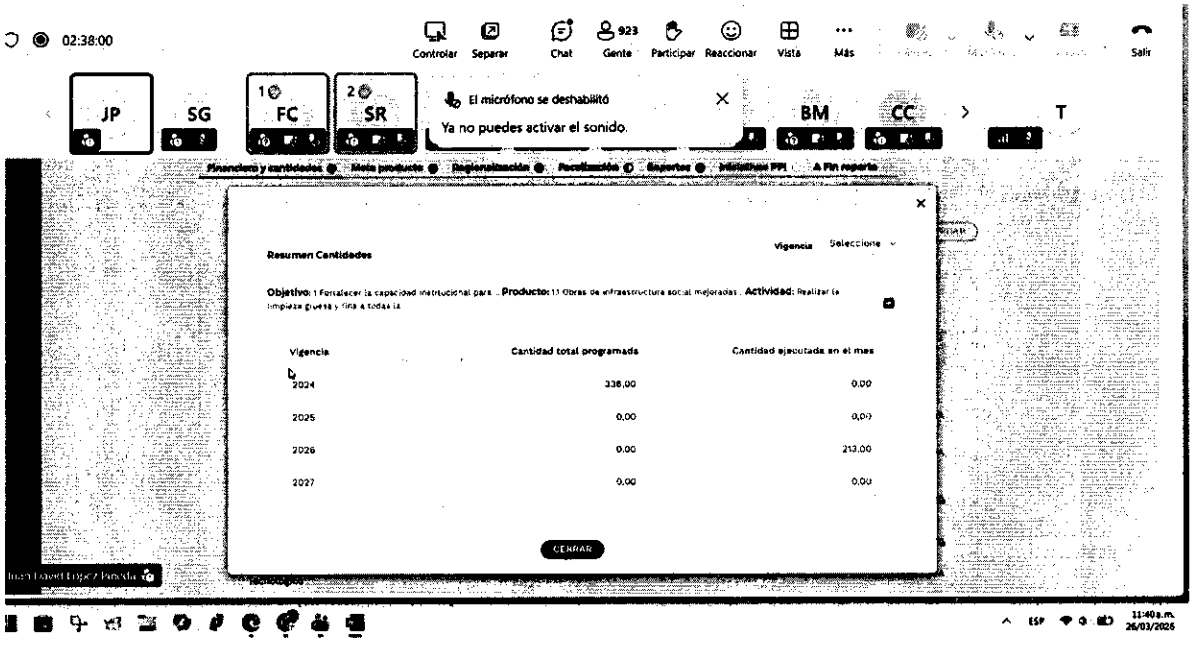


DESCARGAR LA PLNTLLA PARA EL REPRTE DE LAS ACTIVIDADES
EJEM DE LA PLANTILLA Y SU FUNCIONALIDAD

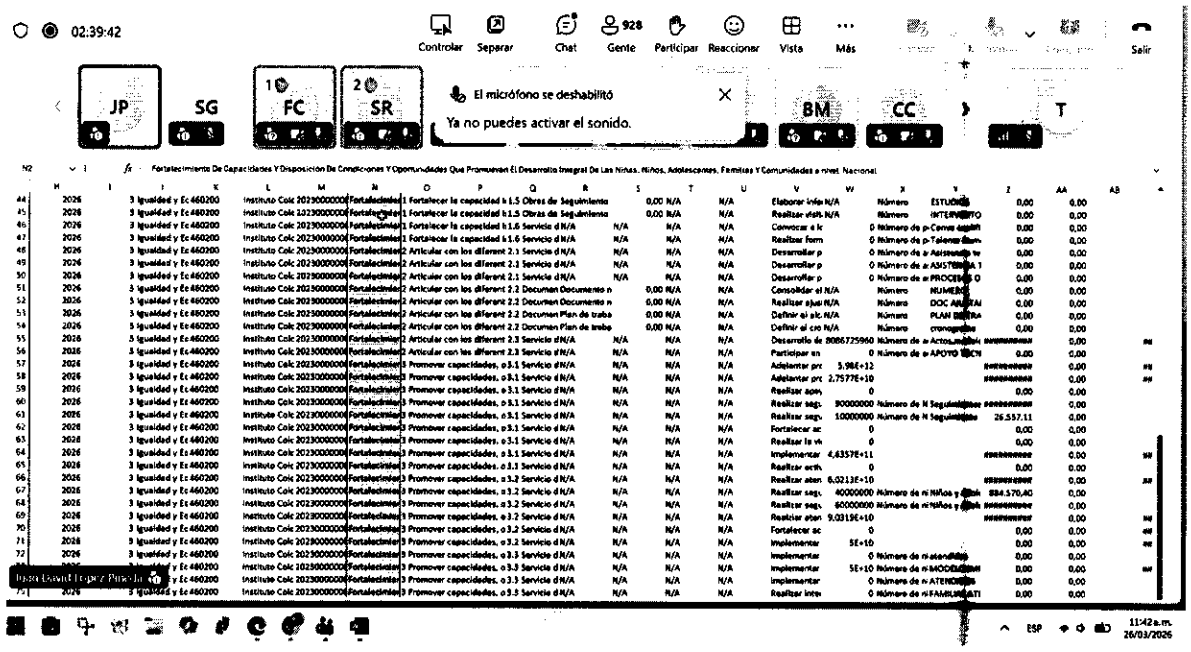

8 archivos adjuntos • Analizado por Gmail ⓘ Agregar a Drive

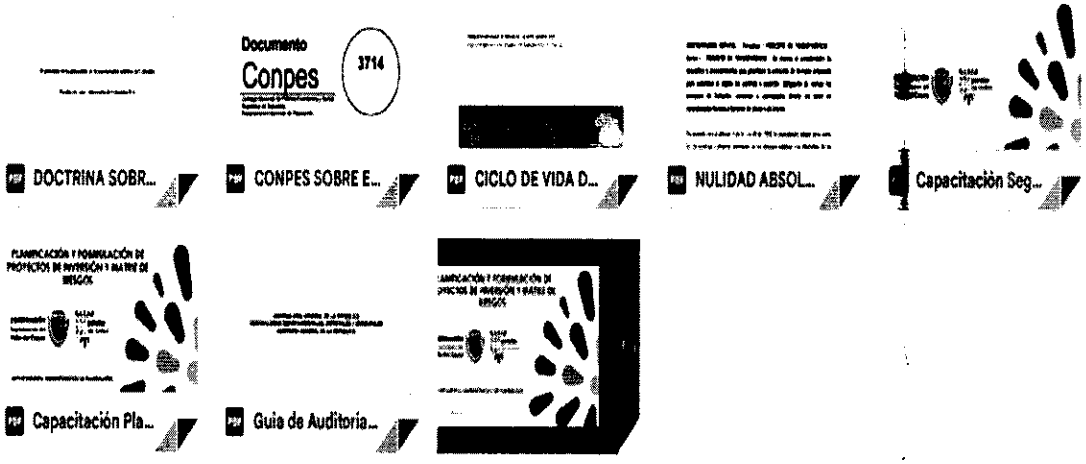

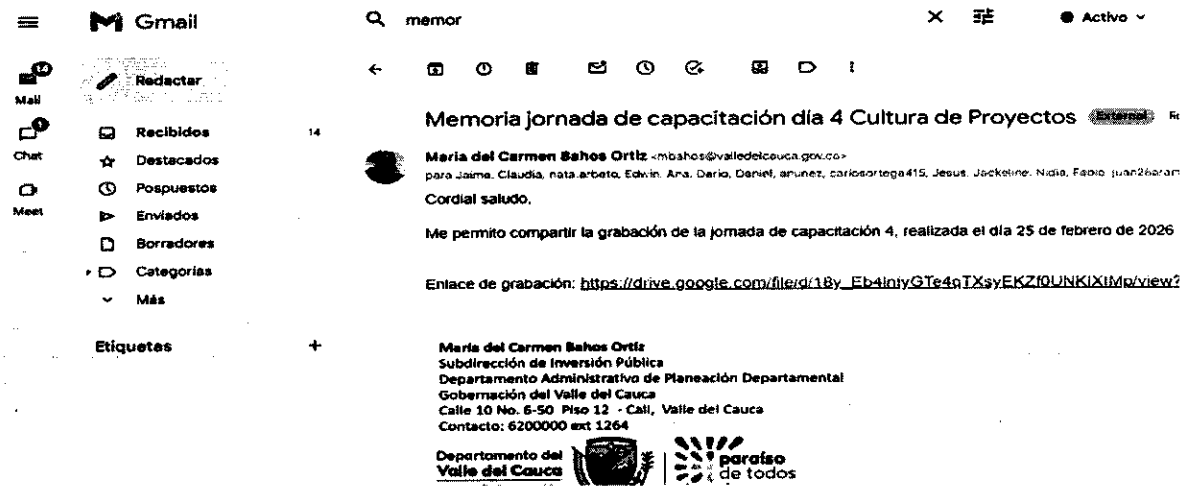

Gmail memor Activo

Redactar

Mail · Chat · Meet

Recibidos 14 · Destacados · Pospuestos · Enviados · Borradores · Categorías · Más

Etiquetas +

Memoria jornada de capacitación día 4 Cultura de Proyectos Externo

María del Carmen Bahos Ortiz <mbahos@valledelcauca.gov.co>
para Jaime, Claudia, nata.arbeto, Edwin, Ana, Dario, Daniel, arunez, carlosortega415, Jesus, Jackeline, Nidia, Fabio, juan26aran


Cordial saludo,

Me permito compartir la grabación de la jornada de capacitación 4, realizada el día 25 de febrero de 2026

Enlace de grabación: https://drive.google.com/file/d/18y_Eb4lnjyGTe4qTXsyEKZf0UNKIXIMp/view?

María del Carmen Bahos Ortiz
Subdirección de Inversión Pública
Departamento Administrativo de Planeación Departamental
Gobernación del Valle del Cauca
Calle 10 No. 6-50 Piso 12 - Cali, Valle del Cauca
Contacto: 6200000 ext 1264

Departamento del Valle del Cauca · paraíso de todos



Gmail memoria Activo

Redactar

Mail · Chat · Meet

Recibidos 14 · Destacados · Pospuestos · Enviados · Borradores · Categorías · Más

Etiquetas +

Memorias jornada de capacitación Regalias dia 3 Externo Recibidos ×

María del Carmen Bahos Ortiz <mbahos@valledelcauca.gov.co>
para Proyectosregalias10, gzeh.cardozo, jenyfer.martinez, Edwin, Juan, Marlon, Sobas, polania, Jesus, dianaconp, becas.doctor

Parece que este mensaje está en inglés ×
Traducir al español

Cordial saludo,

Me permito compartir las memorias de la jornada de capacitación 3, realizada el día 5 de febrero de 2026.

- Cierre de proyectos del SGR
- Monitoreo y seguimiento de los proyectos del SGR
- Sistema de presupuesto y giro de regalías SPGR y SAP

Enlace de grabación:

Enlace de grabación:
https://drive.google.com/file/d/1sRN0pEmoMInwgXpkJViGe-N9VASOpVOG/view?usp=sharing

María del Carmen Bahos Ortiz
Subdirección de Inversión Pública
Departamento Administrativo de Planeación Departamental
Gobernación del Valle del Cauca
Calle 10 No. 6-50 Piso 12 - Cali, Valle del Cauca
Contacto: 6200000 ext 1264

Departamento del Valle del Cauca Gobernación · paraíso de todos

Gobernación del Valle del Cauca
Calle 10 No. 6-50 Piso 12 - Cali, Valle del Cauca
Contacto: 6200000 ext 1264

Departamento del Valle del Cauca Gobernación | paraíso de todos

4 archivos adjuntos • Analizado por Gmail ⓘ Agregar a Drive



Evidencia Fotográfica mesa de trabajo en revisión previa al informe entregado de alcance de actividades de los proyectos de inversión pública de la secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo asi:

HORARIO MESAS TECNICAS MENSUALES REVISION INFORMES DE AVANCE PIIP		
SUBSECRETARIA	**PROYECTO DE INVERSION**	**HORARIO ASIGNADO**
EMPRENDIMIENTO	PI37-102499	8:30AM -9:15AM
	PI38-102555	9:15AM-10:30AM
	2025003760002-SGR	10:30AM -11:15PM
COMPETITIVIDAD	PI39-102642	11:15AM-12:30
	PI38-102556	1:30PM-2:15PM
	PI39-102571	2:15PM-3:00PM
INTERNACIONALIZACION	PI37-102481	3:00PM-3:45PM
	PI37-102756	3:45PM-4:30PM








GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	REGISTRO DE ASISTENCIA (CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN, ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA, REUNIONES, CONSEJO DE GOBIERNO, COMITÉ TECNICO DE LA DEPENDENCIA, EQUIPO DE MEJORA CONTINUA DEL PROCESO)	Código: FO-M9-P1-14 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 15/08/2018 Página: 1 de

LUGAR:	Área Planeación Sedespc						TOTAL HORAS:	
No. DE ACTA:	HORA DE INICIO: 2:10 pm			HORA DE TERMINACIÓN:			CODIGO DEL PROCESO/SUBPROCESO:	
FACILITADOR (ES)/RESPONSABLE:	Paola Luz Mery Campo Benitez - Jose Alberto Rodriguez Aparte - Yolanda Isabel Arias T.							
NOMBRE DEL EVENTO/TEMA DE REUNIÓN/TEMAS A TRATAR	Reunion a mesa de trabajo - sesion Proyecto de Inversion Sedespc: Avance de Actividades correspondiente al mes de mayo-2026.						FECHA: 29-05-2026	
No.	DEPENDENCIA / ENTIDAD/MPIO	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	CÉDULA	No. DE CELULAR - TEL/EXT	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA DE ASISTENCIA	
1	Sedec	Yolanda Isabel Arias T.	Contratista	67043089	3122869754	[illegible]	[illegible]	
2	Sedec-Planeación	Luz Mery Ocampo Benitez	Contratista	31192164	3153491818	[illegible]	[illegible]	
3	Sedec-Planeación	Jose Alberto Rodriguez	Contratista	1149017498	3152890197	[illegible]	[illegible]	
4	Sedec-Fortalecimiento	Alejandro Portocarrero	Planta	1144077509	3160021162	[illegible]	[illegible]	
5	Sedec - Planeación	Omar Andres Correa Campiño	Contratista	1112224230	3138828938	[illegible]	Omar Correa.	
6	Sedec - Planeación	Carlos Gutierrez Cabrera	Contratista	14970442	3168251802	[illegible]	[illegible]	
7	Sub Internacionalización	Daniela Aguirre Hurtado	Contratista	1144061195	3166137196	[illegible]	[illegible]	
8	Sub emprendimiento	Dina María Hernandez A	Contratista	1.143935666	3184319145	[illegible]	Dina M.	
9	Sedec-Competitividad	Julio César Gómez Narváez	Profesional Univ.	94560352	3172641832	[illegible]	Julio	
10								
11								
12								
13								
14								

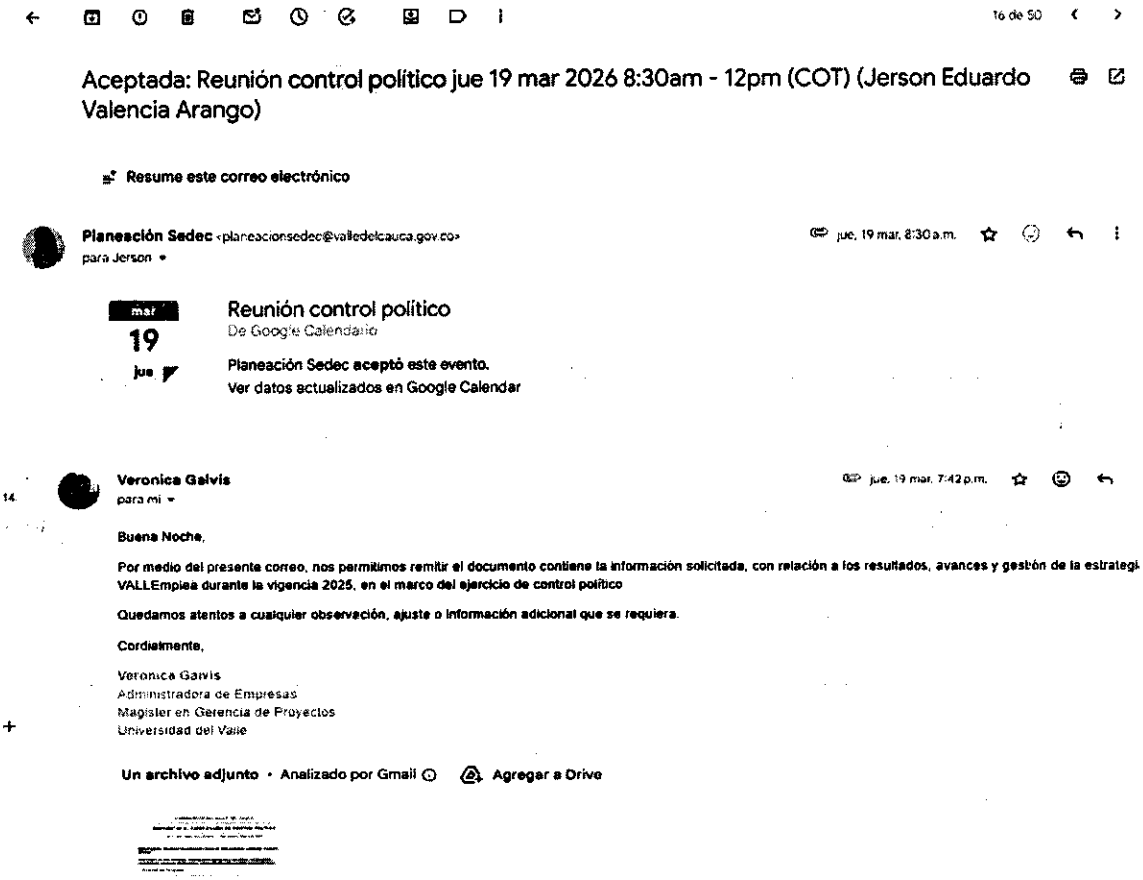

16 de 50

Aceptada: Reunión control político jue 19 mar 2026 8:30am - 12pm (COT) (Jerson Eduardo Valencia Arango)

Resume este correo electrónico

Planeación Sedec <planeacionsedec@valledelcauca.gov.co>
para Jerson

jue, 19 mar, 8:30 a.m.

mar 19 jue

Reunión control político
De Google Calendario

Planeación Sedec aceptó este evento.
Ver datos actualizados en Google Calendar

Veronica Galvis
para mi

jue, 19 mar, 7:42 p.m.

Buena Noche,

Por medio del presente correo, nos permitimos remitir el documento contiene la información solicitada, con relación a los resultados, avances y gestión de la estrategi VALLEmplea durante la vigencia 2025, en el marco del ejercicio de control político

Quedamos atentos a cualquier observación, ajuste o información adicional que se requiera.

Cordialmente,

Veronica Galvis
Administradora de Empresas
Magister en Gerencia de Proyectos
Universidad del Valle

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail **Agregar a Drive**

Presento soporte de pago del Sistema de Seguridad Social en Salud, pensión y ARL con lo cual acredito que me encuentro al día. De otra parte, manifiesto que no estoy obligado a pagar los parafiscales de SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar.

Actividades realizadas correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios No. 1.310.19.13.1010-2026 del mes de Mayo de vig.2026

ACTIVIDAD 1:. Realizar, conforme a indicaciones del líder de programa, la formulación de los proyectos que contribuyan al desarrollo del proceso M2-P2 "y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca", que le sean asignados por el jefe inmediato y/o supervisor del contrato.

Durante el periodo asignado atendí las indicaciones del líder de programa en relación con la formulación de proyectos del proceso M2-P2 y la promoción del desarrollo económico del Valle del Cauca. Revisé lineamientos y criterios para asegurar la coherencia con los objetivos institucionales, manteniendo disposición para la formulación de iniciativas, aunque en este lapso no se generaron proyectos específicos bajo mi gestión.

ACTIVIDAD 2: Brindar acompañamiento en el diseño de los formatos y herramientas para facilitar el seguimiento a las acciones desarrolladas en torno al proceso M2-P2 y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca.

Se brindó acompañamiento en el diseño de los formatos y herramientas orientados a facilitar el seguimiento de las acciones desarrolladas en torno al proceso M2-P2. Asimismo, se promovió la articulación de lineamientos que aportan al desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca, garantizando que los instrumentos respondieran a las necesidades institucionales.

ACTIVIDAD 3: Realizar seguimiento a la inversión pública adelantada por la dependencia en el marco del proceso M2-P2 "y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca".

Realicé seguimiento a la inversión pública adelantada por la dependencia en el marco del proceso M2-P2, promoviendo el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca y garantizando la transparencia en el cumplimiento de las metas establecidas.

REPORTE AVANCE DE EJECUCION ACTIVIDADES EN PLATAFORMA PIIP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026

- PI37-102481 TEJIDO EMPRESARIAL
- PI37-102499 FORTALECIMIENTO UNIDADES ECONOMICAS
- PI38-102555 MEJORAMIENTO DEL SECTOR MANUFACTURERO – trae reserva presupuestal

- PI38-102556- MEJORAMIENTO DE LA FORMALIDAD LABORAL EN EL VALLE DEL CAUCA
- PI38-102756 COOPERACION INTERNACIONAL
- PI39-102642 – ADECUACION Y DOTACION CENTRO DE INNOVACION SENA
- PI39-102571 FORTALECIMIENTO TEJIDO EMPRESARIAL

ACTIVIDAD 4: Realizar seguimiento al avance en el cumplimiento de los indicadores de producto y de gestión definidos para los proyectos de inversión a cargo de la dependencia.

Realicé seguimiento al avance en el cumplimiento de los indicadores de producto y de gestión definidos para los proyectos de inversión a cargo de la dependencia, con el propósito de garantizar la transparencia en la ejecución, identificar oportunidades de mejora y contribuir al logro de las metas establecidas en el marco del plan de desarrollo.

- ✓ Proyecto PI37-102481 – Fortalecimiento del tejido empresarial
- ✓ **MR12005 (Exportaciones +5 %):** Programado 2 % en 2026 → **Avance 0 %.**
- ✓ **MP1200507043502116 (Asistir técnicamente a 75 empresas):** Programado 20 en 2026 → **Avance 0**.
- ✓ **MP1200507013502003 (Ejecutar 1 estrategia exportadora):** Programado 1 en 2026 → **Avance 0**.
- ✓ **Indicadores complementarios:** 350 MiPymes formadas, 250 rutas exportadoras, 350 encuestas, 18–21 empresas en vitrina comercial.
- ✓ Proyecto PI37-102499 – Fortalecimiento de las Unidades Económicas
- ✓ **MR11001 (Formalizar 300 empresas):** Programado 88 en 2026 → **Avance 0**.
- ✓ **MP1100101043502015 (Asistir técnicamente 5.300 unidades productivas):** Programado 1.700 en 2026 → **Avance 148**.
- ✓ **MP1100101023502009 (Beneficiar 300 unidades económicas en comercialización):** Programado 130 en 2026 → **Avance 0**.
- ✓ **MP1100101033502011 (Realizar 150 mentorías):** Programado 62 en 2026 → **Avance 0**.

- ✓ Proyecto Pi38-102555 – Mejoramiento De Competencias Técnicas Y Humanas En El Sector Manufacturero En El Departamento Del Valle Del Cauca
- ✓ Iniciativa Marroquinería – 1.310.18.02-16746
- ✓ **Indicadores:** 400 estudiantes beneficiarias atendidas.
- ✓ **Horas de formación:** 260 horas ejecutadas.
- ✓ **Avance:** Cumplimiento total del cronograma académico → **Meta formativa alcanzada**.
- ✓ **Iniciativa** UNITEX Cali – 1.310.18.02-16764 (II Fase)
- ✓ **Indicadores:** Estudiantes beneficiarias activas.
- ✓ **Horas de formación:** 330 horas ejecutadas.
- ✓ **Avance:** Cumplimiento total del cronograma académico → **Meta formativa alcanzada**.
- ✓ Proyecto PI38-102556 – Mejoramiento de la Formalidad Laboral
- ✓ **MR11002 (Colocar 5.000 personas en salud y pensión):** Programado 1.170 en 2026 → **Avance 252 colocaciones laborales** (en validación).
- ✓ **MP1100202013602004 (Promover colocación de 1.500 personas):** Programado 500 en 2026 → **Avance 0**.
- ✓ **MP1100202033602043 (Documento técnico de trabajo decente):** Programado 1 en 2026 → **Avance 0**.
- ✓ Proyecto PI37-102756 – Cooperación Internacional
- ✓ **MR12005 (Exportaciones +5 %):** Programado 2 % en 2026 → **Avance 0 %.**
- ✓ **MP1200507033502048 (Constituir 8 alianzas de cooperación internacional):** Programado 2 en 2026 → **Avance 0**.
- ✓ **Avance cualitativo:** Se firmó el acuerdo de cooperación con Saint-Ouen-sur-Seine (Francia), Cali y Valle del Cauca.
- ✓ Proyecto PI39-102571 – Innovación NIDO 2026 y Hub de E-Commerce
- ✓ **MR12006 (Invertir $45.720 millones en CTI):** Programado $3.000 millones en 2026 → **Avance 0 %**.
- ✓ **MP1200609033906019 (Asistir técnicamente a 80 unidades productivas):** Programado 30 en 2026 → **Avance 0**.

- ✓ **Indicadores de gestión:** 445 ingresos al coworking, 277 personas impactadas, 46 reservas de salas, 15 startups en StartCo.
- ✓ Proyecto PI39-102642 – Centro de Innovación e Inteligencia Artificial (SENA)
- ✓ **MR12006 (Invertir $45.720 millones en CTI):** Programado $1.950 millones en 2026 → **Avance 0 %.**
- ✓ **MP1200609023906018 (Adecuar y dotar distrito de innovación):** Programado para 2027 (vigencia futura) → **No aplica en 2026.**
- ✓ **Avance:** Adjudicación de contratos de obra e interventoría, sin ejecución física aún.

REGIONALIZACIION EN PIIP: Realice en plataforma PIIP la regionalizacion de los proyectos de inversion de SEDECFE, acorde lo requerido por el Departamento de Planeacion DAVP cirular 063 de 30 de abril 202, y el DNP, realizando el proceso sin tramite presupuestal acorde lo indicado por cada Subsecretaria de SEDECFE y sus enlaces.

COD PI	NOMBRE PI	CODIGO BPIN	TRAMITE REGIONALIZACIÓN
PI39-102571	FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN PARA EL TEJIDO EMPRESARIAL DEL VALLE DEL CAUCA	2024003760150	Ejecución **Ajustes sin trámite presupuestal ET** EJ-AJ-TER-0376-0966 **Completado** Fecha inicio: 29-04-2026 14:55:36 Fecha fin: 29-04-2026 15:29:22
PI37-102481	FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN EN EL VALLE DEL CAUCA	2024003760096	Ejecución **Ajustes sin trámite presupuestal ET** EJ-AJ-TER-0376-0954 **Completado** Fecha inicio: 28-04-2026 09:01:34 Fecha fin: 28-04-2026 10:59:02

PI38-102555	MEJORAMIENTO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS Y HUMANAS EN EL SECTOR MANUFACTURERO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	202500000007106	Ejecución **Ajustes sin trámite presupuestal ET** EJ-AJ-TER-0376-0945 **Completado** Fecha inicio: 27-04-2026 10:13:09 Fecha fin: 27-04-2026 12:42:07
PI37-102499	FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL VALLE DEL CAUCA	2024003760114	Ejecución **Ajustes sin trámite presupuestal ET** EJ-AJ-TER-0376-0955 **Completado** Fecha inicio: 28-04-2026 11:03:42 Fecha fin: 28-04-2026 12:20:53
PI38-102556	MEJORAMIENTO DE LA FORMALIDAD LABORAL EN EL VALLE DEL CAUCA	2024003760152	Ejecución **Ajustes sin trámite presupuestal ET** EJ-AJ-TER-0376-0957 **Completado** Fecha inicio: 28-04-2026 14:33:48 Fecha fin: 28-04-2026 15:05:47

PI39 – 102642	ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE INNOVACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA COMPETITIVIDAD, EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA INCLUSIÓN SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	202500000023888	**Ajustes sin trámite presupuestal ET** EJ-AJ-TER-0376-0965 **Completado** Fecha inicio: 29-04-2026 12:33:01 Fecha fin: 29-04-2026 14:53:09
PI37-102756	INCREMENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	202500000045486	Ejecución **Ajustes sin trámite presupuestal ET** EJ-AJ-TER-0376-0999 **Completado** Fecha inicio: 05-05-2026 15:28:19 Fecha fin: 05-05-2026 16:28:33

ACTIVIDAD 5: Elaborar informes periódicos del avance de ejecución de los proyectos de inversión a cargo de la dependencia.

Se elaboró y presentó el reporte de avance en la plataforma PIIP correspondiente al mes de abril-2026, cumpliendo con los lineamientos establecidos y asegurando la actualización de la información requerida para el seguimiento institucional.

A continuacion se hace breve descripcion del avance en cumplimiento de producto y gestion:

Proyecto PI37-102481 – Fortalecimiento del tejido empresarial y desarrollo de estrategias de negociación en el Valle del Cauca: avanzó principalmente en la línea de internacionalización y fortalecimiento exportador. Se ejecutaron actividades de formación híbrida con cobertura a 350 MiPymes, se entregaron 250 rutas exportadoras individualizadas, se aplicaron 350 encuestas de retroalimentación y se facilitó la participación de entre 18 y 21 empresas en una vitrina comercial, dato pendiente de validación. Estos resultados reflejaron un proceso integral de capacitación, asistencia técnica y vinculación a escenarios reales de mercado, consolidando capacidades empresariales para la internacionalización.

En cuanto a la Meta de Resultado (MR12005), que buscaba aumentar en un 5 % las exportaciones de los clústeres y/o empresas asistidas durante el periodo de gobierno, se había programado un avance del 2 % para la vigencia 2026, pero el corte reportó 0 %, sin incremento en exportaciones.

Respecto a las Metas de Producto, la asistencia técnica prevista para 20 empresas en 2026 y la ejecución de 1 estrategia exportadora no registraron avances, manteniéndose en 0 %.

En síntesis, el proyecto logró avances verificables en la fase de fortalecimiento empresarial y preparación técnica, con indicadores cumplidos en formación y asistencia, pero aún no reflejó impacto en las metas de resultado ni en las metas de producto programadas para la vigencia, lo que evidenció que la etapa se concentró en el alistamiento y consolidación de capacidades más que en resultados exportadores inmediatos.

Proyecto PI37-102499 – Fortalecimiento de las Unidades Económicas en el Valle del Cauca: tuvo como propósito apoyar emprendedores y mipymes mediante los **Centros de Desarrollo Empresarial e Innovación (CDEI)**, con presencia en los 42 municipios del departamento.

En cuanto a la **Meta de Resultado (MR11001)**, que buscaba formalizar **300 empresas durante el periodo de gobierno**, para la vigencia 2026 se programó la formalización de **88 empresas**, pero el avance reportado fue **0**.

Respecto a las **Metas de Producto**, se programó asistir técnicamente a **1.700 unidades productivas** en temas de legalidad y formalización, logrando un avance de **148**. Las metas de

beneficiar a **130 unidades económicas en comercialización** y realizar **62 mentorías** no registraron avances, manteniéndose en **0**.

En términos operativos, se atendieron **2.205 emprendedores** en etapas de ideación y **2.557 en fortalecimiento**, además de **2.145 asesorías** en temas como gestión financiera, legalidad, formalización, planeación estratégica y modelo de negocio. Los CDEI participaron en múltiples espacios de articulación territorial, ferias empresariales y eventos de fortalecimiento institucional, lo que permitió ampliar la cobertura y generar sinergias con actores locales.

En síntesis, el proyecto avanzó en la **asistencia técnica y acompañamiento territorial**, con resultados verificables en capacitación y asesoría, pero aún no reflejó impacto en la meta de resultado de formalización ni en varias metas de producto, evidenciando que la ejecución se concentró en procesos de apoyo inicial y fortalecimiento más que en resultados de formalización y comercialización efectiva.

Proyecto PI38-102555 – Mejoramiento de competencias técnicas y humanas en el sector Manufacturero, en el Departamento del Valle del Cuca: el avance de sus dos iniciativas, se desarrollo asi: Iniciativa de **Marroquinería – Convenio 1.310.18.02-16746** avanzó de manera satisfactoria durante el mes de abril de 2026, cumpliendo con el cronograma académico y operativo establecido. Se garantizó la asistencia activa de las **400 estudiantes beneficiarias**, quienes participaron en jornadas de capacitación en horario de mañana y tarde, organizadas en grupos A y B. Las acciones ejecutadas incluyeron la **operación en máquinas fileteadoras, planas y collarín**, el suministro diario de refrigerios, la entrega de kits formativos y el apoyo de transporte para asegurar la permanencia en el proceso. Las sesiones se estructuraron en bloques pedagógicos de 45 minutos con recesos intermedios, lo que favoreció el aprendizaje y el bienestar de las participantes. Durante este periodo se culminó el **programa de manufactura con una intensidad total de 260 horas**, alcanzando los objetivos formativos previstos. El cumplimiento del cronograma fue satisfactorio, evidenciándose compromiso, puntualidad y disposición por parte de las estudiantes. En conclusión, el proyecto logró consolidar la fase formativa prevista para abril, asegurando cobertura total de las beneficiarias y cumpliendo con los componentes académicos, logísticos y de

apoyo, lo que permitió avanzar en la meta de fortalecer las capacidades técnicas en marroquinería y manufactura en el Valle del Cauca.

Iniciativa UNITEX **Cali – Convenio 1.310.18.02-16764 (II Fase)** avanzó de manera satisfactoria durante el mes de abril de 2026, cumpliendo con el cronograma académico y operativo establecido. Se garantizó la asistencia activa de las estudiantes beneficiarias, quienes participaron en jornadas de capacitación en horario de mañana y tarde, organizadas en grupos A y B. Las acciones ejecutadas incluyeron la **operación en las máquinas según el cronograma de clases**, el suministro diario de refrigerios y el apoyo de transporte para asegurar la asistencia y permanencia en el proceso formativo. Los contenidos abordados durante este periodo fueron: **ejercicios de control de operación de las máquinas, identificación de problemas y aplicación de soluciones, mantenimiento preventivo y operación en las tres máquinas principales**. Las sesiones se estructuraron en bloques pedagógicos de 45 minutos con recesos intermedios, lo que favoreció el aprendizaje y el bienestar de las participantes. En total, se culminó el **programa de manufactura con una intensidad de 330 horas**, alcanzando los objetivos formativos propuestos para esta segunda fase.

En conclusión, el proyecto consolidó la formación técnica de las beneficiarias, evidenciando compromiso, puntualidad y disposición en el proceso, y avanzó en el fortalecimiento de competencias técnicas y empresariales en el sector textil del Valle del Cauca

Proyecto PI 38-102556 – Mejoramiento de la Formalidad Laboral en el Valle del Cauca: avanzó durante abril de 2026 con resultados parciales en la meta de inserción laboral. La **Meta de Resultado (MR11002)** planteaba la colocación de **5.000 personas cotizando a salud y pensión durante el cuatrienio**, con una programación de **1.170 para la vigencia 2026**. En abril se reportaron **252 beneficiarios con vinculación laboral formal**, aunque estos datos estaban en proceso de validación mediante certificación en el sistema de seguridad social.

En cuanto a las **Metas de Producto**, se había programado para la vigencia la colocación laboral de **500 personas** y la elaboración de **1 documento técnico sobre estrategias de trabajo decente**, pero ambos indicadores permanecieron en **0 % de avance**. Las acciones ejecutadas incluyeron la

ruta de conexión empleabilidad, combinando estrategias virtuales, presenciales e intermediación laboral. Se realizaron **Master Class virtuales y presenciales** para fortalecer competencias socioemocionales y de empleabilidad, además de **ferias de empleo** en Cali y Ginebra con participación de **149 asistentes**. En paralelo, se desarrollaron cursos cortos de empleabilidad rápida, como el de **Normas de Tránsito y Seguridad Vial**, con **42 beneficiarios en formación adicionales a 96 certificados previamente**. El proyecto tuvo cobertura amplia en **29 municipios del departamento**, con mayor concentración en Cali, Buenaventura, Palmira, Jamundí, Candelaria y Tuluá, además de presencia en municipios intermedios y rurales como Buga, Guacarí, La Unión, Cartago y Pradera.

En conclusión, el proyecto logró avances verificables en la **inserción laboral de 252 personas** y en el fortalecimiento de competencias laborales, aunque las metas de resultado y producto programadas para la vigencia aún no reflejaron cumplimiento pleno. La ejecución se concentró en habilitar beneficiarios para la empleabilidad y ampliar la cobertura territorial, consolidando una base inicial de colocación laboral formal.

Proyecto PI37-102756 – Incremento de las capacidades institucionales de cooperación internacional en el Valle del Cauca: avanzó en abril con acciones de gestión y articulación, aunque aún no reflejó cumplimiento en las metas programadas.

La Meta de Resultado (MR12005) buscaba aumentar en un 5 % las exportaciones de los clústeres y/o empresas asistidas durante el periodo de gobierno, con un avance programado del 2 % para la vigencia 2026, pero se reportó 0 %. En cuanto a la Meta de Producto (MP1200507033502048), que consistía en constituir 8 alianzas de cooperación internacional (2 programadas para 2026), tampoco se registró avance.

Durante abril se ejecutaron varias actividades relevantes:

Visitas técnicas a los municipios de Pradera y Vijes, orientadas a fortalecer la conformación de Comités Municipales de Cooperación Internacional y preparar talleres de diagnóstico.

Reuniones institucionales con la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, y con Americas Flyways Initiative, para identificar necesidades y posibles apoyos en temas de aviturismo y turismo sostenible.

Encuentro del programa IURC de la Unión Europea, con participación de la ciudad de Salvador de Bahía, explorando un posible hermanamiento cultural.

Alianza con la Universidad San Buenaventura, que dio inicio al curso de "Diplomacia Subnacional, Cooperación e Innovación para el Desarrollo", con participación de municipios como Florida, Yumbo, Jamundí y Tuluá.

Firma del Acuerdo de Cooperación entre el Valle del Cauca, Santiago de Cali y Saint-Ouen-sur-Seine (Francia), el 28 de abril de 2026, con compromisos en juventud, sostenibilidad ambiental y cultura, bajo un esquema de cooperación descentralizada alineado con la Agenda 2030 de la ONU.

En conclusión, el proyecto avanzó en la gestión institucional y la formalización de alianzas estratégicas, consolidando acuerdos y espacios de cooperación, aunque los indicadores cuantitativos de meta de resultado y producto permanecieron en 0 % de avance para la vigencia. La ejecución se centró en la construcción de bases institucionales y en la apertura de nuevas alianzas internacionales que fortalecen la competitividad regional.

Proyecto PI39-102571 – Fortalecimiento de la innovación para el tejido empresarial del Valle del Cauca (NIDO 2026 y Hub de E-Commerce): avanzó en abril de 2026 principalmente en la fase de consolidación técnica y metodológica, aunque los indicadores de resultado y producto aún no reflejaron cumplimiento.

La Meta de Resultado (MR12006) planteaba invertir $45.720 millones en actividades de ciencia, tecnología e innovación durante el cuatrienio, con un aporte programado de $3.000 millones para 2026, pero el avance reportado fue 0 %. En cuanto a la Meta de Producto (MP120609033906019), que consistía en asistir técnicamente a 80 unidades productivas (30 programadas para 2026), tampoco se registró avance en el corte.

Durante abril se lograron hitos importantes:

Administración del espacio NIDO: se formalizó el contrato con Zonamérica, con 445 ingresos, 277 personas impactadas, 46 reservas de salas y 1 evento registrado, consolidando el coworking como punto de encuentro del ecosistema emprendedor.

Atención integral a visitantes: se atendieron estudiantes de la Universidad Antonio José Camacho y emprendedores de la Comuna 20, con talleres prácticos y capacitación en comercio electrónico.

Participación en StartCo 2026: se logró la presencia de 15 startups, generando networking, acceso a inversión y alianzas estratégicas.

Centro Comercial Virtual y Hub de E-Commerce: se avanzó en la estructuración técnica y convocatoria, con inicio de diagnósticos previsto para mayo.

Retail del Futuro – FENALCO: se posicionó la estrategia NIDO + HUB en este evento, conectando a MiPymes con tendencias digitales y herramientas de transformación del retail.

En conclusión, el proyecto se enfocó en **fortalecer la infraestructura y articulación institucional del ecosistema de innovación**, con resultados verificables en gestión, participación y posicionamiento, pero sin avances aún en los indicadores de meta de resultado y producto. La ejecución se centró en preparar las condiciones para que en los siguientes meses se materialice la asistencia técnica y el impacto directo en las unidades productivas beneficiarias.

Proyecto PI39-102642 – Adecuación y dotación de un Centro de Innovación e Inteligencia Artificial para la competitividad, el desarrollo económico y la inclusión social en el Valle del Cauca: avanzó en abril de 2026 principalmente en la fase administrativa y contractual, sin reportar aún ejecución física de obra.

La **Meta de Resultado (MR12006)** consistía en invertir **$45.720 millones en actividades de ciencia, tecnología e innovación durante el cuatrienio**, con un aporte programado de **$1.950 millones para 2026**, pero el avance reportado fue **0 %**. La **Meta de Producto (MP1200609023906018)**, que contempla la adecuación y dotación de un distrito de innovación e inteligencia artificial, está prevista para 2027 como vigencia futura, por lo que no aplica en este corte.

Durante abril se lograron hitos clave:

Se culminó el proceso **precontractual** y se adjudicaron los contratos de **obra (PAF-ATSENA-O-004-2026)** e **interventoría (PAF-ATSENA-I-006-2026).**

Se completaron las evaluaciones técnicas y financieras, la validación en comités fiduciarios y la aprobación de términos de referencia.

Se garantizó la selección de contratistas idóneos y la viabilidad técnica y jurídica del proyecto, asegurando condiciones habilitantes para iniciar la fase constructiva.

Los beneficiarios directos serán **startups, MiPymes, población joven y grupos vulnerables** (mujeres cabeza de hogar, víctimas del conflicto, comunidades étnicas, personas con discapacidad, migrantes y población rural). A partir de 2028, con la puesta en operación del **Smart Campus**, se proyecta atender **11.520 personas anuales** con enfoque diferencial.

En conclusión, el proyecto avanzó en la **estructuración y adjudicación contractual**, consolidando las bases para iniciar la construcción del Centro de Innovación e Inteligencia Artificial en Cali. Aunque no se reportó avance físico en abril, la gestión realizada fue indispensable para garantizar la correcta ejecución futura y el cumplimiento de las metas de innovación y competitividad regional.

ACTIVIDAD 6 : Participar activamente en actividades incluidas las de fortalecimiento, como capacitaciones, reuniones desarrolladas por la Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, así como las que otras dependencias de la Gobernación Valle del Cauca lleven a cabo. Igualmente, asistir y participar en las mesas de trabajo y otras instancias en las que sea designado, conforme a la instrucción impartida por el Jefe y/o Supervisor, o las que convoquen de otras dependencias de la Gobernación del Valle.

Participé activamente en las actividades de fortalecimiento organizadas por la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, incluyendo capacitaciones y reuniones, así como en aquellas convocadas por otras dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca. Igualmente, asistí y aporté en las mesas de trabajo y demás instancias en las que fui

designada, siguiendo las instrucciones impartidas por mi Supervisor y atendiendo las convocatorias realizadas desde otras áreas de la Gobernación a continuacion se describen:

- Capacitación 2026 - Entidades del Orden Territorial

Plataforma Integrada de Inversión (PIIP):
https://piip.dnp.gov.co/

Guía orientadora del Modelo Integral de Seguimiento:
https://mgaayuda.dnp.gov.co/Recursos/Guia_modelo_integral_seguimiento.pdf

Instructio: Planear la ejecución (línea base 0 y línea base 1):
https://mgaayuda.dnp.gov.co/Recursos/Instructivo_Planear_la_Ejecucion_Lineas_0_1.pdf

Instructivo: Reporte de avance de ejecución:
https://mgaayuda.dnp.gov.co/Recursos/Instructivo_Reporte_avance_ejecucion_PIIP.pdf

ACTIVIDAD 7 : Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato o jefe inmediato, para el cumplimiento del objeto contractual y estén acorde con la naturaleza del contrato.

Participé activamente en las actividades de fortalecimiento convocadas por la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, así como en las instancias designadas por otras dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.

ACTIVIDAD 8: Apoyar la difusión de los contenidos de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Desarrollo Económico cada vez que se realice una publicación, en las plataformas Instagram, Facebook, X y YouTube, realizando por cada publicación acciones de interacción tales como dar "me gusta" y comentar y/o compartir los contenidos en sus redes sociales personales, con el fin de fortalecer el alcance y el engagement institucional.


Mi participación se centró en la interacción con las publicaciones realizadas en las plataformas institucionales, a través de acciones como la lectura, el seguimiento constante y la generación de "me gusta", fortaleciendo así el alcance y el engagement institucional.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICASACTIVIDADES 5: MESA DE TRABAJO REVISION INFORME DE AVANCE - REGISTRO FOTOGRAFICO CON ARTICULADORES DE LAS TRES SUBSECRETARIAS COMPETITIVIDAD, EMPRENDIMIENTO E INTERNACIONALIZACION.








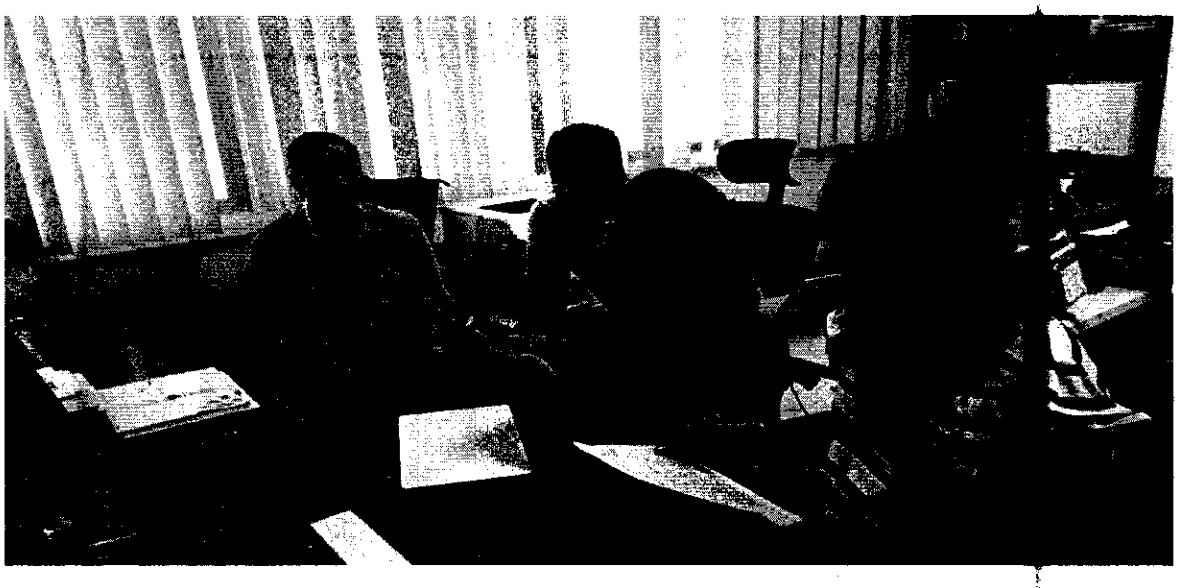








Reunión de seguimiento a Proyectos del SGR con FUNDACION UNIVALLE, realizado en sala de juntas de DAPV.

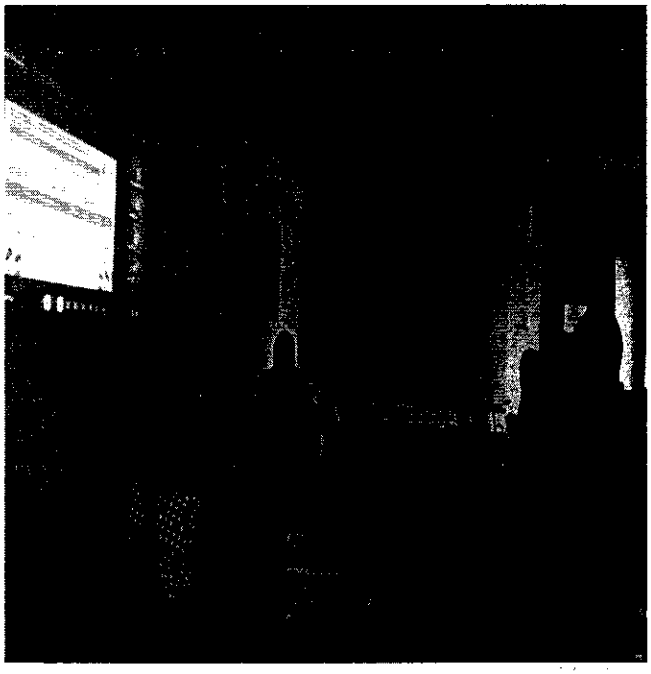


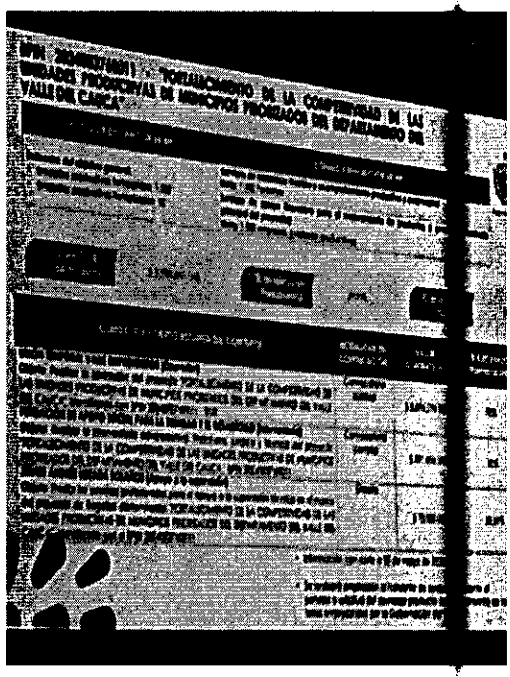



ACTIVIDADES 6: PRINT CAPACITACIONES

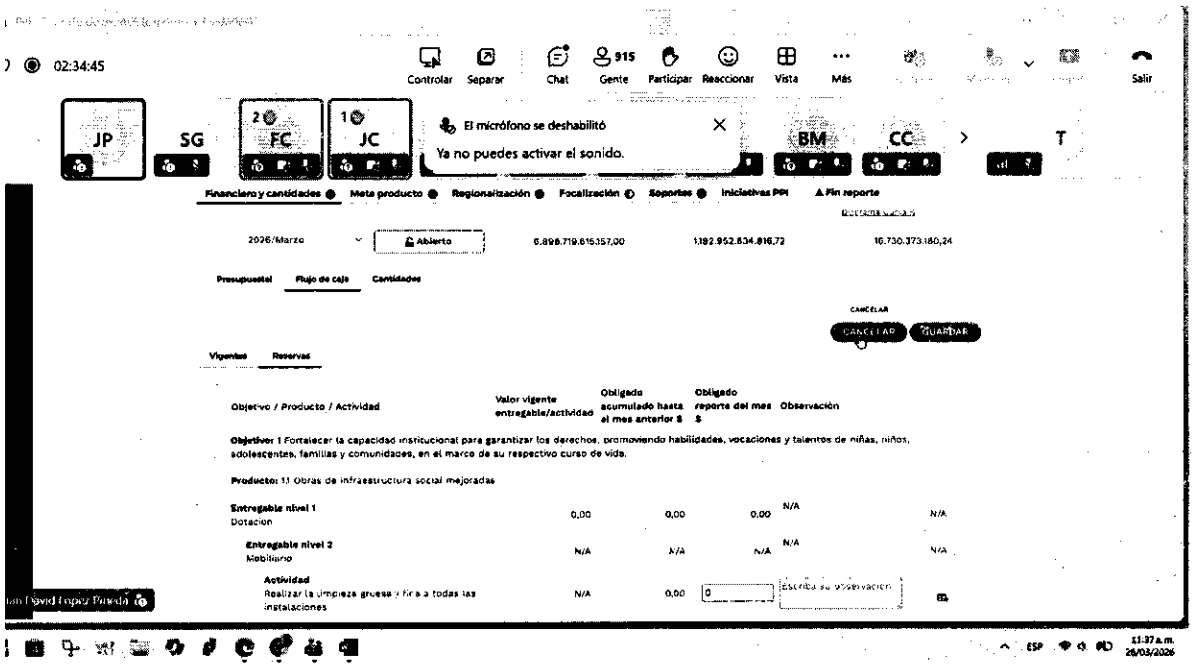
02:34:45
Controlar
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Más
Salir
El micrófono se deshabilitó
Ya no puedes activar el sonido.
JP
SG
FC
JC
BM
CC
T
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Iniciativas PPI
Fin reporte
2026/Marzo
Abierto
6.898.719.615.157,00
1.192.952.834.816,72
16.730.373.180,24
Presupuestal
Flujo de caja
Cantidades
CANCELAR
GUARDAR
Vigentes
Reservas
Objetivo / Producto / Actividad
Valor vigente entregable/actividad
Obligado acumulado hasta el mes anterior $
Obligado reporte del mes $
Observación
Objetivo: 1 Fortalecer la capacidad institucional para garantizar los derechos, promoviendo habilidades, vocaciones y talentos de niñas, niños, adolescentes, familias y comunidades, en el marco de su respectivo curso de vida.
Producto: 11 Obras de infraestructura social mejoradas
Entregable nivel 1
Dotacion
Entregable nivel 2
Mobiliario
Actividad
Realizar la limpieza gruesa y fina a todas las instalaciones
Escriba su observación
ESP
11:37 a.m.
26/03/2026

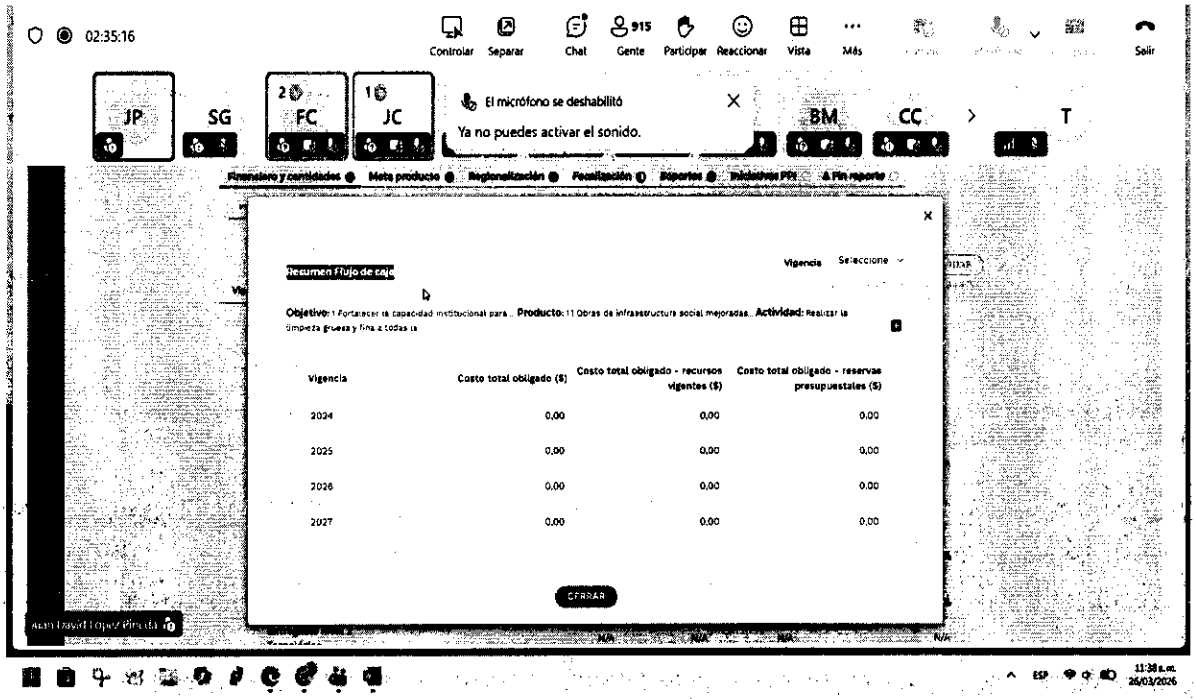
02:35:16
Controlar
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Más
Salir
El micrófono se deshabilitó
Ya no puedes activar el sonido.
JP
SG
FC
JC
BM
CC
T
Resumen Flujo de caja
Vigencia
Seleccione
Objetivo: 1 Fortalecer la capacidad institucional para... Producto: 11 Obras de infraestructura social mejoradas. Actividad: Realizar la limpieza gruesa y fina a todas la
Vigencia
Costo total obligado ($)
Costo total obligado - recursos vigentes ($)
Costo total obligado - reservas presupuestales ($)
2024
2025
2026
2027
0,00
CERRAR
ESP
11:38 a.m.
26/03/2026

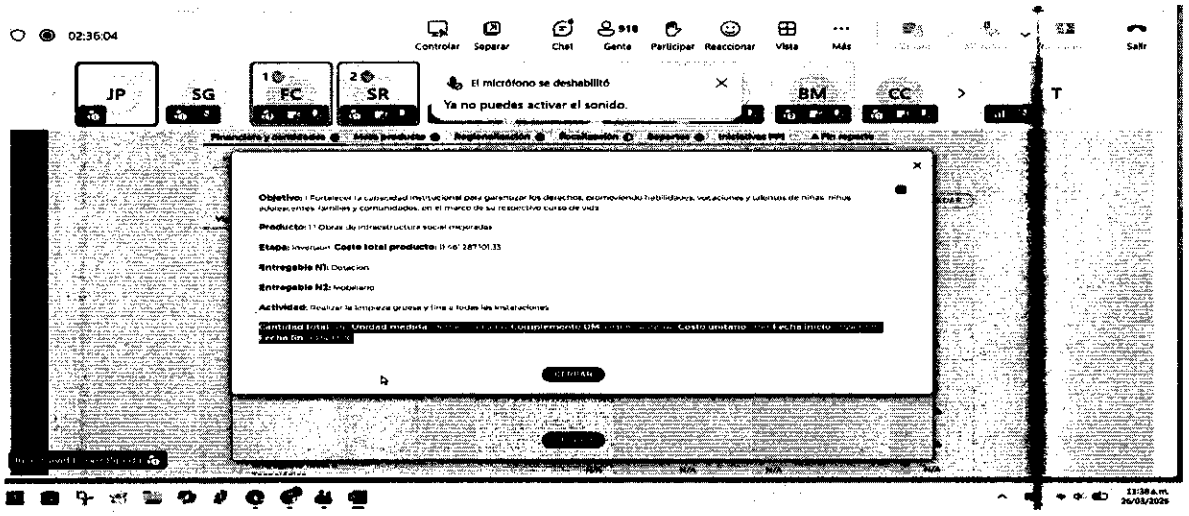

02:36:04
Controlar
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Más
Salir
JP
SG
FC
SR
El micrófono se deshabilitó
Ya no puedes activar el sonido.
BM
CC
T

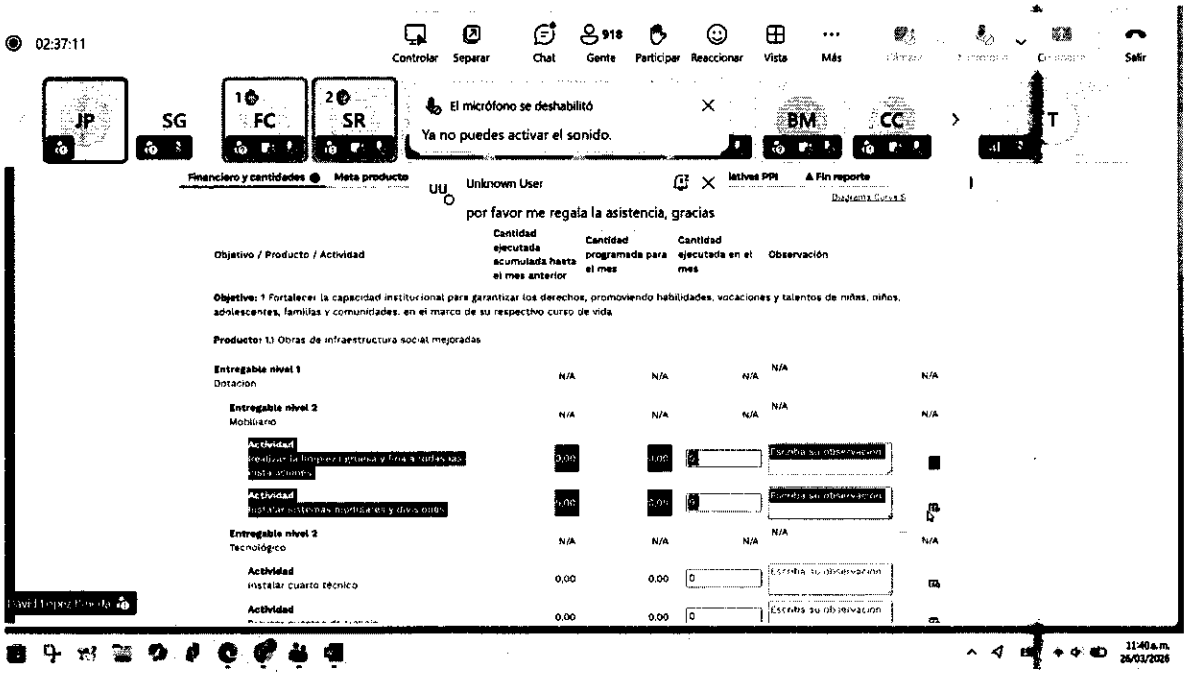
02:37:11
Controlar
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Más
Salir
JP
SG
FC
SR
El micrófono se deshabilitó
Ya no puedes activar el sonido.
BM
CC
T
Financiero y cantidades
Meta producto
Unknown User
por favor me regala la asistencia, gracias
Objetivo / Producto / Actividad
Cantidad ejecutada acumulada hasta el mes anterior
Cantidad programada para el mes
Cantidad ejecutada en el mes
Observación
Objetivo: 1 Fortalecer la capacidad institucional para garantizar los derechos, promoviendo habilidades, vocaciones y talentos de niñas, niños, adolescentes, familias y comunidades, en el marco de su respectivo curso de vida
Producto: 1.1 Obras de infraestructura social mejoradas
Entregable nivel 1
Dotacion
Entregable nivel 2
Mobiliario
Actividad
Actividad
Entregable nivel 2
Tecnológico
Actividad
Instalar cuarto técnico
Actividad
Escriba su observación

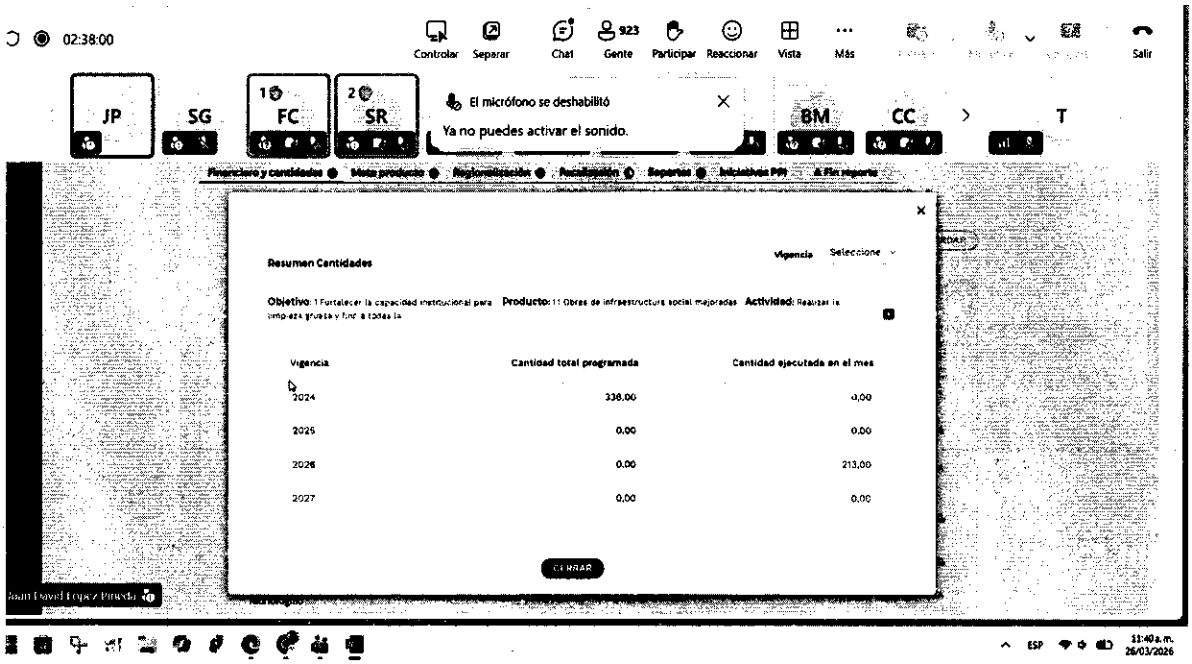


DESCARGAR LA PLNTLLA PARA EL REPRTE DE LAS ACTIVIDADES


EJEM DE LA PLANTILLA Y SU FUNCIONALIDAD

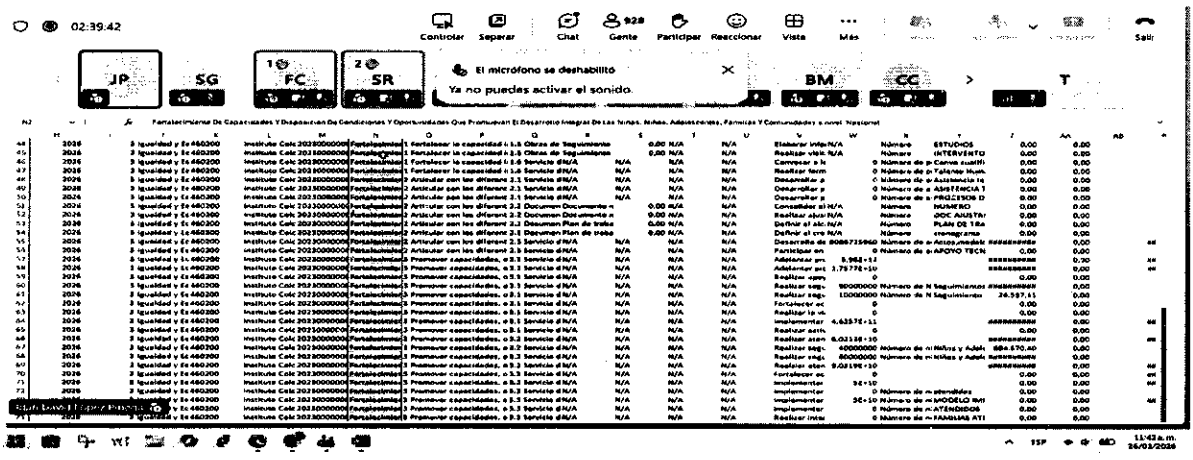

16 de abril de 2026


Capacitación Ajuste sin tramite presupuestal Regionalización.

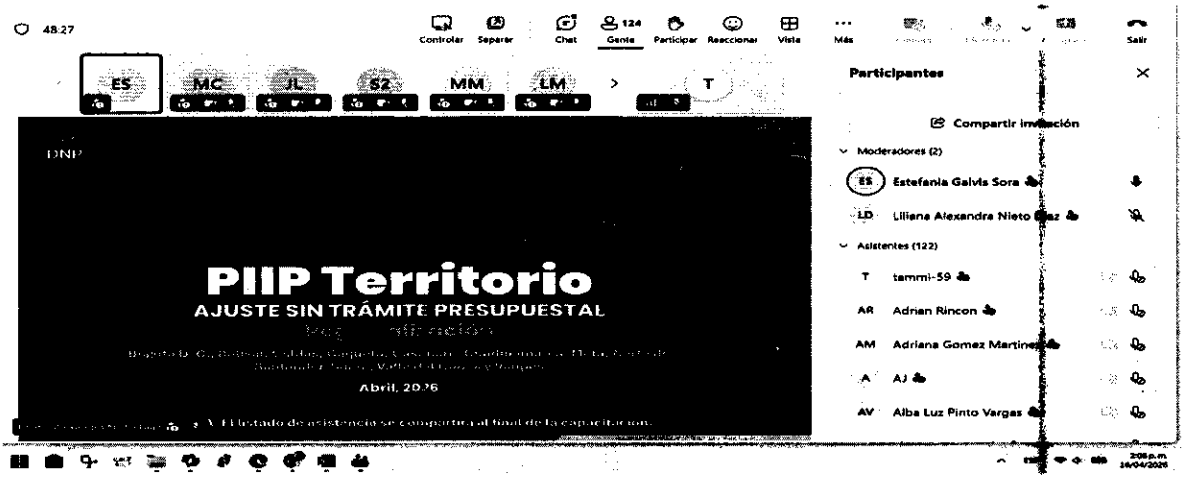




DNP


La ejecución es el momento durante el cual se adelanta la **etapa de inversión del proyecto.** Este proceso comprende todos los procedimientos de afectación presupuestal, **desarrollo de las actividades, seguimiento y ajustes al proyecto** hasta la entrega a satisfacción de los bienes y servicios contemplados en su cadena de valor.




Comienza con el **acto administrativo** que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto y finaliza con la **entrega de los bienes o servicios** contemplados en el proyecto en la etapa de inversión y el cierre de su ejecución financiera.


Liliana Alexandra Nieto Diaz

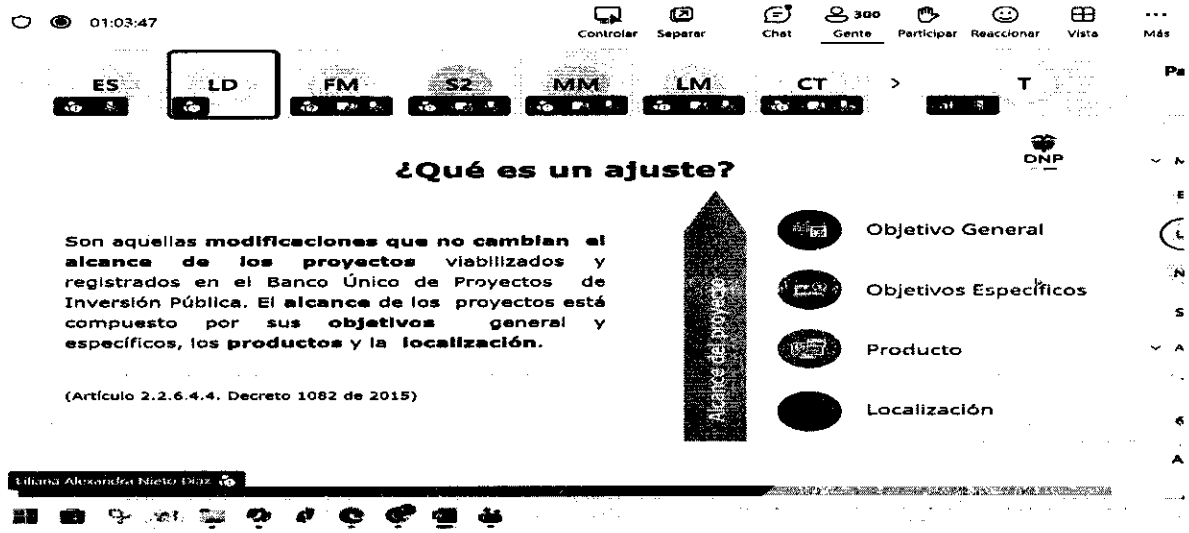

01:03:47
Controlar
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Más
ES
LD
FM
S2
MM
LM
CT
T
DNP
¿Qué es un ajuste?
Son aquellas modificaciones que no cambian el alcance de los proyectos viabilizados y registrados en el Banco Único de Proyectos de Inversión Pública. El alcance de los proyectos está compuesto por sus objetivos general y específicos, los productos y la localización.
(Artículo 2.2.6.4.4. Decreto 1082 de 2015)
Alcance del proyecto
Objetivo General
Objetivos Específicos
Producto
Localización

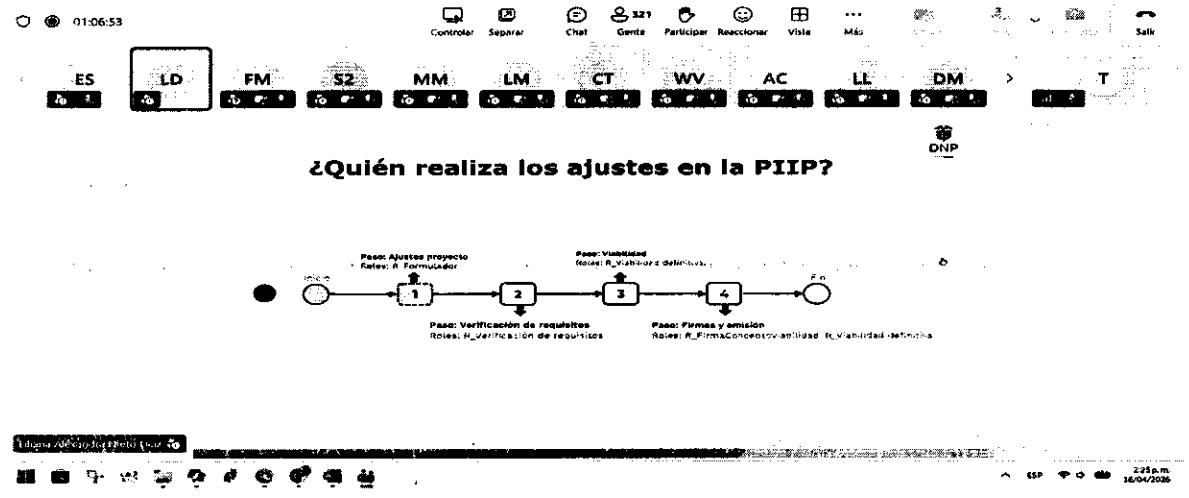

01:06:53
Controlar
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Más
Salir
ES
LD
FM
S2
MM
LM
CT
WV
AC
LL
DM
T
DNP
¿Quién realiza los ajustes en la PIIP?
Paso: Ajustes proyecto
Roles: R_Formulador
Paso: Verificación de requisitos
Roles: R_Verificación de requisitos
Paso: Viabilidad
Paso: Firmas y emisión
1
2
3
4



01:08:11
Controlar
Separar
Chat
339
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Más
Salir
ES
LD
FM
S2
MM
LM
CT
WV
AC
LL
DM
T
DNP
Crear el ajuste en PIIP
2:26 p.m.
16/04/2026

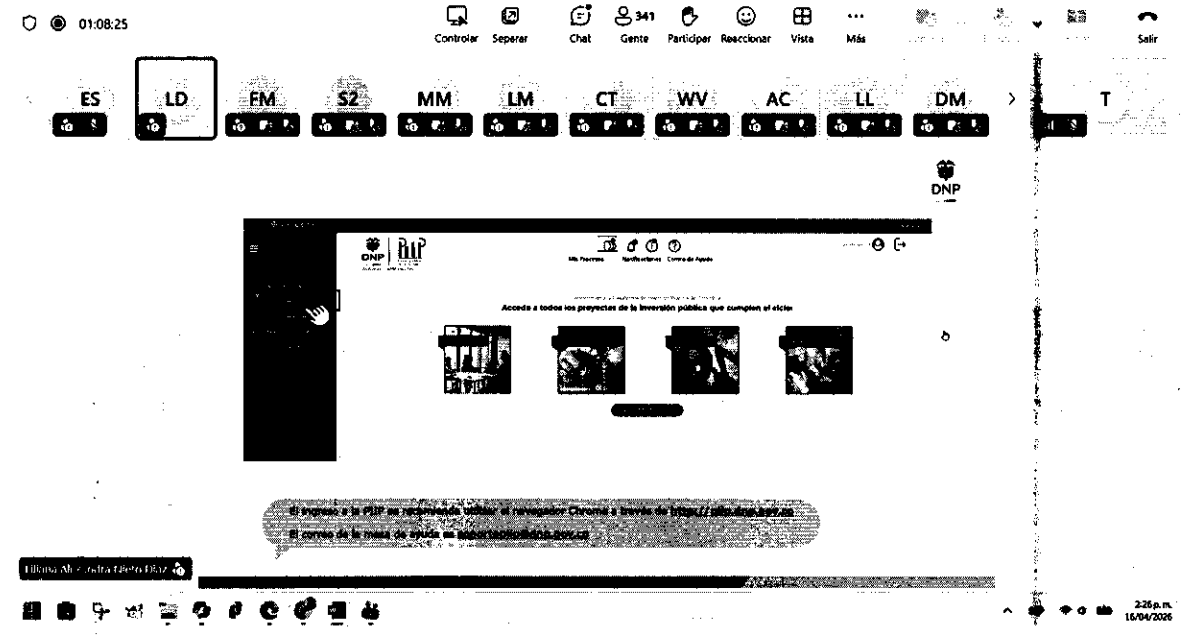

01:08:25
Controlar
Separar
Chat
341
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Más
Salir
ES
LD
FM
S2
MM
LM
CT
WV
AC
LL
DM
T
DNP
2:26 p.m.
16/04/2026

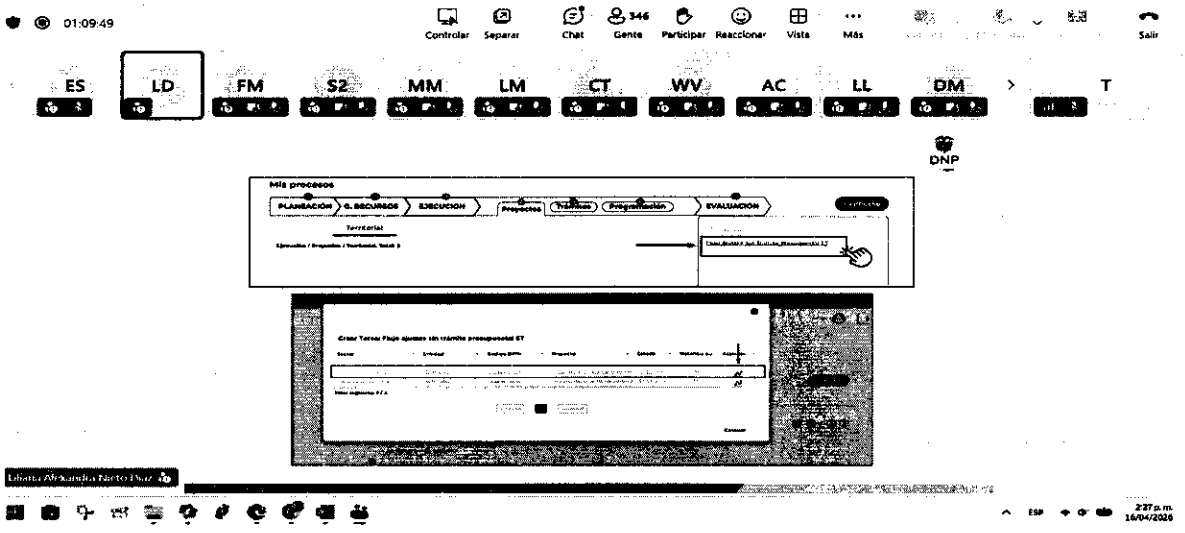
01:09:49
Controlar
Separar
Chat
346
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Más
Salir
ES
LD
FM
S2
MM
LM
CT
WV
AC
LL
DM
T
DNP
Mis procesos
PLANIFICACIÓN
G. RECURSOS
EJECUCIÓN
Proyectos
Trámites
Programación
EVALUACIÓN
Territorial
Crear Tarea Flujo ajustes sin trámite presupuestal ET
2:27 p.m.
16/04/2026

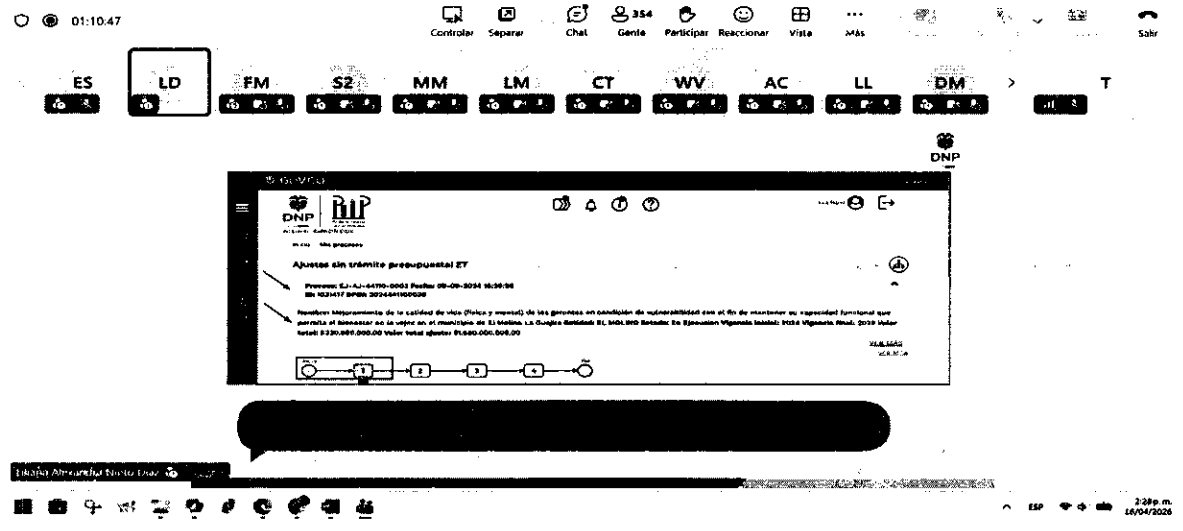
01:10:47
Controlar
Separar
Chat
354
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Más
Salir
ES
LD
FM
S2
MM
LM
CT
WV
AC
LL
DM
T
DNP
DNP
BIP
Ajustes sin trámite presupuestal ET
2:28 p.m.
16/04/2026

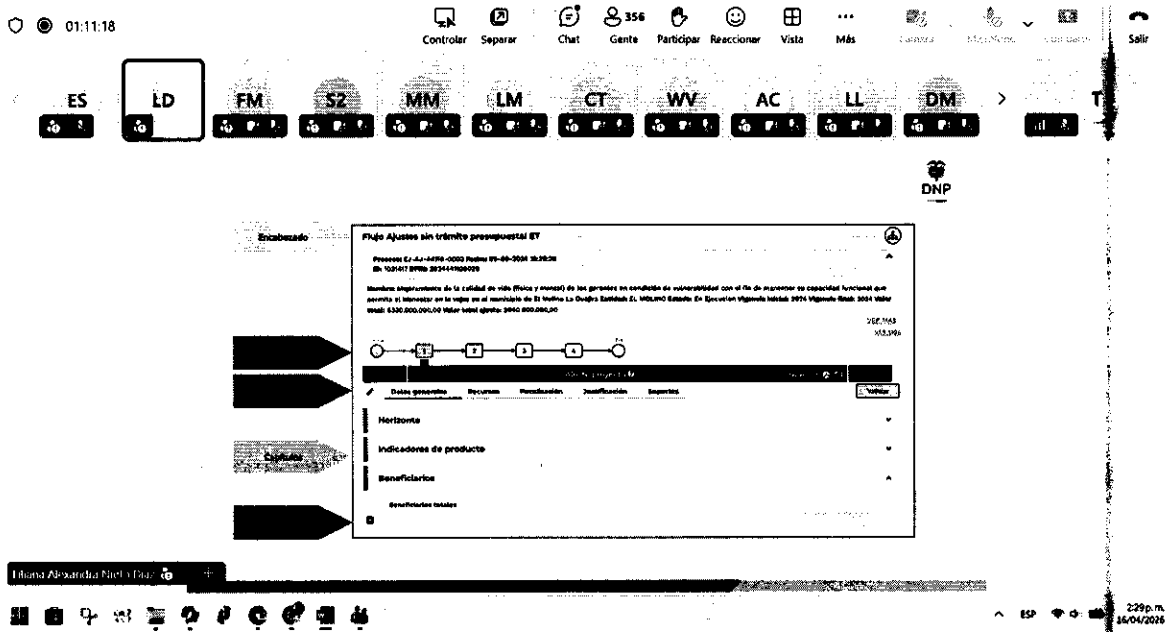
01:11:18
Controlar
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Más
Salir
ES
LD
FM
S2
MM
LM
CT
WV
AC
LL
DM
DNP
Encabezado
Flujo Ajustes sin trámite presupuestal EF
Datos generales
Recursos
Horizonte
Indicadores de producto
Beneficiarios
2:29 p. m.
16/04/2026

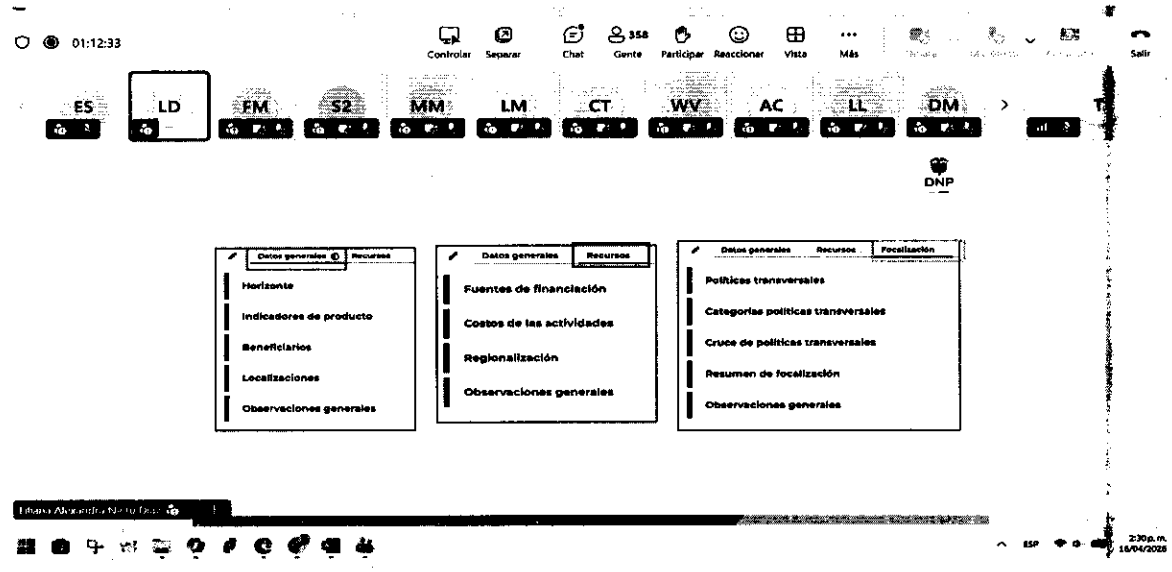
01:12:33
Controlar
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Más
Salir
ES
LD
FM
S2
MM
LM
CT
WV
AC
LL
DM
DNP
Datos generales
Recursos
Horizonte
Indicadores de producto
Beneficiarios
Localizaciones
Observaciones generales
Fuentes de financiación
Costos de las actividades
Regionalización
Observaciones generales
Focalización
Políticas transversales
Categorías políticas transversales
Cruce de políticas transversales
Resumen de focalización
Observaciones generales
2:30 p. m.
16/04/2026

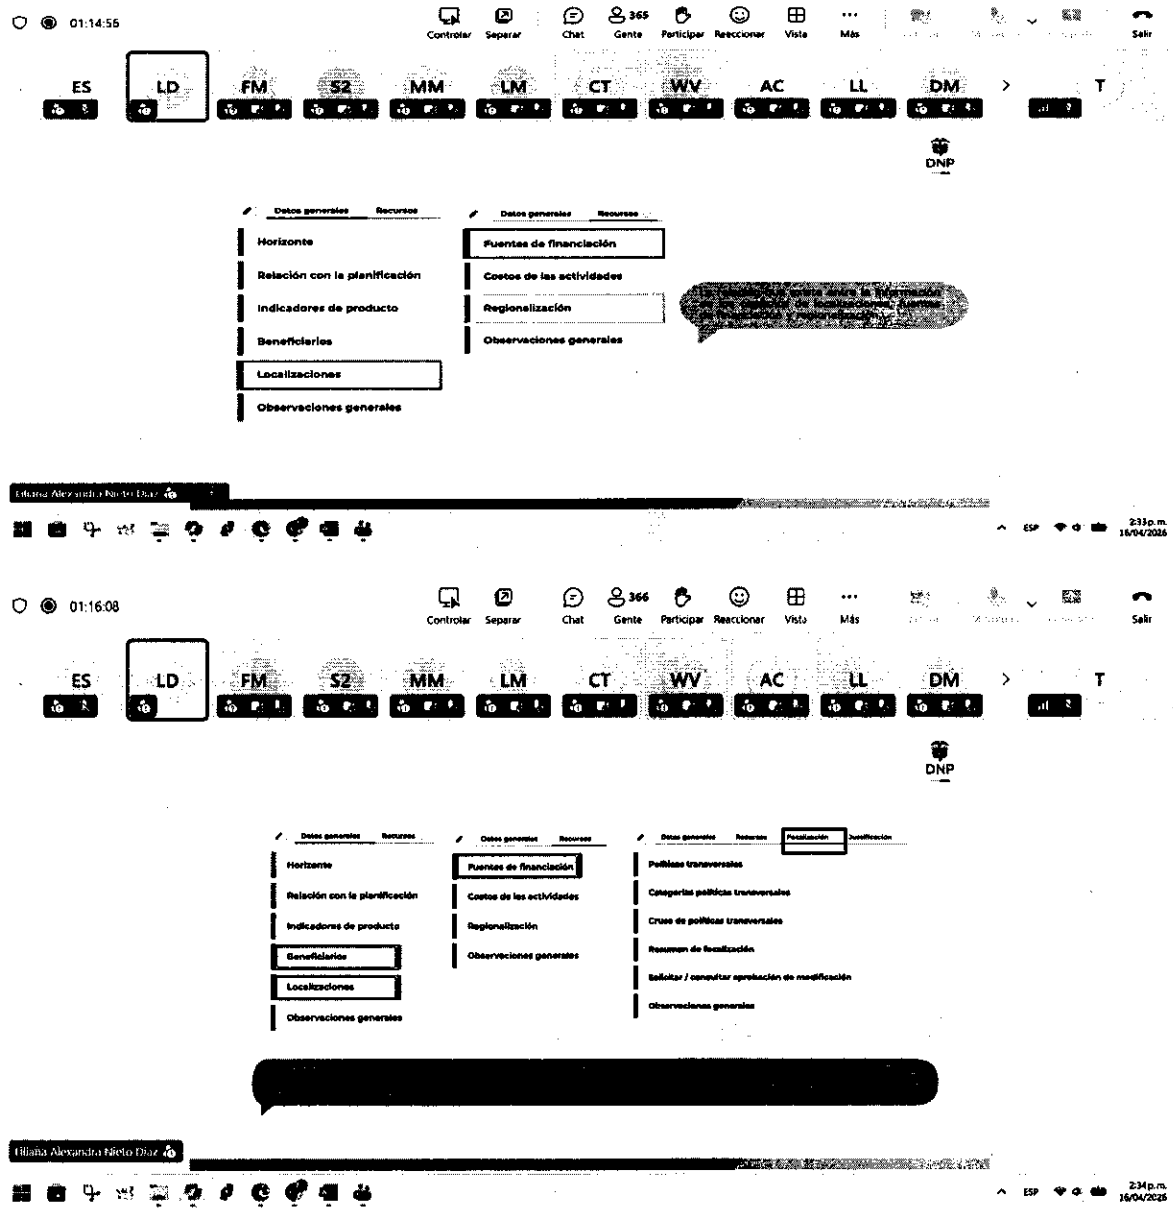

Se debe escoger la política establecida o grupo poblacional

ES LD FM S2 MM LM CT WV AC LL DM

DNP

¿Qué es la Localización?



- Espacio geográfico definido para la ubicación de la alternativa de solución del proyecto de inversión pública.
- La localización debe ser consistente con la ubicación de la población objetivo y con la necesidad que se pretende solucionar.
- El nivel de detalle que determina la localización dependerá del análisis del (los) producto(s) que se vaya(n) a entregar a través del proyecto y a su vez estará soportada en los criterios técnicos, sociales, económicos y financieros, ambientales y jurídicos que soportan la viabilidad del proyecto.
- El detalle que se realice en la regionalización no genera un cambio de localización.

Teniendo en cuenta la relación que existe entre la localización y los aspectos que soportan la viabilidad del proyecto de inversión, se considera la localización como una de las variables que definen su alcance (El alcance de los proyectos de inversión se encuentra definido en el ARTÍCULO 2.2.6.4.1. del Decreto 1082 de 2015)

Liliana Alexandra Ribón Díaz

2:35 p.m. 16/04/2026

01:19:17

Controlar Separar Chat Gente 370 Participar Reaccionar Vista Más Salir

ES LD FM S2 MM LM CT WV AC LL DM

DNP

¿Qué es la Regionalización?

Es un proceso obligatorio que consiste en la distribución del costo total y las metas físicas de los productos de un proyecto entre sus diferentes fuentes de financiación y localizaciones geográficas.







Distribución Equitativa

Cerrar las brechas territoriales para el desarrollo económico, social y ambiental.

Metas Estructuradas

Fomentar metas sociales y económicas de diferente naturaleza como la redistribución, la competitividad y la estabilidad macroeconómica.

Gestión Descentralizada

Gestión eficiente para el territorio adaptándose a las particularidades de cada región, promoviendo así un desarrollo más participativo y medible.

Ana Alexandra Ribón Díaz

2:37 p.m. 16/04/2026

El documento soporte, firmado por el secretario de planeación donde se aclara o justifica el poque de la regionalización o ajuste.

Lina Sarria DAPV
Reenviado

Join conversation
teams.microsoft.com

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NDVjOTU0MzMtZDk1Zi00ZGRlLWFjYjgtNGQ0ZmUxMWQ0N2Fm%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252204260e20-234c-4c9f-a9dd-79286b1b70ac%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522d7e7780d-9f8c-4857-9334-de38b0c31d66%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=a35dfb08-c7c8-4751-b6b6-22eaa47f857a&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true 1:28 p.m.

Seria importante que se conecten a esta capacitación, al menos los que reportan avance y deben de planear la ejecución en proyectos con regionalización. 1:29 p.m.

CAPACITACIÓN SODR - FORMATO CIRCULAR 163 DE 2025 - REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PDD PARA APORTAR A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO

8:00 a.m.

Compañeros 8:00 a.m.


~ Diegofé +57 318 8312152


Meet
Reuniones en tiempo real de Google. Con un navegador, comparte tu video, tu escritorio y tus presentaciones con los miembros de tu equipo y tus clientes.
meet.google.com


CAPACITACIÓN SODR - FORMATO CIRCULAR 163 DE 2025 - REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PDD PARA APORTAR A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO
Martes, 14 abril · 9:00 – 11:00am
Zona horaria: America/Bogota
Información para unirse a la reunión de Google Meet
Vínculo a la videollamada: https://meet.google.com/ygm-fwup-hsg
O marca el: (CO) +57 602 3896806 PIN: 984 369 080#
Más números de teléfono: https://tel.meet/ygm-fwup-hsg?pin=9783936662434

8:00 a.m.

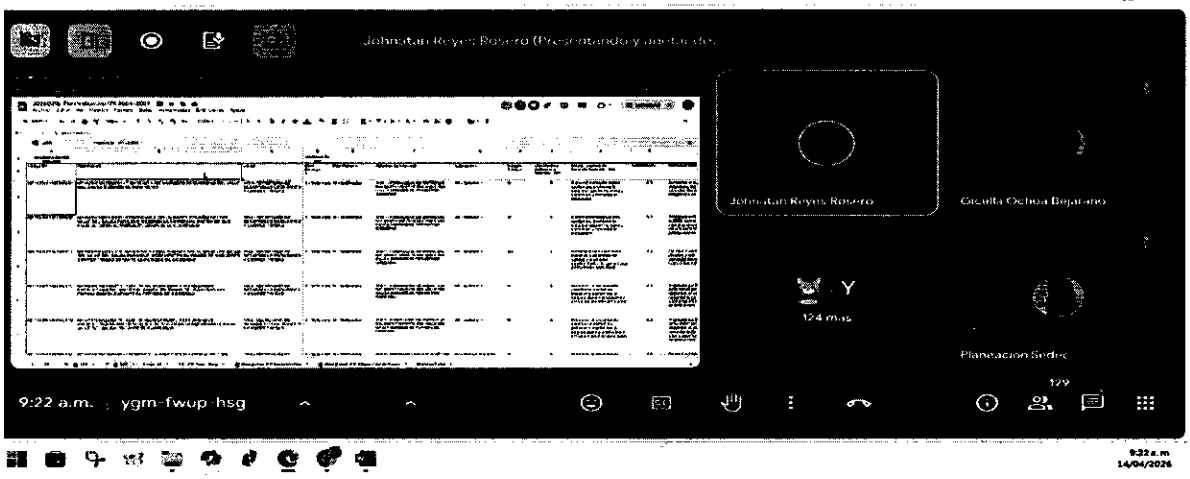


Johnatan Reyes Rosero
Cecilia Ochoa Bejarano
124 más
Planeacion Sedec
9:22 a.m. | ygm-fwup-hsg

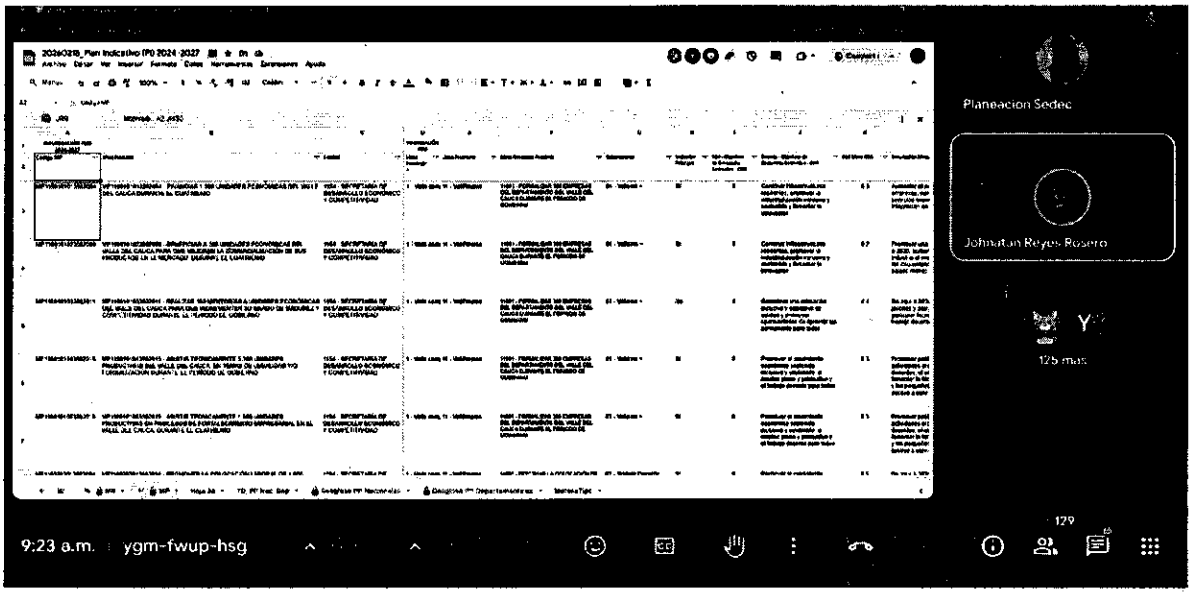
Planeacion Sedec
Johnatan Reyes Rosero
126 más
9:23 a.m. | ygm-fwup-hsg

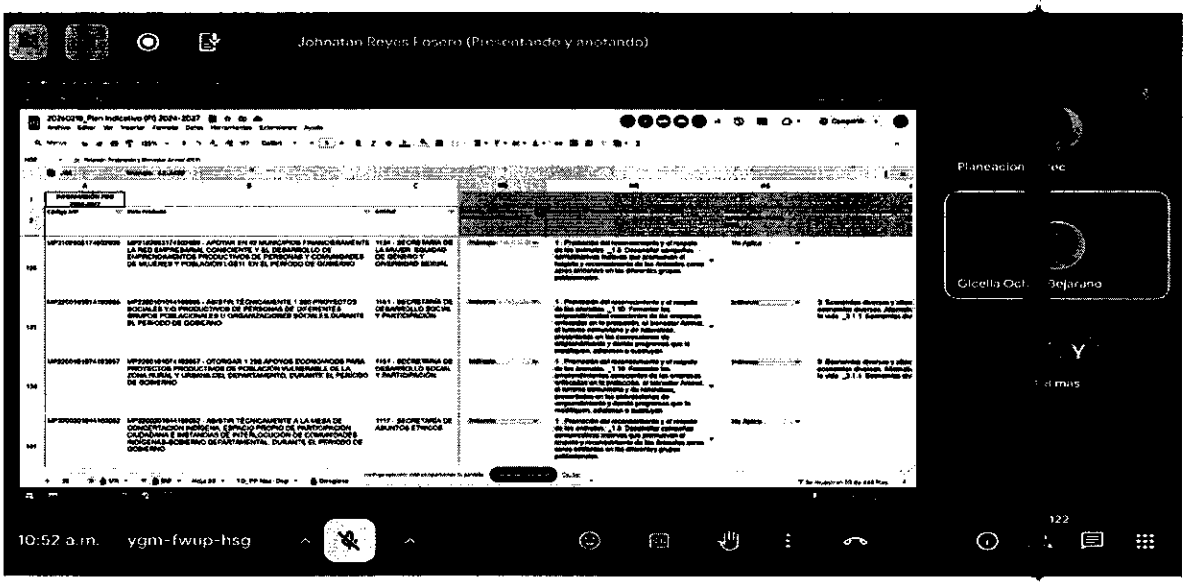

CAPACITACIÓN - FORMATO CIRCULAR 163 DE 2025 - REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PDD Y CONTRIBUCIÓN A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS


Capacitación organizada por el Departamento Administrativo de Planeación, Subdirección de Ordneamiento y Desarrollo Regional.

14 de abril de 2026

planeacionsedec@valledelcauca.gov.co Cambiar cuenta

No compartido

* Indica que la pregunta es obligatoria

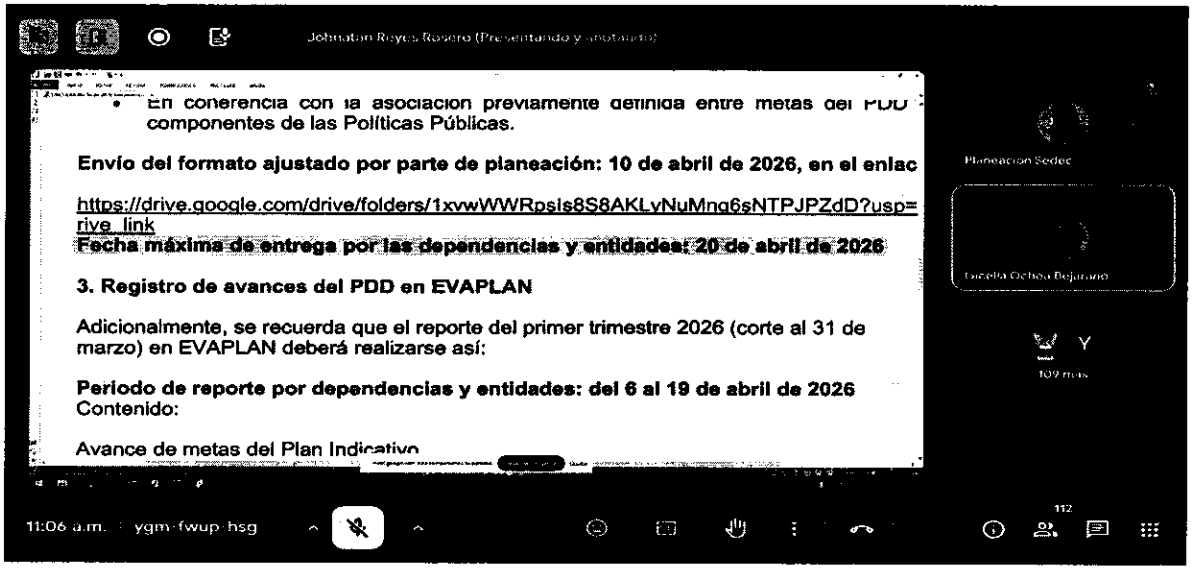

Presento soporte de pago del Sistema de Seguridad Social en Salud, pensión y ARL

ACTIVIDADES REALIZADAS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 1.310.19.13.1010-2026 DEL MES DE JUNIO DE VIG.2026

1. Realizar, conforme a indicaciones del líder de programa, la formulación de los proyectos que contribuyan al desarrollo del proceso M2-P2 "y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca", que le sean asignados por el jefe inmediato y/o supervisor del contrato.

Durante el periodo asignado atendí a las indicaciones del líder de programa, en relación con el proceso M2-P2 y la promoción del desarrollo económico del Valle del Cauca. Revisó lineamientos y criterios para asegurar la coherencia con los objetivos institucionales, manteniendo disposición para la formulación de iniciativas, aunque en este lapso no se generaron proyectos específicos bajo su gestión

2. Brindar acompañamiento en el diseño de los formatos y herramientas para facilitar el seguimiento a las acciones desarrolladas en torno al proceso M2-P2 y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca.

Se brindo acompañamiento en el diseño de formatos y herramientas orientados a facilitar el seguimiento de las acciones desarrolladas en torno al proceso M2-P2. Asimismo, promovió la articulación de lineamientos que aportaron al desarrollo económico del departamento, garantizando que los instrumentos respondieran a las necesidades institucionales.

3. Realizar seguimiento a la inversión pública adelantada por la dependencia en el marco del proceso M2-P2 "y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca".

Realice seguimiento a la inversión pública adelantada por la dependencia en el marco del proceso M2-P2, promoviendo el desarrollo económico del departamento y garantizando la transparencia en el cumplimiento de las metas establecidas.

REPORTE AVANCE DE EJECUCION ACTIVIDADES EN PLATAFORMA PIIP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.

- PI37-102481 TEJIDO EMPRESARIAL
- PI37-102499 FORTALECIMIENTO UNIDADES ECONOMICAS
- PI38-102555 MEJORAMIENTO DEL SECTOR MANUFACTURERO - trae reserva presupuestal
- PI38-102556- MEJORAMIENTO DE LA FORMALIDAD LABORAL EN EL VALLE DEL CAUCA
- PI38-102756 COOPERACION INTERNACIONAL
- PI39-102642 – ADECUACION Y DOTACION CENTRO DE INNOVACION SENA
- PI39-102571 FORTALECIMIENTO TEJIDO EMPRESARIAL

4. Realizar seguimiento al avance en el cumplimiento de los indicadores de producto y de gestión definidos para los proyectos de inversión a cargo de la dependencia.

En cumplimiento de la actividad asignada, se realizo el seguimiento al avance de los proyectos de inversión a cargo de la dependencia, verificando el cumplimiento de los indicadores de producto y de gestión definidos en los instrumentos de planeación institucional.

Metodología aplicada:

- **Revisión documental**: contrastar la información registrada en PIIP, EVAPLAN y matriz Z080 financiera.
- **Consolidación de datos**: recopilación de porcentajes de avance físico, de producto, de resultado y de ejecución financiera.
- **Análisis comparativo**: identificación de brechas entre metas programadas y avances reales.
- **Registro de hallazgos**: observaciones sobre retrasos, ajustes o cumplimiento oportuno.
- **Resultados del seguimiento**
- Se evidenció el nivel de cumplimiento de los indicadores de **producto**, reflejando el avance en las actividades y entregables previstos.
- Se verificó el cumplimiento de los indicadores de **gestión**, relacionados con la eficiencia en la ejecución de recursos y la oportunidad en la implementación de acciones.
- Se identificaron proyectos con avances superiores al 80%, otros en rango intermedio (50–79%) y algunos con rezago menor al 50%, lo cual permite focalizar acciones de mejora, las

cuales se socializan en las mesas de trabajo previa revisión del informe de avance presentado

El seguimiento permitió contar con información clara y actualizada sobre el estado de los proyectos, facilitando la toma de decisiones y el ajuste de estrategias para garantizar el cumplimiento de las metas institucionales.

A continuación, se detalla el estado de avance con corte a junio 30 de 2026 – I semestre de la vigencia.

Proyecto PI37-102481 – BPIN 2024003760096 Nombre: Fortalecimiento del tejido empresarial y desarrollo de estrategias de negociación en el Valle del Cauca
Meta de Resultado (MR)

MR12005: Aumentar en 5 % las exportaciones de los clústeres y/o empresas asistidas.
Meta programada para la vigencia: 2 %
Avance reportado: 0 %

- No se registra cumplimiento frente a la meta de resultado.
- **Meta de Producto (MP)**
- MP1200507043502116: Asistir técnicamente a 75 empresas en el cuatrienio.
- Meta programada para la vigencia: 20 empresas Avance reportado: 0 %
- MP1200507013502003: Ejecutar 1 estrategia para impulsar exportaciones.
- Meta programada para la vigencia: 1 estrategia Avance reportado: 0 %

Aunque se realizaron gestiones de atracción de inversión (ej. misión en Brasil con 7 empresas priorizadas), aún no se refleja cumplimiento formal en los indicadores de producto.

Avances relevantes

- Atracción de inversión: 7 empresas con alta probabilidad de instalarse en el Valle, principalmente en sectores cosmético y manufactura avanzada.
- Vallexporta 2026:
- Cumplimiento del 100 % en actividades programadas.
- Avance acumulado del 55 % en la vigencia.
- Participación de 17 MiPymes en la Macrorrueda 2026 con resultados iniciales: 236 citas, 98 compradores potenciales, expectativas comerciales por USD 3,2 millones y acuerdos inmediatos por USD 342.000.
- Avance financiero: 88 % de ejecución sobre el valor contractual ($500 millones).

Conclusión

El proyecto muestra un avance operativo y financiero sólido, especialmente en internacionalización y atracción de inversión. Sin embargo, los indicadores de resultado y producto permanecen en 0 % frente a las metas programadas, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la trazabilidad y formalización de los logros para que se traduzcan en cumplimiento efectivo de los indicadores institucionales.

Proyecto PI37-102499 – BPIN 2024003760114 Nombre: Fortalecimiento de las Unidades Económicas en el Valle del Cauca

Meta de Resultado (MR)

- MR11001: Formalizar a 300 empresas del Departamento del Valle del Cauca durante el periodo de gobierno.
- Meta programada para la vigencia: 88 empresas
- Avance reportado: 0 No se registra cumplimiento frente a la meta de resultado.
- **Meta de Producto (MP)**
- MP1100101043502015: Asistir técnicamente 5.300 unidades productivas en temas de legalidad y/o formalización.
- Meta programada para la vigencia: 1.700
- Avance reportado: 148
- MP1100101023502009: Beneficiar a 300 unidades económicas para mejorar la comercialización de sus productos.
- Meta programada para la vigencia: 130
- Avance reportado: 0
- MP1100101033502011: Realizar 150 mentorías a unidades económicas para incrementar madurez y competitividad.
- Meta programada para la vigencia: 62
- Avance reportado: 0

Se evidencia un avance parcial en asistencia técnica (148 unidades productivas), mientras que las metas de comercialización y mentorías aún no presentan cumplimiento.

Avances relevantes

- Atención a emprendedores y empresarios a través de los 10 Centros de Desarrollo Empresarial e Innovación (CDEI), con cobertura en los 42 municipios del departamento.
- Se reportan 295 emprendedores en etapa de ideación y 991 en etapa de fortalecimiento, además de 933 asesorías realizadas.

- Cumplimiento parcial de metas de asistencia técnica en los CDEI, con porcentajes de avance entre 39 % y 42 % según el centro.
- Desarrollo de ferias, capacitaciones y articulaciones institucionales que fortalecen el ecosistema emprendedor y empresarial.

Conclusión

El proyecto presenta un avance operativo importante en la atención territorial y en la asistencia técnica inicial, pero los indicadores de resultado y varias metas de producto aún muestran rezago frente a lo programado. Se requiere fortalecer la ejecución y trazabilidad para alcanzar los objetivos de formalización, comercialización y mentorías en el periodo de gobierno.

Proyecto PI38-102555 – BPIN 202500000007106 Nombre: Mejoramiento de competencias técnicas y humanas en el sector manufacturero en el departamento del Valle del Cauca

Meta de Resultado (MR)

MR11002: Efectuar la colocación de 5.000 personas cotizando a salud y pensión en articulación con los actores del mercado laboral del Valle del Cauca, durante el cuatrienio.
Meta programada para la vigencia: 320 personas
Avance reportado: 0 No se registra cumplimiento frente a la meta de resultado.

Meta de Producto (MP)

MP1100202023602040: Formar para el trabajo a 4.000 vallecaucanos en condición de vulnerabilidad durante el cuatrienio.
Meta programada para la vigencia: 1.000 personas
Avance reportado: 650
Se evidencia un avance parcial en la formación para el trabajo, con un cumplimiento del 65 % frente a la meta programada.

Avances relevantes

Convenio Unitex Cali:

- Culminación del ciclo formativo integral con certificación de 240 personas.

- Entrega de 15 máquinas de costura a beneficiarios destacados para fortalecer unidades productivas.
- Articulación con empresas del sector manufacturero (ej. Denim Factory) para procesos de inserción laboral, con 25 perfiles revisados y 17 preseleccionados.
- Convenio Confección y Marroquinería, Cuero y Calzado:
- Formación y graduación de 500 personas (400 en confección y 100 en calzado).
- Cumplimiento del 100 % de la meta contractual, equivalente al 50 % de la meta producto anual programada.
- Encuesta de satisfacción con resultados superiores al 67 % en todos los componentes evaluados.
- Clausura oficial realizada en el Teatro Calima con presencia institucional y empresarial.

Conclusión

El proyecto muestra un avance significativo en la meta de producto, con logros concretos en formación y fortalecimiento de competencias técnicas y humanas en sectores estratégicos como confección y calzado. Sin embargo, la meta de resultado relacionada con la colocación laboral aún no presenta avances, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la articulación con el mercado laboral para garantizar la vinculación formal de los beneficiarios.

Proyecto PI38-102556 – BPIN 2024003760152 Nombre: Mejoramiento de la Formalidad Laboral en el Valle del Cauca

Meta de Resultado (MR)

- MR11002: Efectuar la colocación de 5.000 personas cotizando a salud y pensión en articulación con los actores del mercado laboral del Valle del Cauca, durante el cuatrienio.
- Meta programada para la vigencia: 1.170 personas
- Avance reportado: 443 personas vinculadas laboralmente (en proceso de validación)
- Se evidencia un avance parcial frente a la meta de resultado, pendiente de certificación en el sistema de seguridad social.

Meta de Producto (MP)

- MP1100202013602004: Promover la colocación laboral de 1.500 personas en el cuatrienio.
- Meta programada para la vigencia: 500

- Avance reportado: 0
- MP1100202033602043: Elaborar un documento técnico sobre estrategias de implementación y seguimiento del trabajo decente.
- Meta programada para la vigencia: 1
- Avance reportado: 0
- Aunque se reportan avances en colocación laboral, los indicadores de producto aún no registran cumplimiento formal.

Avances relevantes

- Inserción laboral: 443 beneficiarios vinculados laboralmente mediante ferias de empleo, intermediación con empresas y formación dual.
- Fortalecimiento de competencias: 106 beneficiarios certificados en Normas de Tránsito y Seguridad Vial, con 39 en proceso de formación.
- Estrategia de empleabilidad: jornadas presenciales de masterclass para mejorar hoja de vida, entrevistas y relacionamiento empresarial.
- Cobertura territorial: participación de beneficiarios en 29 municipios, con mayor concentración en Cali, Buenaventura, Palmira, Jamundí y Tuluá.

Conclusión

El proyecto muestra avances significativos en la vinculación laboral y en la formación de competencias, con resultados verificables en la empleabilidad de la población beneficiaria. Sin embargo, los indicadores de producto aún no reflejan cumplimiento frente a lo programado, lo que requiere fortalecer la trazabilidad y formalización de los logros para consolidar el impacto en la formalidad laboral del departamento.

Proyecto PI37-102756 – BPIN ID 1636065 Nombre: Incremento de las capacidades institucionales de cooperación internacional en el departamento del Valle del Cauca – Vigencia fiscal 2026

Meta de Resultado (MR)

- MR12005: Aumentar en 5 % las exportaciones de los clústeres y/o empresas asistidas durante el periodo de gobierno.
- Meta programada para la vigencia: 2 %
- Avance reportado: 0 %
- No se registra cumplimiento frente a la meta de resultado.

Meta de Producto (MP)

- MP1200507033502048: Constituir 8 alianzas de cooperación internacional para aumentar la competitividad del Valle del Cauca durante el periodo de gobierno.
- Meta programada para la vigencia: 2 alianzas
- Avance reportado: 0
- Aunque se reportan gestiones y acercamientos, aún no se refleja cumplimiento formal en los indicadores de producto.

Avances relevantes

- Firma de una alianza con la Universidad San Buenaventura para el curso "Diplomacia Subnacional, Cooperación e Innovación para el Desarrollo", dirigido a fortalecer capacidades de gestión de cooperación internacional en municipios del Valle.
- Instalación de Comités Municipales de Cooperación Internacional en Andalucía, Tuluá y Pradera.
- Articulación con INFIVALLE y la Agencia Presidencial de Cooperación (APC Colombia) para vincular municipios a programas de formulación de proyectos del BID.
- Reuniones de articulación con Yumbo, Florida y Jamundí para fortalecer capacidades locales.
- Avances en negociaciones de cooperación con la prefeitura de Salvador de Bahía (cultura afro), y con el CIAT y la región de Coimbra para proyectos de emprendimiento en Palmira y Roldanillo.
- Socialización de la "Guía de Comunicación Institucional" para fortalecer la estrategia de difusión y articulación.

Conclusión

El proyecto ha avanzado en la gestión institucional y en la articulación con actores nacionales e internacionales, consolidando bases para futuras alianzas. Sin embargo, los indicadores de resultado y producto aún no presentan cumplimiento frente a lo programado, lo que evidencia la necesidad de acelerar la formalización de convenios y alianzas para lograr impactos medibles en competitividad y cooperación internacional.

Proyecto PI39-102571 – BPIN 2024003760150 Nombre: Fortalecimiento de la innovación para el tejido empresarial del Valle del Cauca

Meta de Resultado (MR)

- MR12006: Invertir 45.720 millones de pesos en actividades de ciencia, tecnología e innovación en alianza con actores del ecosistema durante el periodo de gobierno.
- Meta programada para la vigencia: $3.000.000.000
- Avance reportado: 0
- No se registra cumplimiento frente a la meta de resultado.

- **Meta de Producto (MP)**
- MP1200609033906019: Asistir técnicamente a 80 unidades productivas para incrementar su productividad y grado de innovación en el periodo de gobierno.
- Meta programada para la vigencia: 30 unidades
- Avance reportado: 0

- Aunque se reportan avances operativos y de gestión, aún no se refleja cumplimiento formal en los indicadores de producto.
- **Avances relevantes**
- Administración del espacio NIDO: 503 ingresos registrados, 440 personas impactadas, 40 reservas de salas y visitas de 170 estudiantes.
- Implementación de la plataforma tecnológica "Mi Ruta" para seguimiento de beneficiarios y medición de impacto.
- Desarrollo del Centro Comercial Virtual "Valle Vende", lanzado en el evento Retail del Futuro 2026, con convocatoria abierta para vinculación de empresas.
- Estrategia ELEVARA: mapeo y vinculación de empresas con potencial de inversión de impacto.
- Jornadas de capacitación en marketing digital y comercio electrónico: 2.151 inscritos, con amplia participación de mujeres (77,9 %) y emprendedores no formalizados (71,9 %).
- Convocatoria "MiPymes Digitales 2026": 119 empresas inscritas, 92 habilitadas para evaluación y selección.

Conclusión

El proyecto presenta un avance operativo estimado del 60 %, con resultados concretos en fortalecimiento empresarial, digitalización y articulación del ecosistema de innovación. Sin embargo, los indicadores de resultado y producto aún no muestran cumplimiento frente a lo programado, lo que evidencia la necesidad de consolidar la asistencia técnica a unidades productivas y la inversión monetaria prevista para alcanzar los objetivos institucionales.
Proyecto PI39-102642 – BPIN ID-MGA 1429461 Nombre: Adecuación y dotación de un Centro de Innovación e Inteligencia Artificial para la competitividad, el desarrollo económico y la inclusión social en el departamento del Valle del Cauca

Meta de Resultado (MR)

- MR12006: Invertir 45.720 millones de pesos en actividades de ciencia, tecnología e innovación en alianza con actores del ecosistema durante el periodo de gobierno.
- Meta programada para la vigencia: $1.950.000.000
- Avance reportado: 0
- No se registra cumplimiento frente a la meta de resultado.

Meta de Producto (MP)

- MP1200609023906018: Adecuar y dotar un distrito de innovación e inteligencia artificial en el Valle del Cauca durante el cuatrienio.
- Meta programada para la vigencia: 1 (ejecución prevista para 2027, vigencias futuras)
- Avance reportado: No aplica
- El proyecto se encuentra en fase de alistamiento contractual y técnico, por lo que aún no se refleja cumplimiento en los indicadores de producto.
- **Avances relevantes**
- Formalización del contrato de obra para la construcción del Centro de Innovación e Inteligencia Artificial.
- Avances en la legalización del contrato de interventoría.
- Reuniones de articulación institucional con SENA, Findeter y entidades cofinanciadoras para definir plan de trabajo, cronograma y flujo de caja.
- Visita técnica al predio objeto de intervención para verificar condiciones de infraestructura y requerimientos previos al inicio de obra.

Conclusión

El proyecto ha avanzado en la transición de la fase precontractual a la fase contractual, consolidando las condiciones técnicas, administrativas y financieras necesarias para iniciar la ejecución física. Sin embargo, los indicadores de resultado y producto aún no presentan avances frente a lo programado, dado que la meta principal corresponde a vigencias futuras.

5. Elaborar informes periódicos del avance de ejecución de los proyectos de inversión a cargo de la dependencia.

En cumplimiento de la actividad asignada, la dependencia ha elaborado informes periódicos sobre el avance de ejecución de los proyectos de inversión registrados en el PIIP y demás instrumentos de planeación, consolidando información clara y actualizada para la toma de decisiones.

Metodología aplicada

- Revisión documental de los proyectos con base en los reportes técnicos, financieros y operativos.
- Consolidación de información sobre metas de resultado y metas de producto programadas frente a los avances reportados.
- Identificación de brechas y rezagos en el cumplimiento de indicadores.
- Registro de evidencias de gestión, actividades realizadas y soportes institucionales.
- Resultados del seguimiento
- Se evidencian proyectos con **avances operativos y financieros significativos** (ej. Vallexporta 2026 con 55 % de avance acumulado y 88 % de ejecución financiera).

- Otros proyectos presentan **cumplimiento parcial en metas de producto** (ej. formación de 650 personas en el sector manufacturero frente a 1.000 programadas; asistencia técnica a 148 unidades productivas frente a 1.700 programadas).
- Se identifican proyectos en **fase de alistamiento contractual o técnico**, sin avances aún en indicadores (ej. Centro de Innovación e Inteligencia Artificial; NIDO – Hub E-Commerce con 0 % en metas de producto, aunque con 60 % de avance operativo).
- En materia de **meta de resultado**, la mayoría de proyectos reportan avances en gestión, pero aún no reflejan cumplimiento frente a los porcentajes programados (ej. colocación laboral, incremento de exportaciones, inversión en CTI).

Conclusiones

El seguimiento periódico permitió consolidar información clara y actualizada sobre el estado de los proyectos de inversión, destacando:
Avances en ejecución física y financiera en algunos proyectos.

Rezagos en el cumplimiento de metas de resultado y producto, que requieren fortalecimiento en trazabilidad y formalización de logros.
La necesidad de continuar con la articulación institucional y territorial para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Departamental.

6. Participar activamente en actividades incluidas las de fortalecimiento, como capacitaciones, reuniones desarrolladas por la Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, así como las que otras dependencias de la Gobernación Valle del Cauca lleven a cabo. Igualmente, asistir y participar en las mesas de trabajo y otras instancias en las que sea designado, conforme a la instrucción impartida por el Jefe y/o Supervisor, o las que convoquen de otras dependencias de la Gobernación del Valle.

En cumplimiento de la actividad asignada, se ha participado de manera activa en capacitaciones, reuniones, mesas de trabajo y demás instancias convocadas por la Secretaría de Desarrollo Económico y otras dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca, fortaleciendo la articulación institucional y territorial. Acciones realizadas.

- Asistencia y participación en **capacitaciones técnicas y formativas** orientadas al fortalecimiento de competencias en innovación, emprendimiento, comercio electrónico y empleabilidad.

- Intervención en **reuniones de articulación institucional** con entidades públicas, privadas y académicas, consolidando sinergias para el desarrollo económico y la competitividad regional.

Resultados del acompañamiento

- Se fortaleció la articulación interinstitucional y territorial, garantizando la presencia de la dependencia en espacios estratégicos de decisión y coordinación.
- Se promovió la transferencia de conocimiento y la socialización de la oferta institucional, beneficiando directamente a emprendedores, empresarios y unidades productivas del departamento.
- La participación activa en capacitaciones, reuniones, mesas de trabajo y demás instancias convocadas me han permitido fortalecer las capacidades institucionales, garantizar la articulación con actores estratégicos y contribuir al cumplimiento de las metas de inversión y desarrollo económico del departamento.

7. Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato o jefe inmediato, para el cumplimiento del objeto contractual y estén acorde con la naturaleza del contrato.

En atención a las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato y el jefe inmediato, atendiendo oportunamente requerimientos adicionales y garantizando que estuvieran en concordancia con la naturaleza del objeto contractual.

Acciones realizadas

- Apoyo en la elaboración, revisión y ajuste de documentos técnicos e informes solicitados por la dependencia.
- Participación en reuniones de coordinación interna y externa, aportando insumos técnicos y administrativos según requerimientos.
- Acompañamiento en procesos de articulación institucional con otras dependencias de la Gobernación y actores estratégicos.
- Atención a solicitudes específicas de seguimiento, consolidación de información y preparación de reportes complementarios.
- Resultados
- Se fortaleció la capacidad de respuesta de la dependencia frente a requerimientos adicionales, asegurando la continuidad de las actividades.
- Se garantizó la disponibilidad y disposición para atender tareas emergentes, manteniendo la coherencia con el objeto contractual.

- Se contribuyó al cumplimiento integral de las metas institucionales mediante la ejecución de actividades complementarias

Conclusión

La atención a las demás actividades asignadas por el supervisor o jefe inmediato ha permitido mantener un acompañamiento constante, flexible y alineado con las necesidades de la dependencia, asegurando el cumplimiento del objeto contractual y la efectividad en la gestión pública.

8. Apoyar la difusión de los contenidos de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Desarrollo Económico cada vez que se realice una publicación, en las plataformas Instagram, Facebook, X y YouTube, realizando por cada publicación acciones de interacción tales como dar "me gusta" y comentar y/o compartir los contenidos en sus redes sociales personales, con el fin de fortalecer el alcance y el engagement institucional.

En cumplimiento de la actividad asignada, se ha apoyado de manera activa en la difusión de los contenidos de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Desarrollo Económico en Instagram, Facebook, X y YouTube, efectuando acciones de interacción como dar "me gusta", comentar y compartir los contenidos en sus redes personales, fortaleciendo el alcance y el engagement institucional.

Acciones realizadas

- Interacción constante en las plataformas **Instagram, Facebook, X y YouTube**, mediante acciones de "me gusta", comentarios y compartidos en redes personales.
- Promoción de las publicaciones institucionales para ampliar su visibilidad y llegar a un mayor número de usuarios.
- La participación activa en la difusión de contenidos digitales ha permitido consolidar la estrategia de comunicación institucional, garantizando que la información sobre programas, proyectos y actividades llegue de manera efectiva a la comunidad y contribuya al fortalecimiento de la competitividad y el desarrollo económico del departamento.


Presento soporte de pago del Sistema de Seguridad Social en Salud, pensión y ARL con lo cual acredito que me encuentro al día. De otra parte, manifiesto que no estoy obligado a pagar los parafiscales de SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar.

Durante este periodo en desarrollo del presente contrato, guardé estricta confidencialidad y di cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, respecto de toda la información y datos personales de los que tuve conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

ACTIVIDAD 3: Print reporte de avance de ejecución de las actividades en plataforma PIIP

Reunión revisión previa presentación para Comité Directivo

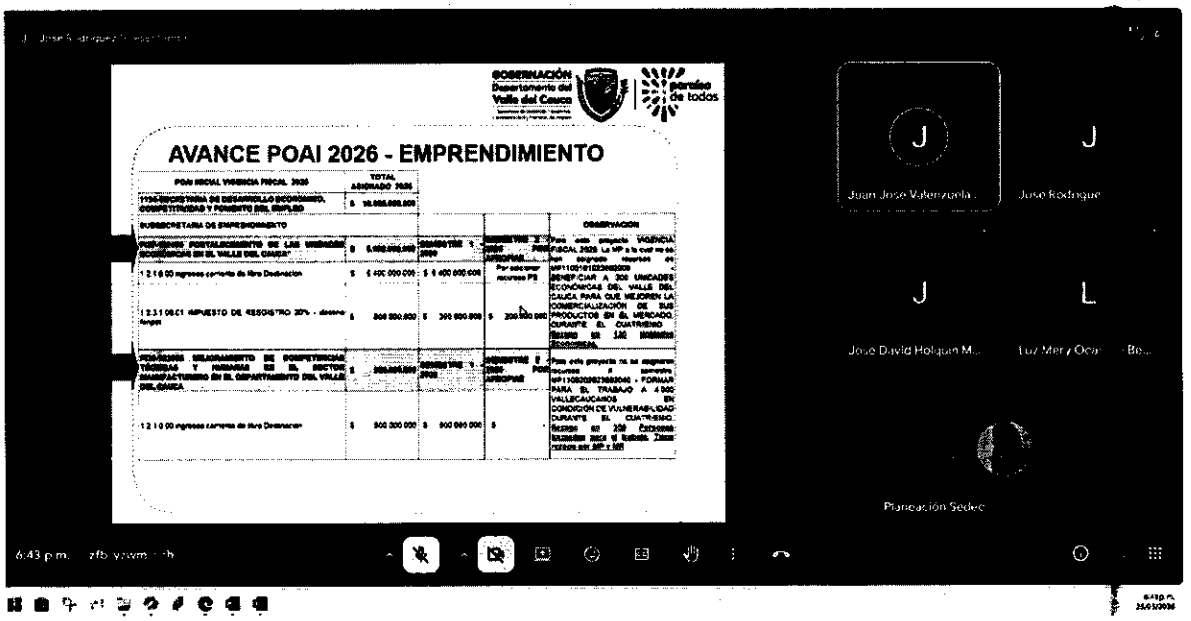

REPORTE AVANCE DE ACTIVIDADES CON CORTE A 30 DE JUNIO 2026

Se detecta que algunas de las actividades que se encuentran en ejecución en vig. 2026 no se visualizan en plataforma PIIP, para el reporte del mes de mayo 2026, asi mismo presupuestalmente, a continuación se deja constancia mediante captura de pantalla de la novedad:

PI38-102556 Reporte avance ejecución

Proceso: EJ-SYC-0376-0264 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 13-05-2025 Fecha fin: ID: 1318299 BPIN: 202500000007106 Periodo(s) abierto(s): 2026 Mayo(11/05/2026 - 05/06/2026), Nombre de proyecto: MEJORAMIENTO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS Y HUMANAS EN EL SECTOR MANUFACTURERO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

CAUCA Entidad: Valle del Cauca Sector: Trabajo Estado: En Ejecucion Horizonte: 2025 - 2027 Valor total: $10.202.610.272,00 Apropiación inicial: $500.000.000,00 Apropiación vigente: $500.000.000,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $500.000.000,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Se proyecta adelantar las acciones necesarias para ejecutar un proceso integral de formación y colocación laboral en el sector manufacturero del Valle del Cauca. Las actividades comprenden la convocatoria de participantes, la identificación de sus perfiles, la capacitación en competencias técnicas, administrativas y socioemocionales ajustadas a las necesidades del mercado laboral, y la vinculación con actores del sector para garantizar la inserción laboral. Asimismo, se brindará acompañamiento en la formalización de emprendedores del sector, fomentando la creación de unidades económicas sostenibles y competitivas, en respuesta al déficit de personal calificado y la baja formalización en el sector manufacturero. Costo total del proyecto: Ejecutor: Valle del Cauca Fecha real de inicio: 24-01-2025 PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Imagen de las actividades acorde la Z080 con corte a 30 de mayo de 2026

C.Gestor	Proyecto	Desc. Proyecto	Programa	Desc. Tipo Act	Desc. PEP	Total Ejecutado	Total Pagos	Total Oblig
1154	PI38-102555	Mejoramiento de competencias técnicas y humanas en el sector manufacturero, en el departamento del Valle del Cauca	PI38-102555/1/1/01/08	Vigencia Futura ordinaria	Realizar convocatoria para propiciar encuentro entre la oferta de empleo y los beneficiarios del proyecto - vigencia futura	$ 9.390.000,00	$ 9.390.000,00	$ 9.390.000,00
1154	PI38-102555	Mejoramiento de competencias técnicas y humanas en el sector manufacturero, en el departamento del Valle del Cauca	PI38-102555/1/1/01/09	Vigencia Futura ordinaria	[illegible]	$ 435.800.000,00	$ 230.610.000,00	$ 230.610.000,00
1154	PI38-102555	Mejoramiento de competencias técnicas y humanas en el sector manufacturero, en el departamento del Valle del Cauca	PI38-102555/1/1/01/10	Vigencia Futura ordinaria	[illegible]	$ 45.000.000,00	$ -	$ -
1154	PI38-102555	Mejoramiento de competencias técnicas y humanas en el sector manufacturero, en el departamento del Valle del Cauca	PI38-102555/1/2/01/06	Vigencia Futura ordinaria	Articular con actores del sector manufacturero el procedimiento para la inserción laboral - vigencia futura	$ 5.005.000,00	$ -	$ -
1154	PI38-102555	Mejoramiento de competencias técnicas y humanas en el sector manufacturero, en el departamento del Valle del Cauca	PI38-102555/1/2/01/10	Vigencia Futura ordinaria	Realizar seguimiento para vinculación empresarial y/o formalizacion de emprendedores - Vigencia Futura	$ 5.005.000,00	$ -	$ -

PRINT novedad donde no se evidencian las actividades resaltadas en el cuadro anterior .

Reporte avance

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte | Validar

Recursos vigentes

Fuente de financiación	Apropiación inicial $	Apropiación vigente $	Acumulado compromisos $	Acumulado obligaciones $	Acumulado pagos $
Inversión - Departamentos - Valle del Cauca - Propios	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00
Inversión - Privadas - GESTIÓN - Propios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Total	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00

Reservas presupuestales

Fuente de financiación	Apropiación inicial $	Apropiación vigente $	Acumulado compromisos $	Acumulado obligaciones $	Acumulado pagos $
Inversión - Departamentos - Valle del Cauca - Propios	0,00	0,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
Inversión - Privadas - GESTIÓN - Propios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Total	0,00	0,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00

3:44 p.m.
3/06/2026

Reporte avance

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte | Validar

Etapa Inversión Costo total del producto $ 15.848.231.197,00 Fecha inicio 28/01/2025 Fecha fin 28/12/2025

Indicadores Total: 1

Indicador principal Personas capacitadas
Unidad de medida Número Meta total 3.200,0000 Es acumulativo Si

Total avance reportado
0,0000

Detalle indicador principal

Avance indicador principal

EDITAR | BORRAR

Vigencia/Periodo	Avance acumulado hasta el mes anterior	Avance ejecutado en el mes	Observación
2026/Mayo	100,0000	550,0000	El resultado refleja una eficacia del 100% en la

Resumen indicador principal

3:45 p.m.
3/06/2026

Financiero y cantidades ● Meta producto ● Regionalización ● Focalización Soportes ● Fin reporte

Objetivo: 1 Formar personas en competencias blandas y duras para el sector manufacturero.

Producto: 1.1 Servicio de educación informal (Producto principal del proyecto)

Actividad Realizar convocatoria para propiciar encuentro entre la oferta de empleo y los beneficiari ...VER MÁS	9.390.000,00	0,00	0,00	
Actividad Formar en competencias técnicas, blandas y administrativas según las necesidades del merca ...VER MÁS	0,00	0,00	0,00	
Actividad Realizar la confección, como fase práctica de un proceso de cierre de brechas de talento h ...VER MÁS	0,00	2.500.000.000,00	0,00	

1 2 >

Archivo plantilla carga masiva actividades DESCARGAR PLANTILLA PARA CARGUE MASIVO DE ACTIVIDADES:

EXAMINAR

11:59 a.m. 3/06/2026

Reporte avance

Financiero y cantidades ● Meta producto ● Regionalización ● Focalización Soportes ● Fin reporte

anterior $

Objetivo: 2 Articular mecanismos de apoyo directo a la población para la formalización del trabajo en sectores específicos.

Producto: 2.1 Servicio de colocación laboral


Actividad Articular con actores del sector manufacturero el procedimiento para la inserción laboral.	5.005.000,00	0,00	0,00	
Actividad Realizar seguimiento para vinculación empresarial y/o formalización de emprendedores	5.005.000,00	0,00	0,00	

< 1 2


Archivo plantilla carga masiva actividades DESCARGAR PLANTILLA PARA CARGUE MASIVO DE ACTIVIDADES:


EXAMINAR


12:00 p.m. 3/06/2026

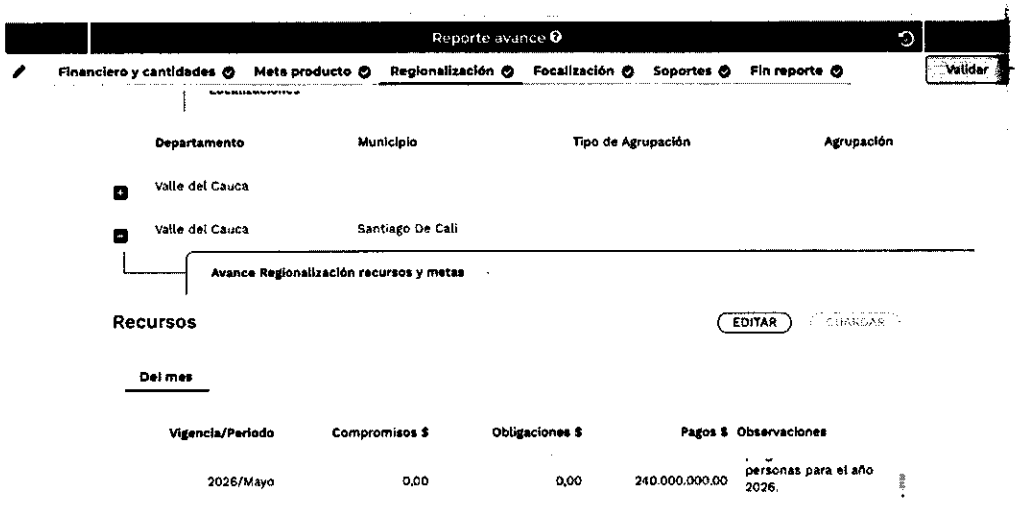
Reporte avance
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Departamento
Municipio
Tipo de Agrupación
Agrupación
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Santiago De Cali
Avance Regionalización recursos y metas
Recursos
EDITAR
Del mes
Vigencia/Periodo
Compromisos $
Obligaciones $
Pagos $
Observaciones
2026/Mayo
0,00
0,00
240.000.000,00
personas para el año 2026.

Metas

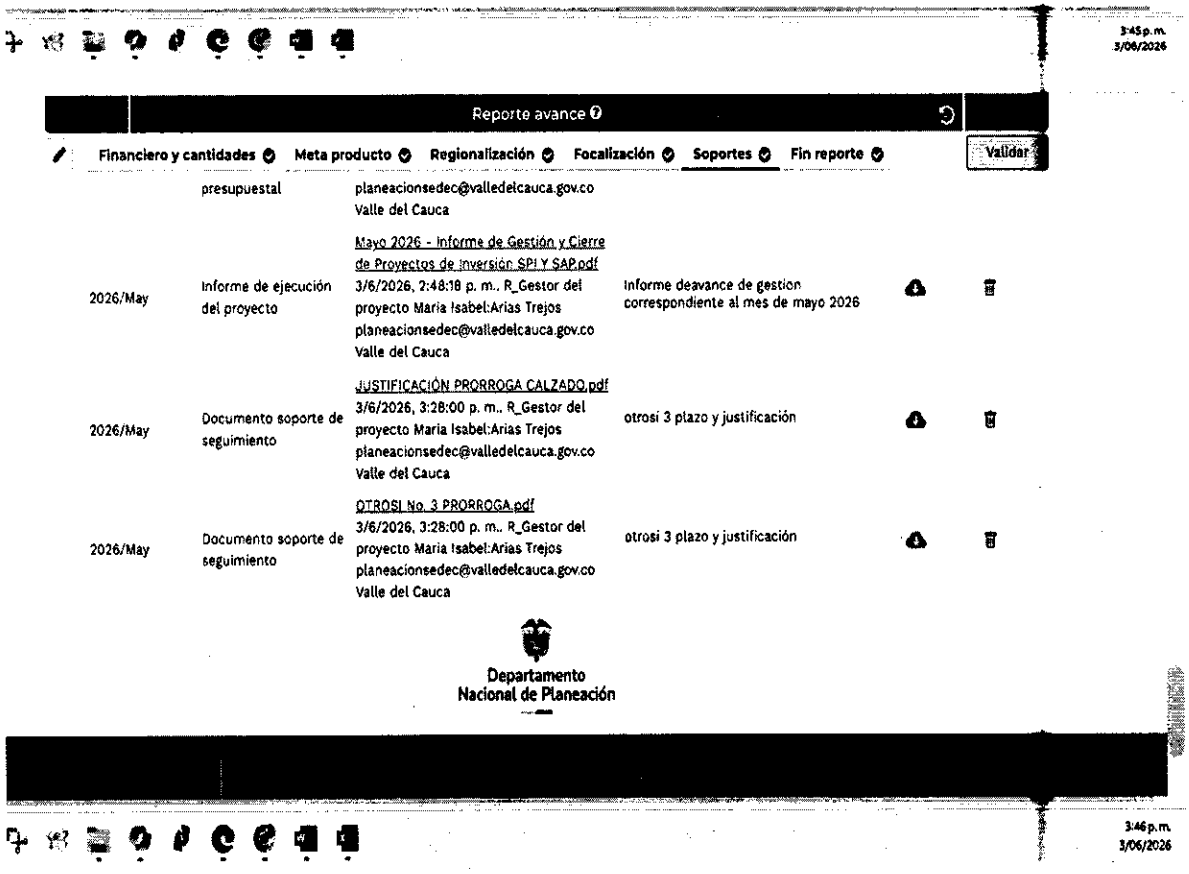
3:45 p.m.
3/06/2026
Reporte avance
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
presupuestal
planeacionsedec@valledelcauca.gov.co
Valle del Cauca
2026/May
Informe de ejecución del proyecto
Mayo 2026 - Informe de Gestión y Cierre de Proyectos de Inversión SPI Y SAP.pdf
3/6/2026, 2:48:18 p. m.. R_Gestor del proyecto Maria Isabel:Arias Trejos
planeacionsedec@valledelcauca.gov.co
Valle del Cauca
Informe deavance de gestion correspondiente al mes de mayo 2026
2026/May
Documento soporte de seguimiento
JUSTIFICACIÓN PRORROGA CALZADO.pdf
3/6/2026, 3:28:00 p. m.. R_Gestor del proyecto Maria Isabel:Arias Trejos
planeacionsedec@valledelcauca.gov.co
Valle del Cauca
otrosi 3 plazo y justificación
2026/May
Documento soporte de seguimiento
OTROSI No. 3 PRORROGA.pdf
3/6/2026, 3:28:00 p. m.. R_Gestor del proyecto Maria Isabel:Arias Trejos
planeacionsedec@valledelcauca.gov.co
Valle del Cauca
otrosi 3 plazo y justificación
Departamento Nacional de Planeación
3:46 p.m.
3/06/2026

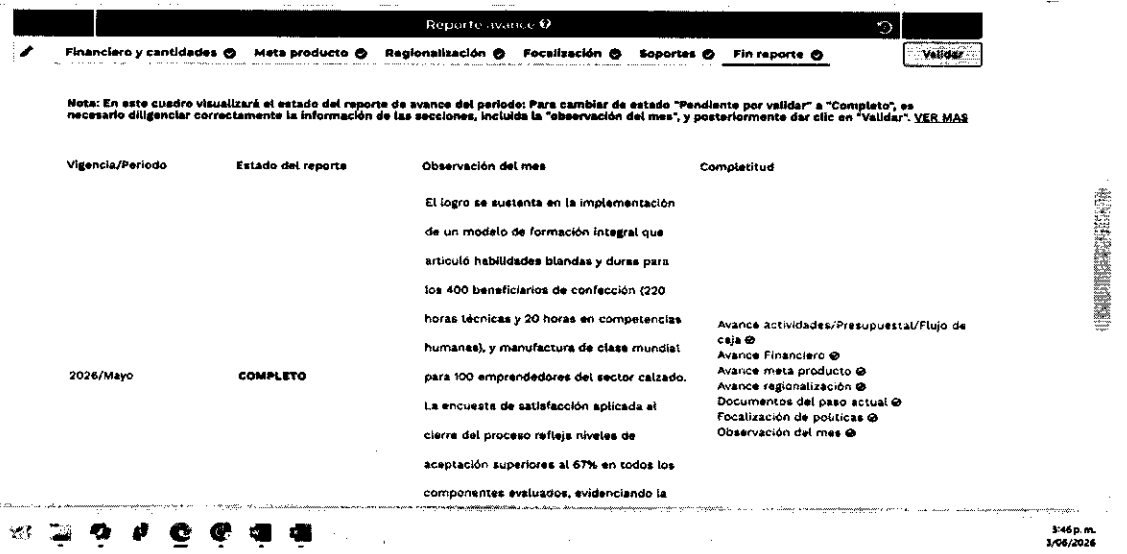




Reporte avance ejecución

Proceso: EJ-SYC-0376-0077 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 27-01-2025 Fecha fin:

ID: 1004794 BPIN: 2024003760114 Periodo(s) abierto(s): 2026 Mayo(11/05/2026 - 05/06/2026),

Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL VALLE DEL CAUCA. VALLE DEL CAUCA Entidad: Valle del Cauca Sector: Comercio, industria y turismo Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $24.563.100.000,00 Apropiación inicial: $5.900.000.000,00 Apropiación vigente: $5.900.000.000,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $5.900.000.000,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: Ejecutor: Valle del Cauca Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

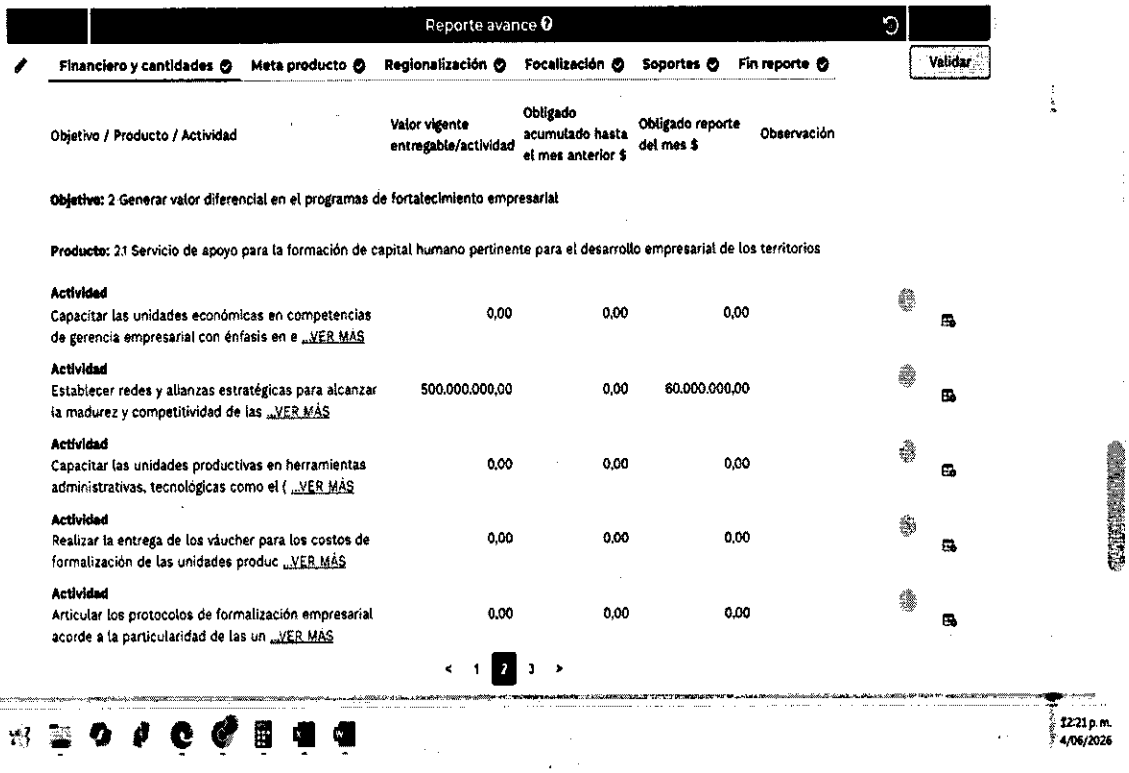

Reporte avance

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte | Validar

Objetivo / Producto / Actividad	Valor vigente entregable/actividad	Obligado acumulado hasta el mes anterior $	Obligado reporte del mes $	Observación
Objetivo: 1 Asistir técnicamente a las unidades económicas del Valle del Cauca.				
Producto: 1.1 Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio (Producto principal del proyecto)				
Actividad Asistir técnicamente a los articuladores del ecosistema empresarial, competitivo y de inte ...VER MAS	645.000.000,00	430.000.000,00	105.000.000,00	
Actividad Asistir técnicamente las unidades económicas en el aprendizaje práctico de habilidades de ...VER MAS	4.755.000.000,00	3.147.000.000,00	809.500.000,00	

1 2 3 >

Archivo plantilla carga masiva actividades DESCARGAR PLANTILLA PARA CARGUE MASIVO DE ACTIVIDADES:

EXAMINAR

12:20 p.m.
4/06/2026

Reporte avance

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte | Validar

Periodos abiertos 2026/Mayo

Periodos cerrados Periodo

Abierto	2026/Mayo	11/05/2026 - 05/06/2026	Ejecución acumulada $	4.551.500.000,00

EDITAR

En los campos de Compromisos, Obligaciones y Pagos, registre el valor correspondiente al avance financiero acumulado con corte al periodo a reportar.

Recursos vigentes

Fuente de financiación	Apropiación inicial $	Apropiación vigente $	Acumulado compromisos $	Acumulado obligaciones $	Acumulado pagos $
Inversión - Departamentos - Valle del Cauca - Propios	5.900.000.000,00	5.900.000.000,00	5.700.000.000,00	4.551.500.000,00	3.577.000.000,00
Inversión - Privadas - RECURSOS DE GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD - Propios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Total	5.900.000.000,00	5.900.000.000,00	5.700.000.000,00	4.551.500.000,00	3.577.000.000,00

12:20 p.m.
4/06/2026

Reporte avance

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte | Validar

Vigencia/Periodo	Avance acumulado hasta el mes anterior	Avance ejecutado en el mes	Observación
2026/Mayo	612,0000	148,0000	se realizaron 148 asistencias tecnicas a

Resumen indicador principal

Vigencia	Meta en firme	Avance total meta por vigencia
2024	0,0000	1.000,0000
2025	1.150,0000	2.234,0000
2026	1.700,0000	760,0000

Objetivo 2
Generar valor diferencial en el programas de fortalecimiento empresarial

12:19 p.m.
4/06/2026

Reporte avance

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte | Validar

Periodo	Comparativo	Compromisos $	Obligaciones $	Pagos $
2026/Enero	Valores de la fuente	5.700.000.000,00	246.800.000,00	0,00
2026/Febrero	Valores de la fuente	5.700.000.000,00	1.762.000.000,00	0,00
2026/Marzo	Valores de la fuente	5.700.000.000,00	2.694.000.000,00	1.762.000.000,00
2026/Abril	Valores de la fuente	5.700.000.000,00	3.577.000.000,00	2.694.000.000,00
2026/Mayo	Valores de la fuente	5.700.000.000,00	4.551.500.000,00	3.577.000.000,00
2026/Enero	Regionalizado Acumulado a	5.700.000.000,00	246.800.000,00	0,00
2026/Febrero	Regionalizado Acumulado a	5.700.000.000,00	1.762.000.000,00	0,00
2026/Marzo	Regionalizado Acumulado a	5.700.000.000,00	2.694.000.000,00	1.762.000.000,00
2026/Abril	Regionalizado Acumulado a	5.700.000.000,00	3.577.000.000,00	2.694.000.000,00
2026/Mayo	Regionalizado Acumulado a	5.700.000.000,00	4.551.500.000,00	3.577.000.000,00

12:18 p.m.
4/06/2026

Reporte avance

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte | Validar

2026/Feb	Informe de ejecución del proyecto	2026 feb .pdf 4/3/2026, 3:44:54 p. m.. R_Gestor del proyecto Maria Isabel:Arias Trejos planeacionsedec@valledelcauca.gov.co Valle del Cauca	Adjunto informe de seguimiento correspondiente al mes de febrero de	
2026/Abr	Documento soporte de seguimiento	FO-M1-P1-28 Informe SPI Y SAP Abril 2026.pdf 4/5/2026, 4:37:39 p. m.. R_Gestor del proyecto Maria Isabel:Arias Trejos planeacionsedec@valledelcauca.gov.co Valle del Cauca	Adjunto informe de avance de actividades correspondiente al mes de	
2026/Abr	Documento soporte de seguimiento	PIIP ABRIL 2026.pdf 4/5/2026, 4:37:39 p. m.. R_Gestor del proyecto Maria Isabel:Arias Trejos planeacionsedec@valledelcauca.gov.co Valle del Cauca	Adjunto informe de avance de actividades correspondiente al mes de	
2026/May	informe de ejecución del proyecto	FO-M1-P1-28 Informe SPI Y SAP Mayo 2026.pdf 4/6/2026, 12:11:55 p. m.. R_Gestor del proyecto Maria Isabel:Arias Trejos planeacionsedec@valledelcauca.gov.co Valle del Cauca	adjunto informe de seguimiento correspondiente al mes de mayo 2026	

Departamento Nacional de Planeación

12:17 p. m.
4/06/2026

Reporte avance

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte | Validar

Abierto | 2026/Mayo. 11/05/2026 - 05/06/2026


Fecha y hora validación Reporte de avance mensual : 04/06/2026 12:15:21
CC27373988

EDITAR

Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". VER MAS

Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Completitud
2026/Mayo	**COMPLETO**	Dando cumplimiento a la meta la asistencia tecnica se fortalecieron 148 unidades economicas en habilidades de Gestión Financiera, Legalidad y Formalización, Planeación Estratégica, Modelo de Negocio, Finanzas y Emprendimiento.	Avance actividades/Presupuesta/Flujo de caja Avance Financiero Avance meta producto Avance regionalización Documentos del paso actual Focalización de políticas Observación del mes


12:17 p. m.
4/06/2026

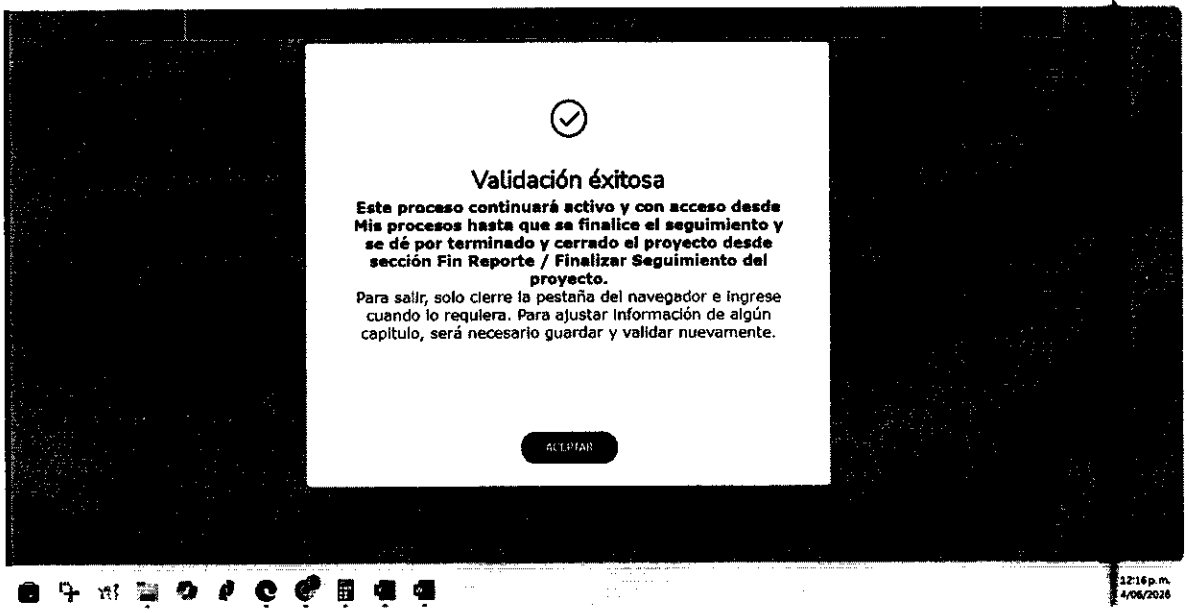

Reporte avance ejecución

Proceso: EJ-SYC-0376-0103 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 28-01-2025 Fecha fin:


ID: 1000368 BPIN: 2024003760096 Periodo(s) abierto(s): 2026 Mayo(11/05/2026 - 05/06/2026),Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN EN EL VALLE DEL CAUCA Entidad: Valle del Cauca Sector: Comercio, industria y turismo Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $8.000.000.000,00 Apropiación inicial: $4.000.000.000,00 Apropiación vigente: $4.000.000.000,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $4.000.000.000,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: Ejecutor: Valle del Cauca Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida





En los campos de Compromisos, Obligaciones y Pagos, registre el valor correspondiente al avance financiero acumulado con corte al periodo a reportar.

Recursos vigentes

Fuente de financiación	Apropiación inicial $	Apropiación vigente $	Acumulado compromisos $	Acumulado obligaciones $	Acumulado pagos $
Inversión - Departamentos - Valle del Cauca - Propios	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	3.150.000.000,00	2.800.000.000,00	500.000.000,00
Inversión - Privadas - RECURSOS DE GESTIÓN - Propios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Total	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	3.150.000.000,00	2.800.000.000,00	500.000.000,00

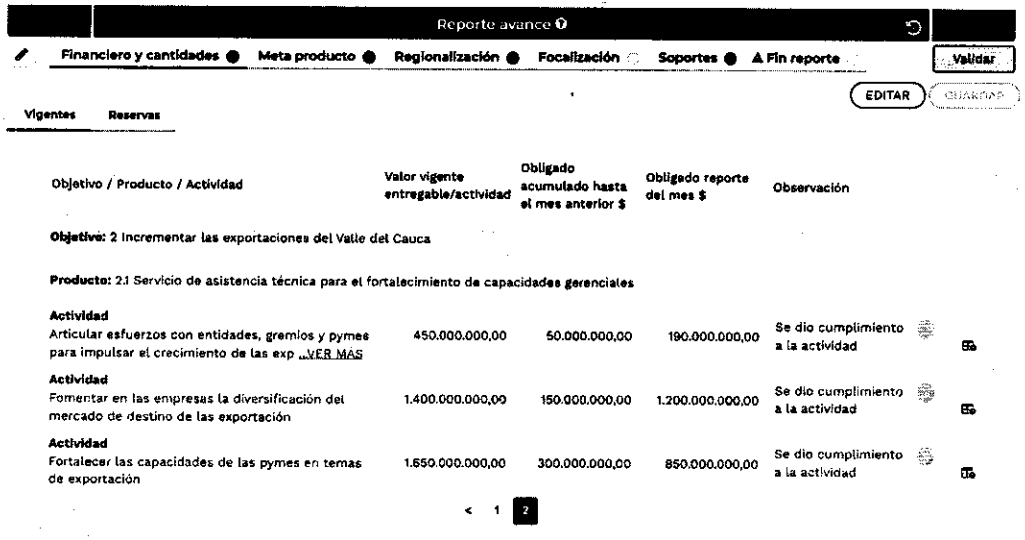

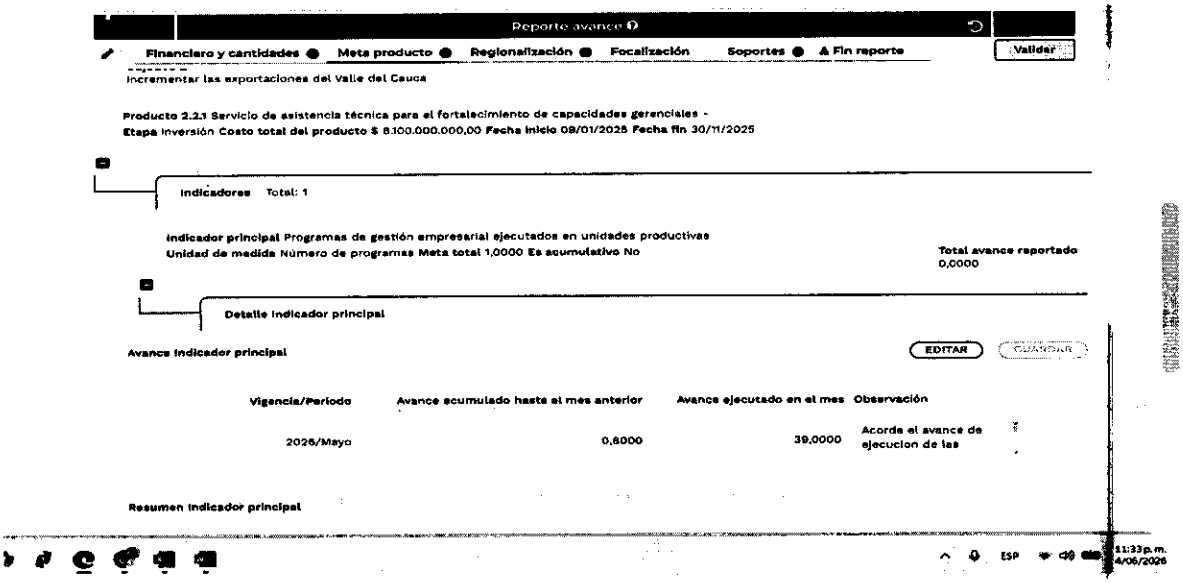
Reporte avance
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Incrementar las exportaciones del Valle del Cauca
Producto 2.2.1 Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades gerenciales -
Etapa Inversión Costo total del producto $ 8.100.000.000,00 Fecha inicio 08/01/2025 Fecha fin 30/11/2025
Indicadores Total: 1
Indicador principal Programas de gestión empresarial ejecutados en unidades productivas
Unidad de medida Número de programas Meta total 1,0000 Es acumulativo No
Total avance reportado 0,0000
Detalle indicador principal
Avance indicador principal
EDITAR
GUARDAR
Vigencia/Periodo
Avance acumulado hasta el mes anterior
Avance ejecutado en el mes
Observación
2026/Mayo
0,8000
39,0000
Acorde al avance de ejecucion de las
Resumen indicador principal
ESP
11:33 p. m.
4/06/2026

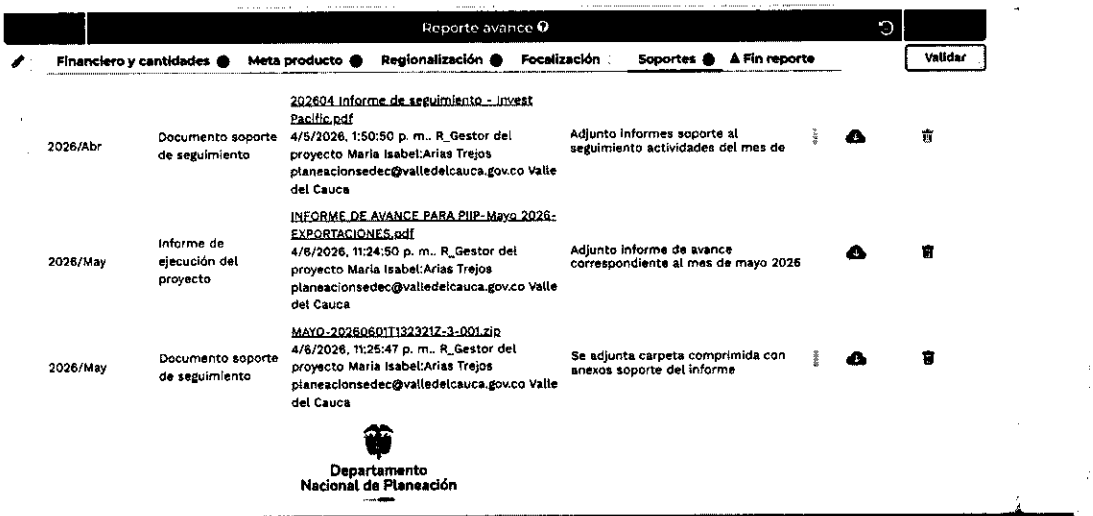

Reporte avance
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
2026/Abr
Documento soporte de seguimiento
202604 Informe de seguimiento - Invest Pacific.pdf
4/5/2026, 1:50:50 p. m.. R_Gestor del proyecto Maria Isabel:Arias Trejos planeacionsedec@valledelcauca.gov.co Valle del Cauca
Adjunto informes soporte al seguimiento actividades del mes de
2026/May
Informe de ejecución del proyecto
INFORME DE AVANCE PARA PIIP-Mayo 2026-EXPORTACIONES.pdf
4/6/2026, 11:24:50 p. m.. R_Gestor del proyecto Maria Isabel:Arias Trejos planeacionsedec@valledelcauca.gov.co Valle del Cauca
Adjunto informe de avance correspondiente al mes de mayo 2026
2026/May
Documento soporte de seguimiento
MAYO-20260601T132321Z-3-001.zip
4/6/2026, 11:25:47 p. m.. R_Gestor del proyecto Maria Isabel:Arias Trejos planeacionsedec@valledelcauca.gov.co Valle del Cauca
Se adjunta carpeta comprimida con anexos soporte del informe
Departamento Nacional de Planeación
Plataforma Integrada de Inversión Public
Contacto
ESP
11:34 p. m.
4/06/2026

Reporte avance


Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte | Validar

Periodo	Comparativo	Compromisos $	Obligaciones $	Pagos $
2026/Enero	Valores de la fuente	650.000.000,00	0,00	0,00
2026/Febrero	Valores de la fuente	3.150.000.000,00	0,00	0,00
2026/Marzo	Valores de la fuente	3.150.000.000,00	200.000.000,00	0,00
2026/Abril	Valores de la fuente	3.150.000.000,00	500.000.000,00	200.000.000,00
2026/Mayo	Valores de la fuente	3.150.000.000,00	2.800.000.000,00	500.000.000,00
2026/Enero	Regionalizado Acumulado a	650.000.000,00	0,00	0,00
2026/Febrero	Regionalizado Acumulado a	3.150.000.000,00	0,00	0,00
2026/Marzo	Regionalizado Acumulado a	3.150.000.000,00	200.000.000,00	0,00
2026/Abril	Regionalizado Acumulado a	3.150.000.000,00	500.000.000,00	200.000.000,00
2026/Mayo	Regionalizado Acumulado a	3.150.000.000,00	2.800.000.000,00	500.000.000,00

ESP 11:34 p. m. 4/06/2026



ESP 11:29 p. m. 4/06/2026

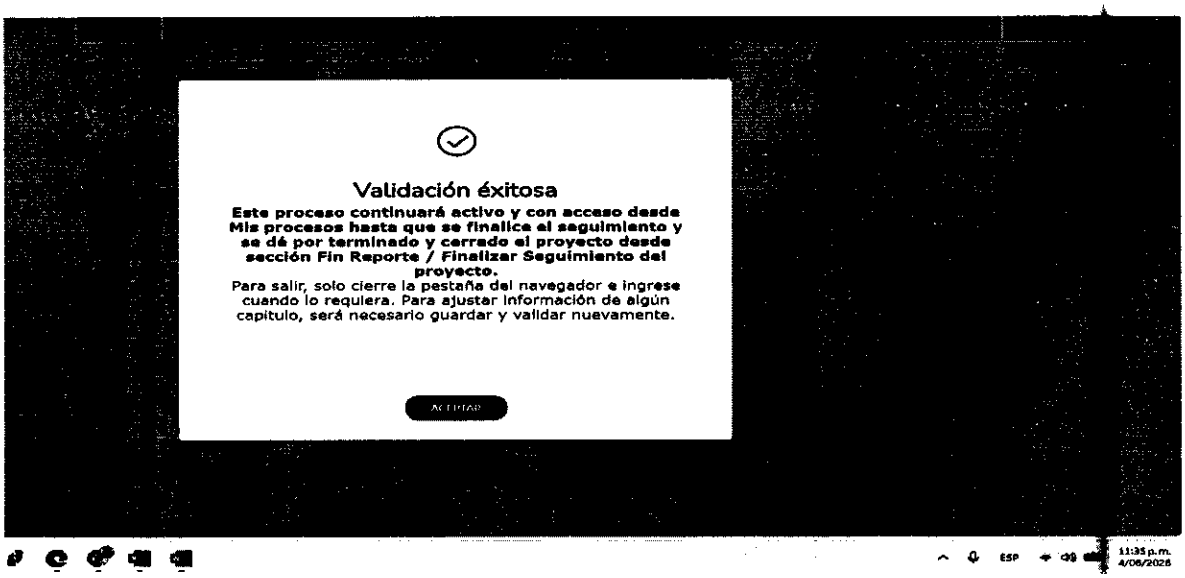


Reporte avance ejecución

Proceso: EJ-SYC-0376-0363 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 27-02-2026 Fecha fin:

ID: 1636065 BPIN: 202500000045486 Periodo(s) abierto(s): 2026 Mayo(11/05/2026 - 05/06/2026),

Nombre de proyecto: INCREMENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Entidad: Valle del Cauca Sector: Comercio, industria y turismo Estado: En Ejecucion Horizonte: 2026 - 2027 Valor total: $4.698.000.000,00 Apropiación inicial: $200.000.000,00 Apropiación vigente: $200.000.000,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $200.000.000,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Fortalecer la articulación del ecosistema regional de cooperación internacional mediante espacios de coordinación, planeación conjunta y gobernanza colaborativa Documentos normativos (Producto principal del proyecto) , Medido a través de: Número de documentos, Cantidad: 4 con el fin de Incrementar las capacidades institucionales de las entidades públicas para gestionar de forma estratégica la cooperación internacional en los territorios del Valle del Cauca, con el fin de potenciar su competitividad y desarrollo. 350204800-Documentos realizados, Número, 4 Valle del Cauca Costo total del proyecto: Ejecutor: Valle del Cauca Fecha real de inicio: 02-01-2026 PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

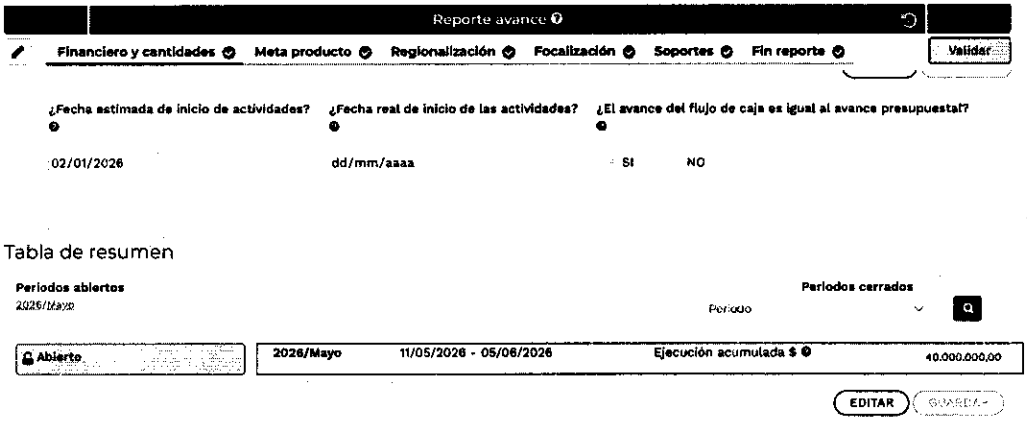


En los campos de Compromisos, Obligaciones y Pagos, registre el valor correspondiente al avance financiero acumulado con corte al periodo a reportar.

Recursos vigentes

Fuente de financiación	Apropiación inicial $	Apropiación vigente $	Acumulado compromisos $	Acumulado obligaciones $	Acumulado pagos $
Inversión - Departamentos - Valle del Cauca - Propios	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
Inversión - Privadas - Recursos de Gestion - Propios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



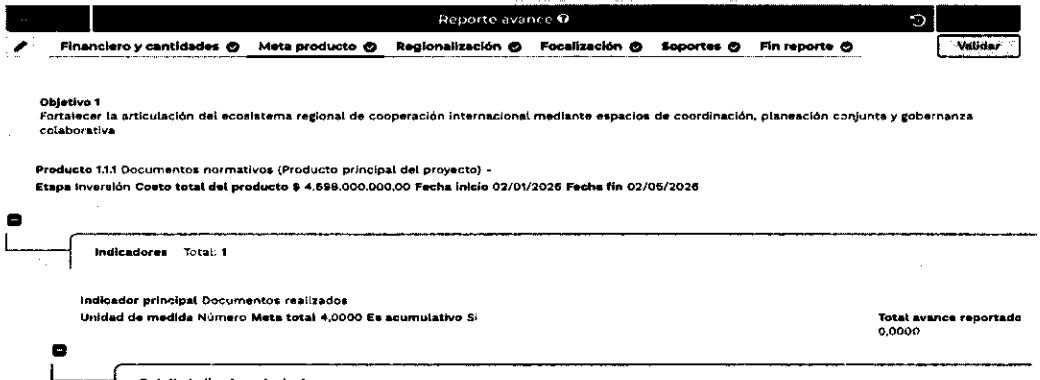

Vigencia/Periodo	Avance acumulado hasta el mes anterior	Avance ejecutado en el mes	Observación
2026/Mayo	0,0000	0,0000	El proyecto se encuentra en ejecución



Reporte avance

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte | Validar

Periodo	Comparativo	Compromisos $	Obligaciones $	Pagos $
2026/Enero	Valores de la fuente	0,00	0,00	0,00
2026/Febrero	Valores de la fuente	200.000.000,00	0,00	0,00
2026/Marzo	Valores de la fuente	200.000.000,00	0,00	0,00
2026/Abril	Valores de la fuente	200.000.000,00	40.000.000,00	0,00
2026/Mayo	Valores de la fuente	200.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2026/Enero	Regionalizado Acumulado a	0,00	0,00	0,00
2026/Febrero	Regionalizado Acumulado a	200.000.000,00	0,00	0,00
2026/Marzo	Regionalizado Acumulado a	200.000.000,00	0,00	0,00
2026/Abril	Regionalizado Acumulado a	200.000.000,00	40.000.000,00	0,00
2026/Mayo	Regionalizado Acumulado a	200.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00


ESP 11:58 p. m. 4/06/2026


Reporte avance

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte | Validar

	de seguimiento	proyecto María Isabel:Arias Trejos planeacionsedec@valledelcauca.gov.co Valle del Cauca	soporte correspondiente al avance de		
2026/May	Informe de ejecución del proyecto	Firmado- Mayo - Cooperación.pdf 4/6/2026, 11:49:56 p. m.. R_Gestor del proyecto María Isabel:Arias Trejos planeacionsedec@valledelcauca.gov.co Valle del Cauca	Adjunto informe de seguimiento correspondiente al mes de mayo 2026		
2026/May	Documento soporte de seguimiento	Correo documentos Coimbra para CIAT.pdf 4/6/2026, 11:51:30 p. m.. R_Gestor del proyecto María Isabel:Arias Trejos planeacionsedec@valledelcauca.gov.co Valle del Cauca	Documentos soporte al informe de avance del mes de mayo 2026		
2026/May	Documento soporte de seguimiento	Envío documento base - Guía de comunicación institucional.pdf 4/6/2026, 11:51:30 p. m.. R_Gestor del proyecto María Isabel:Arias Trejos planeacionsedec@valledelcauca.gov.co Valle del Cauca	Documentos soporte al informe de avance del mes de mayo 2026		
2026/May	Documento soporte de seguimiento	Correo - Curso BID APC.pdf 4/6/2026, 11:51:30 p. m.. R_Gestor del proyecto María Isabel:Arias Trejos planeacionsedec@valledelcauca.gov.co Valle del Cauca	Documentos soporte al informe de avance del mes de mayo 2026		
2026/May	Documento soporte de seguimiento	Correo articulación Yumbo.pdf 4/6/2026, 11:51:30 p. m.. R_Gestor del proyecto María Isabel:Arias Trejos planeacionsedec@valledelcauca.gov.co Valle del Cauca	Documentos soporte al informe de avance del mes de mayo 2026		


ESP 11:58 p. m. 4/06/2026

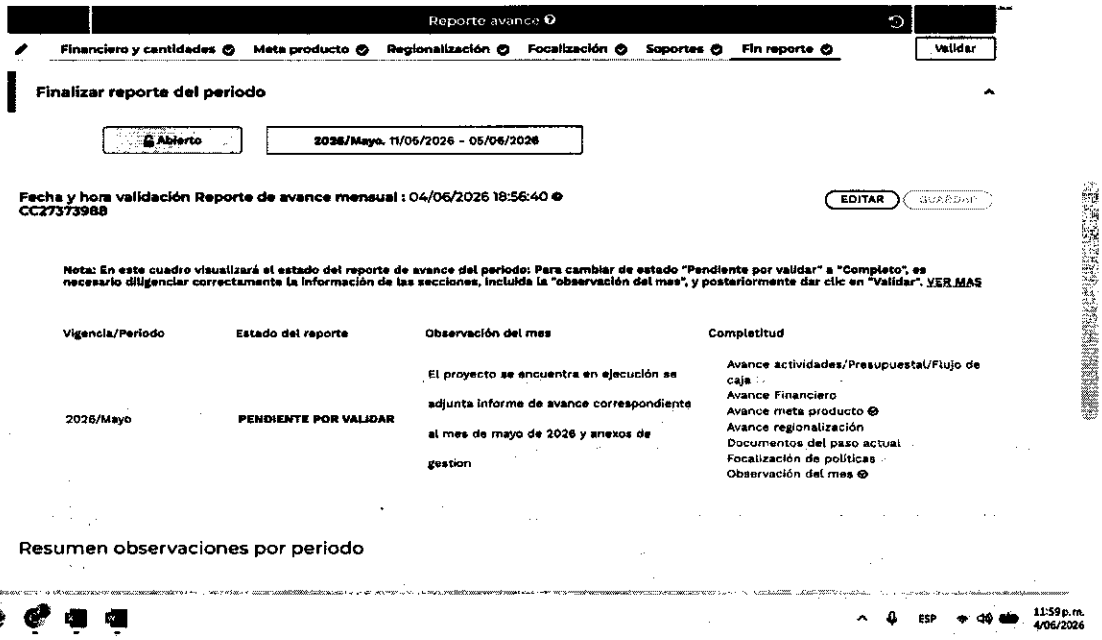

Reporte avance
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2026/Mayo. 11/06/2026 - 05/06/2026
Fecha y hora validación Reporte de avance mensual : 04/06/2026 18:56:40
CC27373988
EDITAR
Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". VER MAS
Vigencia/Periodo
Estado del reporte
Observación del mes
Completitud
2026/Mayo
PENDIENTE POR VALIDAR
El proyecto se encuentra en ejecución se adjunta informe de avance correspondiente al mes de mayo de 2026 y anexos de gestion
Avance actividades/Presupuesta/Flujo de caja
Avance Financiero
Avance meta producto
Avance regionalización
Documentos del paso actual
Focalización de políticas
Observación del mes
Resumen observaciones por periodo
ESP
11:59 p.m.
4/06/2026

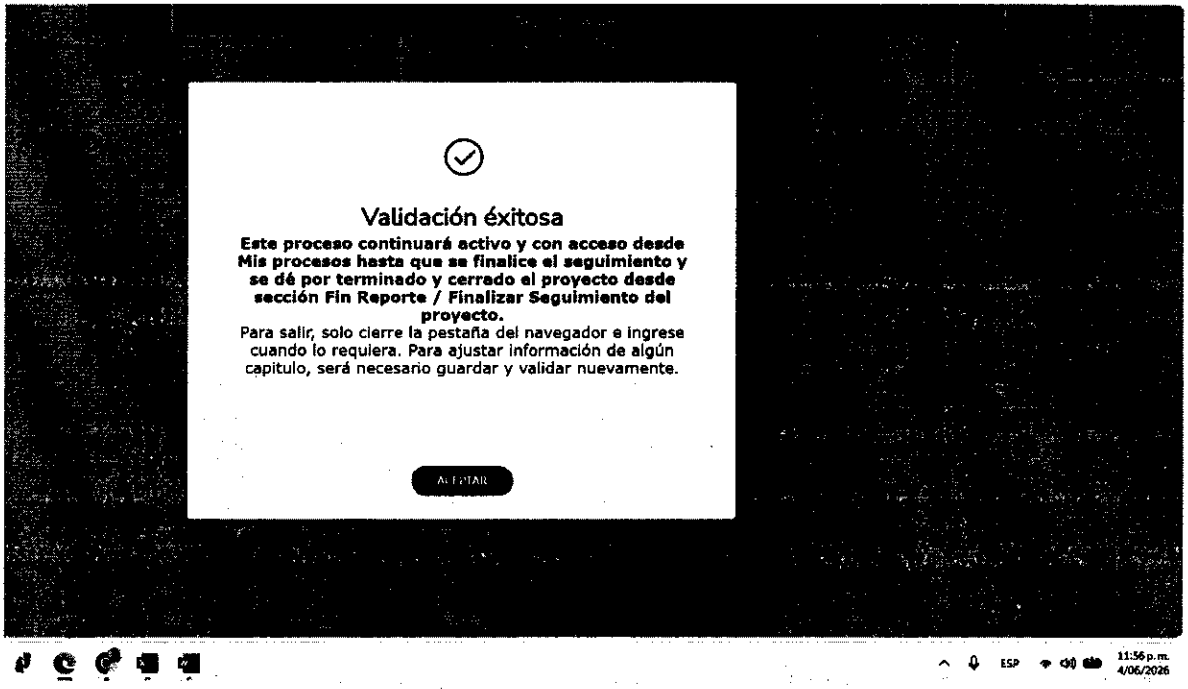
Validación éxitosa
Este proceso continuará activo y con acceso desde Mis procesos hasta que se finalice el seguimiento y se dé por terminado y cerrado el proyecto desde sección Fin Reporte / Finalizar Seguimiento del proyecto.
Para salir, solo cierre la pestaña del navegador e ingrese cuando lo requiera. Para ajustar información de algún capitulo, será necesario guardar y validar nuevamente.
ACEPTAR
ESP
11:56 p.m.
4/06/2026

Reporte avance ejecución

Proceso: EJ-SYC-0376-0307 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 29-10-2025 Fecha fin: ID: 1429461 BPIN: 202500000023888 Periodo(s) abierto(s): 2026 Mayo(11/05/2026 - 05/06/2026), Nombre de proyecto: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE INNOVACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA COMPETITIVIDAD, EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA INCLUSIÓN SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Entidad: Valle del Cauca Sector: Ciencia, tecnología e innovación Estado: En Ejecucion Horizonte: 2025 - 2027 Valor total: $11.050.000.000,00 Apropiación inicial: $1.950.000.000,00 Apropiación vigente: $1.950.000.000,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $1.950.000.000,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: El proyecto tendrá un impacto estratégico y transformador en el departamento del Valle del Cauca, al consolidarse como una iniciativa clave para cerrar brechas tecnológicas, sociales y económicas mediante la promoción de la innovación, la inteligencia artificial y la inclusión digital. Desde una perspectiva de impacto económico, el centro contribuirá al fortalecimiento del tejido productivo regional al facilitar el acceso a tecnologías de vanguardia, fomentar la creación de nuevos modelos de negocio basados en

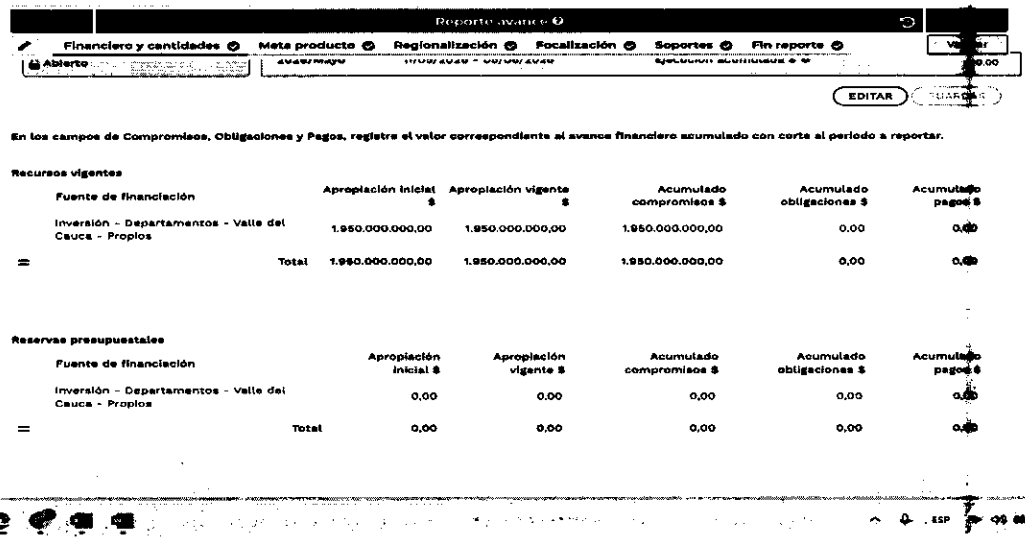

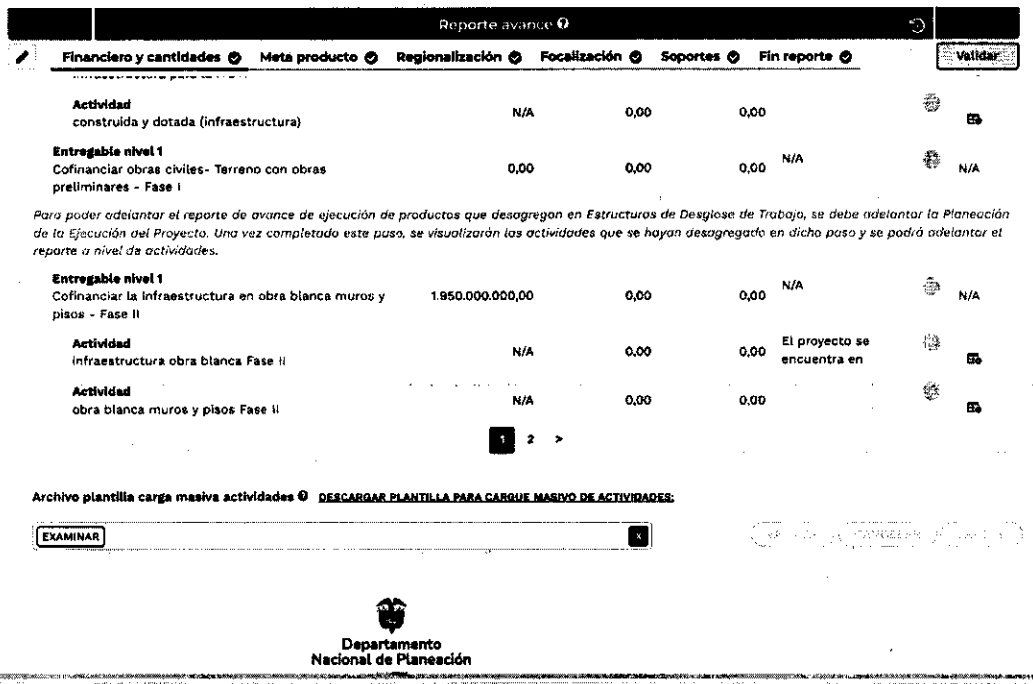

Reporte avance

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte | Validar

Actividad construida y dotada (infraestructura)	N/A	0,00	0,00		
Entregable nivel 1 Cofinanciar obras civiles- Terreno con obras preliminares - Fase I	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A

Para poder adelantar el reporte de avance de ejecución de productos que desagregan en Estructuras de Desglose de Trabajo, se debe adelantar la Planeación de la Ejecución del Proyecto. Una vez completado este paso, se visualizarán las actividades que se hayan desagregado en dicho paso y se podrá adelantar el reporte a nivel de actividades.

Entregable nivel 1 Cofinanciar la infraestructura en obra blanca muros y pisos - Fase II	1.950.000.000,00	0,00	0,00	N/A	N/A
Actividad infraestructura obra blanca Fase II	N/A	0,00	0,00	El proyecto se encuentra en	
Actividad obra blanca muros y pisos Fase II	N/A	0,00	0,00		


1 2 >

Archivo plantilla carga masiva actividades DESCARGAR PLANTILLA PARA CARGUE MASIVO DE ACTIVIDADES:

EXAMINAR

Departamento Nacional de Planeación

ESP 12:08 a.m. 5/06/2026

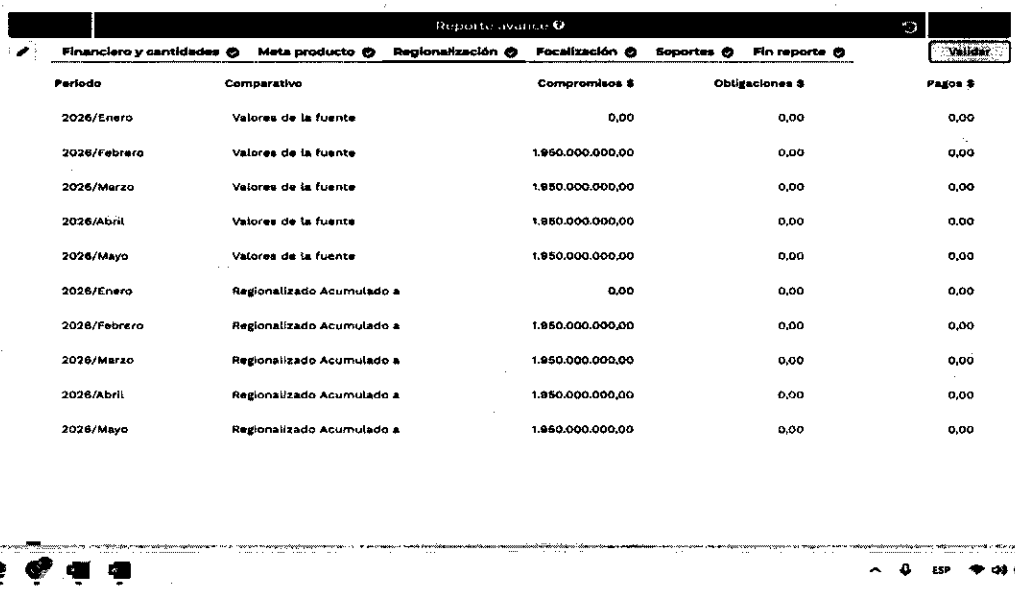


Reporte avance

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte | Validar

Periodo	Comparativo	Compromisos $	Obligaciones $	Pagos $
2026/Enero	Valores de la fuente	0,00	0,00	0,00
2026/Febrero	Valores de la fuente	1.950.000.000,00	0,00	0,00
2026/Marzo	Valores de la fuente	1.950.000.000,00	0,00	0,00
2026/Abril	Valores de la fuente	1.950.000.000,00	0,00	0,00
2026/Mayo	Valores de la fuente	1.950.000.000,00	0,00	0,00
2026/Enero	Regionalizado Acumulado a	0,00	0,00	0,00
2026/Febrero	Regionalizado Acumulado a	1.950.000.000,00	0,00	0,00
2026/Marzo	Regionalizado Acumulado a	1.950.000.000,00	0,00	0,00
2026/Abril	Regionalizado Acumulado a	1.950.000.000,00	0,00	0,00
2026/Mayo	Regionalizado Acumulado a	1.950.000.000,00	0,00	0,00

ESP 12:09 a.m. 5/06/2026

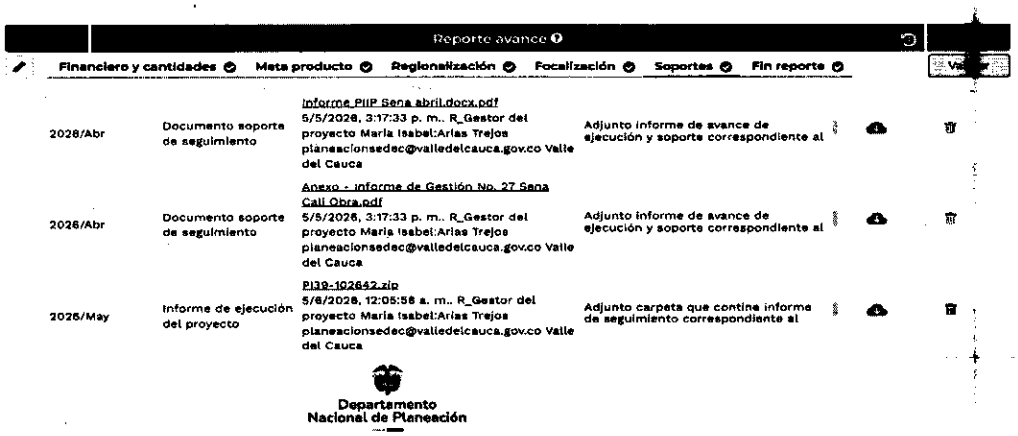



Reporte avance


Financiero y cantidades	Meta producto	Regionalización	Focalización	Soportes	Fin reporte	Ve

2026/Abr	Documento soporte de seguimiento	Informe PIIP Sena abril.docx.pdf 5/5/2026, 3:17:33 p. m.. R_Gestor del proyecto Maria Isabel:Arias Trejos planeacionsedec@valledelcauca.gov.co Valle del Cauca	Adjunto informe de avance de ejecución y soporte correspondiente al			
2026/Abr	Documento soporte de seguimiento	Anexo - Informe de Gestión No. 27 Sena Cali Obra.pdf 5/5/2026, 3:17:33 p. m.. R_Gestor del proyecto Maria Isabel:Arias Trejos planeacionsedec@valledelcauca.gov.co Valle del Cauca	Adjunto informe de avance de ejecución y soporte correspondiente al			
2026/May	Informe de ejecución del proyecto	PI39-102642.zip 5/6/2026, 12:05:56 a. m.. R_Gestor del proyecto Maria Isabel:Arias Trejos planeacionsedec@valledelcauca.gov.co Valle del Cauca	Adjunto carpeta que contine informe de seguimiento correspondiente al			

Departamento Nacional de Planeación



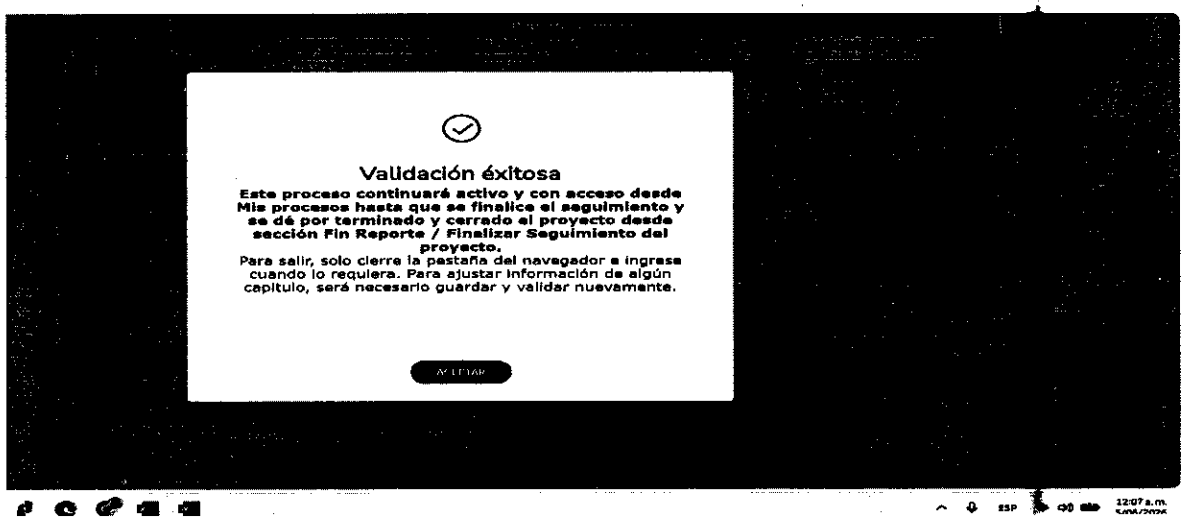

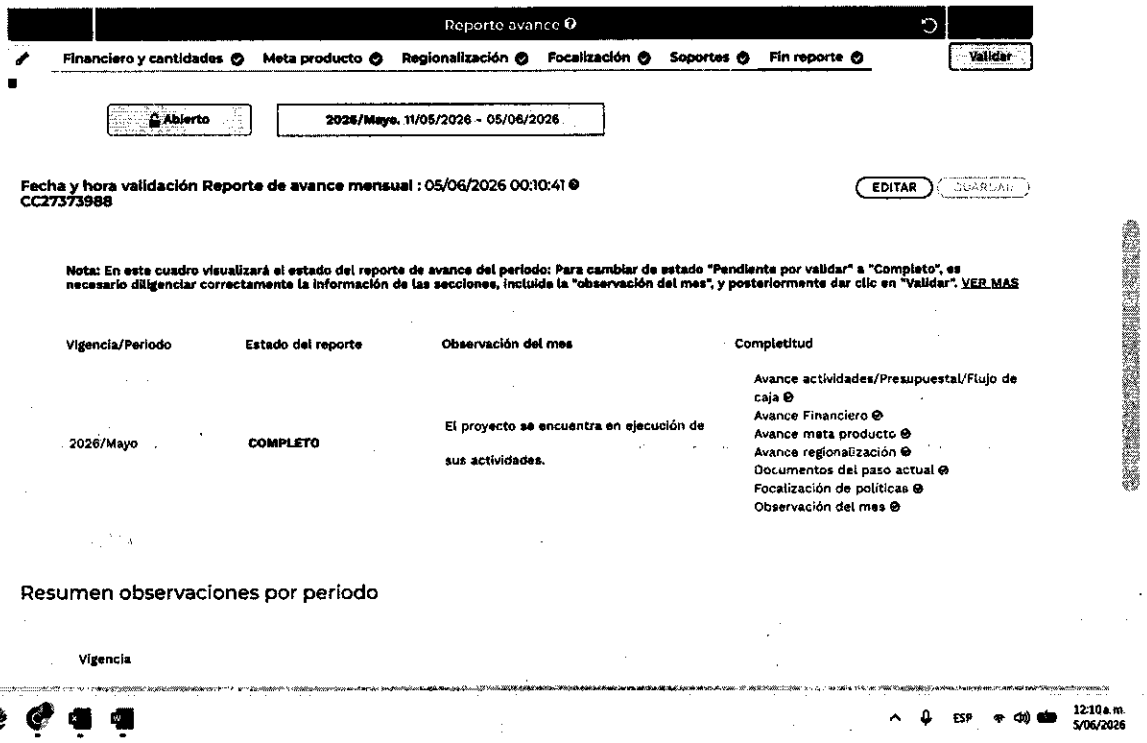



ACTIVIDADES 6: adjunto registro fotográfico y lista de asistencia de las mesas de trabajo y reuniones acorde lo requerido en función de los proyectos de inversión de la SEDECFE.


Asi mismo, evidencia de capacitaciones recibidad de parte del DNP refrente a ajustes realizados en plataforma PIIP y sobre la migración de los proyectos del sistema general de regalías a la plataforma.




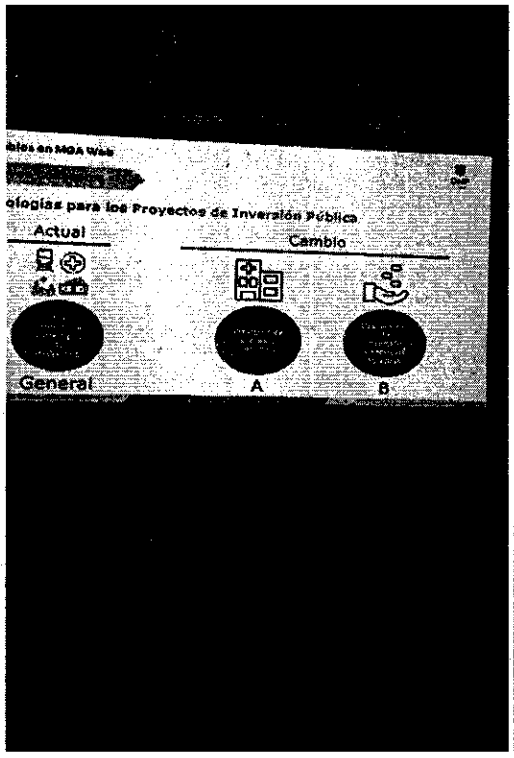




ales en MGA Web
ologías para los Proyectos de Inversión Pública
Actual
Cambio
General
A
B

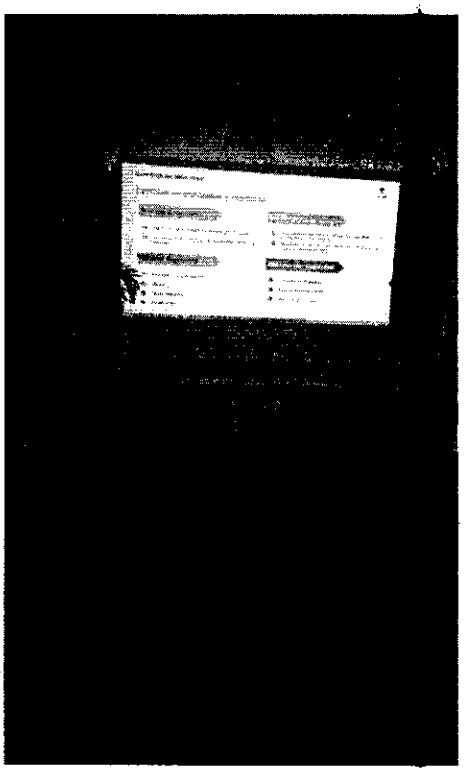

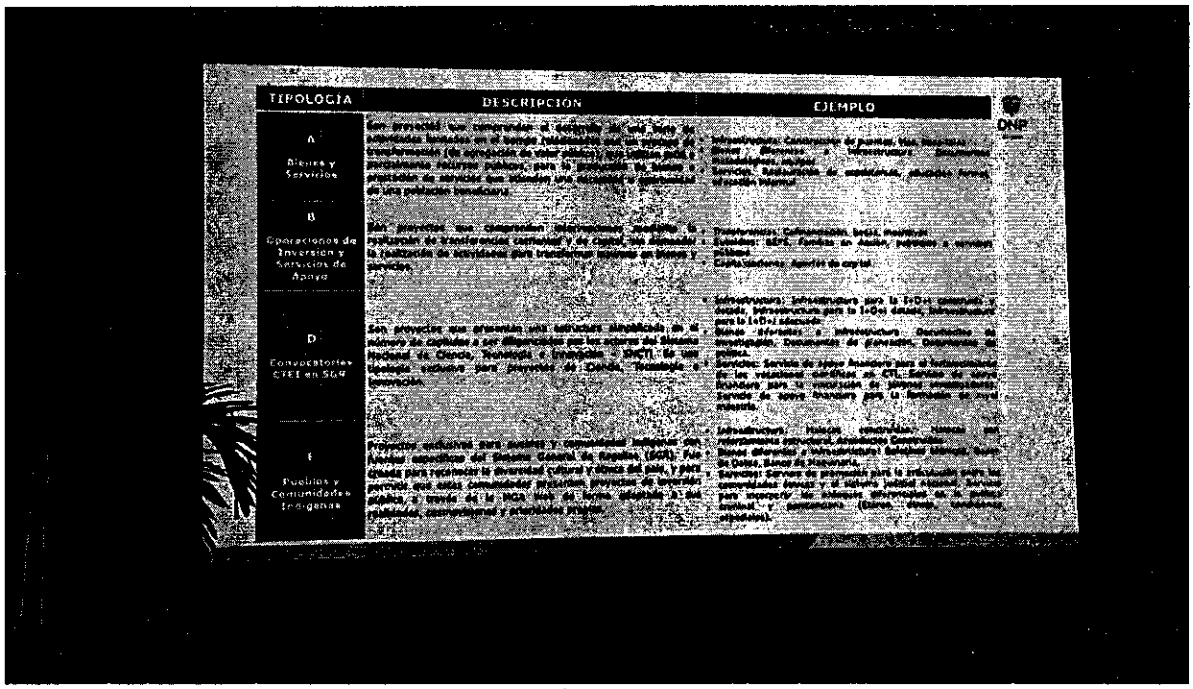
TIPOLOGIA
DESCRIPCIÓN
EJEMPLO
A
Bienes y Servicios
B
Operaciones de Inversión y Servicios de Apoyo
D
Conocimiento CTEI en SGR
E
Pueblos y Comunidades Indígenas
DNP


Cambios en MGA Web
Regionalización
DNP

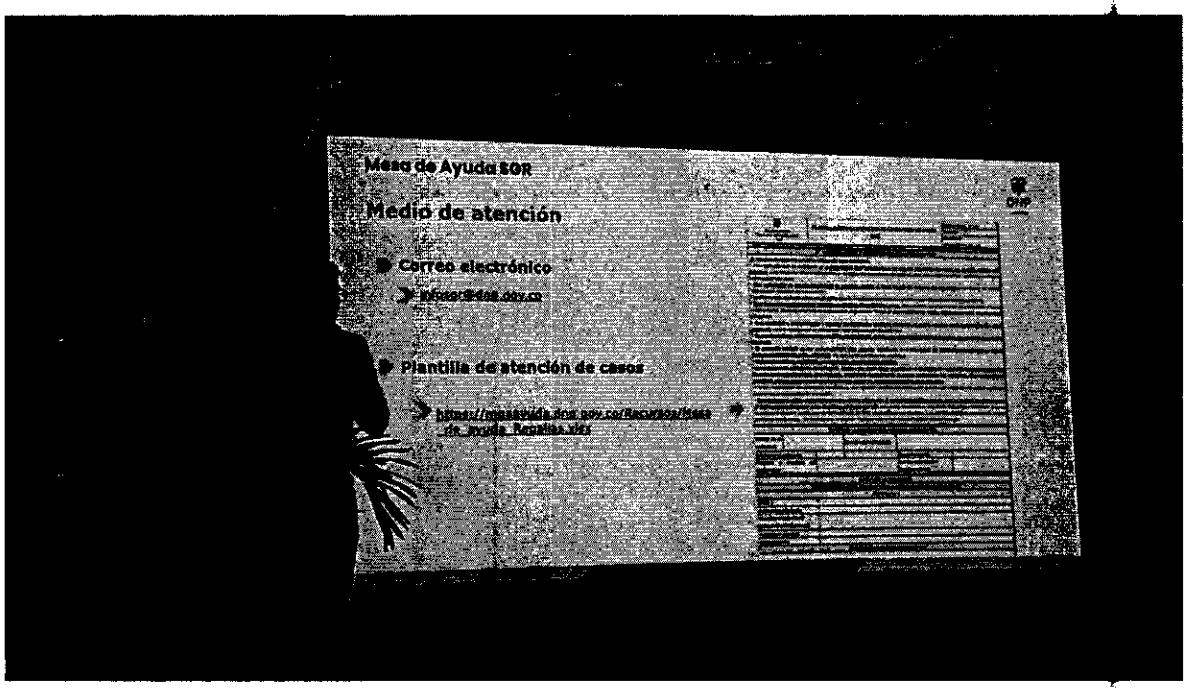

Mesa de Ayuda SOR
Medio de atención
Correo electrónico
Plantilla de atención de casos






















Gobernación Valle del Cauca	REGISTRO DE ASISTENCIA (CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN, REDUCCIÓN, ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA, REUNIONES, CONSEJO DE GOBIERNO, COMITÉ TECNICO DE LA DEPENDENCIA, EQUIPO DE MEJORA CONTINUA DEL PROCESO)	Código: FO-M9-P1-14 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 30/04/2018 Página 1 de
LUGAR:	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo	TOTAL HORAS:
No. DE ACTA:	HORA DE INICIO: 10:00 am / HORA DE TERMINACIÓN:	CODIGO DEL PROCESO/SUBPROCESO:
FACILITADOR (ES)/RESPONSABLE: Equipo de Planeacion -Subdireccion Tecnica de Apoyo a la Gestion.		
NOMBRE DEL EVENTO/TEMA DE REUNIÓN/TEMAS A TRATAR	Mesa de revision informe de avance de actividades correspondiente al mes de Mayo 2020 para reporte en Plataforma PIP	FECHA: 29-05-2020

No.	DEPENDENCIA / ENTIDAD/MPIO	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	CÉDULA	No. DE CELULAR - TEL/EXT	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA DE ASISTENCIA
1	Sedecfe	Maria Palacios	Contratista	45[illegible]	3p[illegible]	[illegible]	
2	Sedec	[illegible]	Contratista	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	Sedec	Esperanza Hern[illegible]	Cont Pry	51632111	3125949[illegible]	[illegible]	
4	Sedec	Luz Mery Ocampo	Contrat	31172164	3154719818	locampo@valledelcauca.gov.co	
5	SedecFE	Mario Isabel Arias T	Contratista	27377688	3322559110	plurecuimsedec@gmail.com	
6	Sedec	Jose Alberto [illegible]	Contratista	1144[illegible]	3157[illegible]	[illegible]	
7	sedec	Carlos Gutierrez C	Contratista	14570442	3168731[illegible]	carlos.cgy.yahoo@gmail.com	
8	Sedec	Daniela Aguirre	Contratista		3165739[illegible]		
9	Sedec	Omar A. Correa	Contratista	1112224230	3179818379		
10	SEDEC	Lina Hernandez Angulo	contratista	1.143935666	3184235345	linamontalegymail.com	

ACTIVIDAD 8: Apoyar la difusión de los contenidos de las redes sociales oficiales de la secretaria de Desarrollo Económico cada vez que se realice una publicación, en las plataformas digitaless, Instagram, Facebook, X, y YouTube.

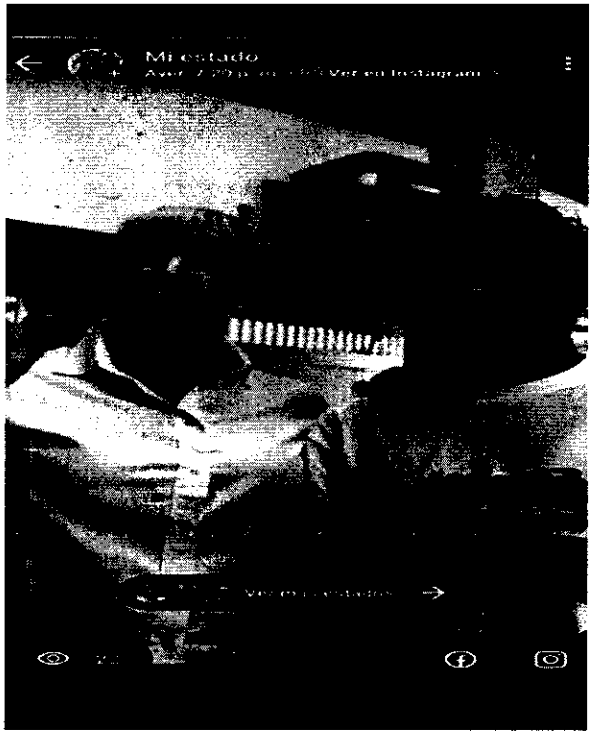





Tú
Hoy a la(s) 9:07 a.m.



Desde los Centros de Desarrollo Empresarial e Innovación (C.D.E.I.) del Valle del Cauca llega Huella Digital, una iniciativa diseñada para fortalecer las capacidades digitales de emprendedores, negocios y unidades productivas de la región.

Aprende sobre:

Que el balance de ejecución física es el siguiente:

Valor total del Contrato:	$ 24.000.000
Valor ejecutado	$ 24.000.000
Valor no ejecutado:	$0
Porcentaje de Ejecución:	100%

Que el balance de ejecución financiero es el siguiente:

Valor total del Contrato:	$ 24.000.000
Anticipo:	$0
Amortización anticipo:	$0
Pago anticipado:	$0
Pagos parciales	$20.000.000

Interés moratorio:	$0
Total pagado:	$20.000.000
Saldo a favor de El Contratista:	$4.000.000
Saldo a favor de El Departamento:	$0

En consecuencia, las partes, una vez leída y aprobada la presente acta, se suscribe en la ciudad de Cali, a los 9 días del mes de Junio de 2026. Con la firma de la presente el contratista se obliga a cargarla en la Plataforma del SECOP II (Si corresponde).

JUAN JOSÉ VALENZUELA HURTADO
Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

MARÍA ISABEL ARIAS TREJOS
CONTRATISTA

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Blanca Cecilia Leyton, Zulima Guzmán, José Antonio Cristancho Martínez, Angela Garcia, Katherine Santamaria Sánchez	**Nombre:** Diana Lorena Vanegas Cajiao / Juan Gabriel Rojas Girón	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta No. 002
Cargo: Profesional Especializado, Profesional Universitario, Contratistas	**Cargo:** directora Jurídica / Subdirector de Contratación	
Firma:	**Firma:**	
Fecha: 03/04/2019	**Fecha:** 03/04/2019	**Fecha:** 17/06/2019
