INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PREVISTO	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
DOCUMENTO	ESTUDIO DEL SECTOR
PROCESO No.	PATIOS-SAMC-SI-19-2026
DEPENDENCIA QUE ELABORÓ ESTUDIO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
OBJETO:	**EJECUTAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACIONES LOCATIVAS PARA LA ADECUACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR EN EL 11 DE NOVIEMBRE, CON EL FIN DE GARANTIZAR LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE ACCESIBILIDAD, SEGURIDAD Y SANIDAD PARA LA POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
PRESUPUESTO OFICIAL	**CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($489.928.756,00)**
ACTIVIDAD CIIU	4112 – Construcción de edificios no residenciales; 4330 – Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil
CODIGO UNSPSC	**721214 – Servicios de construcción de edificios públicos especializados; 721015 – Servicios de apoyo para la construcción**
FECHA DE EMISIÓN:	OCTUBRE 29 DE 2026

El presente estudio de mercado y análisis del sector contempla la realización de un análisis del sector de los diferentes proponentes que podrían participar en el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA de obra pública No. PATIOS-SAMC-SI-19-2026, de acuerdo con la experiencia solicitada por la entidad.

Que el objeto del proceso de selección consiste en: **EJECUTAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACIONES LOCATIVAS PARA LA ADECUACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR EN EL 11 DE NOVIEMBRE, CON EL FIN DE GARANTIZAR LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE ACCESIBILIDAD, SEGURIDAD Y SANIDAD PARA LA POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**

El análisis del sector se basó en la consulta realizada a procesos celebrados por la entidad y otras, a través de la información relacionada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP -a personas naturales o jurídicas que hayan celebrado contratos de relacionados con el objeto de la presente convocatoria.

Teniendo en cuenta los lineamientos Generales para la Expedición de Manuales de Contratación – Guía para la elaboración del Estudio del Sector publicada por Colombia Compra Eficiente, el análisis del Sector a realizar cubre las siguientes áreas

A. Aspectos Generales
B. Análisis de la demanda
C. Análisis de la oferta

I. ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR

A. ASPECTOS GENERALES

A1.ECONÓMICO

(i). Productos incluidos dentro del sector.

La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el crecimiento y desarrollo de un país. La medición y el análisis de su comportamiento son instrumentos claves en el diseño de políticas macroeconómicas y la elaboración de planes y programas gubernamentales. Por ende, las estadísticas derivadas de la inversión en el sector resultan indispensables para la correcta toma de decisiones de las autoridades públicas y del público en general.

Frente a esta necesidad, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) inició el cálculo del Indicador de Inversión en Obras Civiles (IIOC) en 1998.

A través de este, se ha determinado la evolución trimestral de la inversión real en obras de ingeniería civil a través de los pagos y el valor estimado ha servido de insumo para el

cálculo del PIB trimestral del subsector.
El cálculo del IIOC se realiza para cada uno de los tipos de construcción: carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y construcciones de subterráneos (4001); vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo (4002); vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias (4003); construcciones para la minería y centrales generadoras eléctricas y tuberías para el transporte a larga y corta distancia, líneas de comunicación y energía (4004); y **otras obras de ingeniería (4008).**

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA
DANE
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

Anexo A1.
Indicador de Inversión en Obras Civiles, por tipo de construcción (Pagos)
2017 -2020 (IV trimestre)[pr] **Ponderaciones 2015 y año base 2017**

Año	Trimestre	Total IIOC	Tipo de construcción				
			4001 Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y construcción de subterráneos	4002 Vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de tranporte masivo	4003 Vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias	4004 Construcciones para la minería y tuberías para el transporte	4008 Otras obras de ingeniería*
2017	I	65,1	73,5	102,5	79,5	50,0	54,4
	II	87,2	87,9	62,6	83,4	90,3	86,2
	III	104,5	94,5	109,9	102,9	116,0	108,9
	IV	143,1	144,1	125,1	134,2	143,8	150,5
2018	I	60,5	70,3	58,3	74,2	44,9	60,6
	II	82,4	83,9	57,5	74,7	87,3	74,8
	III	102,8	94,7	124,9	95,4	113,4	99,3
	IV	150,6	150,4	169,3	120,9	153,4	159,4
2019	I	65,3	74,9	46,5	76,3	51,8	67,3
	II	93,4	98,7	46,9	77,8	93,2	101,2
	III	115,5	107,3	117,5	102,0	121,8	141,0
	IV	162,3	163,6	97,9	143,5	166,6	181,8
2020	I	71,6	90,3	28,6	68,8	58,2	53,3
	II	72,7	65,6	28,2	58,6	94,4	58,4
	III	86,5	100,5	83,4	88,6	68,7	85,5
	IV	126,3	131,0	87,6	129,4	138,3	75,6

Anexo A1.1.

Variación y contribución anual[1] del indicador de Inversión en Obras Civiles, por tipo de construcción (Pagos)

2017 -2020 (IV trimestre)[pr] **Ponderaciones 2015 y año base 2017**

Año	Trimestre	Total IIOC	Tipo de construcción									
			4001 Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y construcción de subterráneos		4002 Vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de tranporte masivo		4003 Vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias		4004 Construcciones para la minería y tuberías para el transporte		4008 Otras obras de ingeniería*	
			Variación (%)	Contribución (p.p.)	Variación (%)	Contribución (p.p.)	Variación (%)	Contribución (p.p.)	Variación (%)	Contribución (p.p.)	Variación (%)	Contribución (p.p.)
2017	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	I	-7,1	-4,3	-2,1	-43,2	-2,6	-6,8	-0,7	-10,1	-2,7	11,5	0,9
	II	-5,5	-4,6	-2,0	-8,1	-0,2	-10,5	-0,8	-3,3	-1,2	-13,2	-1,3
	III	-1,7	0,2	0,1	13,7	0,5	-7,3	-0,6	-2,2	-0,8	-8,8	-0,9
	IV	5,3	4,4	1,9	35,3	1,2	-9,9	-0,8	6,7	2,3	5,9	0,6
2019	I	7,9	6,5	3,3	-20,1	-0,7	2,9	0,3	15,3	3,9	11,1	1,1
	II	13,3	17,7	7,9	-18,4	-0,5	4,2	0,3	6,8	2,4	35,4	3,1
	III	12,4	13,3	5,4	-6,0	-0,3	7,0	0,5	7,4	2,8	41,9	4,0
	IV	7,7	8,8	3,9	-42,2	-1,8	18,7	1,2	8,6	3,0	14,0	1,5
2020	I	9,6	20,5	10,4	-38,6	-1,0	-9,8	-0,9	12,4	3,4	-20,8	-2,1
	II	-22,1	-33,5	-15,6	-40,0	-0,8	-24,7	-1,7	1,2	0,4	-42,3	-4,5
	III	-25,1	-6,4	-2,6	-29,0	-1,1	-13,2	-0,9	-43,6	-15,7	-39,4	-4,7
	IV	-22,2	-20,0	-8,9	-10,5	-0,2	-9,9	-0,7	-17,0	-6,0	-58,4	-6,4

Anexo A1.2.
Variación y contribución año corrido[2] del indicador de Inversión en Obras Civiles, por tipo de construcción (Pagos)
2017 -2020 (IV trimestre)[pr] **Ponderaciones 2015 y año base 2017**

Año	Trimestre	Total IIOC	Tipo de construcción									
			4001 Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y construcción de subterráneos		4002 Vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de tranporte masivo		4003 Vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias		4004 Construcciones para la minería y tuberías para el transporte		4008 Otras obras de ingeniería*	
			Variación (%)	Contribución (p.p.)	Variación (%)	Contribución (p.p.)	Variación (%)	Contribución (p.p.)	Variación (%)	Contribución (p.p.)	Variación (%)	Contribución (p.p.)
2017	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	I	-7,1	-4,3	-2,1	-43,2	-2,6	-6,8	-0,7	-10,1	-2,7	11,5	0,9
	II	-6,2	-4,4	-2,1	-29,9	-1,2	-8,7	-0,8	-5,7	-1,8	-3,7	-0,3
	III	-4,4	-2,7	-1,2	-12,5	-0,5	-8,1	-0,7	-4,1	-1,4	-5,9	-0,6
	IV	-0,9	-0,2	-0,1	2,5	0,1	-8,7	-0,7	-0,2	-0,1	-1,5	-0,1
2019	I	7,9	6,5	3,3	-20,1	-0,7	2,9	0,3	15,3	3,9	11,1	1,1
	II	11,0	12,6	6,0	-19,2	-0,6	3,5	0,3	9,7	3,1	24,5	2,3
	III	11,6	12,9	5,7	-12,4	-0,5	4,9	0,4	8,6	2,9	31,9	3,0
	IV	10,1	11,3	5,0	-24,7	-1,0	9,4	0,7	8,6	3,0	24,7	2,4
2020	I	9,6	20,5	10,4	-38,6	-1,0	-9,8	-0,9	12,4	3,4	-20,8	-2,1
	II	-9,0	-10,2	-4,9	-39,3	-0,9	-17,3	-1,4	5,2	1,6	-33,7	-3,5
	III	-15,8	-8,7	-3,9	-33,5	-1,0	-15,7	-1,2	-17,1	-5,7	-36,3	-4,0
	IV	-18,2	-12,9	-5,8	-26,2	-0,7	-13,6	-1,0	-17,0	-5,8	-44,5	-4,9

Anexo A1.3.
Variación y contribución doce meses[3] del indicador de Inversión en Obras Civiles, por tipo de construcción (Pagos)
2017 -2020 (IV trimestre)[pr] **Ponderaciones 2015 y año base 2017**

Año	Trimestre	Total IIOC	Tipo de construcción									
			4001 Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y construcción de subterráneos		4002 Vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de tranporte masivo		4003 Vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias		4004 Construcciones para la minería y tuberías para el transporte		4008 Otras obras de ingeniería*	
			Variación (%)	Contribución (p.p.)	Variación (%)	Contribución (p.p.)	Variación (%)	Contribución (p.p.)	Variación (%)	Contribución (p.p.)	Variación (%)	Contribución (p.p.)
2017	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV	-0,9	-0,2	-0,1	2,5	0,1	-8,7	-0,7	-0,2	-0,1	-1,5	-0,1
2019	I	1,4	1,8	0,8	11,9	0,4	-6,9	-0,6	2,8	0,9	-1,3	-0,1
	II	5,5	6,6	2,9	10,5	0,4	-4,0	-0,3	5,1	1,7	8,2	0,8
	III	9,3	9,7	4,3	3,9	0,1	-0,3	0,0	7,9	2,7	21,7	2,1
	IV	10,1	11,3	5,0	-24,7	-1,0	9,4	0,7	8,6	3,0	24,7	2,4
2020	I	10,4	13,9	6,1	-27,0	-1,0	6,8	0,5	8,3	2,9	19,1	1,9
	II	2,4	1,9	0,9	-29,8	-1,1	0,7	0,0	7,1	2,4	1,7	0,2
	III	-7,5	-2,6	-1,2	-37,4	-1,3	-4,7	-0,3	-7,7	-2,6	-19,2	-2,1
	IV	-18,2	-12,9	-5,8	-26,2	-0,7	-13,6	-1,0	-17,0	-5,8	-44,5	-4,9

Fuente: DANE.

pr: Preliminar

Nota: como parte del proceso de producción estadística el DANE realiza análisis y actualización continua de la información en cada una de las fases del proceso; como consecuencia de este proceso se presentan cambios en la serie histórica por actualización de la información recibida de parte de las fuentes informantes.

1. Anual= (trimestre i año (t) / trimestre i año (t - 1) -1)*100
2. Año corrido= (trimestre acumulado año(t)/trimestre acumulado año(t-1))-1)*100
3.Doce meses= (sumatoria de los trimestres, i-3 hasta i / sumatoria de los trimestres i-7 hasta i-4) -1)*100

* Incluye estadios y otras instalaciones deportivas para el juego al aire libre, parques, etc.

(-) No existen datos

Actualizado el 12 de febrero de 2021

El grupo otras obras de ingeniería, disminuyó 44% y resto 4.9% puntos porcentuales a la variación total.

(ii). Agentes que componen el sector. Dentro de los agentes que componen el sector de la construcción se tienen:

- Cartera hipotecaria de vivienda
- Censo de edificaciones


- Estadística de cemento gris
- Licencias de construcción
- Financiación de viviendas
- Indicadores de inversión de obras civiles
- Indicadores económicos alrededor de la construcción.
- Vivienda de interés social
- Índices de costo de la construcción de vivienda.
- Índices de costos de la construcción pesada.
- Índices de precios de vivienda nueva
- Estadística de concreto producido por la industria

(iii). Gremios y asociaciones que participan en el sector.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
ALCALDÍA MUNICIPIO DE LOS PATIOS
GOBERNACIÓN NORTE DE SANTANDER
ASOCIACIÓN DE INGENIERIOS NORTE DE SANTANDER
EMPRESAS inscritas en la CAMARA DE COMERCIO SAN JOSÉ DE CÚCUTA con actividades afines a la construcción, ingeniería y arquitectura.
CAMACOL, Cámara Colombiana de la Construcción
AGRECON, Agregados Y Concretos S.A.
ASOCRETO, Asociación De Productores De Concreto
CEMEX Colombia
DAMA, Departamento Administrativo Del Medio Ambiente
DANE, Departamento Administrativo Nacional De Estadística
DNP, Departamento Nacional De Planeación

PRODUCCIÓN DE CEMENTO GRIS


En febrero de 2026, la producción de cemento gris a nivel nacional fue de 1.080,3 miles de toneladas, lo que representó una variación de 1,3% con relación al mismo mes de 2025. En el mes de análisis se despacharon al mercado nacional 1.024,6 miles de toneladas de cemento gris, lo que significó un crecimiento del 4,4% frente a febrero de 2025.

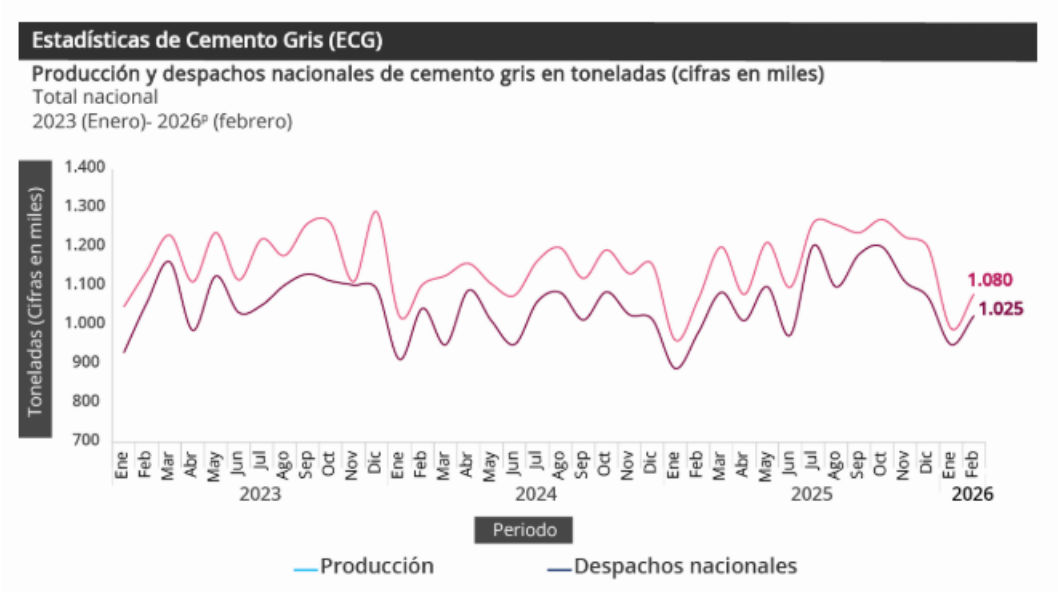

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y CENSO DE EDIFICACIONES

En febrero de 2026 se licenciaron 2.016.426 m² para construcción, cifra superior en 44.476 m² a la registrada en el mismo mes de 2025 (1.971.950 m²). Esto se traduce en un crecimiento anual de 2,3% en el área licenciada. El comportamiento del total licenciado se explica por el aumento de 30,7% en el área aprobada para destinos no habitacionales. Por otra parte, el área aprobada para vivienda disminuyó 4,4%.


Gráfico 2. Área aprobada para vivienda y destinos no habitacionales (metros cuadrados)
Cobertura nacional
Febrero (2024 – 2026Pr)

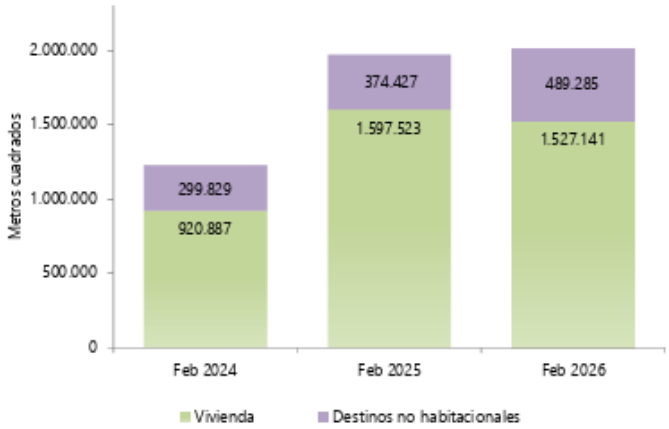

Durante el mes de referencia se aprobaron 1.527.141 m² para vivienda, lo que representó

una disminución de 70.382 m² frente a febrero de 2025. Por su parte, el área aprobada para destinos no habitacionales alcanzó 489.285 m², correspondiente a un aumento de 114.858 m² respecto al mismo mes del año anterior.

Gráfico 3. Variación anual del área aprobada para vivienda y destinos no habitacionales
Cobertura nacional
Febrero (2025 – 2026[Pr])

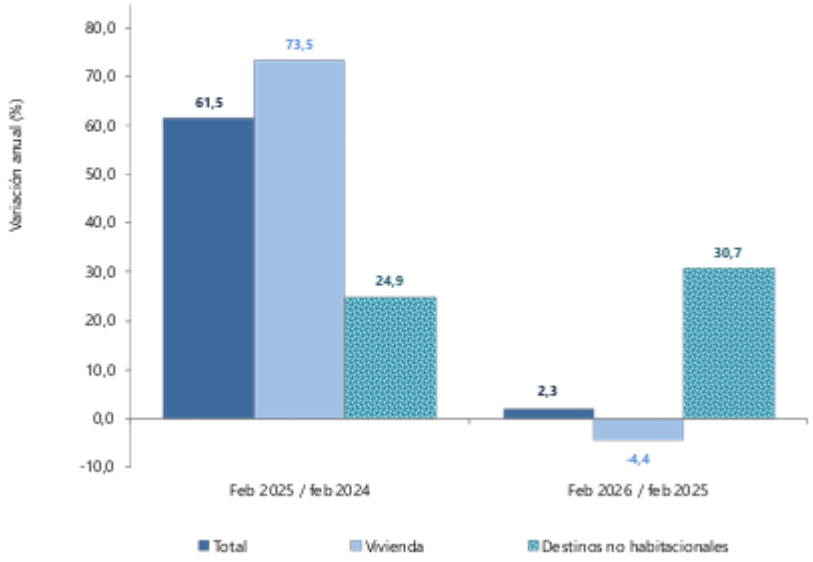


(v). Perspectivas de crecimiento, inversión y ventas.

El boletín de Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC), presenta información de 14 investigaciones, categorizadas en indicadores macroeconómicos, oferta, demanda y precios. Los indicadores de construcción se publican considerando las coberturas geográficas disponibles, a partir de las variaciones mensuales y anuales. Esta información del Dane , es el estudio mas acertado que existe en proyecciones por sectores de la economía.

En el cuarto trimestre de 2025 (octubre – diciembre), el PIB a precios constantes aumentó en 2,3% con relación al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la construcción de 2,6% en su variación anual, que se explica principalmente por la disminución del valor agregado de las edificaciones 6,5%. Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementó en 6,3% y el de las actividades especializadas decreció en 2,7%.

Gráfico 2. Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores (precios constantes)
2019 – 2025ᵖ (IV trimestre)

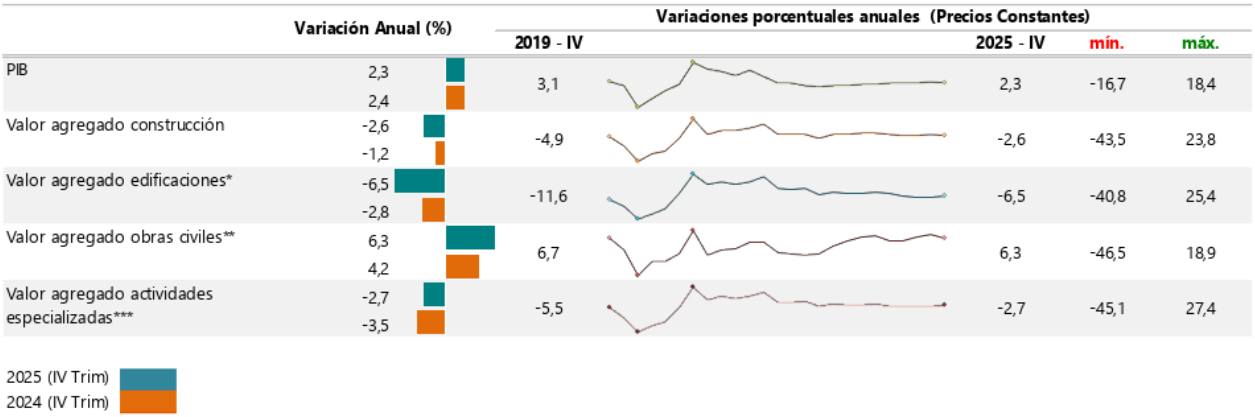


Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.
p: cifras provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice.
* El valor agregado de edificaciones incluye construcción de edificaciones residenciales y no residenciales.
** Incluye construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil.
*** A partir del primer trimestre del año 2018 se realiza cambio del año base a 2015 y se incorporan actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (Alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores).

En el sector empleo, la construcción aporto la siguiente estadística , en enero de 2026, el número de ocupados en el total nacional fue 23.227 miles de personas. La Construcción como rama de actividad económica participó con el 6,8% de los ocupados. En enero de 2026, la población ocupada en el total nacional aumentó 1,4%, mientras que los ocupados en la rama de Construcción aumento en 5,9% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Para enero de 2026, 1.585 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de estos el 43,9% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas equivalente a 697 miles de personas, que además presentaron una disminución del 5,4%, es decir, 40 mil personas menos con respecto a enero de 2025.

Gráfico 4. Variación y participación anual de la población ocupada y en la rama de actividad construcción 2024 – 2026[P] (enero)

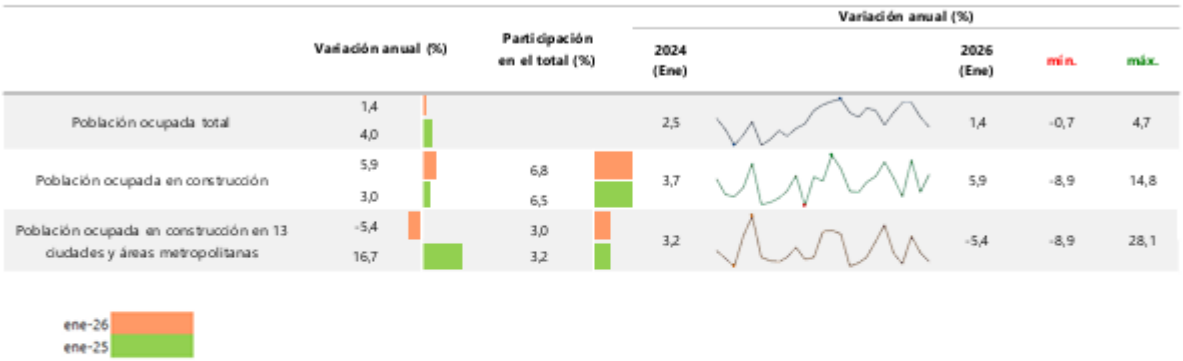

Fuente: DANE, GEIH.
p: Cifras provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice.
* 13 áreas: Bogotá D.C, Medellín - Valle de Aburrá, Cali - Yumbo, Barranquilla - Soledad, Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca, Manizales y Villa María, Pasto, Pereira, Dos Quebradas y La Virginia, Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y El Zulia, Ibagué, Montería, Cartagena, Villavicencio.

(vi). Variables económicas que afectan el sector como inflación, variación del SMMLV y la tasa de cambio.

PRODUCTO INTERNO BRUTO

En el cuarto trimestre de 2025 (octubre – diciembre), el PIB a precios constantes aumentó en 2,3% con relación al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la construcción de 2,6% en su variación anual, que se explica principalmente por la disminución del valor agregado de las edificaciones 6,5%. Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementó en 6,3% y el de las actividades especializadas decreció en 2,7%.

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2025 (octubre– diciembre) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se observa que Perú registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 3,2%, seguido de Colombia que presentó un crecimiento de 2,3% y Mexico presentó 1.8% en contraste con el cuarto trimestre del 2024. En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa crecimiento con relación al mismo trimestre de 2024 para Perú de 9,0%, y Mexico de 4,3%, mientras que, para Colombia se registró


una variación negativa de 2,6%.

Indicador de Producción de Obras civiles

Durante el cuarto trimestre de 2025, la producción de obras civiles a precios constantes registró un crecimiento de 6,3%, frente al mismo trimestre de 2024.

El crecimiento de 6,3% en la producción de las obras civiles a precios constantes con respecto al cuarto trimestre de 2024, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo de construcciones en minas y plantas industriales registró un incremento en su producción anual de 15,8% y aportó 3,1 puntos porcentuales (p.p.) a la variación anual; el grupo de carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles presentó un aumento de 3,9% y sumó 2,0 p.p. a la variación anual a precios constantes, el grupo de tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder, tuberías y cables locales y obras conexas incrementó su producción en 15,7% y aportó 2,0 p.p. a la variación anual (6.3%).

Gráfico 2. Índice y variación anual de la producción de obras civiles (precios constantes)
Total nacional - serie a precios constantes
2021 (I trimestre) – 2025 (IV trimestre^{Pr})

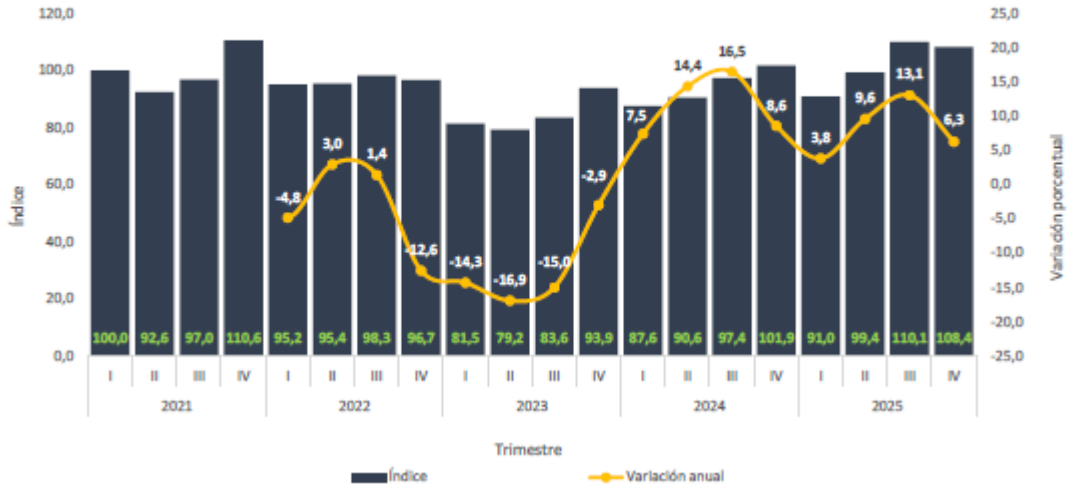

A2.TÉCNICO

Las condiciones técnicas y tecnológicas del objeto del Proceso de contratación, incluyendo el estado de innovación y desarrollo técnico que permite crear nuevos productos y oportunidades del mercado y sus tendencias:

(i) Cambios tecnológicos: No aplica

(ii) Características de los productos

Los trabajos objeto del presente proceso deberán ejecutarse de conformidad con las especificaciones generales de construcción contempladas en la Norma Colombiana de Construcciones Sismo resistentes (NSR-2010), incluidas sus adicciones y / o modificaciones. Los aspectos que éstas no regulen se ejecutarán de acuerdo con lo contemplado en las especificaciones técnicas incluidas en el pliego de condiciones.

Cuando no se haga referencia a alguna norma específica o en alguna eventualidad especial que impida el cumplimiento de las normas, la obra y los elementos suministrados por el contratista deberán cumplir los requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el siguiente orden de prioridades:

- INSTITUTO DE NORMAS TÉCNICAS ICONTEC
- AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS ASTM
- AMERICAN CONCRETE INSTITUTE ACI
- PORTLAND CEMENT ASSOCIATION PCA

En el evento en que se considere conveniente pactar una especificación diferente a la prevista en las especificaciones generales de construcción vigentes, el Municipio y el interventor, previa revisión de precios, podrá autorizar la utilización de las especificaciones contenidas en las normas emitidas por otra entidad, sin que exista prelación alguna entre ellas, de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 4 de la Ley 80 de 1.993. Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, según el caso, las especificaciones generales de construcción y prevalecen sobre las últimas.

Es responsabilidad de los promotores de proyectos pero también de los particulares que los ejecutan, contribuir al desarrollo sostenible, por tanto reconocen que un adecuado dimensionamiento de los componentes ambiental y social, contribuye a mejorar la calidad de las obras, y al cumplimiento de objetivos y metas nacionales con ese propósito.

Durante la ejecución de las obras, el contratista es responsable de dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente en materia ambiental y social. En caso de establecerse conductas, hechos o actividades consideradas infracciones que atenten

contra el medio ambiente o que sean violatorias de la normatividad vigente, en especial el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones que las sustituyan o modifiquen, será acreedor a las multas o sanciones que se estipulan en la ley con respecto a este tema.

Igualmente, el incumplimiento de los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente, lo hará acreedor de las acciones preventivas y sancionatorias establecidas por la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”. El Contratista es el único responsable de los procedimientos administrativos que de este incumplimiento se deriven, entre otros su inclusión en el reporte en el Registro Único de Infractores Ambientales, y otros procedimientos reglamentados por las autoridades competentes.

Es obligación del interventor realizar el control y seguimiento al cumplimiento del cronograma presentado por el contratista, la normatividad aplicable y las obligaciones derivadas de la obtención de permisos; la ejecución de medidas de compensación, programas y obras deben ser simultáneas a la ejecución de las obras del contrato. El contratista se obliga a aportar las certificaciones de cumplimiento expedidas por las autoridades ambientales competentes, como soporte del formato de cierre ambiental.

El proponente identificará con precisión, para el alcance y localización del proyecto, todos los permisos de carácter ambiental del mismo, de tal manera que, en el evento de resultar adjudicatario, le permita obtenerlos en los términos establecidos en el pliego de condiciones.

MATERIALES

Deberán los oferentes bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución.

El costo de todos los acarreos de los materiales, tales como cemento, triturado, arena y los demás materiales utilizados en la construcción, deberán incluirse dentro de los análisis de precios unitarios respectivos, toda vez que no habrá pago por separado para el transporte de los mismos.

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. La totalidad de sus costos

deberán estar incluidos en los ítems de pago de las obras de qué trata la presente Selección Abreviada de Menor Cuantía. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. El ente territorial no aceptará ningún reclamo del constructor, por costos, plazos, falta o escasez de materiales o cambios de fuentes de materiales o elementos de construcción, o por cualquiera de los eventos contemplados en este numeral.

EQUIPO

El proponente favorecido deberá suministrar y mantener en la obra y en cada frente de trabajo el equipo puesto a punto y en operación necesario y suficiente, adecuado en capacidad, condiciones técnico-mecánicas características y tecnología, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes a la puesta en operación del equipo considerado en el análisis de los precios unitarios de la propuesta estarán allí incluidos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

En el desarrollo del proyecto se deben cumplir las especificaciones particulares del proyecto, las especificaciones generales para la construcción, vigentes al momento de la apertura del proceso de selección. De igual manera los materiales utilizados para las obras a ejecutar, deben cumplir con las normas y ensayos de materiales y las especificaciones generales de construcción, así como las particulares establecidas en el formulario de presupuesto oficial. Así mismo, además de cumplir con las especificaciones técnicas de calidad de obra, deberá dar cumplimiento a los tiempos y cronogramas de ejecución conforme se detalle en el pliego de condiciones.

En el documento de especificaciones técnicas elaborado para este proceso, se describen las características técnicas y el alcance de todas las actividades del proyecto, precisando las inclusiones y exclusiones, condiciones de medida y forma de pago. La información de este documento no se constituye en un manual de construcción, entendiéndose claramente que el contratista, es un profesional competente y experimentado con criterio y conocimiento práctico para garantizar la correcta ejecución de la obra.

El contratista, el interventor y el supervisor se reunirán formalmente antes de iniciar la ejecución del contrato para repasar en detalle los planos y las especificaciones del proyecto, acordando todos los parámetros de ejecución, control y recibo de las

actividades y deberán advertir oportunamente cualquier error, omisión, o propuesta de cambio esencial de especificación y diseño, sustentada con fundamentos técnicos o restricciones comerciales.

La Alcaldía de Los Patios llama la atención sobre la obligación de averiguar las condiciones de mercado en la zona para colocar las ordenes de pedido a tiempo, enfatizando en los insumos clave para la cubierta, las redes eléctricas e hidrosanitarias y los acabados.

Desde el mismo proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía, los proponentes deben hacer todas las consultas que consideren pertinentes, pidiendo aclaraciones de las especificaciones, inclusive de los términos que no se entiendan o sean desconocidos en la región.

Para la ejecución de los contratos, se deben tener en cuenta las siguientes normas:

- Normas Colombianas de Diseño y Construcciones Sismo Resistentes NSR 10.
- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE vigente.
- Decreto 34 de 1999.
- NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano.
- Normas Técnicas Colombianas NTC 1500: Código Colombiano De Fontanería.

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN

Las especificaciones básicas detalladas a continuación se complementan íntegramente con los detalles enunciados.

a) Replantear y localizar las obras de acuerdo con la situación específica de campo, estableciendo los distintos niveles y referencias de la red, mediante demarcaciones verticales y horizontales aprobadas por la interventoría en función de los planos del proyecto.

b) Verificar todas las medidas en la obra y chequear que éstas sean correctas en función de los condicionamientos de campo existentes, la topografía del lugar y las redes adyacentes. El contratista debe enfatizar las previsiones y controles sobre niveles y distancias evitando que las nuevas obras puedan afectarlas", "sobre-excavadas" o sometidas a eventuales inundaciones.

c) Para no generar extra costos o desmeritar la calidad de la obra se deberá extremar la precisión del replanteo en las actividades de excavación y localización de las cotas para la instalación de la tubería y sus respectivos rellenos.

d) Notificarle oportunamente a la supervisión cualquier discrepancia detectada entre las medidas de los planos y las reales, absteniéndose de ejecutar el trabajo “observado” hasta haber recibido instrucciones precisas para aclarar la situación presentada. Cuando se realicen obras en espacios existentes, priman las medidas reales del sitio sobre las indicadas en los planos. No obstante, se deberá consultar al diseñador cuando la decisión de campo al respecto no sea clara.

e) Las especificaciones, planos y anexos que se entregan al constructor se complementan entre sí y tienen por objeto explicar las condiciones y características constructivas relacionadas con el empleo de los materiales, como figuran en las especificaciones, en los planos o en ambos.

f) Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, en los planos o en ambos, pero que deba formar parte de la construcción no eximen al Constructor de su ejecución ni podrán tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores.

g) Cualquier cambio que proponga el constructor, deberá ser consultado por escrito a la interventoría y no podrá proceder a su ejecución sin la aceptación escrita de ésta; en caso contrario, cualquier trabajo será por cuenta y riesgo del Constructor.

h) Cuando en los planos o las especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre de fábrica o marca registrada, esto se hace con el fin de establecer un estándar de calidad mínimo, tipo y/o característica, sin que ello implique el uso exclusivo de dicho insumo o equipo. El constructor podrá utilizar productos similares o equivalentes, que cumplan con los requisitos técnicos de la especificación original obteniendo previamente la aprobación de la Interventoría.

A3. REGULATORIO

La normativa vigente aplicable al objeto del proceso de contratación que influye en el mercado del sector de obras civiles regula la actividad de los proveedores y compradores de manera particular, los cambios recientes en la regulación contractual y el impacto de tales modificaciones, es el estatuto general de contratación que incluye en las normas que se desarrollan y se reglamentan, como:

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, expedido por el Ministerio de Minas y Energía, y Norma Técnica Colombiana NTC 1500 – Código Colombiano de Fontanería.

Manuales y guías de Colombia Compra Eficiente. Identificación y cobertura de riesgos, requisitos mínimos habilitantes, codificación de bienes, obras y servicios, acuerdos comerciales, manejo de anticipos, documentos tipo para obras civiles – pliego de condiciones y contratos, etc.

Manual de Contratación del Municipio de Los Patios.
A nivel constructivo o de obra civil:

Ley 56 de 1981. Por la cual se dictan normas sobre obras públicas de generación eléctrica, acueductos, sistema de regadío y obras y se regulan las expropiaciones y servidumbres de los bienes afectados por tales obras.

Ley 400 de 1997. Por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistente.

Código Colombiano de Construcciones Sismo resistente. Aprobado por la ISO – Organización Internacional de Normalización. Estambul – Turquía.

Decreto 926 de 2010. Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismo resistente NSR-10.

B. ESTUDIO DE LA OFERTA

Revisada la base de datos de la Cámara de Comercio de la ciudad de San José de Cúcuta, se presenta a continuación el listado de las empresas que ofrecen servicios afines al proceso de contratación que adelanta el municipio de Los Patios para el: EJECUTAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACIONES LOCATIVAS PARA LA ADECUACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR EN EL 11 DE NOVIEMBRE, CON EL FIN DE GARANTIZAR LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE ACCESIBILIDAD, SEGURIDAD Y SANIDAD PARA LA POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS

	RAZON SOCIAL	Liquidez	Endeudamiento	Razón de Cobertura	Rent. Patrimonio	Rent. Activo
1	LORCA S A S	2,44	0,38	8,58	0,03	0,02

	RAZON SOCIAL	Liquidez	Endeudamiento	Razón de Cobertura	Rent. Patrimonio	Rent. Activo
2	GEOSISTEMAS S A S	2,03	0,36	6,12	0,14	0,09
3	CONSTRUCCIONES ACUSTICAS S A S	2,69	0,39	0,98	0,01	0,00
4	CONTEXTO URBANO S.A.	2,97	0,33	2,35	0,09	0,06
5	CONSTRUCTORA LOS HAYUELOS S.A.	1,45	0,24	1,11	0,02	0,02
6	SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA	1,76	0,33	2,61	0,08	0,06
7	INACAR S.A.	1,58	0,40	5,30	0,05	0,03
8	FINLANDIA LTDA	2,07	0,25	16,06	0,07	0,06
9	KASCH SAS	1,83	0,37	3,20	0,06	0,04
10	INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS S A S	3,58	0,30	1,71	0,03	0,02
11	PROYECTAR INGENIERIA LTDA	2,54	0,28	1,98	0,04	0,03
12	AGM DESARROLLOS SAS	3,47	0,42	34,22	0,12	0,07
13	ENTRE OBRAS S A S	3,74	0,48	2,61	0,09	0,05
14	IMERC LTDA. INGENIERIA METALMECANICA DE REFRIGERACION Y CIVIL	2,25	0,44	10,72	0,13	0,07
15	ROCALES Y CONCRETOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	1,66	0,26	3,77	0,09	0,07
16	SOLUCIONES ARQUITECTONICAS LIMITADA	1,65	0,46	2,16	0,07	0,04
17	ADOLFO SCHLEGEL & CIA. S A S	2,44	0,38	24,82	0,07	0,05
18	QUARK UP LTDA	2,75	0,35	11,69	0,08	0,05
19	VEROCO INGENIERIA S.A.S.	2,83	0,28	9,07	0,14	0,10
20	C&P CONSTRUCCIONES AND PROJECTS S.A.S.	2,46	0,28	2,32	0,02	0,01
21	MULTITECHOS S.A.S	1,48	0,34	3,90	0,09	0,06
22	DESARROLLOS ELECTRICOS Y CIVILES S.A.	4,47	0,46	0,12	0,02	0,01
23	GEOGRAFIA SATELITAL-GEOSAT S.A.	2,51	0,30	4,27	0,10	0,07
24	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES OMEGA LTDA	2,84	0,40	8,24	0,08	0,05
25	CONSTRUCTORA ARGECO LTDA.	3,31	0,30	7,01	0,05	0,03
26	INVIC INGENIEROS CONTRATISTAS SA	2,58	0,29	23,66	0,06	0,04
27	CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS	2,87	0,35	9,15	0,04	0,03
28	OBRAS ESPECIALES OBRESCA C.A.	1,41	0,25	3,31	0,03	0,02

	RAZON SOCIAL	Liquidez	Endeudamiento	Razón de Cobertura	Rent. Patrimonio	Rent. Activo
29	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA	2,98	0,26	6,18	0,17	0,13
30	CONSTRUCTORA GALLERY S A S	2,31	0,44	40,67	0,08	0,05
31	ASER ING INGENIERIA S.A.	1,56	0,42	2,09	0,05	0,03
32	RUVE & CIA. S A S	4,31	0,33	0,35	0,01	0,01
33	FIBRA REDES CONSTRUCCIONES S A S	1,91	0,43	8,21	0,07	0,04
34	TECNA INTEGRITY AND CORROSION ENGINEERING S.A.	3,23	0,36	10,01	0,16	0,10
35	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL LTDA	2,24	0,35	19,30	0,29	0,19
36	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CON Y CON S A S	2,85	0,39	11,54	0,37	0,23
37	GERENCIAS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LTDA	2,64	0,47	6,60	0,02	0,01
38	TES AMERICA ANDINA LTDA	2,02	0,31	11,18	0,27	0,19
39	CONCEPTOS DE CALIDAD AVANZADOS Y CIA LTDA	1,78	0,41	9,02	0,08	0,05
40	MASA INGENIERIA LTDA	2,48	0,40	1,92	0,06	0,04
41	CONSULCONS LTDA	1,94	0,25	3,94	0,00	0,00
42	GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS S A S	2,10	0,32	12,29	0,38	0,26
43	BERNAL ARQUITECTOS S.A.S.	2,07	0,29	16,03	0,07	0,05
44	CONSTRUCCIONES LAPREU S.A.S	2,14	0,24	16,31	0,30	0,23
45	CONSTRUCCIONES MAC LTDA	6,19	0,35	12,17	0,31	0,20
46	KMA CONSTRUCCIONES S A	1,64	0,39	19,78	0,38	0,23
47	NUWA LTDA	2,37	0,34	0,03	0,00	0,00
48	RAHS INGENIERIA S.A.S	2,63	0,68	3,46	0,25	0,08
49	A & D ALVARADO Y DURING S A S	2,35	0,70	3,07	0,15	0,05
50	G C COMUNICACIONES ESTRATEGICAS S A S	1,54	0,62	29,96	0,68	0,26
51	GRADECO CONSTRUCCIONES & COMPAÃ'IA S A S	6,25	0,82	0,13	0,01	0,00
52	MERIDIAN CONSULTING LTDA	1,64	0,47	23,53	0,22	0,11
53	E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES CONSULTORES LTDA	3,88	0,42	4,48	0,41	0,24
54	TERRATEST LABORATORIO DE SUELOS ROCAS Y MATERIALES S A S	1,38	0,41	27,41	0,20	0,12

	RAZON SOCIAL	Liquidez	Endeudamiento	Razón de Cobertura	Rent. Patrimonio	Rent. Activo
55	NHU DISEÃ‘OS CONSTRUCCION Y GERENCIA DE PROYECTOS S.A.S.	4,31	0,65	5,53	0,10	0,03
56	CONSULTORIA E IMAGEN S A S	1,89	0,43	6,42	0,21	0,12
57	CONSTRU AMERICANA MRS S A S	1,33	0,74	3,73	0,06	0,02
58	ANCLAJES Y CONSTRUCCIONES S.A.S	2,22	0,49	3,93	0,21	0,11
59	COLOMBIA CMF S A	1,32	0,48	1,61	0,04	0,02
60	MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL S A S	2,69	0,47	6,63	0,16	0,09
61	RAUL CASTILLO ESPITIA Y CIA S A S	2,40	0,49	10,98	0,32	0,16
62	HITOS URBANOS S.A.	2,89	0,87	2,72	0,57	0,07
63	COMPAÃ‘IA DE INVERSIONES INTEGRALES S A S	2,97	0,53	1,08	0,10	0,05
64	BUONAVITA CONSTRUCCIONES SAS	3,71	0,87	0,60	0,09	0,01
65	SOLARTE NACIONAL DE COSTRUCCIONES S A S	1,68	0,66	2,04	0,07	0,02
66	AQUAVIVA LTDA GESTION E INGENIERIA	1,92	0,51	6,87	0,30	0,15
67	INGENIERIA Y GEORIESGOS IGR SAS	2,10	0,40	16,87	0,30	0,18
68	INVERSION Y DESARROLLO BARRANCO & CURE S.A.	0,36	0,74	1,40	0,42	0,11
69	INVERSIONES FR Y CIA S EN C	1,48	0,43	38,48	0,41	0,23
70	SOLUCIONES INMOBILIARIAS Y FINANCIERAS S A S	2,20	0,72	4,07	0,12	0,04
71	DISEÃ‘OS Y CONSTRUCCIONES CIVILES DCC SAS	2,60	0,44	2,13	0,13	0,07
72	ASCENDER INGENIRIA LTDA	1,70	0,42	14,72	0,36	0,21
73	SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÃ‘O Y CONSTRUCCION S.A.S	1,35	0,64	14,17	0,45	0,16
74	CONSULTORA LATINOAMERICANA DE INGENIERIA S.A.	1,69	0,55	28,86	0,12	0,05
75	LASMO ARQUITECTOS S A S	2,18	0,68	3,74	0,12	0,04
76	NAVARRO ROCHA S A S	2,19	0,41	9,79	0,08	0,05
77	INVERSIONES LATITUDE LTDA.	1,29	0,78	2,08	0,14	0,03
78	REM CONTRUCCIONES S.A.	2,80	0,90	1,52	0,23	0,02
79	LV ESTRUCTURAS EN CONCRETO S A	1,69	0,69	1,51	0,18	0,06
80	AREA URBANA DISEÃ‘O Y CONSTRUCCION S A S	2,88	0,93	1,21	0,24	0,02

	RAZON SOCIAL	Liquidez	Endeudamiento	Razón de Cobertura	Rent. Patrimonio	Rent. Activo
81	COMPAÃ‘IA DE TRABAJOS URBANOS S A	1,54	0,45	3,18	0,07	0,04
82	CUELLAR SERRANO GOMEZ S.A.	2,05	0,30	5,09	0,07	0,05
83	JORGE TRIANA Y COMPANIA S.A.S	1,66	0,46	3,95	0,11	0,06
84	MAZUERA VILLEGAS Y COMPAÃ‘IA SA	0,94	0,27	0,24	0,01	0,01
85	JARDINES DE PAZ S A	1,41	0,59	2,21	0,18	0,07
86	CONSULTORIA COLOMBIANA S A	1,95	0,47	2,34	0,09	0,05
87	FLAMAX LTDA.	2,18	0,50	16,81	0,14	0,07
88	INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A	1,50	0,61	3,33	0,22	0,08
89	INVERSIONES VENTURA S. A.	0,87	0,77	0,48	0,10	0,02
90	CONSTRUCCIONES ARRECIFE S A S	2,32	0,44	4,11	0,13	0,07
91	VILLA HERNANDEZ Y CIA S A S	2,20	0,59	3,23	0,21	0,09
92	INGENIERIA PLINCO S.A	1,67	0,68	11,16	0,19	0,06
93	ORDOÃ‘EZ MENDIETA Y CIA S A	2,58	0,58	1,30	0,18	0,07
94	ARIAS SERNA Y SARAVIA S.A.S.	1,76	0,72	0,26	0,05	0,01
95	HIDROCONSULTA SAS	1,49	0,67	7,24	0,18	0,06
96	C M G CONSTRUCCIONES Y MONTAJES GENERALES S A S	2,57	0,52	1,99	0,22	0,11
97	COINVER S. A. CONSTRUCCIONES INGENIERIA E INVERSIONES	2,58	0,61	6,72	0,41	0,16
98	GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S A	1,80	0,75	19,15	0,13	0,03
99	OBRAS CIVILES Y EQUIPOS LTDA	1,29	0,55	7,75	0,22	0,10
100	ELEMENTOS METALICOS S A	1,59	0,50	5,16	0,26	0,13
	PROMEDIO	**2,30**	**0,47**	**8,09**	**0,16**	**0,08**
	MEDIANA	**2,18**	**0,44**	**4,38**	**0,12**	**0,05**
	VARIANZA	**0,88**	**0,03**	**75,64**	**0,02**	**0,00**
	DESVIACION ESTANDAR	**0,94**	**0,17**	**8,70**	**0,13**	**0,07**

NOTA: Por tratarse de un proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía de obra pública de infraestructura social, los indicadores de capacidad financiera y organizacional exigibles son los fijados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales del Documento Tipo, que la Entidad no puede modificar: para proponentes que no acrediten la condición de Mipyme, índice de liquidez ≥ 1,2; índice de endeudamiento ≤ 0,70; razón de cobertura de intereses ≥ 1; rentabilidad del patrimonio ≥ 0,04 y rentabilidad del activo

≥ 0,02; y para proponentes Mipyme, índice de liquidez ≥ 1,1; índice de endeudamiento ≤ 0,70; razón de cobertura de intereses ≥ 1; rentabilidad del patrimonio ≥ 0,02 y rentabilidad del activo ≥ 0,01. El capital de trabajo se calcula conforme al Documento Base. El análisis estadístico que sigue es referencial y permite verificar que la muestra del sector cumple dichos indicadores, lo que garantiza la pluralidad de oferentes.

Tabla 2 – Indicadores financieros y organizacionales exigidos (Matriz 2 del Documento Tipo) frente a la muestra de 100 empresas del sector

Indicador	Exigido no Mipyme (Matriz 2)	Exigido Mipyme (Matriz 2)	Media muestra	Mediana muestra	% muestra que cumple (no Mipyme / Mipyme)
Índice de liquidez	≥ 1,2	≥ 1,1	2,30	2,18	97 % / 97 %
Índice de endeudamiento	≤ 0,70	≤ 0,70	0,47	0,44	88 % / 88 %
Razón de cobertura de intereses	≥ 1	≥ 1	8,09	4,38	91 % / 91 %
Rentabilidad del patrimonio	≥ 0,04	≥ 0,02	0,16	0,12	87 % / 94 %
Rentabilidad del activo	≥ 0,02	≥ 0,01	0,08	0,05	89 % / 96 %
Capital de trabajo	≥ $161.676.490	≥ $161.676.490	—	—	Según estados financieros de cada proponente
Cumplen todos los indicadores (sin capital de trabajo)					**76 % / 82 %**

Conclusión: el 76 % de las empresas de la muestra cumple simultáneamente la totalidad de los indicadores exigidos a proponentes no Mipyme, y el 82 % los exigidos a proponentes Mipyme. En consecuencia, los requisitos de capacidad financiera y organizacional del Documento Tipo son proporcionales al valor y a la naturaleza del contrato y permiten la pluralidad de oferentes, por lo que la Entidad los adopta sin modificación, como lo exige el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, modificado por la Ley 2022 de 2020.

***El índice de liquidez**, se evaluó con base en la información del SIREM una muestra de empresas dedicadas al sector de la construcción en Norte de Santander y toda Colombia para definir los límites de este indicador.*

Con esta muestra de 100 empresas tomada del SIREM para indicadores de liquide, se tienen los siguientes datos:

$$Media = \frac{\sum Liquidez_i}{n}$$

Media = 2,30

Mediana = 2,18

$$Varianza = \frac{\sum (Liquidez_i - Media)^2}{n}$$


Varianza = 0,88

$$Desviación\ Estándar = \sqrt[2]{Varianza}$$

Desviación Estándar de la muestra = 0,94

Límite inferior a tomar = Media – Desviación Estándar = 1,36
Límite superior a tomar = Media + Desviación Estándar = 3,24

La media de la muestra (2,30) y su mediana (2,18) superan ampliamente el valor exigido en la Matriz 2 del Documento Tipo: ÍNDICE DE LIQUIDEZ MAYOR O IGUAL A UNO PUNTO DOS (≥ 1,2) para proponentes no Mipyme y MAYOR O IGUAL A UNO PUNTO UNO (≥ 1,1) para proponentes Mipyme. El 97 % de las empresas de la muestra cumple este indicador.

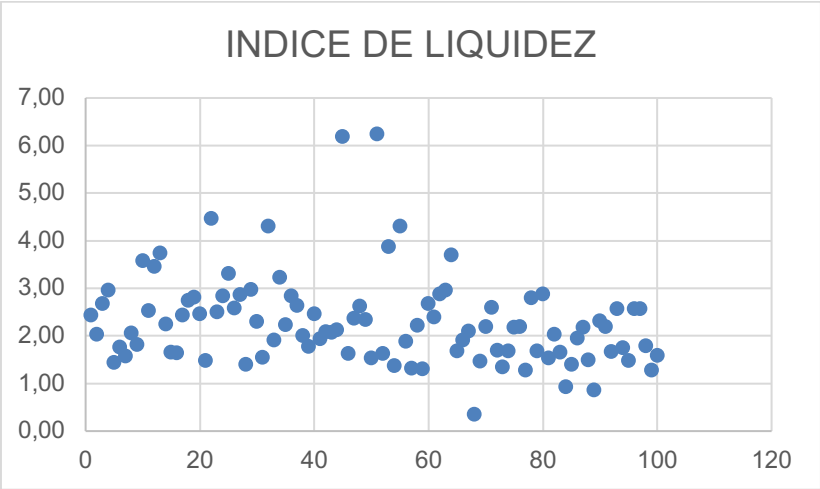

Para determinar el Índice de Liquidez se tendrá en cuenta la siguiente fórmula:

$$\text{Índice de Liquidez} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

En el caso de Consorcios el Índice de Liquidez se calculará sumando los parámetros necesarios de todos los miembros del Consorcio, así:

$$\text{Indice de Liquidez} = \frac{AC_1 + AC_2 + \ldots\ldots AC_n}{PC_1 + PC_2 + \ldots\ldots PC_n}$$

Donde:

ACn = Activo Corriente del miembro n del Consorcio
PCn = Pasivo Corriente del miembro n del Consorcio

En caso de Uniones Temporales el Índice de Liquidez se calculará ponderando los parámetros necesarios de todos los miembros de la Unión Temporal de acuerdo al Porcentaje de Participación de cada uno de los miembros y aplicando la siguiente fórmula:

$$\text{Indice de Liquidez} = \frac{AC_1 * (\%P)_1 + AC_2 * (\%P)_2 + \ldots\ldots AC_n * (\%P)_n}{PC_1 * (\%P)_1 + PC_2 * (\%P)_2 + \ldots\ldots PC_n * (\%P)_n}$$

ACn(%P)n = Activo Corriente del miembro n de la Unión Temporal, multiplicado por su Porcentaje de participación.

PCn(%P)n= Pasivo Corriente del miembro n de la Unión Temporal, multiplicado por su Porcentaje de participación.

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

Con esta muestra de 100 empresas tomada del SIREM para indicadores de endeudamiento, se tienen los siguientes datos:

$$\text{Media} = \frac{\sum \text{Endeudamiento}_i}{n}$$

Media = 47 %
Mediana = 44 %

$$\text{Varianza} = \frac{\sum(\text{Endeudamiento}_i - \text{Media})^2}{n}$$

Varianza = 0,03


$$\text{Desviación Estándar} = \sqrt[2]{\text{Varianza}}$$

Desviación Estándar de la muestra = 0,17 (17 %)

Límite inferior a tomar = Media – Desviación Estándar = 30 %
Límite superior a tomar = Media + Desviación Estándar = 64 %

La media de la muestra (47 %) y su mediana (44 %) se encuentran por debajo del máximo

permitido en la Matriz 2 del Documento Tipo: ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL A CERO PUNTO SETENTA (≤ 0,70) para todos los proponentes, Mipyme o no. El 88 % de las empresas de la muestra cumple este indicador.

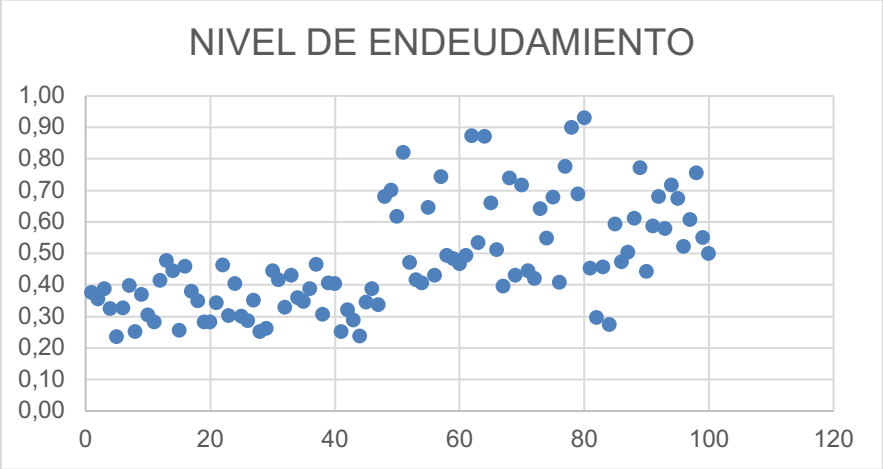

Para determinar el Nivel de Endeudamiento se aplicará la siguiente fórmula:

$$\text{Nivel de Endeudamiento} = \frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$$

En el caso de Consorcios el Nivel de Endeudamiento se calculará sumando los parámetros necesarios de cada uno de los miembros del Consorcio, así:

$$\text{Nivel de Endeudamiento} = \frac{PT_1 + PT_2 + \ldots\ldots PT_n}{AT_1 + AT_2 + \ldots\ldots AT_n}$$

Donde:

PTn = Pasivo Total del miembro n del Consorcio.
ATn = Activo Total del miembro n del Consorcio.

En caso de Uniones Temporales el nivel de endeudamiento se calculará, ponderando los parámetros necesarios de todos los miembros de la Unión Temporal de acuerdo al porcentaje de participación de cada uno de los miembros y aplicando las siguientes fórmulas:

$$\text{Nivel de Endeudamiento} = \frac{PT_1 * (\%P)_1 + PT_2 * (\%P)_2 + \ldots\ldots PT_n * (\%P)_n}{AT_1 * (\%P)_1 + AT_2 * (\%P)_2 + \ldots\ldots AT_n * (\%P)_n}$$

Donde:

PTn*(%P)n = Pasivo Total del miembro n de la Unión Temporal, multiplicado por el porcentaje de participación.

ATn*(%P)n = Activo Total del miembro n de la Unión Temporal, multiplicado por el porcentaje de participación.

COBERTURA DE INTERESES

Con esta muestra de 100 empresas tomada del SIREM para indicadores de Razón de Cobertura de Intereses, se tienen los siguientes datos:

$$Media = \frac{\sum R.C.I_i}{n}$$

Media = 8,09
Mediana = 4,38

$$Varianza = \frac{\sum (R.C.I_i - Media)^2}{n}$$


Varianza = 75,64

$$Desviación\ Estándar = \sqrt[2]{Varianza}$$

Desviación Estándar de la muestra = 8,70

Límite inferior a tomar = Media – Desviación Estándar = -0,61
Límite superior a tomar = Media + Desviación Estándar = 16,79

Dada la alta dispersión de la muestra (desviación estándar 8,70), la media (8,09) no es un valor representativo; sin embargo, tanto la media como la mediana (4,38) superan el valor exigido en la Matriz 2 del Documento Tipo: RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES MAYOR O IGUAL A UNO (≥ 1) para todos los proponentes. El proponente que no tenga gastos de intereses quedará habilitado respecto de este indicador, siempre que su utilidad operacional sea igual o mayor a cero. El 91 % de las empresas de la muestra cumple este indicador.

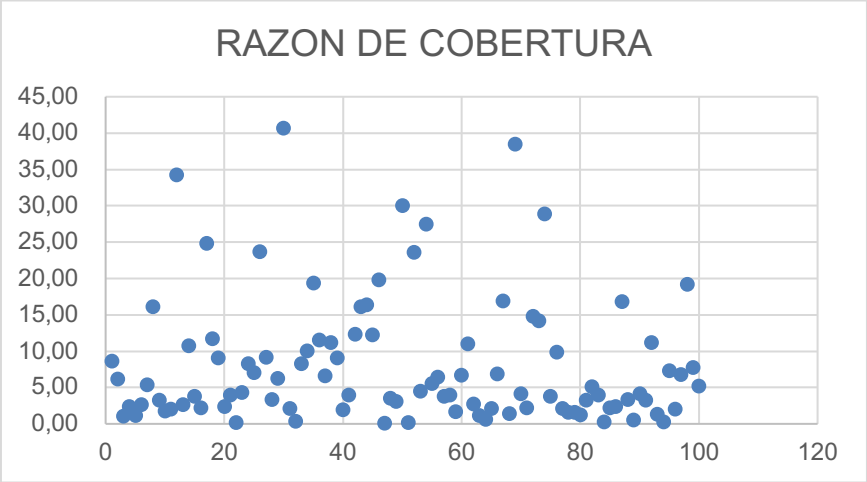

Para determinar la razón de cobertura de intereses se aplicará la siguiente fórmula:

$$\text{Razón de cobertura de intereses} = \frac{\text{Utilidad Operacional}}{\text{Gastos de intereses}}$$

En el caso de Consorcios la Razón de cobertura de intereses se calculará sumando los parámetros necesarios de cada uno de los miembros del Consorcio, así:

$$\text{Razón de cobertura de intereses} = \frac{UO_1 + UO_2 + \ldots\ldots UO_n}{GI_1 + GI_2 + \ldots\ldots GI_n}$$

Donde:

UOn = Utilidad operacional del miembro n del Consorcio.
GIn = Gastos de Intereses del miembro n del Consorcio.

En caso de Uniones Temporales la Razón de cobertura de intereses se calculará, ponderando los parámetros necesarios de todos los miembros de la Unión Temporal de acuerdo al porcentaje de participación de cada uno de los miembros y aplicando las siguientes fórmulas:

$$UO_1 * (\%P)_1 + UO_2 * (\%P)_2 + \ldots\ldots UO_n * (\%P)_n$$

Razón de cobertura de intereses = $\frac{\text{UO}_1 * (\%P)_1 + \text{UO}_2 * (\%P)_2 + \ldots\ldots \text{UO}_n * (\%P)_n}{\text{GI}_1 * (\%P)_1 + \text{GI}_2 * (\%P)_2 + \ldots\ldots \text{GI}_n * (\%P)_n}$

Donde:

UOn*(%P)n = = Utilidad operacional del miembro n de la Unión Temporal, multiplicado por el porcentaje de participación.

GIn*(%P)n = Gastos de Intereses del miembro n de la Unión Temporal, multiplicado por el porcentaje de participación.

CAPITAL DE TRABAJO

Conforme al Documento Base, por tratarse de un contrato con plazo inferior a doce (12) meses y sin anticipo ni pago anticipado, el proponente deberá acreditar un capital de trabajo (CT = Activo corriente – Pasivo corriente) mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd), calculado así: CTd = (POE – Anticipo o pago anticipado) x 33 % = ($489.928.756 – $0) x 33 % = $161.676.490. Para proponentes plurales, el capital de trabajo será la suma del capital de trabajo de cada uno de sus integrantes. En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el presupuesto oficial.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

El Proponente debe acreditar su capacidad organizacional con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP con estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2025 (el cual se debe encontrar debidamente actualizado) , o en la información financiera anexa a la Oferta en aquellos casos en que el Proponente no esté obligado a estar inscrito en el RUP.

Tabla 3- Indicadores de capacidad organizacional para proponentes con RUP (Matriz 2 – proponentes no Mipyme; para proponentes Mipyme: rentabilidad del patrimonio ≥ 0,02 y rentabilidad del activo ≥ 0,01)

INDICADOR	ÍNDICE REQUERIDO
Rentabilidad sobre patrimonio	≥ 0,04
Rentabilidad sobre activos	≥ 0,02

Si el proponente es un consorcio, unión temporal, promesa de sociedad futura o está organizado en cualquier forma de asociación, debe acreditar su capacidad organizacional de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la determinación y Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación.

- ***Análisis para determinar los Indicadores de Rentabilidad***

Los indicadores de rentabilidad se evaluaron con base en la información del SIREM para la cuenta Estado de Resultados con una muestra de empresas dedicadas al sector de la construcción en Norte de Santander y toda Colombia para definir los límites de este indicador.

Con esta muestra de 100 empresas tomada del SIREM para indicadores de Rentabilidad del patrimonio, se tienen los siguientes datos:

$$Media = \frac{\sum R.C.I_i}{n}$$

Media = 0,16
Mediana = 0,12

$$Varianza = \frac{\sum (R.C.I_i - Media)^2}{n}$$


Varianza = 0,02

$$Desviación\ Estándar = \sqrt[2]{Varianza}$$

Desviación Estándar de la muestra = 0,13

Límite inferior a tomar = Media – Desviación Estándar = 0,03
Límite superior a tomar = Media + Desviación Estándar = 0,29

La media (0,16) y la mediana (0,12) de la muestra superan el valor exigido en la Matriz 2 del Documento Tipo: RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO MAYOR O IGUAL A CERO PUNTO CERO CUATRO (≥ 0,04) para proponentes no Mipyme y MAYOR O IGUAL A CERO PUNTO CERO DOS (≥ 0,02) para proponentes Mipyme. Cumplen el 87 % y el 94 % de las empresas de la muestra, respectivamente.

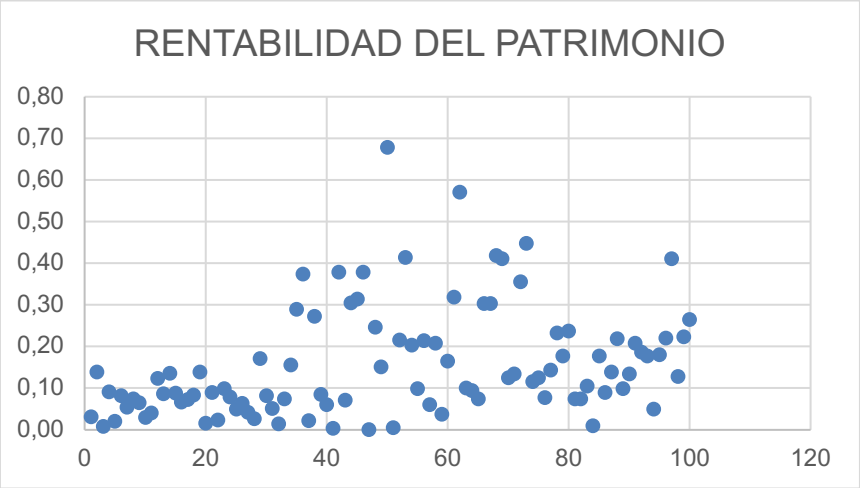

Con esta muestra de 100 empresas tomada del SIREM para indicadores de Rentabilidad del activo, se tienen los siguientes datos:

$$Media = \frac{\sum R.C.I_i}{n}$$

Media = 0,08
Mediana = 0,05

$$Varianza = \frac{\sum (R.C.I_i - Media)^2}{n}$$


Varianza = 0,00

$$Desviación\ Estándar = \sqrt[2]{Varianza}$$

Desviación Estándar de la muestra = 0,07

Límite inferior a tomar = Media – Desviación Estándar = 0,01
Límite superior a tomar = Media + Desviación Estándar = 0,15

La media (0,08) y la mediana (0,05) de la muestra superan el valor exigido en la Matriz 2 del Documento Tipo: RENTABILIDAD DEL ACTIVO MAYOR O IGUAL A CERO PUNTO CERO DOS (≥ 0,02) para proponentes no Mipyme y MAYOR O IGUAL A CERO PUNTO CERO UNO (≥ 0,01) para proponentes Mipyme. Cumplen el 89 % y el 96 % de las empresas de la muestra, respectivamente.

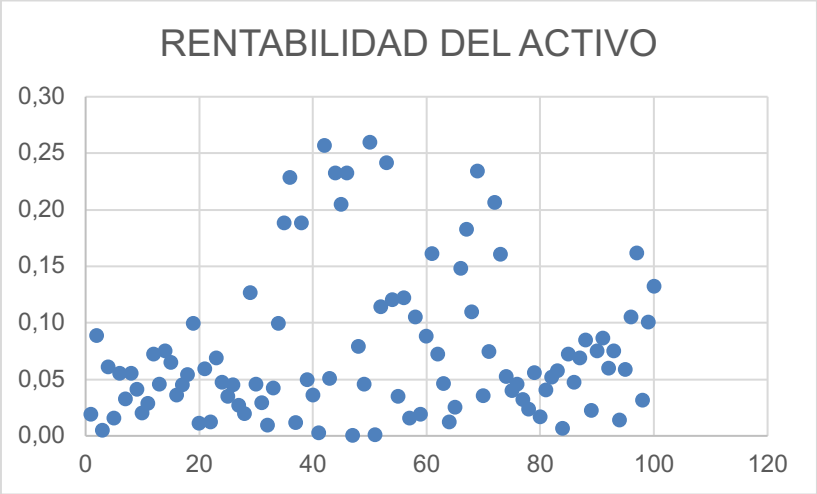

Para determinar la Rentabilidad sobre patrimonio se aplicará la siguiente fórmula:

$$\text{Rentabilidad sobre patrimonio} = \frac{\text{Utilidad Operacional}}{\text{Patrimonio}}$$

En el caso de Consorcios la Rentabilidad sobre patrimonio se calculará sumando los parámetros necesarios de cada uno de los miembros del Consorcio, así:

$$\text{Rentabilidad sobre patrimonio} = \frac{UO_1 + UO_2 + \ldots\ldots UO_n}{P_1 + P_2 + \ldots\ldots P_n}$$

Donde:

UOn = Utilidad operacional del miembro n del Consorcio.
Pn = Patrimonio del miembro n del Consorcio.

En caso de Uniones Temporales la Rentabilidad sobre patrimonio se calculará, ponderando los parámetros necesarios de todos los miembros de la Unión Temporal de acuerdo al porcentaje de participación de cada uno de los miembros y aplicando las siguientes fórmulas:

$$UO_1 * (\%P)_1 + UO_2 * (\%P)_2 + \ldots\ldots UO_n * (\%P)_n$$

$$\text{Rentabilidad sobre patrimonio} = \frac{}{P_1 * (\%P)_1 + P_2 * (\%P)_2 + \ldots\ldots P_n * (\%P)_n}$$

Donde:

UOn*(%P)n = = Utilidad operacional del miembro n de la Unión Temporal, multiplicado por el porcentaje de participación.
Pn*(%P)n = Patrimonio del miembro n de la Unión Temporal, multiplicado por el porcentaje de participación.

Para determinar la Rentabilidad sobre Activos se aplicará la siguiente fórmula:

$$\text{Rentabilidad sobre Activos} = \frac{\text{Utilidad Operacional}}{\text{Activo total}}$$

En el caso de Consorcios la Rentabilidad sobre activos se calculará sumando los parámetros necesarios de cada uno de los miembros del Consorcio, así:

$$\text{Rentabilidad sobre Activos} = \frac{UO_1 + UO_2 + \ldots\ldots UO_n}{AT_1 + AT_2 + \ldots\ldots AT_n}$$

Donde:

UOn = Utilidad operacional del miembro n del Consorcio.
ATn = Activo Total del miembro n del Consorcio.

En caso de Uniones Temporales la Rentabilidad sobre activos se calculará, ponderando los parámetros necesarios de todos los miembros de la Unión Temporal de acuerdo al porcentaje de participación de cada uno de los miembros y aplicando las siguientes fórmulas:

$$\text{Rentabilidad sobre activos} = \frac{UO_1 * (\%P)_1 + UO_2 * (\%P)_2 + \ldots\ldots UO_n * (\%P)_n}{AT_1 * (\%P)_1 + AT_2 * (\%P)_2 + \ldots\ldots AT_n * (\%P)_n} * 100$$

Donde:

UOn*(%P)n = = Utilidad operacional del miembro n de la Unión Temporal, multiplicado por el porcentaje de participación.

ATn*(%P)n = Activo Total del miembro n de la Unión Temporal, multiplicado por el porcentaje de participación.

Cifras de constructores según tamaño empresarial.

El sector está compuesto por 3024 sociedades que reportaron información financiera bajo normas internacionales para los años 2020, 2021 y 2022 sin interrupción. Las cifras se encuentran expresadas en billones de pesos.

Tabla 1. Ingresos Operacionales por Tamaño Año 2020-2022

Figura 1: Ingresos vs Ganancias



Fuente: *Súper sociedades*-Cálculos *Grupo de Estudios Económicos y Financieros.*

Comportamiento financiero del sector de obras civiles o infraestructura


INGRESOS. Se puede observar un aumento del 15% en los ingresos operacionales en el año 2022; sin embargo, este incremento es inferior al crecimiento de los años anteriores, lo que indica una tendencia decreciente.

Las ganancias en promedio crecieron un 11.2 % reflejando un crecimiento sostenido en los años evaluados 2020-2022.

Tendencia creciente 2020 ($44.52 billones), 2022 ($60.30 billones) Crecimiento anual decreciente 18 % - 14 %

Tabla10. ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIOS

Figura 5: Rubros Principales

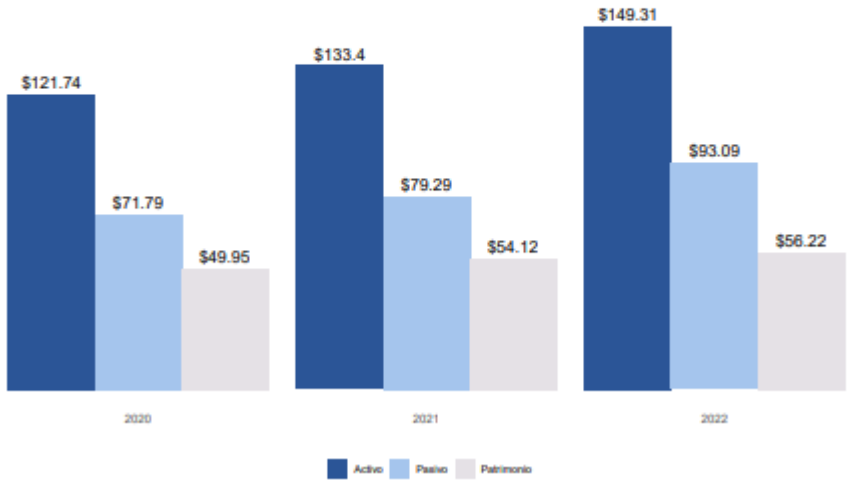

Fuente: *Supersociedades* – Cálculos *Grupo de Estudios Económicos y Financieros.*

La composición de las fuentes de financiamiento durante el periodo es de 60.25 % en patrimonio y de 39.75 % en pasivos. Los pasivos financieros respecto al patrimonio representan en promedio el 42.25 %. Cobertura de intereses. El sector puede hacerse cargo del pago de los intereses de la deuda que ha asumido, para el año 2022 esta capacidad fue del 1.35 veces.

GANANCIAS VS PERDIDAS EN EL SECTOR

En este indicador observamos Tendencia creciente 2024 ($3.10 billones), 2022 ($4.09 billones) Crecimiento anual ascendente en 2021 18.1 % Mayoritariamente ganancias Las pérdidas fueron bajas, sin embargo, aumentaron en ambos años.

Figura 2: Ganancias vs Pérdidas




Fuente: *Supersociedades; cálculos Grupo de Estudios Económicos y Financieros.*

Durante los año 2008 a 2010 una de las cuentas más representativas ha sido la de propiedad, planta y equipo que muestra crecimientos continuos, derivados seguramente de las inversiones en maquinaria amarilla de última tecnología esto con el fin de afianzarse en el cumplimiento de las obras en ejecución y las futuras adjudicadas. Sin embargo esta dinámica de inversión se detuvo en los años 2011 y 2012 producto de la escases de proyectos y con la naturaleza misma del activo, ya que dicha cuenta no requiere reemplazarse con tanta frecuencia y cuya demanda disminuye en la medida que no hay nuevos proyectos.

Gráfica11.

Figura 11: ROA vs ROE

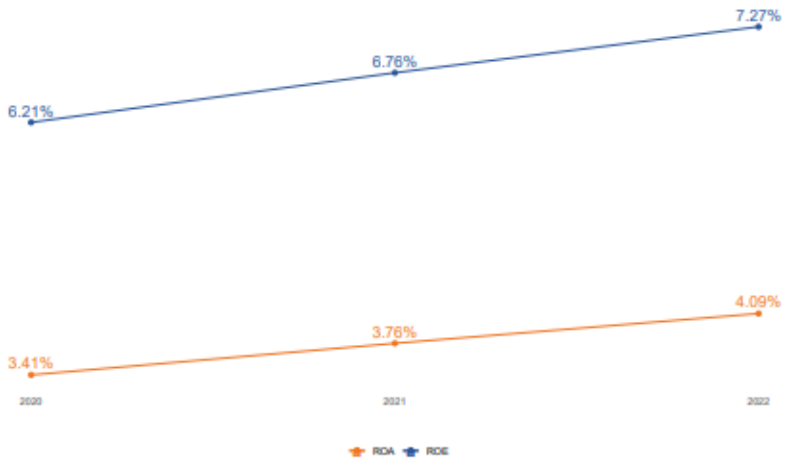

Fuente: *Supersociedades*-Cálculos *Grupo de Estudios Económicos y Financieros.*

ROE: Se mantuvo alrededor de (6.75 %) con tendencia creciente
ROA: Se mantuvo alrededor de (3.75 %) con tendencia creciente

Figura 13: Endeudamiento y Leverage Financiero





Figura 14: Cobertura de intereses



La composición de las fuentes de financiamiento durante el periodo es de 60.25 % en patrimonio y de 39.75 % en pasivos. Los pasivos financieros respecto al patrimonio representan en promedio el 42.25 %. Cobertura de intereses. El sector puede hacerse cargo del pago de los intereses de la deuda que ha asumido, para el año 2022 esta capacidad fue del 1.35 veces.

ANALISIS DEL ENDEUDAMIENTO


Respecto al endeudamiento o apalancamiento financiero de las empresas analizadas dentro de este rol, se encuentra que el indicador disminuyó reflejando las decisiones conservadoras de apalancamiento por parte de los empresarios ante el escenario de desaceleración económica y los inconvenientes presentados por problemas en la administración de los recursos desembolsados para ejecutar las obras de infraestructura.

La rotación de activos presenta una leve caída, sin embargo, permite seguir teniendo estabilidad en la eficiencia del uso y la gestión de los activos para la generación de ingresos operacionales en el sector.

Esto permite concluir que se está alineado con la matriz de buenas prácticas en la contratación elaborado por la Cámara Colombiana de Infraestructura, que propone límites de endeudamiento hasta un 70% para garantizar una puesta en marcha de las obras de infraestructura más segura.

Los indicadores de desempeño EBITDA entendido como la capacidad de generación de caja y Margen EBITDA como el porcentaje de los ingresos operacionales que se convierte en caja para atender las obligaciones financieras, este último, para la serie de tiempo 2020-2022 presenta variaciones positivas producto de los ingresos percibidos por la ejecución de lo presupuestado para las obras de infraestructura adjudicadas.

Figura 4: Ebitda vs Ganancias

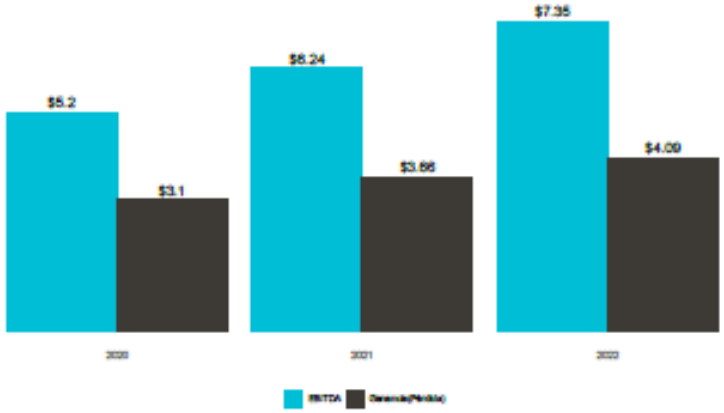

Fuente: *Supersociedades*-Cálculos *Grupo de Estudios Económicos y Financieros.*

Tendencia creciente 2020 ($5.2 billones), 2022 ($7.35 billones) Crecimiento anual descendente 20 % - 17 %

1. **<u>Dinámica de producción, distribución y entrega de los bienes a proveer</u>**

(i) **Producción (métodos de producción).**

- ACTIVIDADES PRELIMINARES: La constituyen la localización y el replanteo, las excavaciones necesarias y el retiro de sobrantes.
- DEMOLICIONES Y DESMONTES: demolición de muros, concreto, escalera y rampa; desmonte de ventanas, tanques, cubierta existente, muros y cielorrasos en drywall y aires acondicionados.
- OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN: elementos estructurales en concreto y acero de refuerzo, estructura metálica y cubierta en teja tipo sándwich, redes eléctricas e hidrosanitarias, aparatos sanitarios, mampostería, pañetes, pintura, cielorrasos, pisos, carpintería en aluminio y aseo final de obra.

(ii) **Distribución**: hace referencia al transporte de los bienes a proveer su tiempo de entrega y costo que manejan los posibles proveedores, teniendo en cuenta lo siguiente:

- **Los proveedores tienen la capacidad de distribuidor el productor en todos los lugares requeridos**: Si los proveedores tienen la capacidad de distribuir los productos a los lugares solicitados por el supervisor del contrato

- **Diferencia entre los costos entre contratar el transporte y distribución al mismo proveedor del producto o contratar el transporte de forma independiente**: el contratar el transporte de los equipos hacia los lugares solicitados por el supervisor del contrato acarrearía un costo adicional al municipio, el cual se ahorraría recursos y disponibilidad de tiempo de personal al estar incluido este en el valor de la propuesta económica siendo esta obligación a cargo del futuro contratista.
- **Tiempos de entrega a los diferentes lugares donde se deba suministrar el producto:** Serán los estipulados por en los pliegos de condiciones y en el presente estudio del sector, el tiempo será máximo de dos meses.
- **El producto permite ser almacenado o necesita de condiciones especiales para conservar sus propiedades:** El producto permite ser almacenado sin ninguna condición especial.
- **El ahorro de comprar en bloque y almacenar es mayor que el costo de distribuir a varios lugares**: No aplica.

(iii) Inventario: Se estudia el almacenamiento y manejan los inventarios los posibles proveedores , para lo cual se tuvo en cuenta:

- Existencia de inventarios en las instalaciones del proveedor y el tiempo para su entrega a la entidad estatal: Debe contar el proveedor con una existencia mínima de los bienes requeridos a fin de que se entregados dentro del tiempo estipulado es decir dos meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

-Los efectos del riesgo de desabastecimiento: al existir el riesgo de desabastecimiento los precios aumenta debido a la poca oferta de productos con lo cual afectaría el equilibrio contractual y retrasando los programas relacionados con los bienes a proveer

-**Costo y los riesgos asociados a mantener el inventario:** los riesgos referentes a mantener el inventario van relacionados con tener en buen estado los bienes a proveer los cuales deben encontrarse debidamente empacados , lo cual tendría costos adicionales al proveedor los cuales deben ser tenidos se en cuenta en el valor de la propuesta

-**Disponibilidad de un espacio adecuado para el inventario al servicio de la entidad estatal y el valor asociado a este:** es necesario para el presente proceso con que se encuentre disponibilidad en el inventario.

C. ESTUDIO DE LA DEMANDA

1. ¿Cómo ha adquirido la entidad estatal en el pasado este bien, obra o servicio?

El municipio de Los Patios, ha adquirido durante las vigencias a través de la modalidad de SELECCIONES ABREVIADAS Y LICITACIONES PUBLICAS ADJUDICADAS, el objeto, el valor de los contratos, número de contratos suscritos, la vigencia de los mismos, el tiempo y lugares de entrega, se presentan en la siguiente tabla:

	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	LP-SI-017-2022 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	Fase de Selección (Presentación de ofertas)	25/11/2022 3:44 PM *(UTC -5 horas)*	9/12/2022 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	1.428.650.848 COP

86	SAMC-SI-006-2018	Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)	Liquidado	NORTE DE SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE LOS PATIOS	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO CASA CAMPESINA DE LA VEREDA LA MUTIS EN EL MUNICIPIO LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER	Norte De Santander : Los Patios	$134.763.076,00	Fecha de Liquidación 03-04-2019
94	SAMC-OP-26-2015	Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)	Liquidado	NORTE DE SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE LOS PATIOS	OBRAS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER	Norte De Santander : Los Patios	$75.293.163,00	Fecha de Liquidación 05-02-2019

Autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución y cuando el contrato incluye diseño y construcción los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. La documentación técnica de cada uno de los procesos celebrados reposa en la Secretaría de Planeación del Municipio de Los Patios y hace parte integral del proyecto formulado que dio origen al proceso de contratación que se celebró con la legalización de los contratos suscritos para cada obra.

Forma de pago. Revisado los contratos suscritos por la entidad se observa que en la mayoría la forma de pago obedece a: El Municipio de Los Patios pagará el valor del contrato, de la siguiente manera: mediante el pago de actas parciales y/o final, por avance de ejecución de los trabajos, previa presentación de la factura y cuenta de cobro, con el visto bueno y recibo a satisfacción por parte de la interventoría.

Anticipo. No se pactará anticipo o pago anticipado para el contrato producto de esta selección. Se pagará con actas parciales y acta final de obra.

Garantías exigidas y siniestros.

Una garantía única otorgada por un banco o compañía de seguros legalmente establecida en Colombia que ampare los siguientes riesgos con las cuantías y vigencias aquí establecidas.

Suficiencia y vigencia de las garantías

Amparo	Suficiencia	Vigencia
Seriedad de la oferta: La garantía de seriedad de la oferta debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos: 1.La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses 2.El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas 3.La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario 4. la falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionada de la garantía	10% del presupuesto oficial	Tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso
Cumplimiento y calidad del servicio: **(a)** El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista **(b)** El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cual el incumplimiento es imputable al contratista **(c)** Los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuan el contrato no prevé entregas parciales **(d)** El pago del valor de las multas y dela cláusula penal pecuniaria	10% del valor del contrato	Plazo del contrato y hasta su liquidación

Estabilidad de la Obra	(20%) del valor total del contrato	Cinco (5) años contados a partir del acta de recibo final de la obra
Responsabilidad Civil	200 SMMLV	Igual al período de ejecución del contrato
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. Este amparo debe cubrir a la entidad estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para el cumplimiento del contrato amparado	(5%) del valor total del contrato	Vigencia del contrato y tres (3) años más.

A. Garantía de seriedad de la Oferta

El Proponente debe presentar junto con la oferta una garantía de seriedad de la oferta a favor de la Entidad Contratante por un valor del 10% del presupuesto oficial y con vigencia de tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso.

B. Garantía de Cumplimiento


El contratista debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, a favor de la Entidad contratante serán las descritas en la tabla.

1. **¿Cómo adquieren las entidades y las empresas privadas este bien, obra o servicio?**



Se tomó una muestra de procesos celebrados a nivel nacional, para la realización de contratos relacionados con obras de ingeniería civil, se puede observar que las modalidades utilizadas corresponden, según la cuantía de cada entidad, a la LICITACIÓN PÚBLICA y a la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA. Para el presente proceso, dado que el presupuesto oficial de $489.928.756 (279,81 SMMLV) no supera la menor cuantía del Municipio de Los Patios, la modalidad aplicable es la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA prevista en el literal b) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, con aplicación obligatoria del Documento Tipo de Selección Abreviada de Menor Cuantía de Obra Pública de Infraestructura Social – Versión 1. Igualmente, como el presupuesto oficial es inferior al umbral de USD 125.000 (fijado en $511.708.497 para 2026-2027), la convocatoria puede limitarse a Mipyme en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015.

	ALCALDIA MUNICIPIO DE CUMARAL META	LP-002-2026 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA DE ADULTO MAYOR EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CUMARAL, DEPARTAMENTO DEL META (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	Fase de Selección (Presentación de ofertas)	15/10/2026 11:38 AM *(UTC -5 horas)*	22/10/2026 10:00 AM *(UTC -5 horas)*	4.573.053.734,84 COP
	CUNDINAMARCA-ALCALDIA MUNICIPIO MOSQUERA	LP-018-2026	OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR Y DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA	Presentación de observaciones	13/10/2026 8:22 PM *(UTC -5 horas)*	13/11/2026 6:01 PM *(UTC -5 horas)*	7.976.361.000 COP
	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META	LP-AIM-CO-003-2026	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META	Presentación de observaciones	23/09/2026 7:06 AM *(UTC -5 horas)*	23/10/2026 9:00 AM *(UTC -5 horas)*	6.480.588.875 COP
	MUNICIPIO DE VICTORIA	LP-001-2026 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DÍA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL CENTRO POBLADO DE ISAZA MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	Fase de Selección (Presentación de ofertas)	4/05/2026 10:59 AM *(UTC -5 horas)*	12/05/2026 7:59 AM *(UTC -5 horas)*	1.648.148.653 COP

Cordialmente,



Ing. CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON
Secretario de Infraestructura

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Aprobó:	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	
Proyecto	DIDIER ISCALA	CONTRATISTA	
Revisión Componente Jurídica	CLAUDIA ALEXANDRA MOROS FONTALVO	ASESORA JURIDICA EXTERNA	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la Firma del Remitente.			
